



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لمنطقة الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر بالخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A6) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / الاندلس للمقاولات العامة "صالح عليان وشركاه"

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

صور وثائق تأمين

برنامج الزمنى

محضر استلام الموقع

خطاب محملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ٧٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١

اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لمنطقة الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر بالخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A6) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / الاندلس للمقاولات العامة "صالح عليان وشركاه"

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى: ٢٠٢٣/١٢/١٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية - المنطقة الاولى

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة A6 (حسب الكروكي المرفق)

تنفيذ شركة الاندلس للمقاولات العامة .

انه في يوم الخميس الموافق ٢٣-١١-٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٧٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-


مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى
سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام
مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة
مكتب XYZ
شركة الاندلس للمقاولات العامة

- ١- السيد المهندس / 
- ٢- السيد المهندس / 
- ٣- السيد المهندس / 
- ٤- السيد المهندس / 
- ٥- السيد المهندس / 

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٣-١١-٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .


التوقيع :

- ٥- 
- ٤- 
- ٣- 
- ٢- 
- ١- 



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس / 

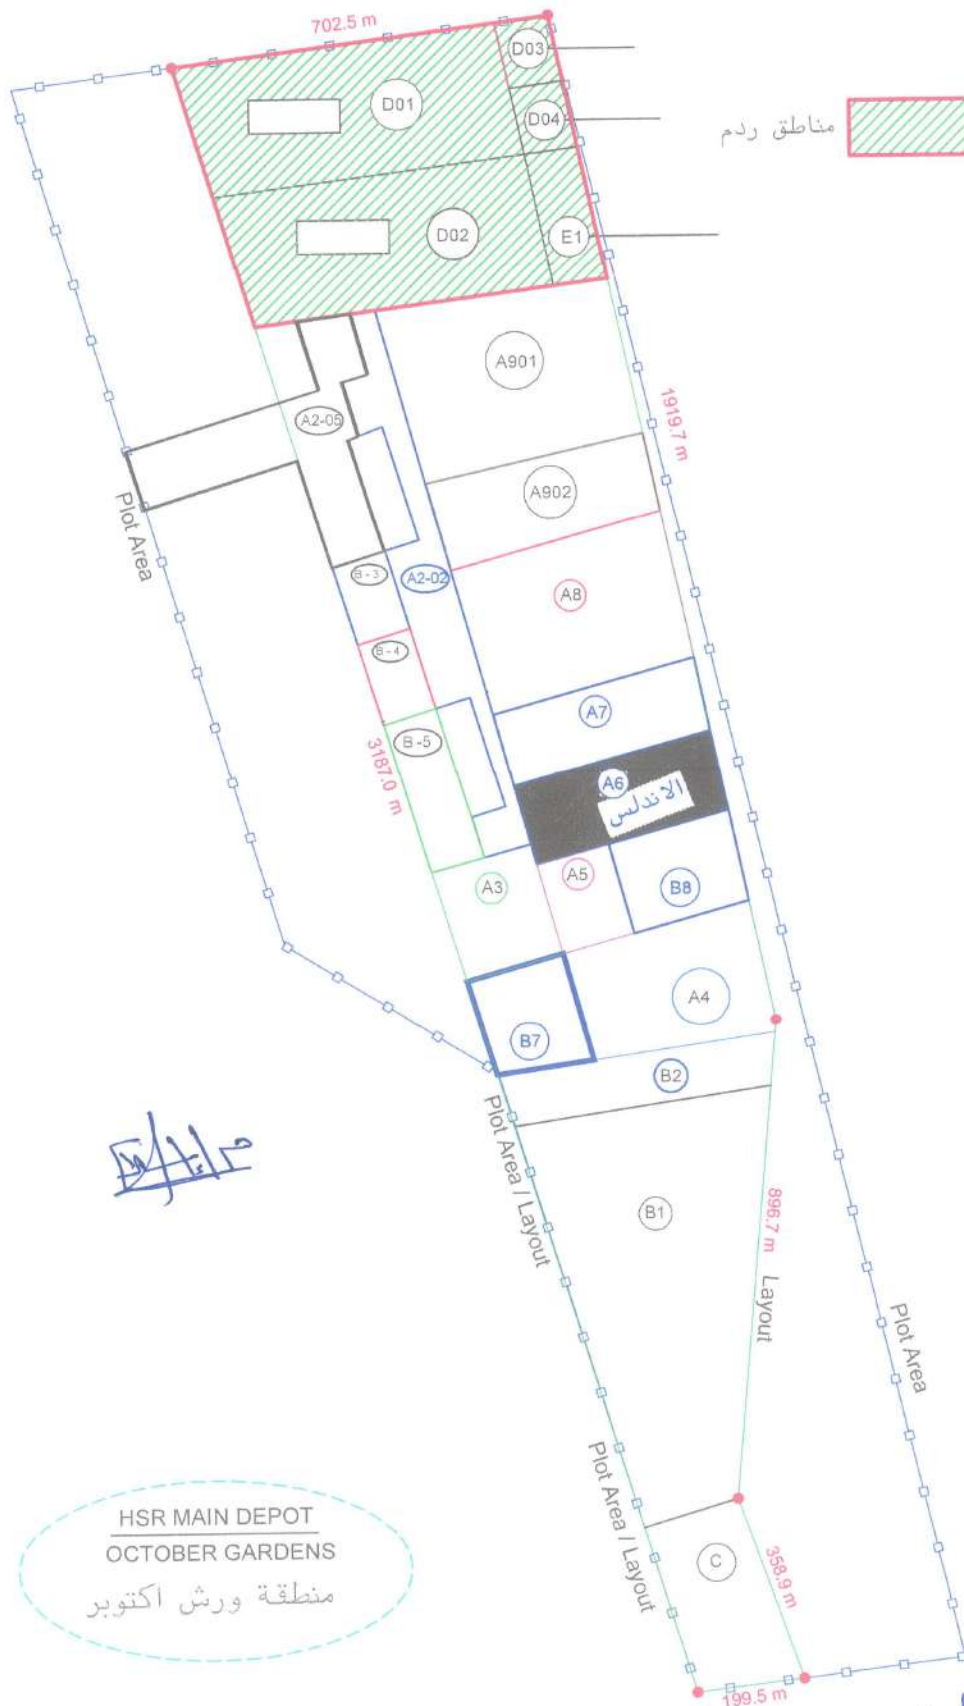

HSR MAIN DEPOT
OCTOBER GARDENS
منطقة ورش اكتوبر

Handwritten signature

Handwritten signature

الردف لى
مستوى الارض

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حادق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح)
المقد رقم : (795-2023-2024) بتاريخ : 2023-11-21

البرنامج الزمني لإنهاء الأعمال

شركة : الاندلس للمقاولات العامة

منطقة A6

الكمية الإجمالية م ³	المخطط	2023						البلد	رقم
		ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
323,826	مخطط شهري	40,478	40,478	40,478	40,478	40,478	40,478	مخطط شهري	3
323,826	مخطط تراكمي	283,348	242,870	202,391	161,913	121,435	80,957	40,478	3
125,003	مخطط شهري	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	4
125,003	مخطط تراكمي	109,378	93,752	78,127	62,502	46,876	31,251	15,625	4

بالمر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويحصل على الرند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وركبة السيول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد التربة مقلية للمواصلات وتطهيرها باستخدام آلات الترسية بسلك لا يزيد عن ٧٥ سم لاستكمال الترسية التربة مقلية تشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) وريشها المياه الصلبة الصلبة لصبوب الترسية نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالدراسات للوصول الى أقصى كثافة حافة (٩٠٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقا للمناصب التصميمية والمقاطع العرضية الجيولوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بالبلد جميع مشتغلاته طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للغمر والتفتيش وتطبيقات الهندس المشرق.

بالمر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويحصل على الرند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وركبة السيول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد التربة مقلية للمواصلات وتطهيرها باستخدام آلات الترسية بسلك لا يزيد عن ٧٥ سم لاستكمال الترسية التربة مقلية تشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) وريشها المياه الصلبة الصلبة لصبوب الترسية نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالدراسات للوصول الى أقصى كثافة حافة (٩٠٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقا للمناصب التصميمية والمقاطع العرضية الجيولوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بالبلد جميع مشتغلاته طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للغمر والتفتيش وتطبيقات الهندس المشرق.



الهيئة العامة للغمر والتفتيش
مؤسسة التنمية الاقتصادية
الهيئة العامة للغمر والتفتيش

مدير عام مشروع

م/ مشيرة السيد

م/ مشيرة السيد

مهندس / نصر محمد نصر طه

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) .
العقد رقم : (735-2023-2024) بتاريخ : 21-11-2023

منطقة A6

شركة : الاندلس للمقاولات العامة

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير تنفيذ للطرق	1	10 سنة
2	مدير المكتب الفني	1	5 سنة
3	مدير ضبط الجودة	1	5 سنة
4	مدير السلامة الوقائية	1	10 سنة
5	مهندس تنفيذ طرق	1	5 سنة
6	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	1	5 سنة
7	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	1	5 سنة
8	مراقب تنفيذ / في مواد	2	5 سنة
9	حاسب كميات	1	5 سنة
10	فني سلامة مرورية	2	5 سنة
11	مساح	2	7 سنة

الهيئة العامة للطرق والكبارى



المستشار المشرف

م. م. / م. م. / م. م.

م. م. / م. م. / م. م.

م. م. / م. م. / م. م.

م. م. / م. م. / م. م.

م. م. / م. م. / م. م.



تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) .
العقد رقم : (735-2023-2024) بتاريخ : 21-11-2023

منطقة A6

شركة : الاندلس للمقاولات العامة

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	حفار	15
2	بلدوزر	2
3	دببر	10
4	لودر	3
5	سيارة مياه	1
6	سيارة خدمة موقع	2

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

م /



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم 1 لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح عقد 735 - 2023 - 2024 منطقة A6 تنفيذ شركة الاندلس للمقاولات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

نصر محمد نصر طيخ



) منطقة



طبيب



منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل توناج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

بيان أعمال شركة الاندلس للمقاولات العامة

كميات القطع	كميات الردم	المستخلص	المنطقة	العقد
252,431	0	جاري 1	A7	2024-2023-423
13,273	0	ختامي		
369,760	0	جاري 1	A7	2024-2023-764
635,464	0		الاجمالي	
438,829	0	جاري 1	A6	2024-2023-735
204,403	0	جاري 1	A6	2024-2023-765
643,232	0		الاجمالي	
389,575	0	جاري 1	A202	2024-2023-735
389,575	0		الاجمالي	
287,692	0	جاري 1	B7	2024-2023-737
287,692	0		الاجمالي	
285,040	0	جاري 1	A5	2024-2023-766
285,040	0		الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام

سيمون الاستشارات الهندسية

1/2

EMULANS
مشرق المقاولات
مشاريع الطرق والكباري

مؤنس عبد الحليم
مدير عام
مشاريع الطرق والكباري
14-10-2024

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : الاندلس للمقاولات العامة

توزيع صرف كميات منطقة A6 علي العقود

رقم البند	البيد	الكميات المنقذة	عقد 2024-2023-735	عقد 2024-2023-765	الكمية الاجمالية المصروفة
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتناصكة (مظلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (استخدام البلدوزر) ونسوية السطح بالآلات السوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك بالهراشات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآلية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٨٥٠٦٠٠٠٠	٣١٣٨٦٠٠٠	٦١٢٣٤٠٠٠	٣٧٥٠٦٠٠٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ورنكة التربة الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية ترديد التربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥ اسم لاستكمال المنسوب التصميمي تشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليونيليا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراشات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .				
	ذات اجهاد (٣٠٠٠٠) كجم/اسم	٤١٣٠١٠٠٠	٤١٣٠١٠٠٠	٠٠٠٠	٤١٣٠١٠٠٠
	ذات اجهاد (٤٠٠٣٠٠) كجم/اسم	٨٣٧٠٢٠٠٠	٨٣٧٠٢٠٠٠	٠٠٠٠	٨٣٧٠٢٠٠٠
	ذات اجهاد (٦٠٠٥٠٠) كجم/اسم	١٤٣١٦٩٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٣١٦٩٠٠٠	١٤٣١٦٩٠٠٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام

الإستشارى المشرف

استشاري المساحة

الشركة العامة


1/

مستشار الاستشارات الهندسية

مستشاري المساحة

مستشاري المساحة

مستشاري المساحة



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة- مطروح) - (قطاع غرب النيل)

Green Line (GL) MAIN DEPOT



منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

Employer Consultant GARB Consultant

علاوات الحفر			الكميات المنفذة بعد تاريخ 2023 / 5 / 4							الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 5 / 4							شركة : الأندلس للمقاولات العامة											
الكميات الاجمالية المنفذة			اجمالي كمية الصخر باستخدام المعدات الميكانيكية ذات اجهاد							حفر في تربة متماسكة	اجمالي كمية الصخر باستخدام المعدات الميكانيكية ذات اجهاد						حفر في تربة متماسكة	الكميات المنفذة بعد تاريخ 2023 / 5 / 4	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 5 / 4	حفر في تربة صخرية	حفر في تربة شديدة التماسك	الاجهاد (كجم / سم ²)	الكمية الاجمالية لكل منطقة	المنطقة	الكمية المنفذة الاجمالية	القطعة		
حفر من 0-100	من 100-200	من 200-300	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	100-200		200-300	300-400	400-500	500-600	600-700													
0.00	0.00	202410.00							130438.00					143169.00				254622.00	171739.00	481493.00	268172.00	385060.00				653,232.00	A6	
														83702.00														
							41301.00																					
0	0	202410	0	0	0	0	41301	0	130438	0	143169	0	83702	0	0	254622	171739	481493	268172	385060	653,232.00	الكمية الاجمالية						
الكميات المنفذة بعد تاريخ 2023 / 5 / 4										الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 5 / 4																		
رقم	البند	الكمية (م ³)	رقم	البند	الكمية (م ³)																							
1	اعمال الحفر في تربة شديدة التماسك	130,438.00	1	اعمال الحفر في تربة شديدة التماسك	254,622.00																							
2	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (100-200) كجم / سم ²	0.00	2	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (100-200) كجم / سم ²	0.00																							
3	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (200-300) كجم / سم ²	41,301.00	3	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (200-300) كجم / سم ²	0.00																							
4	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (300-400) كجم / سم ²	0.00	4	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (300-400) كجم / سم ²	83,702.00																							
5	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (400-500) كجم / سم ²	0.00	5	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (400-500) كجم / سم ²	0.00																							
6	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (500-600) كجم / سم ²	0.00	6	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (500-600) كجم / سم ²	143,169.00																							
7	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (600-700) كجم / سم ²	0.00	7	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (600-700) كجم / سم ²	0.00																							

مهندس الإجابة
م.ع.ع.ع.

الاستشاري العام
Systra

الاستشاري المشرف
م.ع.ع.ع.ع.
EnTrans CONSULTING

الاستشاري المسجل
مكتب XYZ
مشروع القطار السريع
س.ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب.ض : ٤٩٧ ٣٤٣ ٥١١ م.ض ٢٥٣ ١٩٠

الشركة المنفذة
شركة / الأندلس للمقاولات العامة
م.ع.ع.ع.ع.ع.
ب.ض : ٤٩٧ ٣٤٣ ٥١١ م.ض ٢٥٣ ١٩٠

د.د.د.
