



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لمنطقة الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر بالخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B7) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / الاندلس للمقاولات العامة "صالح عليان وشركاه"

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف أنمعدات

عدد (١) كشف المهندسين

صور وثائق تأمين

برنامج الزمنى

محضر استلام الموقع

خطاب محملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد (رقم العقد ٧٣٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١

اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لمنطقة الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر بالخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B7) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / الاندلس للمقاولات العامة "صالح عليان وشركاه"

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم 1 لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح عقد 737 - 2023 - 2024 منطقة B7 تنفيذ شركة الاندلس للمقاولات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية
مهندس/
نصر محمد نصر طبيخ

١٣ / ١٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
1	اعمال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بألات التسوية والريش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر علاوة 0.6 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 .	3م	0.00	23.00	0.00
			0.00	1.00	0.00
			0.00	0.60	0.00
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والريش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر علاوة 0.7 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 .	3م	0.00	26.00	0.00
			0.00	1.00	0.00
			0.00	0.70	0.00
3-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والريش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . (مسافة النقل 1400 م) علاوة 0.8 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 .	3م	196703.00	30.00	5901090.00
			177032.70	0.90	196703.00
			157362.40	0.80	196703.00
4-1	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) وريشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ذات إجهاد (100-200) كجم /سم ² - علاوة 1.6 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 . ذات إجهاد (200-300) كجم /سم ² - علاوة 1.9 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 . ذات إجهاد (300-400) كجم /سم ² - علاوة 2.2 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 . ذات إجهاد (400-500) كجم /سم ² - علاوة 2.4 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 . ذات إجهاد (500-600) كجم /سم ² - علاوة 2.5 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 . ذات إجهاد (600-700) كجم /سم ² - علاوة 2.7 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4 / 5 / 2023 . علاوة الحفر 1 جنيه / م ³ وذلك بعد أول 8 متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية . علاوة الحفر 1.5 جنيه / م ³ وذلك بعد 30 متر حتى 50 متر من منسوب الأرض الطبيعية . علاوة الحفر 2 جنيه / م ³ وذلك بعد 50 متر من منسوب الأرض الطبيعية .	3م	0.00	60.00	0.00
			0.00	1.60	0.00
			700000.00	70.00	10000.00
			19000.00	1.90	10000.00
			410000.00	82.00	5000.00
			11000.00	2.20	5000.00
			6338728.00	88.00	72031.00
			172874.40	2.40	72031.00
			273540.00	94.00	2910.00
			7275.00	2.50	2910.00
			5629300.00	100.00	56293.00
			151991.10	2.70	56293.00
			50000.00	1.00	50000.00
			0.00	1.50	0.00
			0.00	2.00	0.00
5-1	علاوة الحفر 1 جنيه / م ³ وذلك بعد أول 8 متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية . علاوة الحفر 1.5 جنيه / م ³ وذلك بعد 30 متر حتى 50 متر من منسوب الأرض الطبيعية . علاوة الحفر 2 جنيه / م ³ وذلك بعد 50 متر من منسوب الأرض الطبيعية .	3م	0.00	1.50	0.00
			0.00	2.00	0.00
الاجمالي					19999193.60

مقاسم معدلة رقم (١)
مهندس /
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى
طبيب

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

محرر

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة B7 (حسب الكروكي المرفق)
تنفيذ شركة الاندلس للمقاولات العامة .

انه في يوم الخميس الموافق ٢٣-١١-٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٧٣٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى
سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام
مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة
مكتب XYZ
شركة الاندلس للمقاولات العامة

- ١- السيد المهندس / علاء محمد
٢- السيد المهندس / علاء محمد
٣- السيد المهندس / عبد الرحمن
٤- السيد المهندس / أحمد هاشم
٥- السيد المهندس / محمد عبد الله

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٣-١١-٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع .
واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

- ٥- محمد عبد الله
٤- علاء محمد
٣- عبد الرحمن
٢- أحمد هاشم
١- محمد عبد الله

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) .
العقد رقم : (737-2023-2024) بتاريخ : 21-11-2023

منطقة B7

شركة : الاندلس للمقاولات العامة


فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير تنفيذ للطرق	1	10 سنة
2	مدير المكتب الفني	1	5 سنة
3	مدير ضبط الجودة	1	5 سنة
4	مدير السلامة الوقائية	1	10 سنة
5	مهندس تنفيذ طرق	1	5 سنة
6	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	1	5 سنة
7	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	1	5 سنة
8	مراقب تنفيذ / فني مواد	2	5 سنة
9	حاسب كميات	1	5 سنة
10	فني سلامة مرورية	2	5 سنة
11	مساح	2	7 سنة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

مكتب انترانس كونسولتينج




تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) .
العقد رقم : (737-2023-2024) بتاريخ : 21-11-2023

منطقة B7

شركة : الاندلس للمقاولات العامة

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	حفار	15
2	بلدوزر	2
3	دببر	10
4	لودر	3
5	سيارة مياه	1
6	سيارة خدمة موقع	2

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف





-1

E:627865.50
N:795463.31

E:628043.32
N:795512.47

E:628098.62
N:795312.45

E:627920.09
N:795286.50

(B7)

مسافة النقل
B7 1400 M




مسافة حساب
(B7)

XgZ
Handwritten signature

الاندلس
Handwritten signature

1/17/1
Handwritten signature

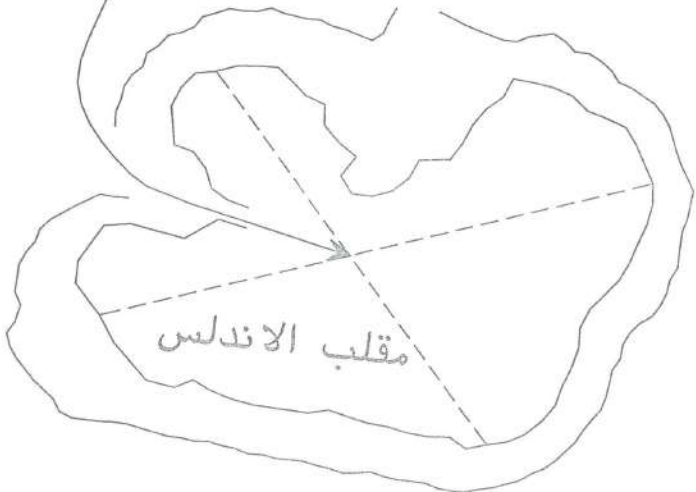

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

بيان أعمال شركة الاندلس للمقاولات العامة


كميات القطع	كميات الردم	المستخلص	المنطقة	الحظ
252,431	0	جاري 1	A7	2024-2023-423
13,273	0	ختامي		
369,760	0	جاري 1	A7	2024-2023-764
635,464	0		الاجمالي	
438,829	0	جاري 1	A6	2024-2023-735
204,403	0	جاري 1	A6	2024-2023-765
643,232	0		الاجمالي	
389,575	0	جاري 1	A202	2024-2023-736
389,575	0		الاجمالي	
287,692	0	جاري 1	B7	2024-2023-737
287,692	0		الاجمالي	
285,040	0	جاري 1	A5	2024-2023-766
285,040	0		الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكهربى

الاستشاري العام

م

مهندس الاستشارات الهندسية





Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة- مطروح) - (قطاع غرب النيل)

Green Line (GL) MAIN DEPOT



منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

Employer Consultant GARB Consultant

علاوات الحفر			الكميات المنفذة بعد تاريخ 2023 / 5 / 4							الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 5 / 4						شركة : الإدلس للمقاولات العامة									
الكميات الإجمالية المنفذة			اجمالي كمية الصخر باستخدام المعدات الميكانيكية ذات اجهاد						حفر في تربة متماسكة	اجمالي كمية الصخر باستخدام المعدات الميكانيكية ذات اجهاد					حفر في تربة متماسكة	الكميات المنفذة بعد تاريخ 2023 / 5 / 4	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 5 / 4	حفر في تربة صخرية	حفر في تربة شديدة التماسك	الاجهاد (كجم / سم ²)	الكمية الاجمالية لكل منطقة	المنطقة	الكمية المنفذة الاجمالية	القطعة	
من 0 حتى 100	من 100 حتى 200	من 200 حتى 300	600-700	500-600	400-500	300-400	200-300	100-200		600-700	500-600	400-500	300-400	200-300											100-200
0.00	0.00	40598.00	56293.00						159368.00							0.00	287692.00	0.00	128324.00	159368.00			287,692.00	Z1	B7
																					622	56293.00	Z1		
					72031.00																	427	72031.00	Z2	
0	0	40598	56293	0	72031	0	0	0	159368	0	0	0	0	0	0	0	287692	0	128324	159368	287,692.00		الكمية الاجمالية		

الكميات المنفذة بعد تاريخ 2023 / 5 / 4		
رقم	البند	الكمية (م ³)
1	اعمال الحفر في تربة شديدة التماسك	159,368.00
2	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (100-200) كجم / سم ²	0.00
3	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (200-300) كجم / سم ²	0.00
4	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (300-400) كجم / سم ²	0.00
5	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (400-500) كجم / سم ²	72,031.00
6	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (500-600) كجم / سم ²	0.00
7	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (600-700) كجم / سم ²	56,293.00

الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 5 / 4		
رقم	البند	الكمية (م ³)
1	اعمال الحفر في تربة شديدة التماسك	0.00
2	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (100-200) كجم / سم ²	0.00
3	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (200-300) كجم / سم ²	0.00
4	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (300-400) كجم / سم ²	0.00
5	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (400-500) كجم / سم ²	0.00
6	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (500-600) كجم / سم ²	0.00
7	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (600-700) كجم / سم ²	0.00

مهندس الهندسة

الإستشاري العام

Systra

الإستشاري الهندسي

مكتب التصميم والدراسات

استشاري المساحة

XYZ

الشركة المنفذة

شركة / الإدلس للمقاولات العامة

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١

ب. ق. ٢٨٤٨١
