

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية - الأولى

محضر إستلام موقع

عملية :- أعمال إستكمال تأمين وسلامة المرور علي طريق أكتوبر / الواحات مرحلة أولى
بالإتجاهين (إشراف المنطقة الأولى - المركزية) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٦٠)

تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠ / ٠٣ م وبناء علي عقد العملية رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٦٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ إجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد:

- | | |
|----------------------------------|---|
| ١- السيدة المهندسة / مشيرة السيد | مدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية - الأولى |
| ٢- السيدة المهندسة / أسماء علي | مدير المشروع للعملية بالمنطقة المركزية - الأولى |
| ٣- السيد / محمد سيد | عن / شركة ساب للدهانات الحديثة |

وقامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣ هو تاريخ إستلام الموقع .
واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيعات :-

- | |
|--|
| ١-  |
| ٢-  |
| ٣-  |

تحريرا في ٢٠٢٣ / ١٠ /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
مهندس / 



١٠

حصر جاري

عملية : استكمال اعمال تأمين و سلامة المرور علي طريق اكتوبر / الواحات مرحلة اولي اتجاهين

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند ١ : بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي

المسلسل	بيان الأعمال	العدد	الأجمالي	ملاحظات
	بالعدد أعمال نقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد & مزد)	٢	٢	
	اجمالي البند		٢	

البند ٢ : بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي

المسلسل	بيان الأعمال	العدد	الأجمالي	ملاحظات
	نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي	٤	٤	
	اجمالي البند		٤	

البند ٣ : بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات

المسلسل	بيان الأعمال	الوحدة	العدد	الأبعاد			الكميات			ملاحظات
				الطول	العرض	الارتفاع	خصم	اضافة	اجمالي	
	حفر لزوم الاساسات		٢	٥,٥	٢	٠,٨٥			١٨,٧	
	اجمالي البند	٣م							١٨,٧٠	

البند ٤ : بالمتر المكعب ردم بأتربة طبيعيه ناتج الحفر

المسلسل	بيان الأعمال	الوحدة	العدد	الأبعاد			الكميات			ملاحظات
				الطول	العرض	الارتفاع	خصم	اضافة	اجمالي	
	ردم بأتربة طبيعيه ناتج الحفر		٢	٥,٥	٢	٠,٥	٦,٧٥		٤,٢٠	
	اجمالي البند	٣م							٤,٢٠	

البند ٥ : بالمتر المكعب خرسانة عاديه لزوم القواعد

المسلسل	بيان الأعمال	الوحدة	العدد	الأبعاد			الكميات			ملاحظات
				الطول	العرض	الارتفاع	خصم	اضافة	اجمالي	
	ق.ع		٢	٥,٥	٢	٠,٣٥٠			٧,٧٠	
	اجمالي البند	٣م							٧,٧٠	

البند ٦ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد

المسلسل	بيان الأعمال	الوحدة	العدد	الأبعاد			الكميات			ملاحظات
				الطول	العرض	الارتفاع	خصم	اضافة	اجمالي	
	ق.م		٢	٤,٥	١,٥	٠,٥			٦,٧٥	
	رقبة عمود		٢	١,٧٥	١	٠,٧٥			٢,٦٢٥	
	اجمالي البند	٣م							٩,٣٧٥	

مهندس الضيفه

مهندس الشركة



حصر جاري

عملية : استكمال اعمال تأمين و سلامة المرور علي طريق اكتوبر / الواحات مرحلة اولي اتجاهين
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند ٧ : بالطن توريد وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار

الملاحظات	الكميات			الأبعاد			الوحدة	العدد	بيــــــــــــــــان الأعمال	المسلسل
	اجمالي	مجموع طول التسليح	خصم	رجل ٢	رجل ١	الطول				
	١١٠,٠٠	٢,٢٠		٠,٤٠	٠,٤٠	١,٤٠	م.ط	٥٠	قاعدة مسلحة فرش حديد ١٢ لعدد ٢ قاعدة	١
	١٢٤,٨٠	٥,٢٠		٠,٤٠	٠,٤٠	٤,٤٠	م.ط	٢٤	قاعدة مسلحة غطا حديد ١٢ لعدد ٢ قاعدة	٢
	٢٣٤,٨٠						م.ط		اجمالي حديد ١٢	
الملاحظات	الكميات			الأبعاد			الوحدة	العدد	بيــــــــــــــــان الأعمال	المسلسل
	اجمالي	مجموع طول التسليح	خصم		رجل ١	الطول				
	٨٤,٠٠	٤,٢٠			٣,٠٥	١,١٥	م.ط	٢٠	حديد رقبة العمود فرش لعدد ٢ قاعدة	١
	٨٦,٠٠	٢,١٥			١,٠٠	١,١٥	م.ط	٤٠	حديد رقبة العمود غطا لعدد ٢ قاعدة	٢
	١٧٠,٠٠						م.ط		اجمالي حديد ٢٢ لعدد ٢ قاعدة	
الملاحظات	الأبعاد						الوحدة	العدد	بيــــــــــــــــان الأعمال	المسلسل
	اجمالي	قفل الكانه	طول ٤	طول ٣	طول ٢	طول ١				
	٢٤,٢٠	٠,٢٠	٠,١٦	٠,١٦	٠,٩٥	٠,٩٥	م.ط	١٠	كانات رقبة عمود كانه ١ قطر ٨	١
	٢٧,٤٠	٠,٢٠	٠,٣٢	٠,٣٢	٠,٩٥	٠,٩٥	م.ط	١٠	كانات رقبة عمود كانه ٢ قطر ٨	٢
	٢٧,٤٠	٠,٢٠	٠,٣٢	٠,٣٢	٠,٩٥	٠,٩٥	م.ط	١٠	كانات رقبة عمود كانه ٥ قطر ٨	٣
	٤٦,٠٠	٠,٢٠	٠,٥٠	٠,٥٠	١,٧٠	١,٧٠	م.ط	١٠	كانات رقبة عمود كانه ٣ قطر ٨	٤
	٥٥,٥٠	٠,٢٠	١,٠٠	٠,٩٥	١,٧٠	١,٧٠	م.ط	١٠	كانات رقبة عمود كانه ٤ قطر ٨	٥
	١٨٠,٥٠						م.ط		اجمالي قطر ٨	
الملاحظات	الأبعاد						الوحدة	العدد	بيــــــــــــــــان الأعمال	المسلسل
	اجمالي	قفل الكانه	طول ٤	طول ٣	طول ٢	طول ١				
	٢٣,٦	١١,٨					م	٢	برندة القاعدة المسلحة لعدد ٢ قاعدة	
	٢٣,٦						م.ط		اجمالي قطر ١٠	
الاجمالي	وزن المتر الطولي (طن)			الطول بالمتر			الوحدة	بيــــــــــــــــان الأعمال	المسلسل	
٠,٠٧١٢٩٧٥	٠,٠٠٠٣٩٥			١٨٠,٥٠			طن	اجمالي وزن حديد قطر ٨	١	
٠,٠١٤٥٦١٢	٠,٠٠٠٦١٧			٢٣,٦٠			طن	اجمالي وزن حديد قطر ١٠	٢	
٠,٢٠٨٥٠٢٤	٠,٠٠٠٨٨٨			٢٣٤,٨٠			طن	اجمالي وزن حديد قطر ١٢	٣	
٠,٥٠٧٦٢	٠,٠٠٢٩٨٦			١٧٠,٠٠			طن	اجمالي وزن حديد قطر ٢٢	٤	
٠,٨٠٢٠							طن	الأجمالي		

مخبر الحصى



حصر جاري

عملية : استكمال اعمال تأمين و سلامة المرور علي طريق اكتوبر / الواحات مرحلة اولي اتجاهين
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند ٨ : بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين

ملاحظات	الكميات			الأبعاد			الوحدة	العدد	بيان الأعمال	المستعمل
	اجملي	اضافة	خصم	الارتفاع	العرض	الطول				
	١٠,٠٠		١,٧٥		١,٥٠	١,٥٠	٢		عزل لعدد قاعدتين	١
	٩,٠٠				٠,٥٠	١,٥٠	١			٢
	٣,٠٠				٠,٥٠	١,٥٠	١			٣
	٢٢,٠٠							٢م	اجملي البند	٨

البند ٩ : التخطيط بالبويات المروية على الساخن بنظام (Extruder) اتجاه الواحات للكارثة اتجاه القاهرة

ملاحظات	الكميات			الأبعاد			الوحدة	العدد	بيان الأعمال	المستعمل
	اجملي	اضافة	خصم	عدد الخطوط	عرض الخط	طول الطريق				
	١٠٦٩٨,٠٠			١	٠,٢٠	٥٣٤٩٠				
	١٠٦٩٨,٠٠			١	٠,٢٠	٥٣٤٩٠				
	٢٦٧٤,٥٠			١	٠,١٥	١٧٨٣٠				
	٢٤٠٧٠,٥٠							٢م	اجملي البند	

مهندس الهيئة

هاني محمد إبراهيم السيد

ساب المهندسات الشركة
SAP
For Modern Projects
عمرو رمضان عبد الستار

رسالة فاكس

من	المهندس / رئيس الإدارة الهندسية وإسلامة الطريق
إلى	المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

تحيه طيبة وبعد 000

أشرفنا بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات المعملية المبوية على السطح ويودره الزجاج الواردة من المنطقة

بتاريخ 19 / 6 / 2023 الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور على طريق أكتوبر الواحات مرحلة أولى الطريق

القائم / إشراف المنطقة المركزية / تنفيذ / شركة سبب الهندسات الحديثة

والتي تبين من النتائج الواردة من المركز القومي للبحوث أنها اجتازت حدود المواصفات

بإجراء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الإدارة المركزية

تقديرا في 2023/7/12

المهندس /

مهندس /

مرفقات عدد (التقرير)

" بدر عبد التواب "

التعليق على النتائج

• اجتازت عينة دهان المرور على الساخن - بيضاء اللون كود RM 23*6/5 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية أعمال تأمين سلامة المرور على طريق أكتوبر/الواحات المرحلة الاولى الطريق القادم مزدوج" - الواردة من المنطقة المركزية " تنفيذ "شركة ساب للدهانات" .. جميع اختبارات المذكورة فى المواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢.

• اجتازت عينة بودرة الزجاج كود GM 23*6/6 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية أعمال تأمين سلامة المرور على طريق أكتوبر/الواحات المرحلة الاولى الطريق القادم مزدوج" - الواردة من المنطقة المركزية " تنفيذ "شركة ساب للدهانات" .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية الأشتو ٢٤٧ إم (AASHTO 247M) Type I.

• وتمثل هذه النتيجة العينات الواردة إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث بمعرفة العميل "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومى للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائمون بالاختبار

د. سمير مرسى محمد


الباحث الرئيسى

أ.د. أحمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،

رئيس الوحدة

أ.د. محمود أحمد عبد القفار

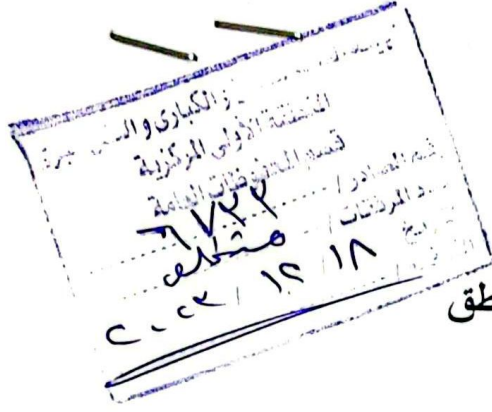

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري عملية اعمال استكمال تامين
سلامة المرور طريق اكتوبر / الواحات بطول مرحلة اولي بالاتجاهين بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة ساب للدهانات الحديثة

يرجى التفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً ٢٠٢٣/١٢/١٧

عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر اعمال
محضر استلام موقع
خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /

٢/١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ٤٦٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢)
عملية اعمال استكمال تامين سلامة المرور طريق اكتوبر / الواحات بطول مرحلة اولي
بالاتجاهين بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ساب للدهانات الحديثة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل توريد عدد (١) حاسب الي (بجميع
مشمولاته) باحدث المواصفات علي ان يتم فحصها عن طريق الادارة العامة لمركز
المعلومات بالهيئة ويتم تسليمها للمخازن بمدينه نصر و توريد ٢٥ كرتونة ورق A4 ولا
يشمل على اى محملات اخري.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٧

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ

مهندس /



Handwritten signature

Handwritten signature

مارة لاعتماد الصرف
مصلحة: الحق في الله - لك في الكبار

قسم : النفوس
المبلغ المستحق إلى : رحمه الله تعالى

الطلبات طبعه ، أو : م (أ) فامرس } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
المستفيد من الهدية

[illegible]

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ _____



رسالة الادب والعلوم

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكائن المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
	مردود	مردود	مردود	قسم	فرع	نمل
	المردود	المردود	المردود	بند		
	مرحله اول اسباب كنية					
	بيانات الاستقطاعات			إجمالي الأصل		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

المختتم ذو التاريخ

۹۹۰—ج

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنة ۲۰۱

(١١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الأامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری
 الامدادات بتاريخ الإمضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ الختم ذو التاريخ

٢٠١ ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لتسويق المطابع الأميرية ٢٠٠٢ س ٢٠٠٠ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

إمضاءات موظفي الشطب

شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

الحالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

الشحات رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

شماره ۱۰۰

إذن صرف امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

(۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

(۵) أدرج فی کشف

(۶) استقامت
