

اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال
المنطقة الصناعية (يازاكي) (انتهاء اعمال الجسر
بخصوص :- الترابي و طبقة الاساس) ضمن البروتوكول الموقع
مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله)
بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٤ ختامي) عن العمليه عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

عدد (٧) شهادات

خطاب محملات

اصل المقاييسه النهائيه

اصل محضر التقييم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /
احمد عراقي حسين

مادة الاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للمرقق والكيماويات

قسم : المصروفات
المبلغ المستحق إلى : شركة الاستيراد والتصدير بمطاوله
(وصالح عبد الوهاب مرشدي)
الطلبات طيه ، أو :
موجب } الكوثرى المرفق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } شركة السيد المحفوظ
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : (صاحب محله)

[illegible]

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

میسر الادارہ اعلیٰ

أحمدى

(1) لكاتب المخطوط

المحتوم ذو التاريخ

ع-٩١

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: جاري بتاريخ الإمضاء:

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی _____ سنة ٢٠٢

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

إمضاءات موظفي الشطب

مقايضة ختامية

عملية رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الإضافية العاجلة)

الشركة المنفذة
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
صالح عبدالوهاب يسمن وشريكه

عقد رقم : ١٥٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	سعر التكلفة
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومي تمهيدا لاجال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٥٠٠	٦,١	٣٣٥٥٠
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسته مسلحه برابح طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي ان تحقق الخرسته رتبه لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والبند بجميع مشتعلاته ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٤١	٢٤٥٢,٥	١٠٠٥٥٣
٣	بالمتر المكعب علاوة زيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ الي ٤٠٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٤١	١٣٠	٥٣٣٠
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسته عاديه لحماية مواسير البرابح طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي علي ان لا تقل اجهاد العينات عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٨	١٥٥٦	٢٨٠٠٨
٥	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية حتي ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كمالا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠,٦٦١	٥٣٠٠٠	٣٥٠٣٣
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابح مواسير سائفة التجهيز قطر داخلي ٠,٥ متر وسبك ٦ سم من الخرسة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م ^٣ زلط + ٠,٤ رمل) والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٨	٩٥٠	٤٥٦٠٠
٧	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل ١٢٠ كم	م ^٣	٠	٣٣٩	٠
٨	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول يوردها المقاول على حسابه وبمعرفة من اى جهة يراها وتحت مسؤليته على ألا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات والفئة غير شاملة قيمة المادة الحجرية و شاملة اعمال التطهير وازالة الحشائش او اى مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والنظافة التامة قبل البدء في العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل ٦٠ كم	م ^٣	٤٣٠٠٠	١١٩,١	٥١٢١٣٠٠٠
٩	بالعدد رفع وتعليق اغطية مطابق المصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع مخلفات خارج الموقع وصب الخرسة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة	عدد	٠	٥٥٠	٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للعينه المعتمدة واجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسبك ٤٠ سم في الامكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة مقاس ١٠٠*٢٠٠*٦٠ مم	م ^٢	٠	٢٠٣	٠
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية(عجالي) بابعاد ٢٥/٣٠*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣٠,٨ سم دلويميت لا يزيد اكر بعد للحيبيات عن ١,٥ سم + ٣٠,٤ رمل ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	١٤٢	٠
١٢	بالمتر الطولي دهان برودة بابعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	١٨	٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وصب قلمة من الخرسة العادية اسفل البردورات بابعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٤٦	٠
١٤	بالمتر المكعب توريد ورص رمال نظيفة او غريبة زلطية مودة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كمالا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٨٠ كم	م ^٣	٠	٢٠٠	٠
١٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف، وفي حال زيادة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكل كيلو متر زياده مسافة النقل ٢٥ كم	م ^٣	١٥٠٠٠	٥٢,٤	٧٨٦٠٠٠

مكتب عام التنفيذ والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فريحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري
مهندس / ايهاب ابراهيم محمد

مقاييس ختامية

عملية رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يزاكى) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الإضافية العاجلة)

الشركة المنفذة
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
صالح عبدالوهاب يسن وشريكه

عقد رقم : ١٥٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	مسر التكلفة
١٦	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات في تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ ومحمل علي البند الاتي : ١- تحميل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التعموجية والرسومات التفصيلية طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٥ كم .	م ^٣	٣٥٢٨	٨٧,٤	٣٠٨٣٤٧,٢
١٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل نهارا وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٩٠	٠
١٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجيسري) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦٥6) م. ط . التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٠	٥٥٧,٦	٠
١٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجيسري) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٩٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦٥10) م. ط . التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٠	٧٥٠	٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية بالابعاد التالية ١٥*٦*٦٠ والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبغة الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٠	٥٦٠٠	٠
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بقطر ٣٦ ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والزلج ونقل ناتج الحفر الزائد للمقالب العمومية وتوصيل بين غرفة التفنيس الى اقرب مطبق وكل ما يلزم نهو الاعمال طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة .	م. ط	٠	٤٥٠	٠
٢٢	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق الامنة لتفاديها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٥٠	١٢٠	٦٠٠٠
٢٣	كارتات الاتربة	م ^٣	٤٣٠٠٠,٠	١٣	٥٥٩٠٠٠
٢٤	كارتات طبقة الاساس	م ^٣	٠	٢٥	٠
٢٥	مادة محجوبة للاتربة	م ^٣	٤٣٠٠٠,٠	٥٦,٧	٢٤٣٨١٠٠
	الاجمالي				٩,٤٦٦,٨٢١

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري

مهندس / إيهاب إبراهيم محمد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة بنى سويف

مهندس /
أحمد عرافي حسين



شهادة

اسم العملية :- عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

اسم الشركة المنفذة :- شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	إبراهيم صالح عبدالوهاب	مدير التنفيذ بالشركة	جيد
٢	محمود عبدالمحسن	مدير مشاريع الشركة	جيد
٣	أحمد عبدالظاهر تهاامي	مدير المكتب الفني	جيد
٤	أحمد شاكر	مهندس موقع	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

المهندس / أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يزاكى بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف .
والتي قامت بتنفيذها الشركة شركة المتحدة للمقاولات المتكامله وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٣/١٥٥٢/٢٠٢٤ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف .
والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)
انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) بالاتي :

- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية
المهندس / أحمد عراقي حسين



كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

- قيمة العملية طبقا للعقد: ٩٥٥٠٠٠٠ جنية
- قيمة العملية طبقا للختامي: ٩٤٦٣٥٨٧٧٠ جنية
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ م
- تاريخ النھو الفعلي: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية





العملية : عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) تنفيذ
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/ صالح عبدالوهاب يسن جابر وشريكه) لعقد رقم
٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٩٥٥.٠٠٠ جنية

مدة العملية طبقا للعقد: (٤) أربعة أشهر

تمت إضافة مدة قدرها: ٨٩ يوم

تاريخ استلام الموقع: ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايسة معتمدة ٩٤٦٦٨٢١/ جنية

قيمة العملية طبقا للختامي ٩٤٦٣٥٨٧١/ جنية

تاريخ النهو الفعلي: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ٩٩ %

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

أحمد عراقي حسين



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

شروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي عملية /

عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط


وللمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية



أحمد عراقي حسين



المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال المنطقة الصناعيه (يازاكي
(انتهاء اعمال الجسر الترابي و طبقه الاساس) ضمن البروتوكول الموقع
مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)

شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٨

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكميه السابقه	الكميه خلال المدة	الاجمالي	الموقع	
						من	الي
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	م ^٢	٥,٥٠٠	٠	٥,٥٠٠		
2	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانته مسلحه قطر ٥٠ سم و سمك ٦ سم من الخرسانه المسلحه	م.ط	٤٨	٠	٤٨,٠٠٠		
4	تحميل و نقل اتربه صالحه للردم	م ^٣	٤٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٣,٠٠٠		
10	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربه (ما عدا المتماسكه) بالعمق المطلوب	م ^٣	١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠		
11	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه في تربه صخريه ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	٣,٥٢٨	٠	٣,٥٢٨		
15	اعمال توريد و صب خرسانته عاديه طبقا للرسومات	م ^٣	١٨	٠	١٨		
17	اعمال توريد و تركيب خرسانته مسلحه برباخ محتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاند معالدمك الميكانيكي	م ^٣	٤١	٠	٤١		
18	توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠)	طن	٠.٦٠	٠.٠٠	٠.٦٠		
21	حفر استكشافي بعماله يدويه في ارض الموقع	م ^٣	٥٠	٠	٥٠		

مدير عام التنفيذ و الصنائه

مهندس المشرو ع

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند التطهير
 عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الوحدة	الطريق	الطول	العرض	المسطح	الخصم	الاجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع	م٢	Road c اتجاه المزرعة	٢٧٥	٢٠	٥٥٠٠		
	الإجمالي (م٢)							٥٥٠٠

مهندس الاستشاري
 السيد / محمد

مهندس المقاول
 السيد / محمد

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند برباخ

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
٢	أعمال توريد وتركيب برباخ مواسير سابقة التجهيز	م. ط	٢	٢٤			٤٨		
	الاجمالي (م / ط)								٤٨

مهندس الاستشاري
أ. م. م. م.
استشاري المشروع
مكتب ألفا للاستشارات الهندسية
بصايفه المصنوعه
ت. ف. / ٢٢٣٢٨٠٨٢ - ٢٢٣٨٨٦٦٤

مهندس المقاول
أ. م. م. م.
مهندس المقاول
مكتب ألفا للاستشارات الهندسية
بصايفه المصنوعه
ت. ف. / ٢٢٣٢٨٠٨٢ - ٢٢٣٨٨٦٦٤

الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الساحلية بني سويف
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يزاكي)		

كشف حصر لبند التربة

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجملي
٤	اعمال توريد وتشغيل اترية	م	٣				٤٣٠٠٠		
	الاجملي								٤٣٠٠٠

مهندس الاستشاري
إبراهيم محمد
٢٠٢٣ / ٢٠٢٤


مهندس المقاول
د. صالح عبد الوهاب يس وشريكه
٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
٢٠٢٣ / ٧٨٧ / ٧٨٧

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يزاكي)		

كشف حصر لبند الحفر



عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤



م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٠	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	م ^٣	١				١٥٠٠٠		
	الاجمالي								١٥٠٠٠

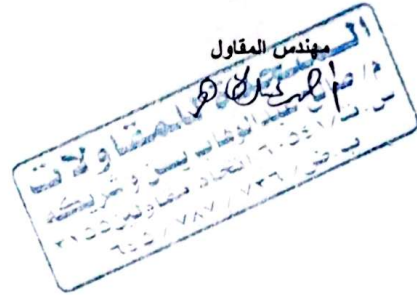

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة المسماة بني سويف	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي)		

كشف حصر لبند الحفر عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤									
البيد	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة ذات إجهاد ١٠٠- ٢٠٠ كجم/سم ^٢	م ^٣	١				٣٥٢٨		
	الاجمالي								٣٥٢٨

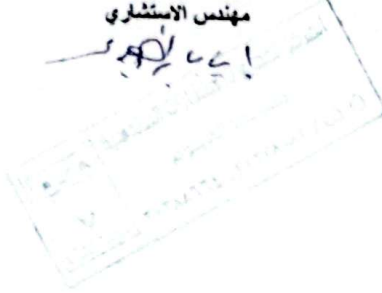مهندس الاستشاري




مهندس المقاول



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند خرسانة عادية

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الفصم	الاجمالي
١٥	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحملية مواسير البرايخ	م٣	٢	١٢	٣	٠,٢٥	١٨		
	الاجمالي (م٣)								١٨




وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند خرسانة مسلحة برابح


عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٧	اعمال توريد وصب خرسانه مسلحة برابح	م ^٣	٢	١٢	٢,٥	١,١	٦٦	٢٤,١٤	
	الاجمالي (م ^٣)								٤١,٨٦

مهندس الاستشاري



مهندس المقاول



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند حديد التسليح
 عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	الطول	العدد	القطر	طول القطعية	عدد القطعيات	اجمالي الطول	الاجمالي
١٨	بالطن توريد وتركيب حديد التسليح لزوم البربخ	طن	١٢	٢	١٢	٤	١٢٠	٤٨٠	٤٢٧
					١٢	١٢	٢٢	٢٦٤	٢٣٥
	الإجمالي (طن)								٠,٦٦١

مهندس الاستشاري
 ا. ع. ي. ر. م.
 م. صالح عبد الوهاب يس وشريكه
 ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٦
 ٦٤٥ / ٧٨٧ / ٧٣٦

مهندس المقاول
 ا. ع. ي. ر. م.
 م. صالح عبد الوهاب يس وشريكه
 ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٦
 ٦٤٥ / ٧٨٧ / ٧٣٦

مشروع رصف طريق منشأة كمال (يازاكي) (انهاء أعمال الجسر الترابي وطبقة الأساس) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق المدرجة بالخطة العاجلة المقررة من مجلس الوزراء لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم

(عقد ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م)

اشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)

الاستشاري (المركز المصري للاستشارات الهندسية) (الفا كونسلت)

الشركة المنفذة / المتحدة للمقاولات المتكاملة (م / صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠٢ بناء على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ م بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٧ بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ م وبناء على مطالبة الشركة المنفذة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٨ .
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم:-

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المهندس / حسام الدين حسن حسين | مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بنى سويف (رئيسا) |
| ٢- السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ | مدير ادارة المشروعات المنطقة السادسة (عضوا) |
| ٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | مهندس مشروعات بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٤- السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم | مهندسة ادارة المعامل بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٥- السيد المهندس / ايهاب ابراهيم محمد | مهندس المشروع (استشاري الهيئة) (عضوا) |
| ٦- السيد المهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب | مهندس الشركة المنفذة (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع ظاهرياً على الطبيعة وذلك لاختذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتي :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولا: أعمال خرسانة مسلحة برباخ مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية في بعض الأماكن

المتفرقة وقد قدرت اللجنة هذه العيوب بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .

ثانيا : أعمال الأتربة مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه في بعض الأماكن المتفرقة وقد قدرتها

اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- ١- خصم نسبة ٥ % من البند الاول (اولا)
- ٢- خصم نسبة ٥ % من البند الثاني (ثانيا)

وعلى تـرى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ الاستلام الابتدائي هو تاريخ خطاب الشركة بالمطالبة بتسليم الأعمال بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/١٨) طبقاً لافادة مهندس الاشراف واستشاري المشروع بالموافقة.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

٥-
٣-
١-

٦-
٤-
٢-
