

عملية استكمال اعمال رصف طريق منشاه كمال
المنطقة الصناعيه (يازاكي) محافظة الفيوم)
بخصوص :- الخطه الاضافيه العاجله (اشراف) المنطقة السادسة -
بني سويف (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (٥٣٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص ختامى رقم (٤) عن العمليه عاليه من اصل و
صوره و باقى المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا فى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

عدد (٧) شهادات

خطاب محملات

اصل المقاييسه النهائيه

اصل محضر التقييم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

اصل خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين



العملية : عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمير المباشر) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م / صالح عبدالوهاب يسن جابر وشريكه) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٥٤٥.١٧٠ جنية

مدة العملية طبقا للعقد: (٤) أشهر

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤/١٢/١٦ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايضة معتمدة: ٥٤٥.١٧٠ جنية


قيمة العملية طبقا للختامي: ٥٤٥.١٦٨,٤٤ جنية

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي عملية /

عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

رقم العقد: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

والتي قامت بتنفيذها الشركة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


أحمد عراقي حسين

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / عملية استكمال رصف طريق
منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.
والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)
انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من
المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة


تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يزاكى بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) بالاتي :

- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

اسم العملية :- عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم
(بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.


اسم الشركة المنفذة :- شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	إبراهيم صالح عبدالوهاب	مدير التنفيذ بالشركة	جيد
٢	محمود عبدالمحسن	مدير مشاريع الشركة	جيد
٣	أحمد عبدالظاهر تهامي	مدير المكتب الفني	جيد
٤	أحمد شاكر	مهندس موقع	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد عراقي حسين

كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (

بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.


الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

- قيمة العملية طبقا للعقد: ٥٤٥.١٧٠ جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: ٥٤٥.١٦٨,٤٤ جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٤/١٢/١٦ م
- تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

المهندس /
أحمد عراقي حسين

مقايمة ختامية

عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بناكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الإضافية العاجلة)

المقاول : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
صالح عبدالوهاب يسمن وشريكه

عقد رقم ٥٣٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب الصومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٦٠٠٠	٧.٨	٤٦٨٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة برابح طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ والبند بجميع مشتعلاته ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٢٨٠.٨	٠
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحملية مواسير البرابح طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي على أن لا تقل أجهاد العينات عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٢٠٢.٤	٠
٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة اسس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ١٢٠ كم يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقا لمحضض المفاوضات وبناءا على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر.	م ^٣	١٩٣٧,١٩	٤١٠.٦	٧٩٥٤١١,٦٩
٥	أعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والمويل يوردها المقاول على حسابه وبمعرفة من اى جهة براها وتحت مسؤوليته على ألا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات والفئة غير شاملة قيمة المادة المحجيرة وشاملة أعمال التطهير وإزالة الحشائش أو اى مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والنظافة التامة قبل البدء فى العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ٦٠ كم . يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقا لمحضض المفاوضات وبناءا على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. السعر لايشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر.	م ^٣	١١٤٠٠	١٥٢	١٧٣٢٨٠٠
٦	بالعدد رفع وتغطية أعطية مطلق المصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع مخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	عدد	٠	٨٠٠	٠
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٢٥/٣٠*٠٣٠*٠٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣٠.٨ سم ثلوميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن ١.٥ سم + ٣٠.٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقا للخضوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل النسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٠	١٩٥.٩	٠
٨	بالمتر الطولي دهان برودة بأبعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	٠	٢٢.٩	٠
٩	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٦٠.٣	٠
١٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده مسافه ٥٠٠ متر من محور الطريق والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وفي حال زيادة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١.٣٥ جنيه لكل متر زياده . مسافة النقل ٢٥ كم .	م ^٣	٥١٠٥	٦٧,٤٧٥	٣٤٤٤٥٩,٨٨
١١	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات في تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ ومحمل على البند الاتي :- ١- تحميل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرنة الميول الجنبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد اترية مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى مسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة لكل كم زيادة مسافة النقل ٢٥ كم .	م ^٣	٩٥٩٢	١١٣,٤٢٥	١٠٨٧٩٧٢,٦
١٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوى العمل نهارا وليللا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٩٥	٠
١٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦Ø6) م.ط . التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	١٠٠٠	٠

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري

مهندس / ايهاب ابراهيم محمد

مقاييس ختامية

عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بناكى) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الإضافية العاجلة)

المقاول : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
صالح عبدالوهاب يسن وشريكه

عقد رقم ٥٣٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمعني لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦Ø10) م. ط. التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	.	١٥٠٠	.
١٥	اعمال انشاء طبقة تشريب برامب باستخدام الاسفلت السائل متوسط النقاير MC30 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم /م ^٢ طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	م. ط	.	٦٠	.
١٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	م. ط	.	٣٠١,٥	.
١٧	اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع النقاير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٠,٤ كجم /م ^٢ طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وبراعى الا يتعدى معدل الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	م. ط	.	٢٠,٧	.
١٨	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ ج بسمك ٥ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	م. ط	.	٢٨٠,٩	.
١٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	.	٦٠٤٦٠	.
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابغ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٠,٥ رتبة (١٢) متر وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م ^٣ زلط + ٠,٤ رمل) باستخدام شبكة حديد التسليح المشرسر عالي المقاومة رتبة ٥٢ / ٣٦ بمعدل ١٠ Ø ٥ للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	.	٢٠٠٠	.
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاترلوك الخرساني طبقاً للعينه المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتنظيف ونهوا الاعمال طبقاً لأصول الصناعة مقاس ٦٠*٢٠٠*١٠٠ مم	م. ط	.	٢٧٠	.
٢٢	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٨٠ كم .	م. ط	.	٤٤٠	.
٢٣	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية بالأبعاد التالية ١٥*٦٠*٦٠ والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبغات الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠	٥٨٢٠	٥٨٢٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بقطر ٦" ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقابل العمومية وتوصيل بين غرفة التفريغ الى اقرب مطبق وكل ما يلزم نهوا الاعمال طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة .	م. ط	٨١٨	٦٦٢	٥٤١٥١٦
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق الامة لتفاديها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م. ط	.	١٢٥	.
٢٦	كارتات الاتربة	م. ط	١١٤٠٠	١٣	١٤٨٢٠٠
٢٧	كارتات طبقة الاساس	م. ط	١٩٣٧,١٩	٢٥	٤٨٤٢٩,٨٤
٢٨	مادة محجيرة لبند الاتربة	م. ط	١١٤٠٠	٥٦,٧	٦٤٦٣٨٠
	الاجمالي				٥٤٥٠١٧٠

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فرحات محمد عبدالكبير

مهندس الاستشاري

مهندس / ايهاب ابراهيم محمد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس /
أحمد عزالدين حسين





المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية استكمال اعمال رصف طريق منشاه كمال المنطقة الصناعيه (يازاكي)
محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) اشراف (المنطقة السادسة - بنى
سويف) بالامر المباشر)

شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠٢



بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكميه السابقه	الكميه خلال المدة	الاجمالي	الموقع	
						من	الي
4	توريد و تشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافه نقل ١٢٠ كم	م ^٣	١,٧٩٠	١٤٧.١٩	١,٩٣٧.١٩		

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

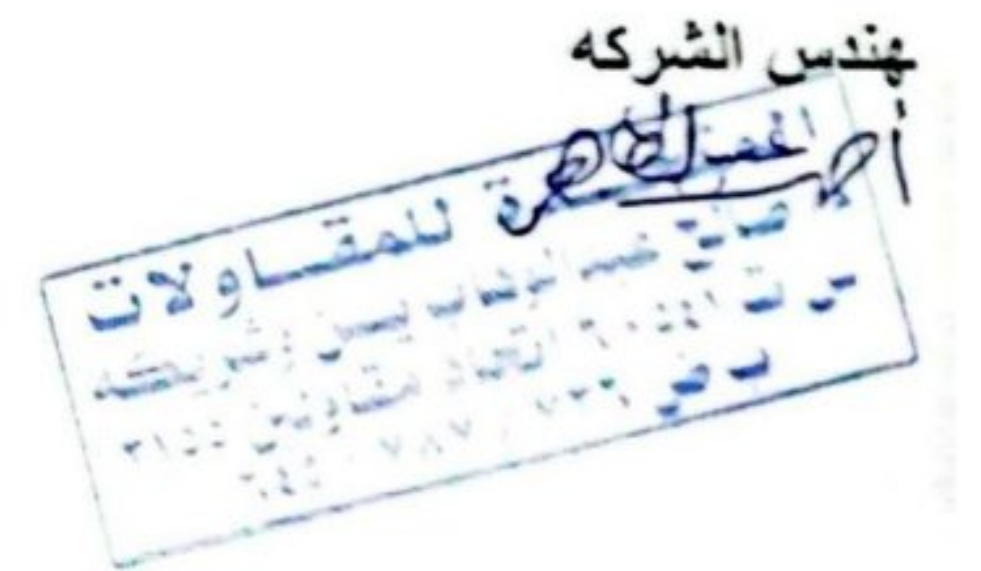


وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يمس وشريكه)
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		
كشف حصر لبند التطهير عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥		

رقم البند	البند	الوحدة	الطريق	الطول	العرض	المسطح	الخصم	الاجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع	٢م	Road c اتجاه المصنع	٢٤٠	٢٥	٦٠٠٠		
	الإجمالي (م)							٦٠٠٠


المشارك المقاول مهندس الاستشاري
محامد محمد
٢٧٢٨٨٦٦٤ / ٢٧٢٧٨٠٨٢ / ف.ا

مهندس المقاول
أحمد
٢٧٢٨٨٦٦٤ / ٢٧٢٧٨٠٨٢ / ف.ا



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف			استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية			الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)			
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)									
كشف حصر لبند طبقة الأساس عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥									
رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	م ٣					١٩٣٧,٥		
الإجمالي (م ٣)									١٩٣٨



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف			استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية			الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)			
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)									
كشف حصر لبند اترية									
عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥									
رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
٥	اعمال توريد وتشغيل اترية	٣م					١١٤٠٠		
الإجمالي (٣ م)									١١٤٠٠



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف			استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية			الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)			
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)									
كشف حصر لبند الحفر									
عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥									
رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٠	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	م٣	١				٥١٠٥		
الاجمالي								٥١٠٥	

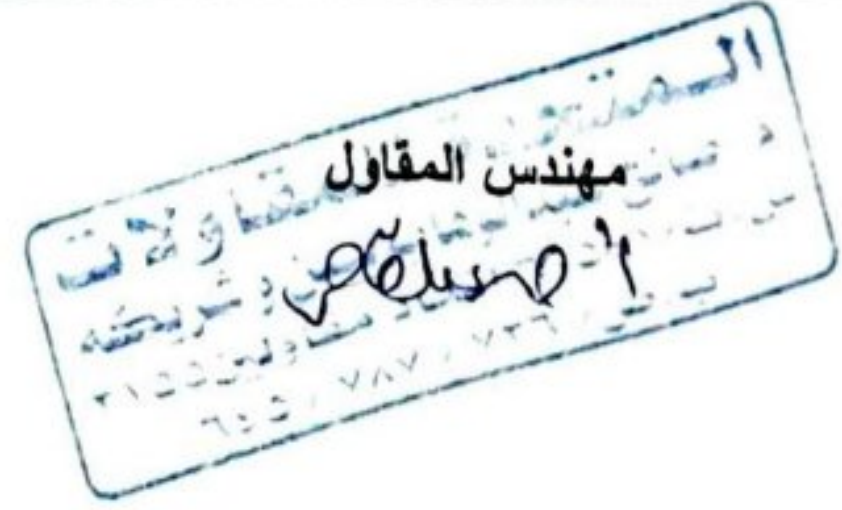

وزارة النقل		استشاري المشروع		الشركة المنفذة					
الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب ألفا للاستشارات الهندسية		شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة					
المنطقة السادسة بني سويف				(م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)					
<u>حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)</u>									
كشف حصر لبند الحفر									
عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥									
رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية	م٣	١				٩٥٩٢		
الإجمالي (م ٣)									٩٥٩٢

مهندس المقاول
أحمد محمد

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه)
<u>حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي)</u>		
كشف حصر لبند بالوعات صرف المطر عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥		


رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الكمية	الخصم	الاجمالي
٢٣	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف مطر	عدد	١٠			١٠		
	الإجمالي (م٢)							
								١٠

مهندس الاستشاري
أ. م. صالح عبدالوهاب
بني سويف
٢٢٢٨٨٦٦٤ - ٢٢٢٨٨٠٨٢ / ٢٢٢٨٨٦٦٤

مهندس المقاول
أ. م. صالح عبدالوهاب
بني سويف
٢٢٢٨٨٦٦٤ - ٢٢٢٨٨٠٨٢ / ٢٢٢٨٨٦٦٤

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		
كشف حصر لبند مواسير الانحدار عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥		

رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	القطر	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
٢٤	أعمال توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لأشعة الشمس	م.ط	١٣٨	٦	" ٦		٨٢٨		
	الإجمالي (م ٣)								٨٢٨



مهندس المقاول
أ. محمد

Base			
Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+000.00	4.74	0.00	0.00
0+020.00	4.62	93.69	93.69
0+040.00	4.63	92.55	186.24
0+060.00	4.64	92.67	278.91
0+080.00	4.64	92.79	371.70
0+100.00	4.61	92.54	464.24
0+120.00	4.62	92.32	556.56
0+140.00	4.63	92.52	649.08
0+160.00	4.64	92.71	741.79
0+180.00	4.58	92.19	833.98
0+200.00	4.57	91.51	925.48
0+220.00	4.58	91.48	1016.96
0+240.00	4.79	92.43	1109.39
0+260.00	5.32	98.74	1208.13
0+340.00	8.80	542.55	1750.68
0+360.00	6.14	142.78	1893.46
0+380.00	4.68	107.57	2001.03
0+400.00	4.68	93.55	2094.58
0+420.00	4.68	93.57	2188.15
0+440.00	4.68	93.60	2281.75

Base			
Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+460.00	5.11	97.90	2379.65
0+480.00	7.28	123.85	2503.50
0+492.67	9.76	107.92	2611.42

المشتركة للمقاولات
د/ صالح عبد الوهاب يسر وشركاه
س.ت. ٦٠٥١ / اتحاد مقاولي ٢١٥٥
ب.ض. ٧٨٧ / ٧٣٦ / ٦٥٥

المشتركة للمقاولات
د/ صالح عبد الوهاب يسر وشركاه
س.ت. ٦٠٥١ / اتحاد مقاولي ٢١٥٥
ب.ض. ٧٨٧ / ٧٣٦ / ٦٥٥

وزارة النقل
المهجة العامة للطرق والكباري المصلحة العامة بـي سويك
اسم المشروع / طريق مخطط كمال (المصلحة العامة) (بازاكي)
استشاري المشروع / مكتب الفا للاستشارات الهندسية
الشركة المصلحة / الشركة المتحدة للمقاولات (صالح عبد الوهاب)
اسم الرحلة / كميات طريق (Road C)

مشروع استكمال رصف طريق منشأة كمال (يازاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم مع
الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق المدرجة بالخطة العاجلة المقررة من
مجلس الوزراء لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم

(عقد ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م)

اشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)

الاستشاري (المركز المصري للاستشارات الهندسية) (الفا كونسلت)

الشركة المنفذة / المتحدة للمقاولات المتكاملة (م / صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠٢ بناء على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ م بتاريخ
٢٠٢٣ / ٩ / ٢٧ بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م وبناءا
على مطالبة الشركة المنفذة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠٢ .
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى أسمائهم :-

- | | |
|--|---|
| ١ - السيد المهندس / حسام الدين حسن حسين | مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بنى سويف (رئيسا) |
| ٢ - السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ | مدير ادارة المشروعات المنطقة السادسة (عضوا) |
| ٣ - السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | مهندس مشروعات بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٤ - السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم | مهندسة ادارة المعامل بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٥ - السيد المهندس / ايهاب ابراهيم محمد | مهندس المشروع (استشاري الهيئة) (عضوا) |
| ٦ - السيد المهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب | مهندس الشركة المنفذة (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع
ظاهرياً على الطبيعة وذلك لاختذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتى :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال :-

أولا : أعمال الأتربة مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه في بعض الأماكن المتفرقة وقد قدرتها
اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .

ثانيا : أعمال طبقة الأساس مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية في بعض الأماكن المتفرقة وقد
قدرت اللجنة هذه العيوب بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .

ثالثا : أعمال غرف صرف المطر مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية علي اجمالي البند

وعليه توصي اللجنة بالآتي:

- ١- خصم نسبة ٥% من البند الاول (اولا)
- ٢- خصم نسبة ٥% من البند الثاني (ثانيا)
- ٣- خصم نسبة ١% من البند الرابع (ثالثا)

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ الاستلام الابتدائي هو تاريخ خطاب الشركة بالمطالبة بتسليم الأعمال بتاريخ (٢٠٢٥/٠٢/٠٢) طبقا لافادة مهندس الاشراف واستشاري المشروع بالموافقة.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

- ٥- اسم:
.....
.....
.....

- ٦-
.....
.....
.....

محضر تقييم

عملية / استكمال رصف طريق منشأة كمال ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق المدرجة بالخطة العاجلة المقررة من مجلس الوزراء لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم.

تنفيذ / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن)

اشراف / المنطقة السادسة بني سويف

العقد / رقم (٥٣٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

بناء على العقد الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٩ والمدرجة ضمن مشروعات الطرق المدرجة بالخطة الإضافية العاجلة بمحافظة الفيوم.

اجتمعت اللجنة المشكلة لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات المالية وبياتها كالآتي:-

إجمالي الخصم (التقييم المعمل) على بند الأتربة = ٠ جنية

إجمالي الخصم (التقييم المعمل) على بند طبقة الأساس = ٠ جنية



إجمالي خصم (التقييم الظاهري) على بند الأتربة = ٤٣٣٢ جنية

إجمالي خصم (التقييم الظاهري) على بند طبقة الأساس = ١٩٨٨,٥ جنية

خصم (التقييم الظاهري) على بند غرف صرف المطر = ٥٨٢ جنية

القيمة الإجمالية للخصم = ٦٩٠٢,٥ جنية

مهندس المعمل (هيئة الطرق)

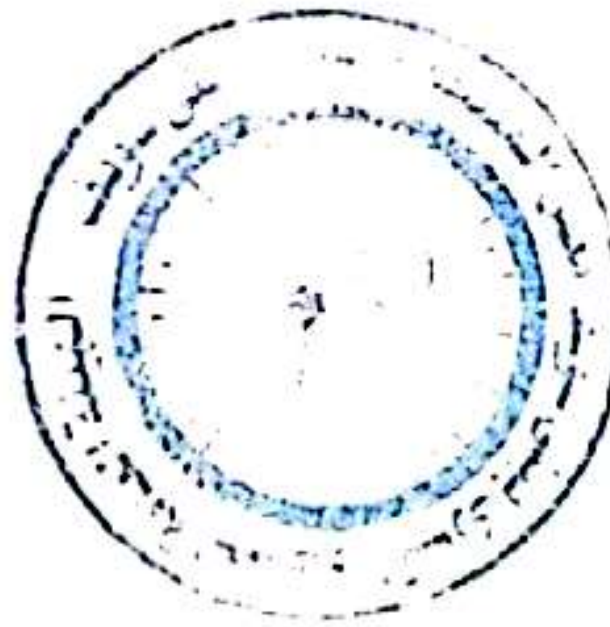

عقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨)

تقرير رقم (٥٥٤)

المشروع : ^{استكمال} رصف طريق منشأة كمال (بازاكي)
تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة

السيد المهندس / مدير شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بان ترفق طيبة نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٣ عينة س٦ المأخوذة من العملية عائله بمعرفه م / ايهاب ابراهيم (استشاري الفا)


وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريري ٢٠٢٥/١٢/٢٠

مرفقات

عدد

(٢)

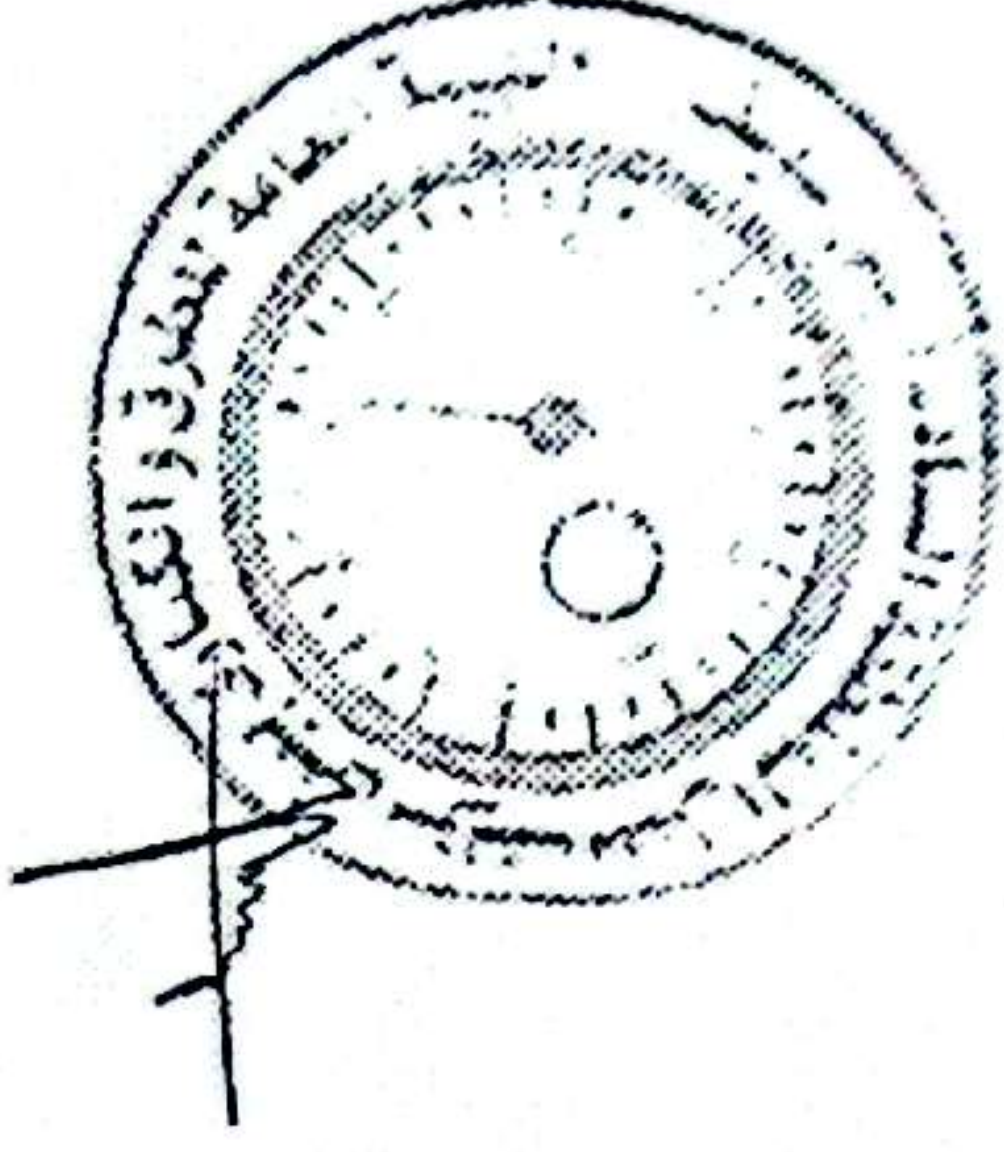

رئيس الإدارة المركزيه

مهندس/

أحمد عراقي حسين


للطرق والكباري والنقل البري

الهيئة العامة

الهيئة العامة للنقل

المستخرج : ارفص طريق منشأة كمال (بازاقي)
شركة : المتحدة للمقاولات المتكاملة
نوع العينة : عدد ٢ عينة من ٦
نوع الاختبار : تدرج - لدونة - صلاحية
أحضرت العينة بمعرفة م / ايهاب ابراهيم (الاستشاري)

التحارب	العدد	تكاليف	اجمالي
تحضير العينة	٣	٨٠	٢٤٠
تدرج خشن	٣	٢٢٥	٦٧٥
تدرج ناعم	٣	٢٠٠	٦٠٠
لدونة	٣	١٧٥	٥٢٥
سيولة	٠	١٨٠	٠
لوس انجلوس	٣	٣١٥	٩٤٥
امتصاص + ثقت	٣	٣٥٥	١٠٦٥
بروكتور	٣	٦١٥	١٨٤٥
سي بي ار	٣	٦٧٥	٢٠٢٥
اعداد تقرير	١	٢٥٠	٢٥٠
قيمة الاعمال			٨١٧٠
ق.م ١٤%			١١٤٣.٨
اجمالي			٩٣١٣.٨

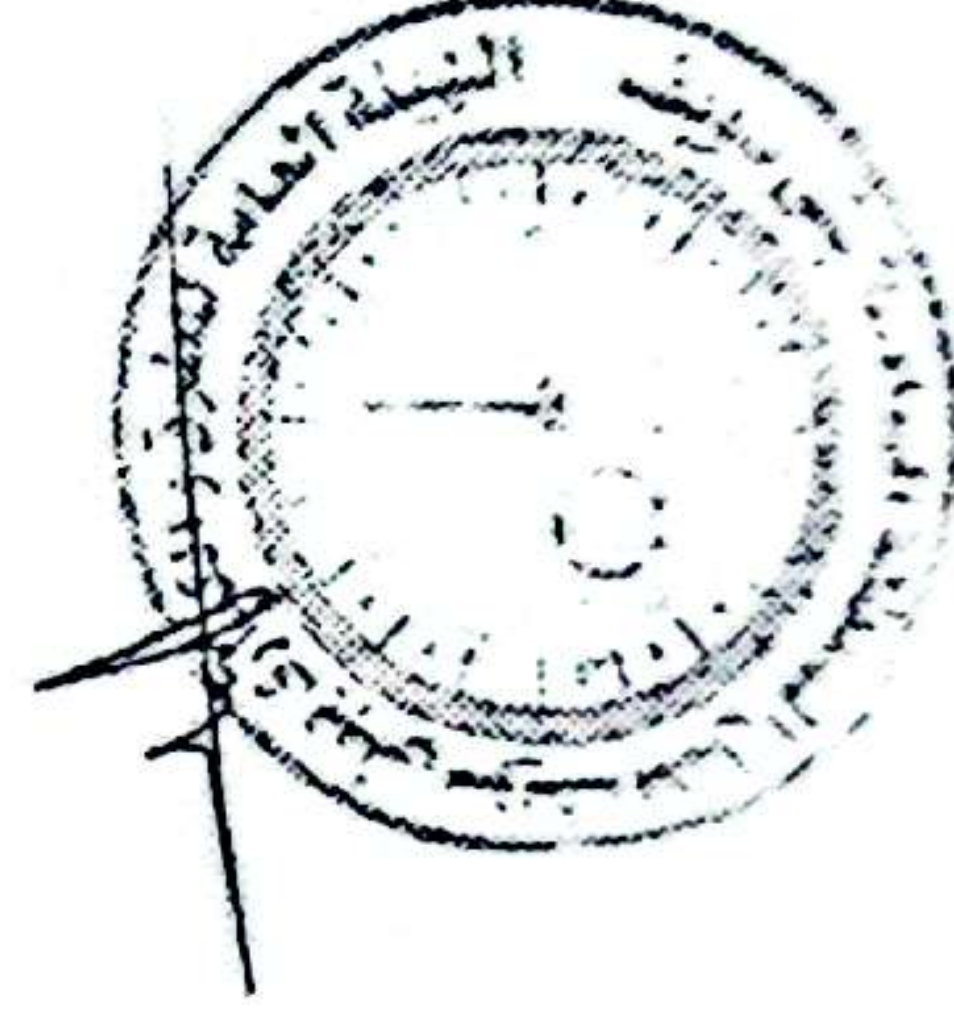



المشروع : رصف طريق منشأة كمال (بازاكي)
شركة : الشركة للمعولات المتكاملة
نوع العينة : عدد ٣ عينة من أحجار سلسية جيرية تكسير كسارات
نوع الاختبار : التدرج - حد اللدونة - صلاحية
أحضرت العينة بمعرفة م/ ايهاب ابراهيم

تتيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

نوع العينة	رقم العينة	ك ٠٠٠٨٠٠ Road c	ك ٠٠١٢٠٠ الطريق المنعطر	ك ٠٠٣٦٠٠ الطريق المنعطر	تدرج (ب)
سعة المنحل	"٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
"٢/١	٩٨	٩٩	٩٩	٩٩	١٠٠-٧٠
"١	٧٩	٧٧	٧٦	٧٦	٨٥-٥٥
"٤/٣	٦١	٦٢	٦١	٦١	٨٠-٥٠
"٨/٣	٥٥	٥٦	٥٤	٥٤	٧٠-٤٠
رقم ٤	٥٠	٤٩	٤٩	٤٩	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٤١	٤١	٤١	٤١	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	٢٠	٢٥	٢٥	٢٥	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	١٢	١٣	١٥	١٥	١٥-٥
حد السيولة	---	---	---	---	لا تزيد عن ٣٠%
حد اللدونة	---	---	---	---	---
محال اللدونة	---	---	---	---	لا تزيد عن ٨%
أقصى كثافة جافة طن / م ^٣	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠	لا تزيد عن ٨%
نسبة المياه المرادسة %	٦	٦	٦	٦	لا تقل عن ٨٠%
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٨٢	٨٤	٨٦	٨٦	لا تزيد عن ٤٠%
نسبة الانتفاخ %	٠	٠	٠	٠	لا تزيد عن ٥%
فقدان بلوس الحلو	٢٧	٣٠	٢٩	٢٩	لا تتأثر بالمياه
الإمتصاص	٢٠٦	٢٠٣	٢٠٨	٢٠٨	
الوقت	٠.٨	٠.٩	٠.٦	٠.٦	

ملاحظات : العينات تتفق مع تدرج (ب) مع وتفق بالنسبة للصلابية

