

دفتر حصر أعمال للمستخلص الجارى رقم (٢)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مهندس الشركة : 

مدير الأعمال (الهيئة)



مهندس الهيئة 



عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من

القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

دفتر حصر اعمال

الجهة المالكة /
مهندس / محمد حسائين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /
مهندس / محمد سيد مسلم

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			جزئي	خصم	إجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
١٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بوابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١متر وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة							
			مقابله					٠,٠٠
١	القصير	٠+٣٧٥				٤٠		
٢	القصير	٠+٦٢٥				١٧٠		
٣	القصير	١+٤٢٥				٥٨		
٤	القصير	٢+٣٠٠				٥٨		
٥	سفاجا	٠+٣٥٠				٣٧		
٦	سفاجا	٠+٩٢٥				٥٦		
٧	سفاجا	١+٢٠٠				٤٠		
٨	القصير	٢+٠٥٠				٧٣		
	الإجمالي حتى ٢٠٢٥/١/٢٩ م ٥٣٢,٠٠							
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (٢) حتى تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ ٥٣٠,٠٠							

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /

مهندس / محمد سید مسلم

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في
المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			جزئي	خصم	إجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ والاساسات والقدمات							
			مابقا ه					٠,٠٠
١	القصير	٠+٣٧٥				٨٧,٥٢		
٢	القصير	٠+٦٢٥				٢٧٦,٤٢		
٣	القصير	١+٤٢٥				١٢٦,٨٥		
٤	القصير	٢+٣٠٠				٤٠,٧٢		
٥	سفاجا	٠+٣٥٠				٨٠,٩٦		
٦	سفاجا	٠+٩٢٥				١٠٢,٨٤		
٧	سفاجا	١+٢٠٠				٨٧,٥٢		
٨	القصير	٢+٠٥٠				٥١,٢٥		
٩	القصير	٢+٦٢٥				٥٣,٣٥		
١٠	القصير	٢+٩٢٥				٤٠,٧٢		
١١	القصير	٣+١٠٠				٥٣,٣٥		
الإجمــ								

الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /

مهندس / محمد سيد مسلم

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء
الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو
طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			جزئي	خصم	إجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١٣	بالطن اعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح							
	ماقبلاً							٠,٠٠
١	القصير	٠+٣٧٥				٧٢٨		
٢	القصير	٠+٦٢٥				٢٦٥٥		
٣	القصير	١+٤٢٥				١٠٩٢		
٥	سفاجا	٠+٣٥٠				٦٦٧		
٦	سفاجا	٠+٩٢٥				٨٧١		
٧	سفاجا	١+٢٠٠				٧٢٨		
	الإجمالي حتى ٢٠٢٥/١/٢٩ م					٦٧٤٠		٦,٧٤٠
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (٢) حتى تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩							٦,٥٠

الجهة المالكة /
مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /
مهندس / محمد سيد مسلم



ملخص بالاختبارات المعملية عملية

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٢)



ملخص الاختبارات المعملية (الأساس)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٢)



بيان متابعة اعمال دمك طبقة الأساس

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من
القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	* الموقف من القبول أو الرفض	رقم الطبقة	رقم الطبقة
			من	الى				
1	جديد	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	0	600	600	مقبول	س ١	القصير
2	جديد	١١ فبراير ٢٠٢٤	650	900	250	مقبول	س ١	القصير
3	جديد	٢٢ فبراير ٢٠٢٤	900	1300	400	مقبول	س ١	القصير
4	جديد	٢١ يناير ٢٠٢٤	1325	1950	625	مقبول	س ١	القصير
5	جديد	٥ سبتمبر ٢٠٢٤	650	900	250	مقبول	نهائي	القصير
6	جديد	٨ سبتمبر ٢٠٢٤	900	1300	400	مقبول	نهائي	القصير
7	جديد	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	1325	1950	625	مقبول	نهائي	القصير
8	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	0	900	900	مقبول	أولى	سفاجا
9	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	900	1300	400	مقبول	أولى	سفاجا
10	جديد	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤	1325	1900	575	مقبول	أولى	سفاجا
11	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1900	2300	400	مقبول	أولى	سفاجا
12	جديد	١٨ يناير ٢٠٢٤	2300	2500	200	مقبول	أولى	سفاجا
13	جديد	٢١ يناير ٢٠٢٤	2500	3050	550	مقبول	أولى	سفاجا
14	جديد	١٠ ديسمبر ٢٠٢٤	0	800	800	مقبول	نهائي	سفاجا
15	جديد	١٤ ديسمبر ٢٠٢٤	800	1300	500	مقبول	نهائي	سفاجا
16	جديد	١٨ ديسمبر ٢٠٢٤	2300	2600	300	مقبول	نهائي	سفاجا
17	جديد	٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤	2600	3050	450	مقبول	نهائي	سفاجا

مهندس / الهيئة

فني مواد الشركة



ملخص الاختبارات المعملية (الطبقة الرابطة)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٢)

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلى سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات فى المسافة من
القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

CONTRACTOR :



شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال رصف (الطبقة الرابطة)

ممسلسل	تاريخ اخذ العينة	المحطة	الحالة	التدرج												
		كم		الثبات	الامتصاص	الجبساة	1	3/4	3/8	4	8	30	50	100	200	نسبة البيتومين %
المواصفات																
				لا يقل عن ٧٠٠	2-4mm	200-500	100	91.4-100	59-69	42.8-50.8	31.3-35	12.3-18.3	5.5-11.5	3.3-6.3	2.2-5.2	4.5% + .25%
1	07/12/2024	R 0+900		869.4	2.8	310.5	100	96.3	63.8	43.2	32.8	15.6	8.8	4.2	2.5	4.45
2	15/12/2024	L 1+750		895.5	2.67	335.80	100	97.3	67.2	48.2	33.2	15.2	8.4	4.1	2.7	4.48
3	16/01/2025	L 0+550		898.2	2.56	325.24	100	93.1	67.8	44.9	33.7	17.2	9.3	3.7	2.3	4.44
4	18/01/2025	R1+050		934.7	2.8	344.21	100	93.9	65	44	31.8	14.6	7.6	3.3	2.8	4.39

مهندس الهيئة

م/محمد حسائين


مدير التنفيذ

م / محمد سيد مسلم

فنى مواد الشركة

أ/ أسامة حمدي ونيس




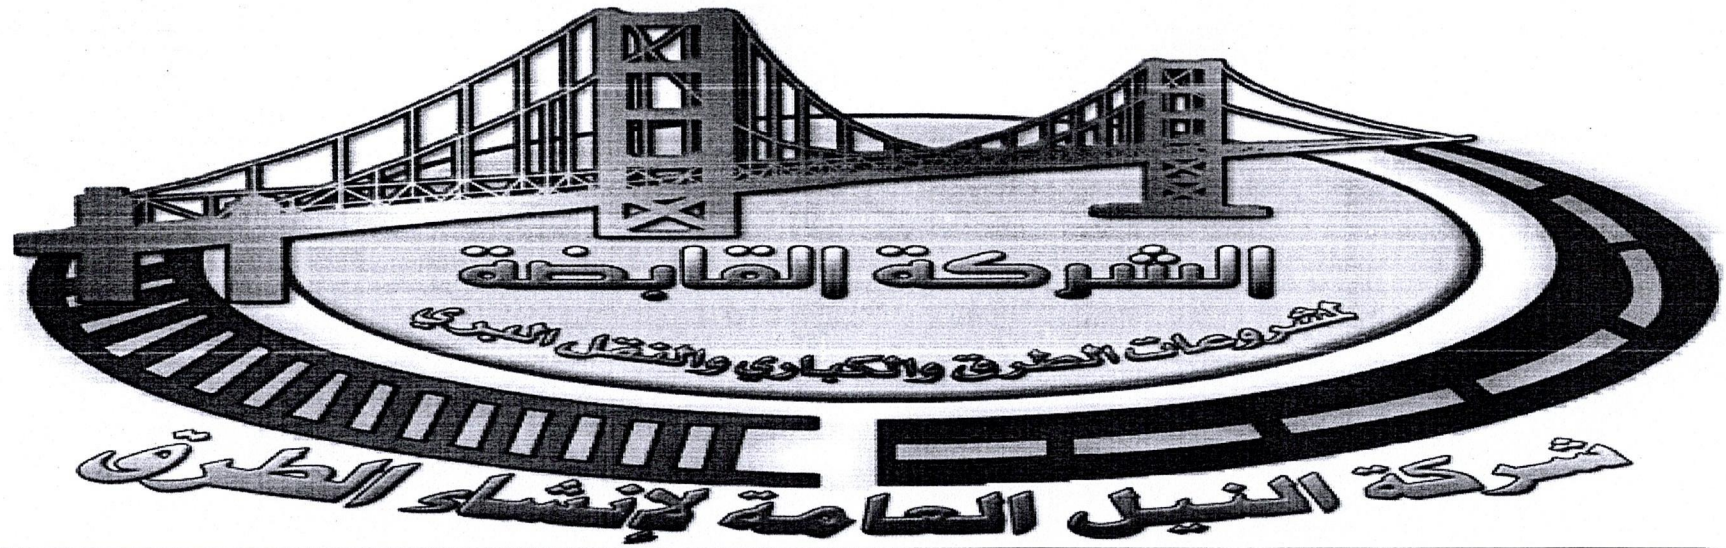

ملخص الاختبارات المعملية (الخرسانة العادية)


مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٢)



بيان متابعة اعمال صب وتكشير المعينات الخرسانية

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول 5 كم (ازدواج) .



م	الموقع	نوع الصبة	الاتجاه	نوع الخرسانة	العدد	تاريخ الصب	بعد ٧ ايام	بعد ٢٨ يوم	بعد ٧ ايام	بعد ٢٨ يوم	المتوسط	بعد ٢٨ يوم	المتوسط
1	2+950	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	24/11/2024	01/12/2024	22/12/2024	171	172	170	221	171
2	2+650	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	25/11/2024	02/12/2024	23/12/2024	189	180	194	222	188
3	3+100	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	26/11/2024	03/12/2024	24/12/2024	192	182	187	221	187
4	2+050	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	28/11/2024	05/12/2024	26/12/2024	164	168	166	222	166



مهندس الهينه

مهندس المواد الشركة المنفذة 4 م حدى
