

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البركتية / مفارق السعدني) القطاع الأول بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (٣٠) .
(مستخلص ١ جاري) تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تم رفع المحملات في الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/١٥ إلى ٢٠٢٤/٨/١٢ طبقاً لخطاب المنطقة لتأخر في استصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساندة بالطريق وتم استئناف الأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ وتم نزول عدد (١) سيارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ (مرفق) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع (
مهندس / محمد جمال محمد العديلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



مستخلص رقم { ١ } جاري

عن عملية رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر / وصلة البراقية / مفارق السعدني { القطاع الأول بطول ٤ كم
مركز الحسينية بحافطة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٧

شاملة الدة من : بدء العمل إلى

مع شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٩

المعقد رقم ٢٠٢٣ / ٣٠ / ٢٠٢٤

إدارة المقرد

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		الباقي		حجز		استقطاع أو حجز		جملة مقادير الأعمال		التي تمت حتى الآن		جملة مقادير الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار العمل السابق		الفترة		البيد	رقم البيد
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	٥٢٤٢٠٠	-	٥٠٠٠	-	٥٢٩٢٠٠	-	٥٢٩٢٠٠	-	٣٢٠٠	-	٣٢٠٠	-	٣٢٠٠	-	٣٢٠٠	-	١٦٨	٥٠	أعمال توريد أتربة رملية	٣
٢- عمل المرق متواجد	٢٣٣٦٦٣	-	-	-	٢٣٣٦٦٣	-	-	-	٢٢٩٠	-	٢٢٩٠	-	٢٢٩٠	-	-	-	١٠٢	٠٨	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتآكلة	٤
٣- مهندس محاسب متواجد	٥٧٤٠٠٨	-	٥٠٠٠	-	٥٧٩٠٠٨	-	-	-	١٢٨٠	-	١٢٨٠	-	١٢٨٠	-	-	-	٤٥٢	٣٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٥
٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد	٢١٢٨١١٢	-	٥٠٠٠	-	٢١٣٣١١٢	-	-	-	١٢٥٠	-	١٢٥٠	-	١٢٥٠	-	-	-	١٧٠٦	٤٩	أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط	١٢
٥- تم تركيب اللافتة الإعلانية للشروع	٦٥٩٩٠٠٠	-	٥٠٠٠	-	٦٦٤٩٠٠٠	-	-	-	٢٥٤٠	-	٢٥٤٠	-	٢٥٤٠	-	-	-	٢٦٠٠	-	أعمال توريد خرسانة مسلحة للحوائط	١٣
٦- يتم تنظيم حركة الدور على الطريق أثناء العمل	١٠٠٩٩٠٨٣	-	٢٠٠٠٠	-	١٠٠٨٩٠٨٣	-	-	-	٧٠	-	٧٠	-	٧٠	-	-	-	-	-	-	-
٧- بمعرفة الشركة باستخدام الملامات الإرشادية																				
والتحضير																				
٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنية التحتية																				
٩- بالتخصيص																				
١٠- التقادير متواجدة																				
١١- بولاية التأمين متواجدة																				
١٢- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال																				
١٣- الميزانية غير متواجدة بالمشقة																				
١٤- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (٣)																				
١٥- أتربة رملية لحين ويزود تجارب العمل																				
١٦- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (٥)																				
١٧- أساس لحين ويزود تجارب العمل																				
١٨- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (١٢)																				
١٩- خرسانة عادية لحين ويزود تجارب العمل																				
٢٠- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (١٣)																				
٢١- خرسانة مسلحة لحين ويزود تجارب العمل																				
٢٢- مهندس العملية																				
٢٣- التوقيع																				
٢٤- الاسم																				
٢٥- التوقيع																				
٢٦- الاسم																				
٢٧- التوقيع																				
٢٨- الاسم																				
٢٩- التوقيع																				
٣٠- الاسم																				
٣١- التوقيع																				
٣٢- الاسم																				
٣٣- التوقيع																				
٣٤- الاسم																				
٣٥- التوقيع																				
٣٦- الاسم																				
٣٧- التوقيع																				
٣٨- الاسم																				
٣٩- التوقيع																				
٤٠- الاسم																				
٤١- التوقيع																				
٤٢- الاسم																				
٤٣- التوقيع																				
٤٤- الاسم																				
٤٥- التوقيع																				
٤٦- الاسم																				
٤٧- التوقيع																				
٤٨- الاسم																				
٤٩- التوقيع																				
٥٠- الاسم																				
٥١- التوقيع																				
٥٢- الاسم																				
٥٣- التوقيع																				
٥٤- الاسم																				
٥٥- التوقيع																				
٥٦- الاسم																				
٥٧- التوقيع																				
٥٨- الاسم																				
٥٩- التوقيع																				
٦٠- الاسم																				
٦١- التوقيع																				
٦٢- الاسم																				
٦٣- التوقيع																				
٦٤- الاسم																				
٦٥- التوقيع																				
٦٦- الاسم																				
٦٧- التوقيع																				
٦٨- الاسم																				
٦٩- التوقيع																				
٧٠- الاسم																				
٧١- التوقيع																				
٧٢- الاسم																				
٧٣- التوقيع																				
٧٤- الاسم																				
٧٥- التوقيع																				
٧٦- الاسم																				
٧٧- التوقيع																				
٧٨- الاسم																				
٧٩- التوقيع																				
٨٠- الاسم																				
٨١- التوقيع																				
٨٢- الاسم																				
٨٣- التوقيع																				
٨٤- الاسم																				
٨٥- التوقيع																				
٨٦- الاسم																				
٨٧- التوقيع																				
٨٨- الاسم																				
٨٩- التوقيع																				
٩٠- الاسم																				
٩١- التوقيع																				
٩٢- الاسم																				
٩٣- التوقيع																				
٩٤- الاسم																				
٩٥- التوقيع																				
٩٦- الاسم																				
٩٧- التوقيع																				
٩٨- الاسم																				
٩٩- التوقيع																				
١٠٠- الاسم																				

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع
الهندسة فتيحة سالم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومختوم وأن المبالغ المبينة بظهرة وقبيرة :
تحريراً في سنة المحاسب
يُدفع إلى القاول مبلغ : ١٠٠٨٩٠٨٣,٧٠ جنيه على الحساب
ملحوظة : غير الوارد بحد الشروط اعتقدت من نهائياً

تحريراً في سنة
تحريراً في سنة
أقر بحدثة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
سليلى سامي صالح

CS CamScanner



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....


إيماءاً إلى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق السعدني) بـ ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٠ تنفيذ شركة أحمد عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية.

وبالإحالة إلى الطلب المقدم من الشركة المنفذة المتضمن رفع المحملات عن السيارة في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ إلى ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنه تم إستلام الموقع في ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت الأعمال تماماً نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأنه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلى توقفها أيضاً التأخر في إستصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساتدة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول على تراخيص الري في ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢ قامت الشركة بإستئناف الأعمال في ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢.

وترى المنطقة بعد الموافقة من سيادتكم التكرم في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ إلى ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة.

والامر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
تحية طيبة وبعد....

بالإحالة إلي عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق السعدني) بطول ٤ كم مركز الحسينية
محافظة الشرقية عقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تحيط علم سيادتكم أنه تم إستلام الموقع في ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت
الأعمال تماماً نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعليه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلي توقفها أيضاً
التأخر في إستصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط المساندة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول علي
تراخيص الري في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ قامت الشركة بإستئناف الأعمال في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ .

لذا نأمل من سيادتكم التكرم بمساعدة الشركة في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

شركة / أحمد عبد الرحمن للمقاولات



أحمد عبد الرحمن
1٢/١٠

المقر الرئيسي : ٥٧ شارع عبد القادر حاتم - زوليليا عالي ٢ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
فرع الشركة : شارع البلاسي - فاقوس قسم أول - الشرقية

((اشتراطات ترخيص))

بناء على الطلب المقدم من / الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل حائط ساند على ترعة بشاره بالبر الأيسر بأماكن متفرقة وهي كالآتي :

- ١ حائط ساند من (ك) ٠.٤٠٠ حتى (ك) ٠.٤٦٠ بطول ٦٠ م
- ٢ حائط ساند من (ك) ٠.٥٠٠ حتى (ك) ٠.٥٤٠ بطول ٤٠ م
- ٣ حائط ساند من (ك) ١.٩٠٠ حتى (ك) ٢.٠٠٠ بطول ١٠٠ م
- ٤ حائط ساند من (ك) ٢.١٥٠ حتى (ك) ٢.١٩٠ بطول ٤٠ م
- ٥ حائط ساند من (ك) ٢.٦٠٠ حتى (ك) ٢.٦٥٠ بطول ٥٠ م
- ٦ حائط ساند من (ك) ٢.٩٠٠ حتى (ك) ٢.٩٦٠ بطول ٦٠ م

وعلى حساب الهيئة العامة للطرق والكبارى وبالرسومات المقدسة من الهيئة العامة للطرق والكبارى ومطابقة المباحث الهندسية والرسومات التنفيذية للعملية وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ يرخّص للهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل حوائط ساند بأماكن متفرقة على ترعة بشاره بالبر الأيسر .

تنتزم الجهة المرخص لها بقانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ وجميع المنشآت المنقطة

لذلك وبما ورد بالسند رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ وجميع المنشآت الوزارية المنقطة لذلك الخاصة بصدار

تراخيص لأجراء أعمال ذات صلة بمنافع الري والصرف والمرافق .

١- تنتزم الجهة المرخص لها بتنفيذ الرسومات الإنشائية الواردة من الاستشاري والمقدمة من الجهة الذاتية لتتخذ

٢- تتوّم الهيئة العامة للطرق والكبارى بأخطار الهندسة بمبعا، التنفيذ وذلك للمتابعة .

٣- على الجهة المرخص لها الالتزام بالقطاع التصميمي للمجرى المائي في مواقع التنفيذ والمحافظة على الجسور وإزالة كافة العوائق التي تعوق سير المياه والتي تنشأ نتيجة التنفيذ وذلك بمعرفة الهيئة وعلى نفقتها بعد التنفيذ مباشرة مهما كانت التكلفة طبقاً للمناسيب والمدة التي تحددها الإدارة والمحافظة على القطاع المائي للمجرى .

٤- هذا الترخيص لا يغطي للجهة المرخص لها سند ملكية على الجسر أو المنشأ المنفذ .

٥- الأعمال المرخص لها تصبح ملكاً لمصلحة الري وسيانها على الجهة المرخص لها .

٦- على الجهة المرخص لها المحافظة على جميع أنواع المرافق من مواسير كهرباء / غاز / صرف صحي وخلافه على مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية في حالة تعارض أحد هذه المرافق مع العمل .

٧- إذا حدث ضرر للحوائط الساندة نتيجة سوء التصميم أو التنفيذ وخلافه فإن الجهة المرخص لها تكون مسؤولة مسؤولة تامّة عن أي ضرر يلحق بالأعمال المنقذة ولا مسؤولة على الإدارة مصدر الترخيص وليس للهيئة الطرق والكبارى الحق في أي تعويضات من أي نوع من الإدارة العامة أرى شرق الشرقية .

٨- هذا الترخيص يعمل به لمدة ٦ أشهر من تاريخ اعتماده ولا يجوز تعديله ولا يعتبر لازماً



محضر استلام موقع

عملية : رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر
(وصلة البراكتيه / مفارق السعدنى)

{ القطاع الأول } بطول ٤ كم مركز محافظة الشرقية

ضمن المادة الرئاسية حياه كريمة

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية

بناءً على العقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والمحضر بين الهيئة وشركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع

شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

• المهندس / أحمد سمير حسن

• المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ والروور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرة تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وحرر هذا محضرنا بذلك ،،،

اللوقيعان

المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد محمد عبد الحميد محمد سعيد
المهندس / أحمد سمير حسن

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	احمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات
رقم العقد	(2024/2023/30)
العملية	اعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكنية / مفارق السعدنى) القطاع الاول بطول 4 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف سيارة هلاكي

تحرير في (2024-12-15)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
مدير عام البحوث

تم المراجعة
ع

صورة طبق الأصل
محمد الباجوري
مدير عام البحوث



شركة

أحمد عبد الرحمن محمود حسين
للمقاولات والتوريدات

تحريراً في: ٢٠ / / م

المادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

المسيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة الى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البركتية / مفارق
السعدنى) القطاع الاول بطول 4 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة". عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٠

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على رد غرامة المحملات وهى عبارة عن عدد (١) سيارة
ملاكى الخاص بالعملية المذكورة أعلاه


مرفق لسيادتكم طية صورة من مذكرة الجهة المختصة

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

مقدمة لسيادتكم

شركة / أحمد عبد الرحمن

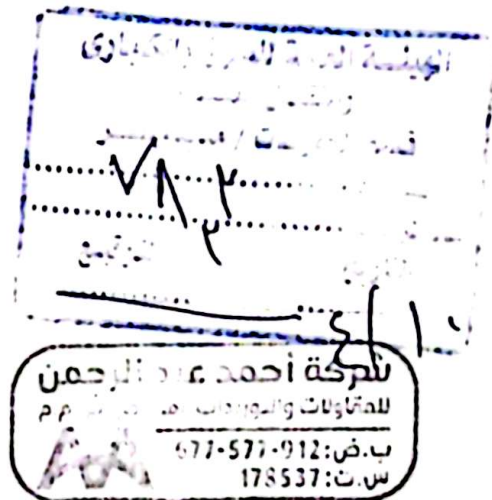

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق

بالإحالة إلى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق السعدني) بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية عقد رقم ٢٠٢٣/٣٠/٢٠٢٤ تنفيذ شركة أحمد عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية .

إيماءً إلى كتاب الشركة المنفذة والمتضمن رفع المحملات عن السيارة في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ إلى ٢٠٢٤/٨/١٢
تتشرف بعرض الآتى :-

١. تم استلام الموقع فى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥ .
٢. قامت الشركة بأعمال تكسير فقط بطول ٥٠٠ متر .
٣. توقفت الأعمال نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ونتيجة التأخر فى استصدار تراخيص الرى .
٤. تم الحصول على موافقة الرى بتاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢ .
٥. قامت الشركة باستئناف الأعمال فى ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢ .

لذا ترى المنطقة والأمر مفوض رفع محملات السيارة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥ إلى ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



أحمد كمال

