

مقاييس ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع لقطار الكهربائي السريع
بطول ٥٠ كم

مقاولة :- شركة الكفاح للمقاولات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً لكميات المنفذ على الطبيعة فقد تم أعداد المقاييس الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية بجمالي مبلغ ٧٢٥١١٢٩,٣٨ جنيه

(فقط وقدره سبعة مليون منتان واحد وخمسون ألف مائة تسعة وعشرون جنيها و١٠٠/٣٨ لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد سعيد جابر

الاسم / ابراهيم الاطمار

التوقيع /

التوقيع /



رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

" عبد مهندس / " هانى محمد محمود طه





رقم البند	بيان الأعمال	طبقات الأساس	القمة	الكمية	الوحدة	الاجمالي
4	بالنور المكتب أصل توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الأهجار الصلبة المتردجة لفتح تكسير الكسارات والمطاطة للمواصفات وأقصى حجم التعبيرها ١٠ مم والأزيد نسبة تحمل تأثيراتها عن ٢٠ % والازيد نسبة المقاد بجهيز لوس جلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ٥ % والي أقل معامل المرونة (Ev2) من تهوية لوح التحمل عن ٨٠ سم و ريشها على طبقتين باستثناء الاتصالات التي توصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتسموية الحديثة على ان لا يزيد سماك الطبقة بعد دعم الماك عن ٢٠ سم و ريشها على طبقتين باستثناء الاتصالات التي توصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراست لوصول إلى اقصى كثافة قصوى (اقل عن ٩٠ %) من الكثافة العملية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتحفظاته المدنى المشرف.	مسافة القلل لا تقل عن ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١٣ % جنباً إلى ١ كم بزيادة أو النقصان	علاقة مسافة النقل	٤٠٨,٢٣٥	١٤٦.٤٠	٤٠١٨.٠٠
4-1	علاقة مسافة النقل ١٢ كم على توقيف رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٦٤٦,٨٩٨ ٥٢٢,٣٤٠ ١٠٠,٤٥٠	١٦١.٠٠ ١٣٠.٠٠ ٢٥.٠٠	٤٠١٨.٠٠ ٤٠١٨.٠٠ ٤٠١٨.٠٠	٣م	٥٨٨,٢٣٥
4-2	بالنور المكتب أصل توريد وفرش طبقة أساس من الأهجار الصلبة المتردجة لفتح تكسير الكسارات والمطاطة للمواصفات وأقصى حجم التعبيرات ما بين ٣١.٥ مم و لا يزيد نسبة الماء من منخل ٤٠ % ولا يزيد التدرج الوارد بالاشترافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل تأثيراتها عن ٢٠ % والا يقل معامل المرونة عن ٨٠ % والي أقل معامل المرونة (Ev2) من تهوية لوح التحمل عن ١٢٠ سم وجهايسكل ولا يزيد نسبة المقاد بجهيز لوس جلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستثناء الاتصالات التي توصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة على ان لا يزيد سماك الماك عن ٢٠ سم و ريشها على طبقتين باستثناء الاتصالات التي توصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراست لوصول إلى اقصى كثافة قصوى (اقل عن ٩٠ %) من الكثافة العملية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتحفظاته المدنى المشرف.	مسافة القلل لا تقل عن ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١٣ % جنباً إلى ١ كم بزيادة أو النقصان - المسحراً يشمل قيمة المواد المهرجية	علاقة مسافة النقل	٤٤٢,٨٥٥.١٠	١٥١.٣٠	٢٩٢٧.٠٠
4-3	علاقة مسافة النقل ١٢ كم على توقيف رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٥١٢,٢٢٥.٥٠ ٨٨٦,٥٨٨ ٧٣,١٧٥	١٧٥.٠٠ ٣٠٢.٩٠ ٢٥.٠٠	٢٩٢٧.٠٠ ٢٩٢٧.٠٠ ٢٩٢٧.٠٠	٣م	٣,٠٨٨,١٧٨
5	بالنور المسطحة أصل توريد وصب غرسنة عادي سماك ١٥ سم أحجام الافتراض والمولى الجاتية تكون من ٣٠ - ٨ سم من توليفة متدرج ٠٠ - ٤ رمل هرقل وأضافات طبقاً لمعاييرات الاتصال (غير + سيدا) على أن يكون السفل طبقاً لوح وطبقه وطبقه والمولى ذاتي من الشواب ونقطة والأخلاص والمواد الرابحة مع وضع قوم (الملاص) بسماك ٢ سم (طبقاً لمعاييرات الاتصال) وبشكل تهوية يحصل على تأثيرات التصميمية على ان تحمل الغرسنة الجيد لا يقل عن ٢٠ كم / سم و تشطيب سطح وله المؤهل بالبيتون المرجل وتحفظاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطريق والجسور وتحفظاته المدنى المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٧% بدءاً من ١٠ متر وراس على ان تضاف كل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راس)	علاقة مسافة النقل	٧,٢٥١,١٢٩.٣٨			
5-1	بالنور المكتب أصل توريد وصب غرسنة عادي لخدمات المحميات و رمل هرقل على انتفاخات من ٣٠ - ٨ سم من توليفة متدرج ٠٠ - ٤ رمل هرقل والاشترافات طبقاً لمعاييرات الاتصال (غير + سيدا) على أن يكون السفل طبقاً لوح وطبقه وطبقه والمولى ذاتي من الشواب ونقطة والأخلاص والمواد الرابحة مع وضع قوم (الملاص) بسماك ٢ سم (طبقاً لمعاييرات الاتصال) وبشكل تهوية يحصل على تأثيرات التصميمية على ان تحمل الغرسنة الجيد لا يقل عن ٢٠ كم / سم و تشطيب سطح وله المؤهل بالبيتون المرجل وتحفظاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطريق والجسور وتحفظاته المدنى المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٧% بدءاً من ١٠ متر وراس على ان تضاف كل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راس)	علاقة مسافة النقل	٣٩٠,١٨٥	٢,٦٦٥.٢٠	١٤٦.٤٠	٦,٧٥٧.٥٠
5-2	(سبة ملائين وسبعين وواحد وخمسمائة وواحدة وتسعة وعشرون جنيها وثمانية وثلاثون قرشاً فقط لا غير)	مدير المشروع المقاول م / محمد محسن فياض م / محمد عباس				

مدير عام المشروع
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع المقاول
م / ابراهيم شحاته

مدير المشروع المقاول
م / محمد محسن فياض
م / محمد عباس

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مصر مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه





التقييم الفني

مشروع :- اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة - العلمين)(قطاع فوكة- مطروح) لاستكمال تشكيل الجسور وطبقات
الاساس والحماية .

المسافة من كم ٥٤٥+٠٠٠ ال كم ٥٤٥+٥٠٠ بطول ٥٠ كم.

عقد رقم:- ٢٤٥/٢٣/٢٣/٢٣/٢٤٥ المؤرخ في ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٣

تنفيذ:- شركة الكفاح للمقاولات.

اشراف:- المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا.



الحسابات المالية و مفصل التقييم و قيمة الخصومات

انه في يوم ٢٠٢٤/٩/٢٥ و بناء على القرار الاداري (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤

ال الصادر من السيد عيد مهندس/ رئيس الادارة المركزية - منطقة غرب الدلتا و محضر الاستلام الابتدائي للعملية الموزع في ٢٠٢٤/٨/١٥ تم عمل التقييم الفني للعملية عالية وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|
| (رئيس اللجنة) | (مدير عام المشروعات) | ١. السيد المهندس / محمد حسني فياض |
| (عضو لجنة) | (ممثل الهيئة) | ٢. السيد المهندس / ابراهيم الحناوي |
| (عضو لجنة) | (معمل المنطقة المشرفة) | ٣. السيد المهندس / عبدالله عبد المحسن |
| (عضو لجنة) | (مكتب دكتور خالد قنديل استشاري الهيئة) | ٤. السيد المهندس / خالد فوزى |
| (عضو لجنة) | (مكتب استشاري المساحة للمشروع) | ٥. السيد المهندس / محمد خليل |
| (عضو لجنة) | (الشركة المنفذة) | ٦. السيد المهندس / محمد محسن فياض |

و بعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية و ملفات التجارب العملية تمت حساب الخصومات المالية و جاءت كالتالي:-

- لا يوجد خصم على خروج العينات.



- يتم خصم مبلغ وقدره (٤٣٥٠٠٠) ثلاثة واربعون ألفا وخمسماة وخمسون جنيه فقط لا غير بنسبة ٠.٦% من اجمالي قيمة المشروع نتيجة الفحص البصري

التوقيعات:

٦- محمد فاضل
٥- سعيد حليم
٤- سعيد حليم
٣- سعيد حليم
٢- سعيد حليم
١- سعيد حليم

يعتمد،



رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا - الاسكندرية

عميد مهندس /"

هانى محمد محمود طه



الهيئة العامة
للطرق والجسور

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

عملية : أعمال الجسر التراقي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٥٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٥ بطول ٥,٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحميات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١-٤) أعمال توريد وفرش طبقة الاساس (sub grade) مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٤٠١٨,٠٠ ٣م

الكمية	بيان الاعمال
٤٠١٨,٠٠	مقدار العمل السابق
٤٠١٨,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣)
٤٠١٨,٠٠	اجمالي الكميات الختامية

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد فياض

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٥٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٥ بطول ٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحمايات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١-٤) قيمة المادة المحجرية


علاوة المادة المحجرية

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات


مقدار العمل السابق : ٤٠١٨,٠٠ م³

الكمية	بيان بالكميات
٤٠١٨,٠٠	مقدار العمل السابق
٤٠١٨,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)
٤٠١٨,٠٠	اجمالي الكميات الختامية


مهندس الهيئة العامة
للطرق والجاري
م / ابراهيم الحناوي



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزي



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / محمد فياض
محمد فياض

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٥٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٠ بطول ٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحمايات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ: شركة الكفاح للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٤٠١٨,٠٠ م³

بيان بالكميات	الكمية
مقدار العمل السابق	٤٠١٨,٠٠
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)	٤٠١٨,٠٠
اجمالي الكميات الختامية	٤٠١٨,٠٠

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجاري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد فياض
محمد عاصم



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

عملية: أعمال الجسر الترايي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٠٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٠ بطول ٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحمايات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٤-١) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة(٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الkartat and الموازين


تنفيذ: شركة الكفاح للمقاولات

٤٠١٨,٠٠ مقدار العمل السابق :

٢م

الكمية	بيان بالكميات
٤٠١٨,٠٠	مقدار العمل السابق
٤٠١٨,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)
٤٠١٨,٠٠	اجمالي الكميات الختامية

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزي


مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل


مهندس الشركة
م / محمد فياض




الهيئة العامة
للطرق والجسور

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

عملية :أعمال الجسر التراي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٠٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٥ بطول ٥,٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحمايات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (٢-٤) أعمال توريد وفرش طبقة الاساس (sub ballast) مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢٩٢٧,٠٠

بيان الاعمال	الكمية
مقدار العمل السابق	٢٩٢٧,٠٠
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)	٢٩٢٧,٠٠
اجمالي الكميات الختامية	٢٩٢٧,٠٠

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد فنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد فياض
مكيان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

عملية: أعمال الجسر التراسي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٠٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٠، كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحميات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (٢-٤) قيمة المادة المحجرية

علاوة المادة المحجرية


تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢٩٢٧,٠٠

٣م

الكمية	بيان بالكميات
٢٩٢٧,٠٠	مقدار العمل السابق
٢٩٢٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)
٢٩٢٧,٠٠	اجمالي الكميات الختامية


مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي



مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزي



مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / محمد قياض
محمد قياض

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

عملية: أعمال الجسر التراي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٠٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٠ بطول ٥,٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحميات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٥٣ كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

٢٩٢٧,٠٠


مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٩٢٧,٠٠	مقدار العمل السابق
٢٩٢٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)
٢٩٢٧,٠٠	اجمالي الكميات الختامية

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / محمد فياض
محمد فياض

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

عملية: أعمال الجسر التراي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٥٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٥ بطول ٥,٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحميات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة(٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الkartas والموازين

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات


٣م ٢٩٢٧,٠٠


مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٩٢٧,٠٠	مقدار العمل السابق
٢٩٢٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)
٢٩٢٧,٠٠	اجمالي الكميات الختامية

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد فنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل


مهندس الشركة
م / محمد فياض


قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٥٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٠ بطول ٥,٥ كيلومتر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية سميكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات


مقدار العمل السابق : ٦٧٥٧,٥٠ ٢م

بيان الاعمال	الكمية
مقدار العمل السابق	٦٧٥٧,٥٠
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)	٦٧٥٧,٥٠
اجمالي الكميات الختامية	٦٧٥٧,٥٠


مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوي



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / محمد فياض



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٥+٥٠٠ بطول ٥,٥ كيلو متر بالإتجاهين


رقم البند و بيانه : (٢-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبية


تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات


مقدار العمل السابق : ١٤٦,٤٠ ٣م


بيان الاعمال	الكمية
مقدار العمل السابق	١٤٦,٤٠
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)	١٤٦,٤٠
اجمالي الكميات الختامية	١٤٦,٤٠

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوي



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي


مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل


مهندس الشركة
م / محمد فياض


نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

القيد : / ٢٠٢٣ المنطقه

التاريخ / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشترف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمى الخاص بعمليه
اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع بطول ٥٠,٥ كم

عقد رقم ٢٤٥/٢٣٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الكفاح للمقاولات

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالاتى :-

نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامسة
سن	م³	٦٩٤٦,٢٨	كسارة
اتربة	م³	محجر المصرية
رمل	م²	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (الbonats المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

٢٠٢٤/١٦



التوقيع (

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

محمد

افادة

بالإشارة لعملية : اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة - العلمين) (قطاع فوكة / مطروح) لتنفيذ أعمال تشكيل الجسور

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٤٥)

في المسافة من من الكم ٥٤٥+٠٠٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٠ بطول ٥٠,٥٠ كم .

مقاولة شركة : الكفاح للمقاولات

اشراف استشاري : مكتب د / خالد قنديل

كمية SUBGRADE المستخدمة في المشروع : ٤٠١٨,٦٢ م^٣

كمية SUBBALAST المستخدمة في المشروع : ٢٩٢٧,٦٦ م^٣

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببونات رسمية معتمدة و قام
استشاري المشروع بمراجعة جميع البونات و التأكيد من الكميات المدرجة و ذلك تحت
اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

م/ محمد حسني فياض

م/ ابراهيم الحناوي

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسي مطروح

عميد مهندس /


"هاني محمد محمود طه"

مدير مشروع الشركة

م/ محمد محسن فياض

محمد فياض

الكافح للمقاولات
٠٩٦٦-٩٦٢-٥٦٧
٠٩٩٦-٠٩٨٢



كشف اتاؤة المحاجر

عن كمية المواد التي تم استخدامها

عملية: اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العلمين) (قطاع فوكة / مطروح) لتنفيذ أعمال تشكيل الجسور

المسافة من الكم ٥٤٥+٥٠٠ الى الكم ٥٤٥+٠٠٠ بطول ٥,٥ كم

تنفيذ: شركة الكفاح للمقاولات

اعمال تم تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٤-٩-٢٨

كمية طبقة تاسيس (SUBGRADE) المنفذة بند (١-٥) :-

بالمتر المكعب = ٤٠١٨,٦٢ م^٣

كمية طبقة اساس (SUBBALLAST) المنفذة بند (٢-٥) :-

بالمتر المكعب = ٢٩٢٧,٦٦ م^٣

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير مشروع الشركة

م/ محمد فياض

محمد حسما



رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE	9/5/2023	code	ZONE	545+000	545+500
location	K.P545+300	KF-1	Material	Prepared Sub Grade	
NAME COMPANY	Al-Kfah				
1-visual inspection test	operate by	Gomaa Bader Lab			

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]	20320.00		gm	table classify	
sieve size	5	4	3	1 1/2	3/4	3/8	# 4	PASS
Mass retained (g)	0.0	0.0	0.0	2305.0	4000.0	2570.0	3820.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	0.0	0.0	2305.0	6305.0	8875.0	12695.0	
Cumulative Retained %	0.0	0.0	0.0	11.3	31.0	43.7	62.5	
Cumulative Passing %	100.0	100.0	100.0	88.7	69.0	56.3	37.5	

B-soft material gradation			WT.OF sample	500.00		gm
sieve size	10	40	. 200			
Cumulative Retained (g)	103.77	253.81	380.80			
Cumulative Retained %	20.75	50.76	76.16			
Cumulative Passing %	79.25	49.24	23.84			

C-General gradient		5	4	3	1 1/2	3/4	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(in)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075	
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075	
Cumulative Passing %	100.0	100.0	100.0	88.7	69.0	56.3	37.5	29.7	18.5	8.9	

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P

Contractor
المعمل المركزي
شركة جمعة بدر نوح
[Signature]

Consultant
Khalid Zaki
[Signature]



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177

الجهاز
لطرق و الماء والصرف الصحي
(GARRL)



المدينة القومية للقطارات
El Qatrain City


PROCTOR TEST

TESTING DATE	9/5/2023	code	ZONE	545+000	545+500
location	K.P545+300	KF-1	Material	Prepared Sub Grade	
NAME COMPANY	Al-Kfah				
	operate by	Gomea Bader Lab.			
Weight of empty mold :	6560.0		MAX Dry Density		
Mold Volume:	2104.9		Water content %		

trial no :	1	2	3	4			
Wt. Of Mold+ wet soil	10986.0	11238.0	11458.0	11286			
WT. WET SOIL	4426.0	4678.0	4898.0	4726.0			
Wt. Density	2.103	2.222	2.327	2.245			

Tare No.	14	14	11	11	5	5	8	8			
Tare wt.	27.36	27.36	23.85	23.85	26.37	26.37	27.48	27.48			
Wt. Of wet soil & tare	126.36	126.36	136.25	136.25	158.36	158.36	136.63	136.63			
Wt. Of dry soil & tare	123.65	123.65	130.86	130.86	150.36	150.36	127.58	127.58			
Wt. Of water	2.7	2.7	5.4	5.4	8.0	8.0	9.1	9.1			
Wt. Of dry soil	96.3	96.3	107.0	107.0	124.0	124.0	100.1	100.1			
Water content %	2.8%	2.8%	5.0%	5.0%	6.5%	6.5%	9.0%	9.0%			
AV.Water content %	2.8%		5.0%		6.5%		9.0%				
Dry Density	2.045		2.116		2.186		2.059				

curve proctor

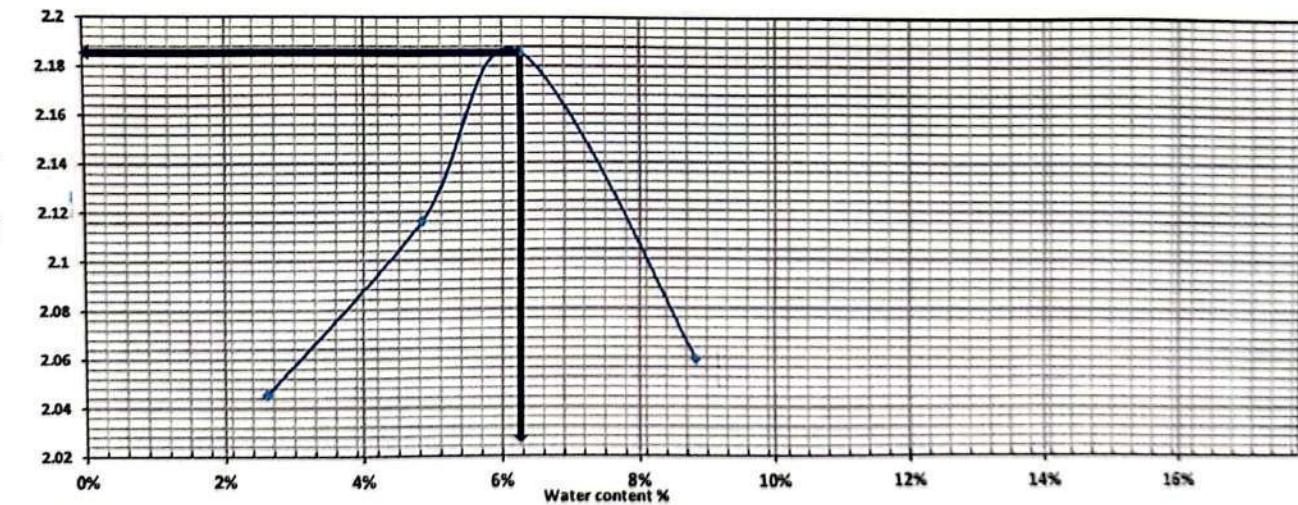

Contractor

المعمل المركزي
شركة جمعه بدرنوح

[Signature]

Consultant

[Signature]



Electric Express Train - HSR



California Bearing Ratio TEST

TESTING DATE	11/6/2023	code	ZONE	545+000	545+500
location	K.P545+300	KF-1	Material	Prepared Sub Grade	
NAME COMPANY	Al-Khalil	operate by	Gomaa Bader Lab		

- Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm³)	2177.5
Mold WT. (gm)	16444
Mold WT. + Wet WT. (gm)	21458
Wet WT. (gm)	5014
Wet Density (g/cm³)	2.303
Dry Density (g/cm³)	2.166
Proctor Density (g/cm³)	2.186
Compaction %	99

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	8
Tare WT. (gm)	22.85
Tare WT. +Wet WT. (gm)	163.25
Tare WT. +Dry WT. (gm)	154.89
Wt. Of water	8.4
Dry WT. (gm)	132.0
Moisture Content %	6.3

Swelling	
Mold No.	1
Date	24/6/2023
Initial Height (mm)	5.75
Final Height (mm)	5.80
Difference	0
Sample Height (mm)	181.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

penetration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	130.00	269.00	415.00	610.00	800.00	948.00	1084.00	1241.00	1581.00
Load (kN)	1.3	2.6	4.1	6.0	8.4	9.3	10.6	12.2	15.5

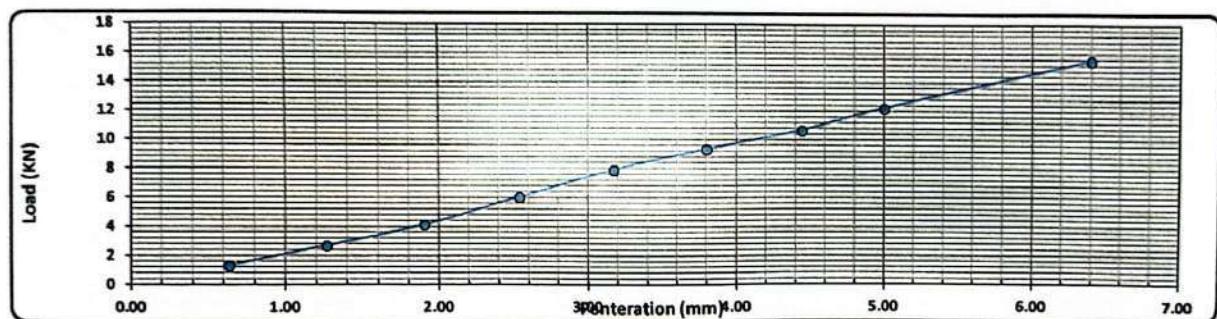
Calculations :-

Penetration (mm)	Load (kN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR % 100
2.50	5.98	13.4	44.8%	99	100	45.2%
5.00	12.16	20.0	60.7%			61.3%

Lab. Specialist

Name : المعمل المركزي
Sign : شركة جمعه بدر نوح

Consultant Engineer

Name : Khalid Zaki
Sign :



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 508+177



Absorption & Aggregate specific gravity
AASHTO-T85

TESTING DATE:	10/5/2023	code	ZONE	645+000	545+500
LOCATION	K.P545+300				
NAME COMPANY	Al-Kfah	KF-1	Material	Prepared Sub Grade	

Weight of sample	2000.00	gm
Weight of saturated -dry surface sample (B)	2108.40	gm
Weight of saturated sample in water (C)		gm
Weight of dry sample after heating (A)	1981.63	gm

Results:-

Bulk specific gravity = A / (B-C)	0.940	
Apparent specific gravity = A / (A-C)	1.000	
Asorption = (B-A)/A	6.397	%

Los Anglos abrasion AASHTO-T96

Results:-

Weight of sample before test (gm)	Weight of sample after test (gm)	Abraslon ratio (%)
5000	3426	31.48

Lab. Engineer

Name :

المعمل المركزي
شركة جمعه بدر نوح

OPERATE BY
GOMAA BADR LAB

Consultant Engineer

Name :

Sign :



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 604+000 To Station 568+177



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE	17/5/2023	code	ZONE	545+000	545+500
location	K.P545+300				
NAME COMPANY	Al-Kfah	KF-1	Material	Sub Ballast	
1-visual inspection test	operate by	Gomaa Bader Lab			

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		23914.00		gm	table classify
sieve size	3	1 1/2	1	3/4	1/2	3/8	# 4	PASS
Mass retained (g)	0.0	626.0	3599.0	3276.0	5440.0	4000.0	2650.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	626.0	4225.0	7501.0	12941.0	16941.0	19591.0	PRO
Cumulative Retained %	0.0	2.6	17.7	31.4	54.1	70.8	81.9	WC
Cumulative Passing %	100.0	97.4	82.3	68.6	45.9	29.2	18.1	CBR

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	123.14	288.14	413.97				
Cumulative Retained %	24.63	57.63	82.79				
Cumulative Passing %	75.37	42.37	17.21				

C-General gradient			3/4		1/2		# 4		# 10	# 40	# 200
sieve size(in)	3	1 1/2	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200	
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075	
Cumulative Passing %	100.0	97.4	82.3	68.6	45.9	29.2	18.1	13.6	7.7	3.1	

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P

Contractor

Consultant

المعمل центральный
شركة جمعة بدر نوح



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177

الجهاز
لطاقة والكلمات
(GARBLT)

المملكة العربية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR PLANNING

PROCTOR TEST


TESTING DATE	17/5/2023	code	ZONE	545+000	545+500
location	K.P545+300	KF-1	Material	Sub Ballast	
NAME COMPANY	Al-Kfah				

	operate by	GOMAA BADR LAB	
Weight of empty mold :	6210.0	MAX Dry Density	2.206
Mold Volume:	2104.9	Water content %	7.50

trial no :	1	2	3	4			
Wt. Of Mold+ wet soil	10545.0	10784.0	11204.0	10945			
WT. WET SOIL	4335.0	4574.0	4994.0	4735.0			
Wt. Density	2.059	2.173	2.373	2.250			

Tare No.	2	2	5	5	8	8	6	6			
Tare wt.	26.91	26.91	24.7	24.7	27.4	27.4	22.6	22.6			
Wt. Of wet soil & tare	135.37	135.37	129.28	129.28	168.41	168.41	138.29	138.29			
Wt. Of dry soil & tare	132	132	124.1	124.1	158.52	158.52	128.22	128.22			
Wt. Of water	3.4	3.4	5.2	5.2	9.9	9.9	10.1	10.1			
Wt. Of dry soil	105.1	105.1	99.4	99.4	131.1	131.1	105.6	105.6			
	3.2%	3.2%	5.2%	5.2%	7.5%	7.5%	9.5%	9.5%			
AV.Water content %	3.2%		5.2%		7.5%		9.5%				
Dry Density	1.995		2.065		2.206		2.054				

curve proctor

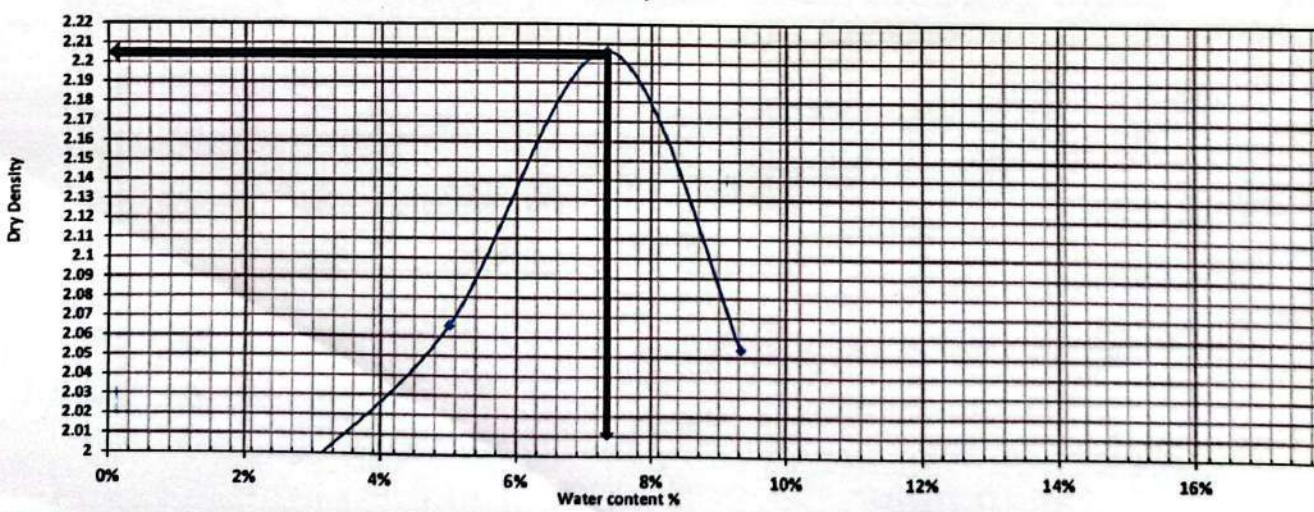

Contractor

المعمل المركزي
شركة جمهور بدرونه

Consultant



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



Absorbtion & Aggregate specific gravity
AASHTO-T85

TESTING DATE:	18/5/2023	code	ZONE	545+000	545+500
LOCATION	K.P545+300	KF-1	Material	Sub Ballast	
NAME COMPANY	Al-Kfah				

Weight of sample	2000.00	gm
Weight of saturated -dry surface sample (B)	2014.50	gm
Weight of saturated sample in water (C)	1244.30	gm
Weight of dry sample after heating (A)	1991.60	gm

Results:-

Bulk specific gravity = A / (B-C)	2.586	
Apparent specific gravity = A / (A-C)	2.665	
Asorbtion = (B-A)/A	1.150	%

Los Anglos abrasion AASHTO-T96

Results:-

Weight of sample before test (gm)	Weight of sample after test (gm)	Abrasion ratio (%)
5000	3767	24.66

Lab. Engineer

Name :

Sign :

المعمل المركزي
شركة جمدة بدر نوح

OPERATE BY
GOMAA BADR LAB


Consultant Engineer

Name :

Sign :



Electric Express Train - HSR



California Bearing Ratio TEST

TESTING DATE	18/5/2023	code	ZONE	545+000	545+500
location	K.P545+300	KF-1	Material		
NAME COMPANY	Al-Kfah		Sub Ballast		

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2177.4
Mold WT. (gm)	16444
Mold WT. + Wet WT. (gm)	21521
Wet WT. (gm)	5077
Wet Density (g/cm ³)	2.332
Dry Density (g/cm ³)	2.189
Proctor Density (g/cm ³)	2.204
Compaction %	99

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	9
Tare WT. (gm)	26.34
Tare WT. + Wet WT. (gm)	142.39
Tare WT. + Dry WT. (gm)	135.3
Wt. Of water	7.1
Dry WT. (gm)	109.0
Moisture Content %	6.5

Swelling	
Mold No.	1
Date	24/5
Initial Height (mm)	2.95
Final Height (mm)	2.97
Difference	0
Sample Height (mm)	181.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

penetration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	290.00	440.00	622.00	805.00	975.00	1175.00	1441.00	1668.00	2170.00
Load (KN)	2.8	4.3	6.1	7.9	9.6	11.5	14.1	16.3	21.3

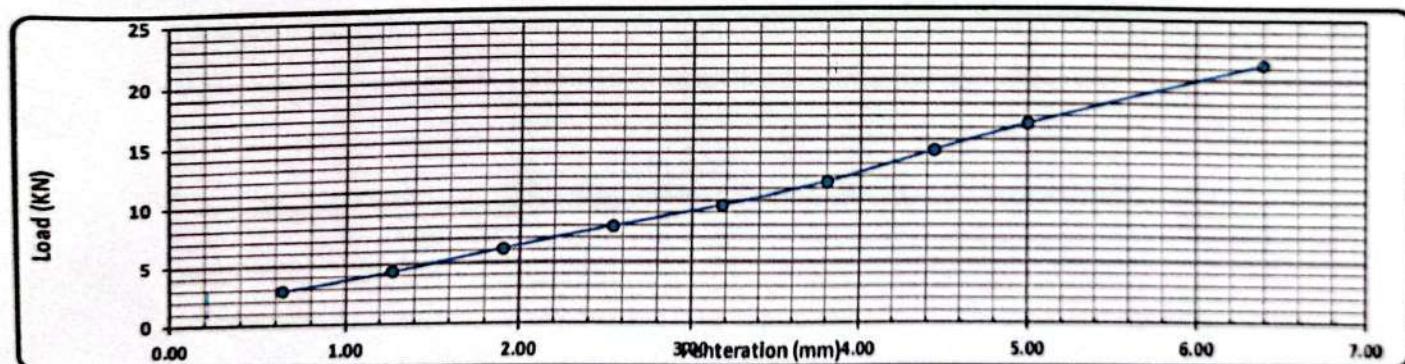

Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR % 100
2.50	7.89	13.4	59.1%			59.5%
5.00	16.35	20.0	81.6%	99	100	82.2%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

المعمل المركزي
 شركة جمعة بدر نوح



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	29/5/2023	code	ZONE MATERIAL	545+000	545+500
LOCATION	K.P(545+000)	KF-2		SUB BALLAST	
NAME COMPANY	el kefah		LAYER THICKNESS	20 CM	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		34067.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS
Mass retained (g)	0.0	1098.0	3054.0	5059.0	10818.0	1459.0	1487.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	1098.0	4152.0	9211.0	20029.0	21488.0	22975.0	PRO
Cumulative Retained %	0.0	3.2	12.2	27.0	58.8	63.1	67.4	WC
Cumulative Passing %	100.0	96.8	87.8	73.0	41.2	36.9	32.6	CBR

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm	soil classify
sieve size	10	40	200					A-1-a
Cumulative Retained (g)	117.00	253.00	410.00					2.22
Cumulative Retained %	23.40	50.60	82.00					6.2%
Cumulative Passing %	76.60	49.40	18.00					82.3%

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	96.8	87.8	73.0	41.2	36.9	32.6	24.9	16.1	5.9
REMARKS		50-97		20-75		15-60		0-35		0-7

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P



Consultant
Mohamed Ali



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sakhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177





PROCTOR TEST

TESTING DATE:	30/5/2023	code	Station	545+000	545+500
LOCATION	K.P(545+000)	KF-2	Material	SUB BALLAST	
NAME COMPANY	K.P(545+000)		layer thickness	20 CM	

Weight of empty mold :	6066.0	MAX Dry Density	2.218
Mold Volume:	2032.0	Water content %	6.2%

trial no :	1	2	3		
Wt. Of Mold+ wet soil	10583.1	10843.2	10808.7		
WT. WET SOIL	4517.1	4777.2	4742.7		
Wt. Density	2.223	2.351	2.334		

Tare No.	3	4	6	7	8	9			
Tare wt.	34.19	22.36	23.33	28.33	22.87	34.3			
Wt. Of wet soil & tare	168.8	155.6	147.32	145.33	155.21	165.7			
Wt. Of dry soil & tare	163.66	150.30	140.41	138.60	145.18	156.08			
Wt. Of water	5.1	5.3	6.9	6.7	10.0	9.6			
Wt. Of dry soil	129.5	127.9	117.1	110.3	122.3	121.8			
Water content %	4.0%	4.1%	5.9%	6.1%	8.2%	7.9%			
AV.Water content %	4.0%		6.0%		8.0%				
Dry Density	2.137		2.218		2.160				

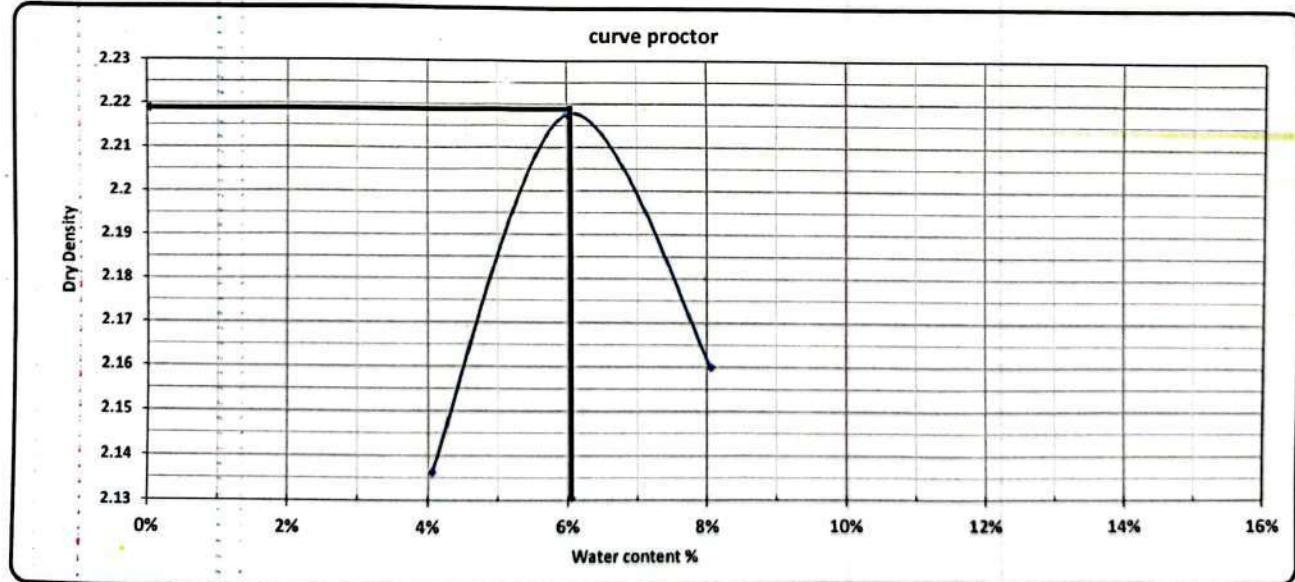

Consultant

30

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	31/5/2023	Code	FROM STA :	545+000	545+500
Location :	K.P(545+000)	KF-2	: Material	SUB BALLAST	
Layer No. :			: Layer Thickness	20 CM	

-:- Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	55
Mold Vol. (cm^3)	2151
Mold WT. (gm)	7350
Mold WT. + Wet WT. (gm)	12410
Wet WT. (gm)	5060
Wet Density (g/cm^3)	2.352
Dry Density (g/cm^3)	2.213
Proctor Density (g/cm^3)	2.218
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	5
Tare WT. (gm)	31
Tare WT. + Wet WT. (gm)	233
Tare WT. + Dry WT. (gm)	221
Water WT. (gm)	12.0
Dry WT. (gm)	190.0
Moisture Content %	6.3

Swelling	
Mold No.	4
Date	31/5/2023
Initial Height (mm)	3.30
Final Height (mm)	3.30
Difference	0
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0%

-:- Loading Reading :


Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	580.00	752.00	896.00	1050.00	1210.00	1388.00	1555.00	1698.00	1987.00
Load (KN)	5.7	7.4	8.8	10.3	11.9	13.6	15.2	16.6	19.5

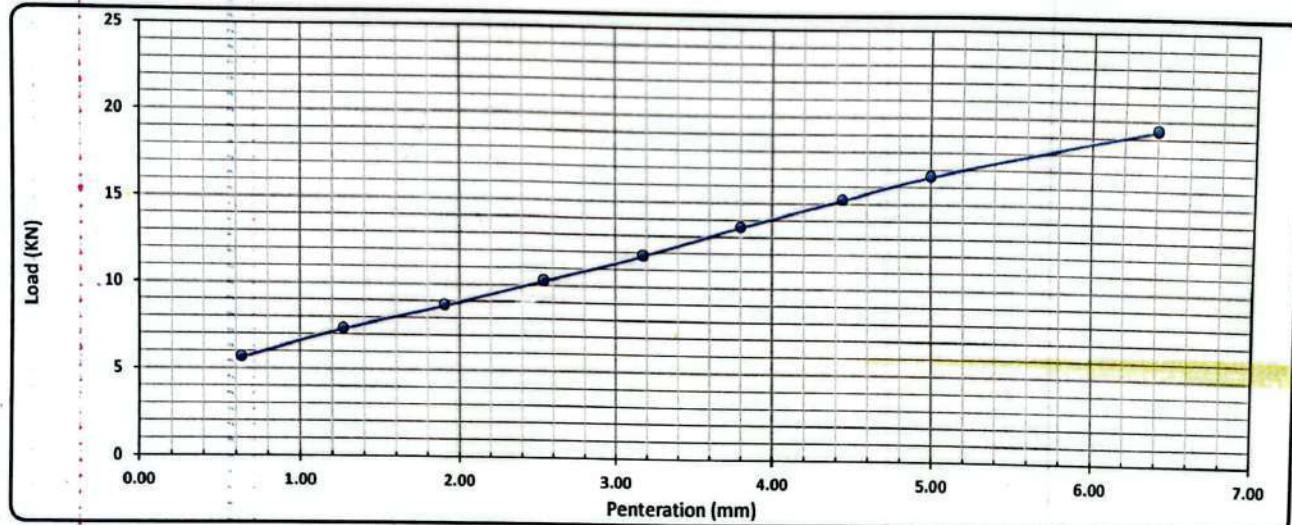
-:- Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold Compaction (%)	Compaction (%)	CBR (%)
2.50	10.29	13.4	77.1%	99	98	98
5.00	16.64	20.0	83.1%			76.3% 82.3%

Lab Specialist

Lab. Engineer



Consultant Engineer

Name: Mohammed AL

Sign:

EL Mahgoub company

Express Electric Trian project



**Absorbtion & Aggregate specific gravity
AASHTO-T85**

Testing date :-	31\5\2023
location :-	k.p(551+300)
material :-	SUB BALLAST
NAME COMPANY	EL MAHGOUB

Weight of sample	2000	gm
Weight of saturated -dry surface sample (B)	2015	gm
Weight of saturated sample in water (C)	1244	gm
Weight of dry sample after heating (A)	1987	gm

Results:-


Bulj spicific gravity = A / (B-C)	2.576	
Apparent spicific gravity = A /(A-C)	2.673	
Asorbtion = (B-A)/A	1.409	

Los Anglos abrasion AASHTO-T96

Results:-

Weight of sample before	Weight of sample before test (gm)	Abrasion ratio (%)
5000	3650	27.00

Lab Engineer/



٣٦١
٣٦٢

MATERIAL
INSPECTION
REQUEST



الهيئة القومية لإنفاق

NATIONAL AUTHORITY FOR CIVIL ENGINEERING



Contractor Company	AL-KFAH Company			Designer Company							
Contractor Reference	KF-2										
Issued by Contractor	Name	Sign	Date 1/6/2023			Time					
	Eng/Mohamed Algaafry	<i>3161225 12</i>									
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
							1	6	2023		

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2		Work Activity	
CODE - 3		Sub Element of Activity	

Description of Materials	SUB BALLAST				
Location to be Used	545+000 to 545+200 level (+0.90) 545+260 to 545+500 level (+0.90)				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement			Specification	Clause	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SEIVE ANALYSIS	M^3	2000	29/5/2023	
2	Atterberg Limits	M^3	2000	29/5/2023	
3	Proctor	M^3	2000	30/5/2023	
4	CBR	M^3	2000	31/4/2023	
5	Specific Gravity	M^3	2000	31/4/2023	
6	Los Anglos	M^3	2000	31/4/2023	
Comments by:		Comments by:			
A sample has been taken by KK Office to (Elnoby central lab)					

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng/ Mohamed Algaafry	<i>3161225 12</i>		
QA/QC*	Mohamed Ali	<i>3161225 12</i>		
GARB**				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL
APPROVAL
REQUEST



Contractor Company	EL KFAH COMPANY			Designer Company						
Contractor Reference	KF-2									
Issued by Contractor	Name	Sign		Date 1/6/2023	Time					
Received by ER	Eng/ Mohamed Algaafry	31612c23 	MAR	C1 C2 C3 DD MM YY H H MM	1	6	2023			

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2		Work Activity	
CODE - 3		Sub Element of Activity	

Description of Materials	Sub Ballast (A-1-a)		
Location to be Used	545+000 to 545+200 level (+0.90) 545+260 to 545+500 level (+0.90)		
Item	Specification	Test Req	Test result attachment
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to specification
2	ASTM D 136	Sieve Analysis	According to specification
3	ASTM D 1440	Passing Sieve No 200	5.9
4	ASTM D 4318	ATTERBERG Limit	NP
5	ASTM D 2974	W.C	6.2
6	ASTM D 1557	Proctor	2.22
7	ASTM D 1883	CBR	82.3
8	ASTM C 127	Specific Gravity	2.576
9	ASTM C 131	Los Anglos	27
Comments by:	Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng/ Mohamed Algaafry			
QA/QC *	Mohammed Ali			
GARB**				
Employers Representative				
