

دفتر حصر أعمال للمستخلص الجارى رقم (٣)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مهندس الشركة :



مهندس الهيئة



مدير الأعمال (الهيئة)



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

[illegible]

الجهة المالكة /

~~مهندس / محمد حسنين عبد الباسط~~



مهندس الشركة المنفذة

مهندس / السيد محمد السيد

~~_____~~

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

<u>رقم البند</u>	<u>نوع الأعمال والتوريدات</u>	<u>عدد</u>	<u>مقاســــــــــــات</u>				
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	إجمالي
٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم وتشغيلها						
	ماقبلـــــــــــــه						٣٣٤٥٠٧,٧٣
٢	٤+٢٥٠ حتى ٤+٧٠٠ اتجاة سفاجا					٦٤١٤,٨٣	
٤	٣+١٢٥ حتى ٣+٧٧٥ اتجاة القصير					٣٠٧٨,٥٠	
	الإجمـــالي حتى ٢٠٢٥/٢/٢٧ م					٩٤٩٣,٣٣	٣٤٤٠٠١,٠٦
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (٣)						٣٤٠٠٠٠,٠٠

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس / السيد محمد السيد



عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من

القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاســــــــــــات			مساحة المكعبات والأوزان		
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	إجمالي
٦	بالمتر المسطح اعمال طبقة تشريب من البيتومين متوسط التطاير MCO							
	ما قبل هـ							
	٢٢٥٠ + الي ٢٠٠٠ اتجاه سفاجا					٧٥٢٠,٠٠		
	الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي حتى ٢٠٢٥/٢/٢٧ م					٧٥٢٠,٠٠	٤٧٥٢٠,٠٠	
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (٣) حتي تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧							
	٤٦٠٠٠,٠٠							

مهندس الشركة المنفذة

مهندس / السيد محمد السيد

مجلس إدارة جامعة القاهرة

~~Ques~~

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من

القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

دفتر حصر اعمال


الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط



مهندس / السيد محمد السيد

[Handwritten signature]

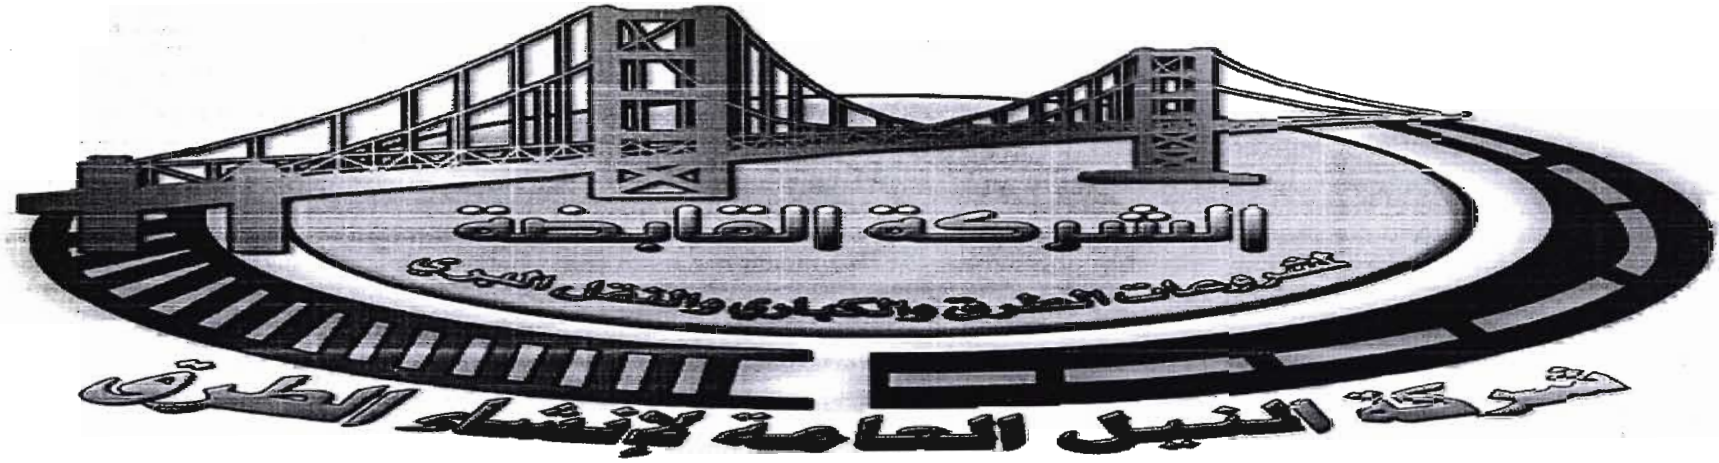

ملخص بالاختبارات المعملية عملية

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٣)



ملخص الاختبارات المعملية (للأتربة)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٣)

بيان متابعة اعمال دمك الاتربة

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) اتجاه القصير

رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	رقم الطبقة	الموقف من القبول او الرفض *	الاتجاه	ملاحظات
			من	الى					
1	جديد	٢٢ يناير ٢٠٢٤	0	200	200	فرمة	مقبول	القصير	
2	جديد	١٧ يناير ٢٠٢٤	200	400	200	فرمة	مقبول	القصير	
3	جديد	٣٠ يناير ٢٠٢٤	400	600	200	فرمة	مقبول	القصير	
4	جديد	٥ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-3.00	مقبول	القصير	
5	جديد	٦ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-2.75	مقبول	القصير	
6	جديد	٧ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-2.50	مقبول	القصير	
7	جديد	٨ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-1.75	مقبول	القصير	
8	جديد	٥ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-1.50	مقبول	القصير	
9	جديد	٦ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-1.00	مقبول	القصير	
10	جديد	٧ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.75	مقبول	القصير	
11	جديد	٨ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.50	مقبول	القصير	
12	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.25	مقبول	القصير	
13	جديد	١٢ يونيو ٢٠٢٤	600	850	250	فرمة	مقبول	القصير	
14	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	1100	1400	300	فرمة	مقبول	القصير	
15	جديد	٦ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-3.50	مقبول	القصير	
16	جديد	٧ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-3.00	مقبول	القصير	
17	جديد	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-2.50	مقبول	القصير	
18	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-2.00	مقبول	القصير	
19	جديد	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-1.50	مقبول	القصير	
20	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-1.00	مقبول	القصير	
21	جديد	١ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.75	مقبول	القصير	
22	جديد	٢ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.50	مقبول	القصير	
23	جديد	٣ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.25	مقبول	القصير	
24	جديد	٤ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	2050	650	فرمة	مقبول	القصير	
25	جديد	١٦ ديسمبر ٢٠٢٣	1650	1975	325	فرمة	مقبول	القصير	
26	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	2225	2600	375	فرمة	مقبول	القصير	
27	جديد	٥ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-6.00	مقبول	القصير	
28	جديد	٦ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.75	مقبول	القصير	
29	جديد	٧ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.50	مقبول	القصير	
30	جديد	٨ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.25	مقبول	القصير	
31	جديد	٩ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-5.00	مقبول	القصير	
32	جديد	١٠ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.75	مقبول	القصير	
33	جديد	١١ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.50	مقبول	القصير	
34	جديد	١٢ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.25	مقبول	القصير	
35	جديد	١٣ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-4.00	مقبول	القصير	
36	جديد	١٤ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.75	مقبول	القصير	
37	جديد	١٥ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.50	مقبول	القصير	
38	جديد	١٦ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.25	مقبول	القصير	
39	جديد	١٧ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.00	مقبول	القصير	
40	جديد	١٧ سبتمبر ٢٠٢٤	850	1100	250	فرمة	مقبول	القصير	
41	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	2050	2225	175	فرمة	مقبول	القصير	

مهندس الاشراف

م/ محمد حسنين

فني مواد الشركة

بيان متابعة اعمال دمك الاتربة

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) اتجاه سفاجا

رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	رقم الطبقة	الموقف * القبول أو الرفض	الاتجاه	ملاحظات
			من	الى					
1	جديد	١٥ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-7.00	مقبول	سفاجا	
2	جديد	١٦ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-6.50	مقبول	سفاجا	
3	جديد	١٧ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-6.00	مقبول	سفاجا	
4	جديد	١٨ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-5.50	مقبول	سفاجا	
5	جديد	١٩ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-5.00	مقبول	سفاجا	
6	جديد	٢٠ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-4.50	مقبول	سفاجا	
7	جديد	٢٥ مارس ٢٠٢٤	1400	1800	400	-5.00	مقبول	سفاجا	
8	جديد	٢٦ مارس ٢٠٢٤	1400	1800	400	-4.50	مقبول	سفاجا	
9	جديد	٢٧ مارس ٢٠٢٤	1400	1800	400	-4.00	مقبول	سفاجا	
10	جديد	٢٨ مارس ٢٠٢٤	1400	1800	400	-3.50	مقبول	سفاجا	
11	جديد	٤ أبريل ٢٠٢٤	1400	1800	400	-3.00	مقبول	سفاجا	
12	جديد	٥ أبريل ٢٠٢٤	1400	1800	400	-2.50	مقبول	سفاجا	
13	جديد	٦ أبريل ٢٠٢٤	1400	1800	400	-2.00	مقبول	سفاجا	
14	جديد	٨ مايو ٢٠٢٤	1400	1850	450	-1.50	مقبول	سفاجا	
15	جديد	٩ مايو ٢٠٢٤	1400	1850	450	-1.00	مقبول	سفاجا	
16	جديد	١٠ مايو ٢٠٢٤	1400	1850	450	-0.75	مقبول	سفاجا	
17	جديد	١١ مايو ٢٠٢٤	1400	1850	450	-0.50	مقبول	سفاجا	
18	جديد	٢٥ مايو ٢٠٢٤	1800	2050	250	فرمة	مقبول	سفاجا	
19	جديد	٧ يونيو ٢٠٢٤	2375	2550	175	-3.00	مقبول	سفاجا	
20	جديد	٨ يونيو ٢٠٢٤	2375	2550	175	-2.50	مقبول	سفاجا	
21	جديد	٩ يونيو ٢٠٢٤	2375	2550	175	-2.00	مقبول	سفاجا	
22	جديد	١٠ يونيو ٢٠٢٤	2375	2575	200	-1.50	مقبول	سفاجا	
23	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	2375	2575	200	-1.25	مقبول	سفاجا	
24	جديد	١٢ يونيو ٢٠٢٤	2300	2575	275	-1.00	مقبول	سفاجا	
25	جديد	١٣ يونيو ٢٠٢٤	2300	2575	275	-0.75	مقبول	سفاجا	
26	جديد	٢٠ يونيو ٢٠٢٤	2300	2575	275	-0.50	مقبول	سفاجا	
27	جديد	٢١ يونيو ٢٠٢٤	2300	2575	275	-0.25	مقبول	سفاجا	
28	جديد	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	2275	2525	250	فرمة	مقبول	سفاجا	
29	جديد	٨ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-3.00	مقبول	سفاجا	
30	جديد	٩ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-2.50	مقبول	سفاجا	
31	جديد	١٠ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-2.25	مقبول	سفاجا	
32	جديد	١١ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-2.00	مقبول	سفاجا	
33	جديد	١٢ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-1.75	مقبول	سفاجا	
34	جديد	٢٠ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-1.50	مقبول	سفاجا	
35	جديد	٢١ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-1.25	مقبول	سفاجا	
36	جديد	٢٢ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-1.00	مقبول	سفاجا	
37	جديد	٢٣ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-0.75	مقبول	سفاجا	
38	جديد	٢٤ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-0.25	مقبول	سفاجا	
39	جديد	٩ أغسطس ٢٠٢٤	2625	3075	450	-1.00	مقبول	سفاجا	
40	جديد	١٠ أغسطس ٢٠٢٤	2625	3075	450	-0.75	مقبول	سفاجا	
41	جديد	١١ أغسطس ٢٠٢٤	2625	3075	450	-0.50	مقبول	سفاجا	
42	جديد	١٢ أغسطس ٢٠٢٤	2625	3075	450	-0.25	مقبول	سفاجا	
43	جديد	٢٥ أغسطس ٢٠٢٤	2500	3075	575	فرمة	مقبول	سفاجا	

مهندس الاشراف

م/ محمد حسنين

فني مواد الشركة

رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	رقم الطبقة	* الموقف من القبول أو الرفض	الاتجاه	ملاحظات
			من	الى					
44	جديد	١ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4700	200	-7.00	مقبول	سفاجا	
45	جديد	٢ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4700	200	-6.50	مقبول	سفاجا	
46		٣ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4700	200	-6.25	مقبول	سفاجا	
47	جديد	٤ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4725	225	-6.00	مقبول	سفاجا	
48	جديد	٥ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4725	225	-5.75	مقبول	سفاجا	
49	جديد	٦ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4725	225	-5.50	مقبول	سفاجا	
50	جديد	٧ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4725	225	-5.25	مقبول	سفاجا	
51	جديد	٨ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4750	250	-5.00	مقبول	سفاجا	
52	جديد	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4750	250	-4.75	مقبول	سفاجا	
53	جديد	١٠ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4750	250	-4.50	مقبول	سفاجا	
54	جديد	١١ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4750	250	-4.25	مقبول	سفاجا	
55	جديد	١٢ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4750	250	-4.00	مقبول	سفاجا	
56	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	4475	4750	275	-3.75	مقبول	سفاجا	
57	جديد	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤	4475	4750	275	-3.50	مقبول	سفاجا	
58	جديد	٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤	4475	4850	375	-3.25	مقبول	سفاجا	
59	جديد	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤	4450	4875	425	-3.00	مقبول	سفاجا	
60	جديد	٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤	250	475	225	-4.50	مقبول	سفاجا	
61	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	250	475	225	-4.00	مقبول	سفاجا	
62	جديد	١ أكتوبر ٢٠٢٤	250	475	225	-3.50	مقبول	سفاجا	
63	جديد	٢ أكتوبر ٢٠٢٤	250	475	225	-3.00	مقبول	سفاجا	
64	جديد	٣ أكتوبر ٢٠٢٤	250	475	225	-2.50	مقبول	سفاجا	
65	جديد	٤ أكتوبر ٢٠٢٤	250	475	225	-2.00	مقبول	سفاجا	
66	جديد	٥ أكتوبر ٢٠٢٤	225	475	250	-1.50	مقبول	سفاجا	
67	جديد	٩ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-7.00	مقبول	سفاجا	
68	جديد	١٠ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-6.00	مقبول	سفاجا	
69	جديد	١١ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-5.00	مقبول	سفاجا	
70	جديد	١٢ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-4.50	مقبول	سفاجا	
71	جديد	١٣ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-4.00	مقبول	سفاجا	
72	جديد	١٤ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-3.50	مقبول	سفاجا	
73	جديد	١٥ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-3.00	مقبول	سفاجا	
74	جديد	١٦ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-2.50	مقبول	سفاجا	
75	جديد	١٧ يناير ٢٠٢٤	1200	1375	175	-2.00	مقبول	سفاجا	
76	جديد	١٨ يناير ٢٠٢٤	1200	1400	200	-1.50	مقبول	سفاجا	
77	جديد	٨ أكتوبر ٢٠٢٤	2050	2275	225	فرمة	مقبول	سفاجا	
78	جديد	٩ أكتوبر ٢٠٢٤	900	1150	250	فرمة	مقبول	سفاجا	
79	جديد	١٠ أكتوبر ٢٠٢٤	500	900	400	فرمة	مقبول	سفاجا	
80	جديد	١١ أكتوبر ٢٠٢٤	0	225	225	فرمة	مقبول	سفاجا	
81	جديد	١٢ أكتوبر ٢٠٢٤	225	500	275	فرمة	مقبول	سفاجا	
82	جديد	١٣ أكتوبر ٢٠٢٤	1150	1800	650	فرمة	مقبول	سفاجا	

فني مواد الشركة

مهندس الاشراف

م/ محمد حسنين





ملخص الاختبارات المعملية (MCO)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) جارى (٣)

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)



المقاول شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال رصف (طبقة MC-30)



التجارب		الاتجاه	الموقع الكيلو متر	
المعدل gm/m2	الحالة		الى	من
1517	مطابق	سفاجا	1050	225
1520	مطابق	سفاجا	1550	1125
1519	مطابق	سفاجا	2000	1650

مهندس الهيئة

مهندس / محمد حسانين

توقيع /

مهندس الشركة المنفذة

مهندس / السيد محمد السيد

توقيع /

فني مواد الشركة

أ / أسامة حمدي ونيس

توقيع /





ملخص الاختبارات المعملية (الطبقة الرابطة)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٣)

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلى سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات فى المسافة من
القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

CONTRACTOR :



شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال رصف (الطبقة الرابطة)

متسلسل	تاريخ اخذ العينة	المحطة	الحالة	التدرج									المواصفات				
		كم		الثبات	الاسياح	الجبس	1	3/4	3/8	4	8	30		50	100	200	نسبة البيتومين %
					لا يقل عن ٧٠٠	2-4mm	200-500	100	91.4-100	59-69	42.8-50.8	31.3-35	12.3-18.3	5.5-11.5	3.3-6.3	2.2-5.2	4.5% + .25%
1	30/01/2025	R 1+000		869.4		2.8	310.5	100	97.3	65.8	44.2	34.8	16.6	8.8	4.2	2.5	4.45
2	09/02/2025	L 1+200		895.5		2.67	335.80	100	95.3	63.2	48.2	33.2	14.2	8.4	4.1	3.2	4.48
3	15/02/2025	L 1+450		898.2		2.56	325.24	100	93.1	67.8	44.9	33.7	17.2	9.3	3.7	2.3	4.44
4	17/02/2025	L 1+650		893.2		2.9	315.50	100	94.5	62.9	47.2	32.1	16.1	8.6	4.6	3.5	4.46
5	20/02/2025	R1+800		934.7		2.8	344.21	100	93.9	65	44	31.8	14.6	7.6	3.3	2.8	4.39

مهندس الهيئة

م/محمد حساني

مهندس الشركة المنفذة

م / السيد محمد السيد

فني مواد الشركة

أ/ أسامة حمدي رئيس

