

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (٤) ختامي اتجاه النوبارية
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والسمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التضمينية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة بالمتر المكعب.

رقم البند وبيانه: (١)

-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
-السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
-والبند لايشمل القيمة المحجورة.

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

٥٧٧٨,٣٦٤٤

مقدار العمل السابق

٥٧٧٨,٣٦٤٤٠

الكمية بالقايمة

الاجمالى م٢م	م٢م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايمة
		الى	من	
٥٧٧٨,٣٦٤٤	٨٢٧,٨٤	٢٩٥+١٦٠	٢٩٥+١٦٠	أعمال الردم
	٢٤٦٢,٥٨	٢٩٥+٦٦٠	٢٩٥+٢٠٠	
	١٩٦٥,٥٤	٢٩٥+٨٠٠	٢٩٥+٧٢٠	
	٨٠٢,٩٦	٢٩٦+٢٨٠	٢٩٦+٣٠٠	
٥٧٧٨,٣٦٤٤	اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			
٥٧٧٨,٣٦٤٤	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٥٧٧٨,٣٦٤٤٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

يعتمد
عن الهيئة

عن الاستشارى

KK

XVZ

عن الشركة

٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢٠

٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢٠

٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢٠

٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢٠



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر
بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري اتجاه الدورية
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أربة مطابقة للمواصفات ونشغليها باستخدام الآت التوسية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2-متر) أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية ولقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة بالمر المكعب.

- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او التقصان.
- السعر يشمل عمل تشويبات وتخطيط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
- والبند لايشمل القيمة المحجوبة.

رقم البند وبيانه: (١)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

٥٨٧٧

مقدار العمل السابق

٢٠٠٠,٠٠٠

الكمية بالقياسية

الاجمالي ٢م	٢م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	من	
٥٧٧٨,٣٦٤٤	٨٧٧,٨٤	٢٩٥+١٦٠	٢٩٥+٠٦٠	أعمال الردم
	٢٤٦٢,٥٨	٢٩٥+٦٦٠	٢٩٥+٣٠٠	
	١٩٦٥,٥٤	٢٩٥+٨٠٠	٢٩٥+٧٢٠	
	٨٠٢,٩٦	٢٩٦+٢٨٠	٢٩٦+٣٠٠	
٥٧٧٨,٣٦٤٤	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٥٨٧٧	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
٩٨,٦٣٥٦٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٥٧٧٨,٣٦٤٤٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

بمقتضى

عن الهيئة

عن الاستشاري

KK

في حادير

شركة



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الميناء الجديدة - مطار جده)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية
أعمال الاحلال الكلي



EXECUTIVE CONSULTING OFFICE OF CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري التنفيذي للمكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد فهد
أ.د. خالد فهد

الهيئة القومية للإسناد



بند رقم (2) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك سالخ

Station	قيمتة الاحلال الكبيه (م)	العرض (م) (تحت)	العرض (م) (فوق)	متوسط العرض (م)	اجمالي ردم الاحلال (م3)	ملسوب الطبقة	اجمالي الردم المنقلد الدويرية	اجمالي الردم سفنكس (م3)	اجمالي الردم سفنكس جاري 2	اجمالي الردم وادى النطرون	اجمالي الردم الاقليمي	اجمالي الردم المتبقي
2551000	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52	-2.00						0.00
2551020	0.8	32.47	29.47	30.97	495.52						495.52	0.00
2551040	0.8	33.97	30.97	32.47	519.52	-3.50		233.78		194.82	90.92	0.00
2551060	0.8	33.97	30.97	32.47	519.52			142.87		376.65	0.00	0.00
2551080	0.8	32.47	30.97	31.72	507.52	-3.00		207.45		300.07	0.00	0.00
2551100	0.8	33.97	30.97	32.47	519.52			148.06		371.46	0.00	0.00
2551120	0.8	33.97	30.97	32.47	519.52			31.82		487.70	0.00	0.00
2551140	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551160	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551180	0.8	35.43	32.47	33.95	543.18					543.18	0.00	0.00
2551200	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551220	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551240	0.8	35.43	32.47	33.95	543.18					543.18	0.00	0.00
2551260	0.8	35.43	32.47	33.95	543.18					543.18	0.00	0.00
2551280	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551300	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52	(-3.5)				531.52	0.00	0.00
2551320	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551340	0.8	35.43	32.47	33.95	543.18					543.18	0.00	0.00
2551360	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551380	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551400	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551420	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551440	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551460	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551480	0.8	33.97	30.97	32.47	519.52			38.96		481.85	-1.30	0.00
2551500	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551520	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551540	0.8	33.97	30.97	32.47	519.52			122.74		396.78	0.00	0.00
2551560	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52	(-3.5)		168.84		358.78	3.90	0.00
2551580	0.8	35.43	33.97	34.70	555.18	(-4.5)				555.18	0.00	0.00
2551600	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551620	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551640	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52	(-4)				531.52	0.00	0.00
2551660	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551680	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551700	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551720	0.8	35.43	32.47	33.95	543.18	-4.50				543.18	0.00	0.00
2551740	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551760	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551780	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551800	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551820	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551840	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551860	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551880	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551900	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551920	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551940	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551960	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2551980	0.8	33.97	32.47	33.22	531.52					531.52	0.00	0.00
2552000	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52						483.52	0.00
2552020	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52						483.52	0.00
2552040	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52						483.52	0.00
2552060	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52						483.52	0.00
2552080	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52						483.52	0.00
2552100	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552120	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552140	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552160	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552180	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552200	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552220	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552240	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552260	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552280	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552300	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552320	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552340	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552360	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552380	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552400	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552420	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552440	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552460	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552480	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552500	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552520	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552540	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552560	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552580	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552600	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552620	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552640	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552660	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552680	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552700	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.00	0.00
2552720	0.8	30.97	29.47	30.22	483.52				483.52		0.0	

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر وزارة النقل بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامى عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع اتجاه التوجيه	بالمر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراشات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (لمسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم حساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان.	رقم البند وبيانه: (٣)																																													
تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية	الكمية بالقياسة ٢٧٥٤٧,٣٨٣ مقدار العمل السابق ٢٧٥٤٧,٣٨	بيان الأعمال بالمقاييس <table border="1"> <thead> <tr> <th>الموقع الكيلو مترى</th> <th>من</th> <th>الى</th> <th>٣م</th> <th>الاجمالى ٣م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٢٩٦+٠٨٠</td> <td>٢٩٦+٣٠٠</td> <td>٥٥٢٦,٩</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>٢٩٦+٣٠٠</td> <td>٢٩٦+٥٠٠</td> <td>٩٤٣٧,١٥٦</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>٢٩٥+٨٠٠</td> <td>٢٩٥+٩٦٠</td> <td>٦٣١٧,٦٢٧</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>٢٩٦+٩٢٠</td> <td>٢٩٧+٢٦٠</td> <td>٦٢٦٥,٧</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه</td> <td></td> <td></td> <td>٢٧٥٤٧,٣٨٣</td> <td></td> </tr> <tr> <td>اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق</td> <td></td> <td></td> <td>٢٧٥٤٧,٣٨٣</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة</td> <td></td> <td></td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى</td> <td></td> <td></td> <td>٢٧٥٤٧,٣٨٣</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الموقع الكيلو مترى	من	الى	٣م	الاجمالى ٣م	٢٩٦+٠٨٠	٢٩٦+٣٠٠	٥٥٢٦,٩			٢٩٦+٣٠٠	٢٩٦+٥٠٠	٩٤٣٧,١٥٦			٢٩٥+٨٠٠	٢٩٥+٩٦٠	٦٣١٧,٦٢٧			٢٩٦+٩٢٠	٢٩٧+٢٦٠	٦٢٦٥,٧			اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٢٧٥٤٧,٣٨٣		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٢٧٥٤٧,٣٨٣		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			.		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٢٧٥٤٧,٣٨٣	
الموقع الكيلو مترى	من	الى	٣م	الاجمالى ٣م																																											
٢٩٦+٠٨٠	٢٩٦+٣٠٠	٥٥٢٦,٩																																													
٢٩٦+٣٠٠	٢٩٦+٥٠٠	٩٤٣٧,١٥٦																																													
٢٩٥+٨٠٠	٢٩٥+٩٦٠	٦٣١٧,٦٢٧																																													
٢٩٦+٩٢٠	٢٩٧+٢٦٠	٦٢٦٥,٧																																													
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٢٧٥٤٧,٣٨٣																																												
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٢٧٥٤٧,٣٨٣																																												
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			.																																												
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٢٧٥٤٧,٣٨٣																																												
عن الشركة عن الاستشارى عن الهيئة يعتمد،،،،،	عن الشركة عن الاستشارى عن الهيئة يعتمد،،،،،	عن الشركة عن الاستشارى عن الهيئة يعتمد،،،،،																																													



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (٣) جاري اتجاه التورارية
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع أنواع التربة عمدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة (مسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
يتم حساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة والتقصان .

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

الكمية بالقياسة ٢٠٠٠٠,٠٠٠ مقدار العمل السابق ١٤٥١٥,٠٠

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م ^٣
	من	الى	
أعمال الحفر	٢٩٦+٠٨٠	٥٥٢٦,٩	٢٧٥٤٧,٣٨٣
	٢٩٦+٣٠٠	٩٤٣٧,١٥٦	
	٢٩٥+٨٠٠	٦٣١٧,٦٢٧	
	٢٩٦+٩٢٠	٦٢٦٥,٧	
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٢٧٥٤٧,٣٨٣
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			١٤٥١٥
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٣٠٣٢,٣٨٣
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٢٧٥٤٧,٣٨٣

يعتمد

عن الهيئة

عن الاستشارى

KK
م. ح. ح. ح.

عن الشركة
م. ح. ح. ح.



مشروع التطوير الكهربائي السريع

استكمال إنشاء أعمال الجسر القرائي والأعمال المدنية، بقطاع مشروع إنشاء التطوير الكهربائي السريع (المرحلة - الخامسة النهائية - فاسين الجديدة - مطروح)

تأليف شركة التصميم للتقنيات المعمارية
للمصمم المهندس



From	To	المساحة (م ²)	كمية الحفر (م ³)	كمية التطوير (م ³)	الكمية التي تم تطويرها (م ³)	الكمية التي لم يتم تطويرها (م ³)	الكمية المتبقية التي لم يتم تطويرها (م ³)	المستخلصات (م ³)	كمية حصى	اجمالي النقل	ملاحظات
295+000	295+100	5786	4672	1735.8	682.12	1053.68	0	3618.32			تجاه ولاي التطوير ٣ ختم
295+100	295+800	37433.76	31888.14	11230.128	2261.96	6000	0	25886.14			تجاه سلكين ختم
296+480	296+900	22856	23371.66	6856.8	1851.91	5004.89	0	18366.77			تجاه اثنين جاري ١
296+080	296+300	10800	8640	3240	125.9	3113.1	0	5526.9		5526.9	
296+300	296+500	8278.18	11716	2483.454	204.61	2278.844	0	9437.156		9437.156	
295+800	295+960	8250.01	8020.45	2475.003	772.18	1702.823	0	6317.627		6317.627	تجاه الترابية ختم
296+920	297+260	19864.61	12536	5959.383	2451.4	3508	0	9028		6861	
297+260	297+500	11811		3543.3	781	2762.3	0	-2762.3		-2762.3	
الاجمالي										25380.38	
										75420.613	

مهندس الاستشاري /

XYZ

KK

مهندس الشركة المتقنة /

مهندس

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامي اتجاه النوبارية
عملية: أعمال الجسر البراني والأعمال الصمائية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدنا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للمشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل حتى ٥٠ م على أن يتم صرف علاوة ٢٥ قرش للكم الزيادة.

رقم البند وبيانه: (٧)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

١٠٦٢٠,٠

مقدار العمل السابق

١٠٦٢٠,٠

الكمية بالقايمة

بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى		أعمال التطهير
	الى	من	
الاجمالى م٢	٢ م		
١٠٦٢٠,٠	١٠٦٢٠,٠		
١٠٦٢٠,٠	٢٩٧+٥٠٠		٢٩٧+٣٢٠
١٠٦٢٠,٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
١٠٦٢٠,٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٠,٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
١٠٦٢٠,٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

يعتمد

عن الهيئة

أ. د. عبد الحليم

عن الاستشاري

م. ع. ح. م.

٧٧٢

عن الشركة

أ. د. عبد الحليم



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (٣) جاري اتجاه النوبارية
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدنا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تهيئاً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للمشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل حتى ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٢٥ قرش للكم الزيادة.

رقم البند وبيانه: (٧)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

الكمية بالقائمة ١٢٠٠٠٠,٠٠ مقدار العمل السابق ١٠٣٠١

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو متري		أعمال التطهير
	من	إلى	
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٢٩٧+٣٢٠	٢٩٧+٥٠٠	١٠٦٢٠
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			١٠٦٢٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٣١٩
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			١٠٦٢٠

يعتمد على

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

KK
٣٠
١٠٣٠١

١٠٣٠١

١٠٣٠١

١٠٣٠١

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامي اتجاه التوبرية
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لارتفاع ٣ % ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا أو مواد طقلية أو بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب الأرضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة أسفل الهراسات علي أن لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدار ٨ KN طبقا لما هو وارد بالموصفات الخاصة بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا

رقم البند وبيانه: (١٣)

- وصول الصنائه الممتازة.
- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجربة

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

٦١١٠,٠٠

مقدار العمل السابق

٦٤٢٠,٢٤٨٣٨

الكمية بالقياسية

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالى ٣م
	من	الى		
أعمال سن الفلتر	٢٩٦+٣٠٠	٢٩٦+٤٨٠	٢١٤٤,٥٥	٦٤٢٠,٢٤٨٣٨
أعمال سن الفلتر	٢٩٦+٥٢٠	٢٩٦+٨٠٠	٤٢٧٥,٦٩٨٣٨	٦٤٢٠,٢٤٨٣٨
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

يعتمد

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة

١٤٤٣/١٢/١٥
١٤٤٣/١٢/١٥

١٤٤٣/١٢/١٥


١٤٤٣/١٢/١٥

١٤٤٣/١٢/١٥

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري اتجاه التوابرية عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع	رقم البند وبيانه: (١٣) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولاحتوي علي اي المواد الناعمة او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت التمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب المياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدلك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة أسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد الا حجار E٧٢/٤٧١ عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالموصفات الخاصه بالعملية علي كل السطح العلوي قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة E٧٢/٤٧١ عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالموصفات الخاصه بالعملية علي كل السطح العلوي - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرة - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - مسافة النقل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. - ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.	تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية الكمية بالتقاييس ٣٠٠,٠٠٠ مقدار العمل السابق ٥٧٧٧,٠٠٠	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="847 159 922 421">بيان الأعمال بالمقاييس</th> <th data-bbox="847 421 922 786">الموقع الكيلو مترى</th> <th data-bbox="847 786 922 1167">٣م</th> <th data-bbox="847 1167 922 1397">الإجمالي ٣م</th> </tr> <tr> <td data-bbox="922 159 975 421">أعمال سن الفلتر</td> <td data-bbox="922 421 975 786">من ٢٩٦+٤٨٠</td> <td data-bbox="922 786 975 1167">٢١٤٤,٥٥</td> <td data-bbox="922 1167 975 1397">٦٤٢٠,٢٤٨٣٨</td> </tr> <tr> <td data-bbox="975 159 1027 421">أعمال سن الفلتر</td> <td data-bbox="975 421 1027 786">٢٩٦+٥٢٠</td> <td data-bbox="975 786 1027 1167">٤٢٧٥,٦٩٨٣٨</td> <td data-bbox="975 1167 1027 1397">٦٤٢٠,٢٤٨٣٨</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1027 159 1080 421">اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه</td> <td data-bbox="1027 421 1080 786"></td> <td data-bbox="1027 786 1080 1167"></td> <td data-bbox="1027 1167 1080 1397">٥٧٧٧</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1080 159 1133 421">الكمية المدرجة بالمستخلص السابق</td> <td data-bbox="1080 421 1133 786"></td> <td data-bbox="1080 786 1133 1167"></td> <td data-bbox="1080 1167 1133 1397">٣٣٢,٠٠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1133 159 1185 421">الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة</td> <td data-bbox="1133 421 1185 786"></td> <td data-bbox="1133 786 1185 1167"></td> <td data-bbox="1133 1167 1185 1397">٦١١,٠٠</td> </tr> </table>	بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	٣م	الإجمالي ٣م	أعمال سن الفلتر	من ٢٩٦+٤٨٠	٢١٤٤,٥٥	٦٤٢٠,٢٤٨٣٨	أعمال سن الفلتر	٢٩٦+٥٢٠	٤٢٧٥,٦٩٨٣٨	٦٤٢٠,٢٤٨٣٨	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٥٧٧٧	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٣٣٢,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٦١١,٠٠	عن الشركة عن الاستشارى عن الهيئة يعتمد
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	٣م	الإجمالي ٣م																									
أعمال سن الفلتر	من ٢٩٦+٤٨٠	٢١٤٤,٥٥	٦٤٢٠,٢٤٨٣٨																									
أعمال سن الفلتر	٢٩٦+٥٢٠	٤٢٧٥,٦٩٨٣٨	٦٤٢٠,٢٤٨٣٨																									
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٥٧٧٧																									
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٣٣٢,٠٠																									
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٦١١,٠٠																									



إمتلاك إسنه أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء الطريق الكورنيش السريع (الممنعة - العاصمة الإدارية - العين الجديدة - مطروح)



بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورم سن ١ وسن ٢ مكرج ناتج كميات بنسبة ١:١ بنسبة المتصاص لارتيد عن ٣ %..... الخ

اجمالي حصر السن						
المتبقى	اجمالي الماده المحجورة بالدرجة	الاجمالي الهندي بالمتفرقات	الاجمالي		الماده المحجورة لاجمالي المتفرقات	اجمالي الماده المحجورة
			الماده المحجورة	الهندي		
0.00000	45105.38	32081.66	45105.38	32081.66	8550.38	45105.38
					16500.00	
					11805.00	
					8250.00	
						اجمالي التوزيعه (2+1 + ختامي)
						6420.24838
						10876.67162
						8116.15
						6668.59

عن الاستشاري

عبد المطلب

KK

 xyz

	الهيئة القومية للإنفاق  المكتب الاستشاري الهندسي ل.د. خالد فتوح	استكمال إمداد أعمال الجسر الترابي والأصل الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المصنعة - العاصمة الإدارية - العدين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية	
---	--	--	---

بالمعتر المكعب توريد وتنفيذ ورلم سن ١ وسن ٢ مخرج نتائج كسرات بنسبة ١:٠١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٢ % الخ

إجمالي حصر السن

المبني	إجمالي المدة المحجورة بالمتكاسات	المخرج الإجمالي الهندسي	الإجمالي		المدة المحجورة	لجميع المتكاسات	إجمالي المدة المحجورة	الهندسي	مستخلص
			المدة المحجورة	الهندسي					
464.32838	45105.38	31617.33162	45105.38	32081.66	8550.38	16500.00	45105.38	5955.92	اتجاه التوزيع (٢+١)
					11805.00			10876.67162	اتجاه السدات الختلى
					8250.00			8116.15	اتجاه العالمين
								6668.59	اتجاه الضبعة

عن الاستشاري

KK

X Y Z

Handwritten signature

Handwritten signature



الهيئة القومية للإسكان
مجلس إدارة الإسكان والبنية التحتية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري اتجاه النوبارية
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

رقم البند وبيانه: (١٤)
- ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / ٢م
وتعليمات المهندس المشرف.
الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى طبقا لأصول


تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

الكمية بالقياسة	مقدار العمل السابق	٢م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
			من	الى	
٢٢١٠٣,٦٥	٣٥٠٢	٣٦١١,١٣	٢٩٦٦,٤٢٠	٢٩٦٦,٣٠٠	أعمال الجيوتكستائل
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

عن الهيئة
يعتمد


عن الاستشارى
KK



عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصخرية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية
مستخلص (١) جاري اتجه التوحيدي



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
إ.د. خالد قنديل



بند رقم (١٤) بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعي جيو تكتسائل التداخل لا يقل عن ١٠% الخ

From	to	length (m)	average width	Area (m2)
296+300	296+420	122.5	29.48	3611.13

الهيئة العامة
للطرق و النقل و البنية التحتية
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



الهيئة القومية للاتفاق

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مقايضة ختامية	
اسم العملية	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) اتجاه النوبارية
الشركة المنفذة	شركة الحسام للمقاولات العمومية
قيمة العملية طبقا للعقد	٥,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.
عقد العملية	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦١٦
مدته المشروع طبقا للتعاقد	٨ أشهر
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/١١/٠٨
تاريخ النهو طبقا لنهاية العقد	٢٠٢٣/٠٧/٠٧
قيمة المقايضة الختامية	٥,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.
قيمة الزيادة عن العقد الاصلي	صفر جنية
قيمة النقصان عن العقد الاصلي	٠ ج.م.
نسبة الزيادة عن العقد الاصلي	%٠
نسبة النقصان عن العقد الاصلي	%٠

مدير المشروع

Handwritten signature of the Project Manager.

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

Handwritten signature of the Central Administration Head.

(مقاييس ختامية للأعمال)				
استكمال أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع				
(وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية) بقطاع غرب النيل وقطاع				
في المسافة من ٢٩٥٠٠٠ إلى المسافة ٢٩٧٠٠٠ بطول ٢,٥ كم				
عقد رقم (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) (اتجاه التواريخ)				
رقم الهند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	المساحة (متر مربع)
	أعمال تحميل وتوريد ونقل اربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك ليزيد من ٥ سم حتى مسسوب (2 متر) اسفل مسسوب القرمه و بسبك ليزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسسوب (2 متر) من مسسوب القرمه لاستكمال المسسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكشاف (على الانقل نسبة تحميل كالبوريتا من ٢٠% والارض الطبيه متفرد ورشها بالماء الاصطناعي للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القوي ككافه جافه (٩٥ % من الكافه الجافه الضروي) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميميه والطعامات المرفقيه النموذجيه والرسومات التفصيليه الممتدة والبريد يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفقه شامله بالدمك المشرف.	٢م		
	مساحه النقل حتى ٢ كم .	٥٧	٥٧٧٨,٣٦٤	٢٩٩٣٦,٧٧٠
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مساحه النقل الممتدة ٩٨ - ٩٦ كم) (مبخر المصريه)	١٢٤	٤٢٨٥,٠٠٠	٥٧٥٠,٤٠٠
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مساحه النقل الممتدة ١١٦ - ١١٤ كم) (مبخر الممتدة)	١٦٠	١٤٩٢,٣٦٤	٢٣٨٢٠,٥٥٨
	رسم المواد المحجيره طبقا لبيود المدف (مبخر المصريه) (1.3*1.12*33) طبقا للمواضحه	٤٨,٠٥	١٦٤,٣٦٤	٧٨٩٧,٣٨٠
	رسم المواد المحجيره طبقا لبيود المدف (مبخر المصريه) (1.3*1.12*35) طبقا للمواضحه	٥,٩٦	٤,٢٢,٠٠٠	٢,٤٩٦,١٢٠
	رسم المواد المحجيره طبقا لبيود المدف (مبخر الممتدة) (1.3*1.12*34) طبقا للمواضحه	٤٩,٥٠	١٥٩٢,٠٠٠	٧٨٨١,٣٨٠
	رسم الكريكات والموازين طبقا للمادة (٣٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء باللائحه الموحدة لاسمار الطرق.	١٣	٥٧٧٨,٣٦٤	٧٥١١٨,٧٧٢
	بالمر المكسب اعمال حفر باستخدام (البليدوز) وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال (لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بآلات التسوية والرش بالماء الاصطناعي للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القوي ككافه جافه (٩٥ % من الكافه الجافه الضروي) ومحمل على هيد تحميل ونقل الاكثريه الزائده لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميميه والطعامات المرفقيه النموذجيه والرسومات التفصيليه الممتدة والبريد يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨,٠ جنيه لكل ١ كم في حالة الزيادة او النقصان.	٢م		
	مساحه النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢,٠١	٢٧٥٢,٣٨٠	٥٥٣٧,٢٣٨
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مساحه النقل الممتدة ١٠ - ٩,٥ كم)	٩,٥	٢٥٢٨,٣٨٠	٢٤١١٢,٦٠٠
	بالمر المسطح اعمال تطوير الموقع من الانجاز والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيه الزراعية الكثيفه بسط حتى ٢٠ م والنقصان منها بالمقابل العموميه لمهيدا لمهيدا لاسمال الرافع المساسي لكامل حدودالمشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل حتى ٥٠٠ م على أن يتصرف علاوة ٢٥,٠ قرش لكل الزيادة.	٢م		
	مساحه نقل حتى ٥٠٠ م	٥,٠٠٠	١٠,٦٢٠,٠٠	٥٣١٠,٠٠٠
	علاوة ٢٥,٠ جنيه لكل ١ كم (مساحه النقل الممتدة ١٠ - ٩,٥٥ كم) .	٢,٣٧٥	١٠,٦٢٠,٠٠	٢٥٢٢٢,٥٠٠
	بالمر المكسب توريد وتنفيذ وزم سن ١ وسن ٢ متفرج نتائج كسرات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص ليزيد عن ٣ % ولاحتوي على اي المواد الناعمه او البودره (ماده من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بهت التمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس اجناس عن ٣٠ % يتم تنفيذها كطيفه تاسيس بالاسار اسفل سطح المياه بمعم ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا مسسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطيفه بهرس زنه ٢٥ طن حتى الثبات للطيفه اسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاجازات واعتماد التجارب المسمليه عليها والبريد يشمل اجراء التجارب المسمليه والمطليه (اختيار الواح التحميل قطر ٢٠ سم) على ان لا يزيد نسبة E2/E1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالمسمليه على كل السطح العلوي ونهيو العمل طبقا لاصول الصناعه المتعاره.	٢م		
	مساحه النقل لاقل من ٢٠ كم .	١٠,٥٠٠	١٤٢,٠٢٤٤	١٤٦١٢,٠٨٠
	مساحه نقل حتى ٢٠ كم .	١٣,٩٢٠	١٤٢,٠٢٤٤	١٩٩٦٩,٥٧
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مساحه النقل الممتدة ١٣٦ - ١١٦٠ كم) .	١٦٨,٠٠٠	٨٥٥,٣٨٠	١٤٣٦٢,٣٨٤
	رسم المواد المحجيره طبقا لبيود المدف (كسرات المصريه) (1.12*1.50) طبقا للمواضحه .	٢٥,٠٠٠	١٤٢,٠٢٤٤	٣٥٠٠,٣٢١
	رسم الكريكات والموازين طبقا للمادة (٣٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء باللائحه الموحدة لاسمار الطرق.			
	بالمر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكس تايل التناخل لا يقل عن ١٠٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه الممتدة والبريد يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م		
	لغت وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / ٢م -	٤٢,٠٠٠	٣٦١١,١٣	١٥١٦٧,٤٦
	اجمالي المقاييس الختامية			٥٧٠٠٠٠٠,٠

عن الشركة المنفذه
عن الاستشاري
عن الهيئه

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع بخصوص : المستخلص الختامي لمشروع إنشاء الجسر الترابى والاعمال الصناعيه بقطاعات مشروع
انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع وادي النظرون / برج
العرب / الاسكندريه في المسافه من كم ٢٩٥+٠٠٠ الى كم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه النوباريه .

عقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٦١٦) بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ .

الشركة المنفذة :- الحسام للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية صورة من محاضر مراجعة البونات الخاصة بالمواد المحجريه للمشروع و ذلك بعد
ان تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.

حيث كانت الكميات المحجريه المورد بالمتر المكعب للعملية عاليه وذلك من تاريخ

٢٠٢٢ / ١١ / ٨ وحتى تاريخ نهو العملية وبياناتها كالاتي

اجمالى كميات سن الفلتر : ٢٤٨٣٨, ٢٤٢٠ م٣

اجمالى كميات الاتربة : ٣٦٤٤, ٥٧٧٨ م٣

برجاء التكرم بالإحاطة و التوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام .

عن الشركة	عن الاستشاري	عن الهيئة
م/احسام ماهر	مدير المكتب الفني	مدير المشروع
م / محمد طارق	م / احمد السعيد	م / احمد الشاعر
م / احمد السعيد	م / رشاد مرسى	م / احمد أبو دقيقة

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر - (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

نموذج رقم ٢

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

القيد: ... / ... / ٢٠٢٣ / المنطقة /
التاريخ: ... / ... / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٥٠+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه النوبارية .
تنفيذ / شركة الحسام للمقاولات العمومية عقد رقم / ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٦١٦
يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بياتها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن فلتز	٣م	٦٤٢٠,٢٤٨٣٨	كسارة العروبة / بون
٢	اتربة	٣م	٤٢٨٥	محجر المصرية/ تصريح
٣	اتربة	٣م	١٤٩٣,٣٦٤٤	محجر المتحدة/ تصريح

حيث تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الشركة

م/احسام ماهر

عاحماهر

عن الاستشاري

مدير المكتب الفني

م/احمد السعيد

م/محمد طارق

م/احمد السعيد

مدير المشروع

م/رشاد مرسي

م/احمد الشاعر

م/احمد الشاعر

عن الهيئة

مدير المشروع

م/احمد أبو دقيقة

م/احمد أبو دقيقة

م/احمد أبو دقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

م/احمد أبو دقيقة



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

شهادة (١)

بخصوص عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة-العاصمة الاداريه-العلمين الجديدة-مطروح) قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه النوبارية .

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦١٦)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية .

يشهد الاستشارى مكتب أ.د. خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بالآتى :

١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العمليه عاليه طبقا للشروط و المواصفات المحدد بهذا الشأن و تم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للشروط و المواصفات.

٢- يتم مراعاة خصم ما جاء بمحضر التقييم الابتدائى و اية خصومات مستحقة .

٣- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد و دفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

عن الاستشارى

أ.د. خالد قنديل

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر





الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

شهادة (٢)

بخصوص عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنه-العاصمة الاداريه-العلمين الجديدة-مطروح) قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه النوبارية .

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦١٦)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية .

يشهد الاستشارى مكتب أ.د خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق و الكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامى للعملية و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا و وجدت انها مطابقة للشروط و المواصفات و طبقا للعقد.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

عن الاستشارى

رئيس الاداره المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

شهادة (٣)

بخصوص عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة-العاصمة الاداريه-العلمين الجديدة-مطروح) قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه النوبارية .

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦١٦)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية .

يشهد الاستشارى مكتب أ.د خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق و الكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها و المحددة بعقد العملية.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

عن الاستشارى

أ.د. أبو دقيقى

رئيس الاداره المركزيه للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة الثالثة عشر- البحيرة و كفر الشيخ

محضر أستلام ابتدائى

بخصوص عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة-العاصمة الادارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه النوبارية .

عقد رقم (٦١٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣١ .

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العموميه

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢٣ و بناءاً على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزيه للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائى لمشروع القطار الكهربائى السريع من كم ٢٠٠ حتى كم ٣٠٠ ترقيم القطار قرار رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٠٢٢/١١/٢٨) و بناءاً على الطلب المقدم من شركة الحسام للمقاولات بتسليم الاعمال ابتدائياً.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد و هم :-

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

١- السيد مهندس / احمد ابو دقيقة (رئيس اللجنة)

٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر (مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

٣- السيد المهندس / حسن حاتم (مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

عن الاستشارى

٤- السيد المهندس / رشاد مرسى (مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

٥- السيد المهندس / أحمد السعيد (مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

٦- السيد المهندس / عبدالله جاسر (مدير تنفيذ المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

٧- السيد المهندس / ايمن عاطف (استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

عن الشركة المنفذة

٨- السيد المهندس / حسام ماهر قرني (شركة الحسام للمقاولات (الشركة المنفذة)

و قد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف و مستندات العملية و دفتر الشروط و المواصفات و ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الاعمال المنفذه ظاهرياً على الطبيعة.

وقد اسفرت المعاينة الظاهرية للاعمال على الاتى :-

(ا) أعمال اترية :

تم الاطلاع على التجارب التى تم اجراؤها اثناء التنفيذ و التأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

تم اخذ عدد (١) عينة طبقا للكشف المرفق و المعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن و المحطات المرفقه و سيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع.

(ب) أعمال سن الفلتر:

تم الاطلاع على التجارب التى تم اجراؤها اثناء التنفيذ و التأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

تم اخذ عدد (١) عينة طبقا للكشف المرفق و المعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن و المحطات المرفقه و سيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع.

التوصيات:

- على الجهة المالكة للمشروع و استشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة و تكليف الشركة بعمل اى اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان.

- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات و تسليمها مرة اخرى لاستكمال الاعمال.

- تم اخذ العينات طبقا للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة وتم ارسالها الى الجهات المرفقة فى الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة و فور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتى تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيوذ فى نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد.

- مرفق عدد (١) كشف باماكن و محطات وسمك العينات و الاختبارات الموقعية التى تم استلامها و موقع من اعضاء اللجنة.

- مرفق كشف بالتجارب التى تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ و نتائج هذه التجارب التى اطلعت عليها اللجنة.

حارس
المهندس
الاسم
الله
س
س
لهود

و عليه ترى اللجنة:-

- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا و يعتبر تاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٦ هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال و بداية فترة الضمان طبقا لخطاب الشركة المنفذة بنهوا الاعمال.
 - سرعة متابعة نتائج الاختبارات و موافاة اللجنة باصل نتائج الاختبارات حتى يتم نهوا اجراءات محضر التقييم.
 - سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ اعمال الجسر الترابي حتى يتسنى نهوا المشروع فى مواعيدة المقررة.
- توقيع اعضاء اللجنة:-

- شركة الحسام للمقاولات (الشركة المنفذة)
- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
- مهندس مدنى المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
- مدير الجودة للمشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
- مدير استشارى المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)

- ٨- حامد ماهر
- ٧- ا.م.ن. عامر
- ٦- [Signature]
- ٥- [Signature]
- ٤- [Signature]
- ٣- [Signature]
- ٢- [Signature]
- ١- [Signature]

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع

قطاع غرب النيل من الكم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات

كشف باماكن و محطات العينات و الاختبارات الموقعية التى تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لاعمال
الترتبة واعمال سن الفلتر لجسر القطار:

مسلسل	STATION	الجهة المرسل اليها العينة	منسوب الردم من الفرمه	نوع الصلاحية
١	من ٢٩٦+٤٨٠ الى ٢٩٦+٥٠٠	معامل كلية الهندسه جامعة الاسكندرية	- ١,٥	سن فلتر
٢	من ٢٩٥+٠٦٠ الى ٢٩٥+١٤٠	معامل كلية الهندسه جامعة الاسكندرية	- ٠,٧٥	اتربة

سيتم اجراء باقى الاختبارات الخاصة بمواصفات المشروع بالجهات المرفقة و موافاة اللجنة بنتائج العينات.

اعتماد لجنة التسليم:-

- شركة الحسام للمقاولات (الشركة المنفذة)
- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
- مهندس مدنى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- مدير الجوده للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)

٨- حامد ماهر

٧- ا.د. كنز عامر

٦- ع. الد. د.

٥- ه. الس. د.

٤- د. د.

٣- د. د.

٢- د. د.

١- ا.د. اودى قنديل

التقييم الخاص لعملية

بخصوص عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة-العاصمة الادارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه النوبارية.

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٣ / ١١٦).

اشراف :- المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

تنفيذ :- شركة الحسام للمقاولات العامة

انه فى يوم الاحد الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ وبناءا على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائى لمشروع القطار السريع من كم ٢٠٠ حتى كم ٣٠٠ ترقيم القطار قرار رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢) وبناءا على الطلب المقدم من الشركة العامة بتسليم الاعمال والاكتفاء بما تم تنفيذه ابتدائيا ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائى بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢٣ وبعد الاطلاع على التقييم للعملية عالية .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

- ١- السيد مهندس / احمد ابو دقينة
- ٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
- ٣- السيد المهندس / حسن حاتم

عن الاستشارى

- ٤- السيد المهندس / رشاد مرسى
- ٥- السيد المهندس / احمد السعيد
- ٦- السيد المهندس / عبدالله جاسر
- ٧- السيد المهندس / ايمن عاطف

عن الشركة المنفذة

- ٨- السيد المهندس / حسام ماهر قرنى

شركة الحسام للمقاولات العموميه (الشركة المنفذة)

وقد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وبناءا على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

اولا : الخصومات على الاختبارات المعملية

- الخصم على الاتربة :

- لا يوجد خصومات .

- نتائج الاختبارات المعملية التى تمت خلال التنفيذ والمرسلة من المنطقة لانتهاء اجراءات التقييم تحت مسئولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة دون ادنى مسئولية على لجنة الاستلام والتقييم .

- الخصم على سن الفلتر :

- لا يوجد خصومات .

- نتائج الاختبارات المعملية التى تمت خلال التنفيذ والمرسلة من المنطقة لانتهاء اجراءات التقييم تحت مسئولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة دون ادنى مسئولية على لجنة الاستلام والتقييم .

ثانيا : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائى :

- لا يوجد خصومات .

شركة الحسام للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

مهندس مدنى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)

٨- عامر
٧- المهندس عامر
٦- المهندس
٥- المهندس
٤-
٣-
٢-
١- المهندس

بمكتب

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ


مهندس / مجدى عبد السلام عامر



Grain Size Distribution Curve

CLIENT	مصلحة الحسام للمقاولات المعمارية
PROJECT	الطريق الكورنيش السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العاين - القطر)
LOCATION	مطروح (قطاع غرب النيل من كم ٢٩٥+٠٠٠ إلى ٢٩٥+٠٠٠ على مستوى ٢٩٦+١٤٠ إلى ٢٩٥+٠٠٠ م)
LAYER TYPE	طبقة تربة / ١ / ١
Receiving Date	06/09/2023
Cheque Date	06/09/2023
Receipt Number	114723
Report Date	30/09/2023
Lab. Ref.	G 130/09

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE

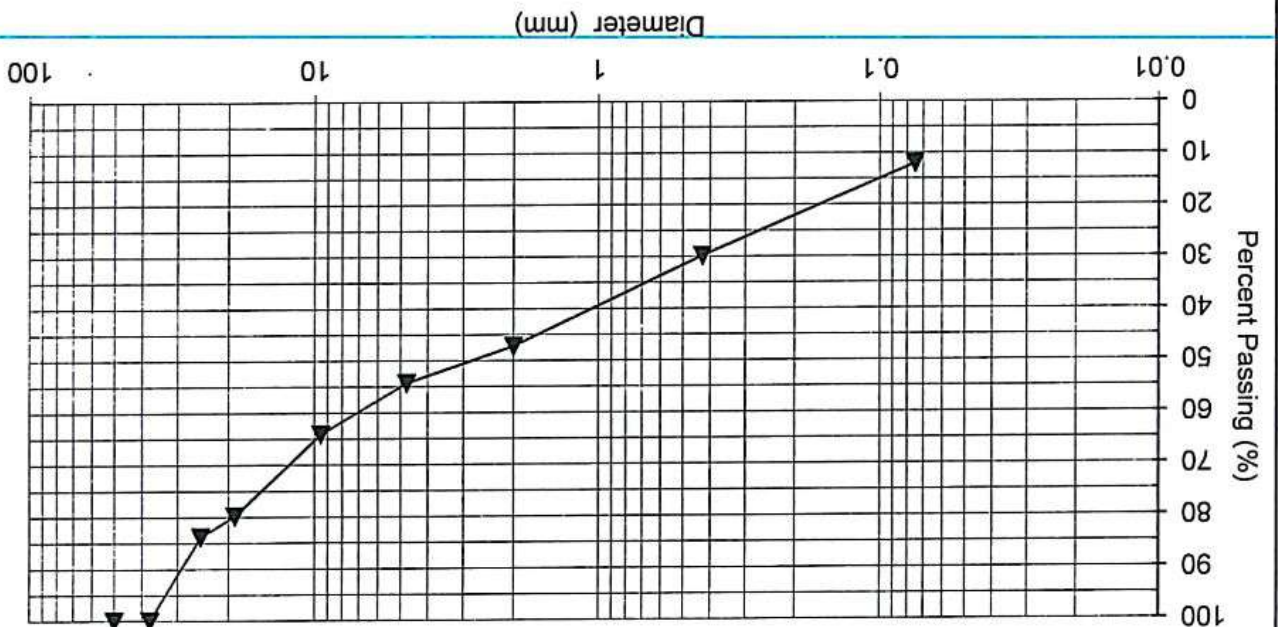

PERCENT PASSING

Sieve No.	Test Results
No. 200	12.1
No. 40	29.8
No. 10	47.2
No. 4	54.3
3/8"	64.1
3/4"	79.9
1"	83.8
1 1/2"	100.0
2"	100.0

A-1-a : تصنيف التربة

وردت العينة التي اجري عليها تحليل التربة الى المعمل بمرافق هندسة الطرق / جلال قنديل

Laboratory Director


Dr. Wael Bekheet

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اي نتائج مبنية على ذلك



קדוש קדוש קדוש - אלהים אלהים אלהים

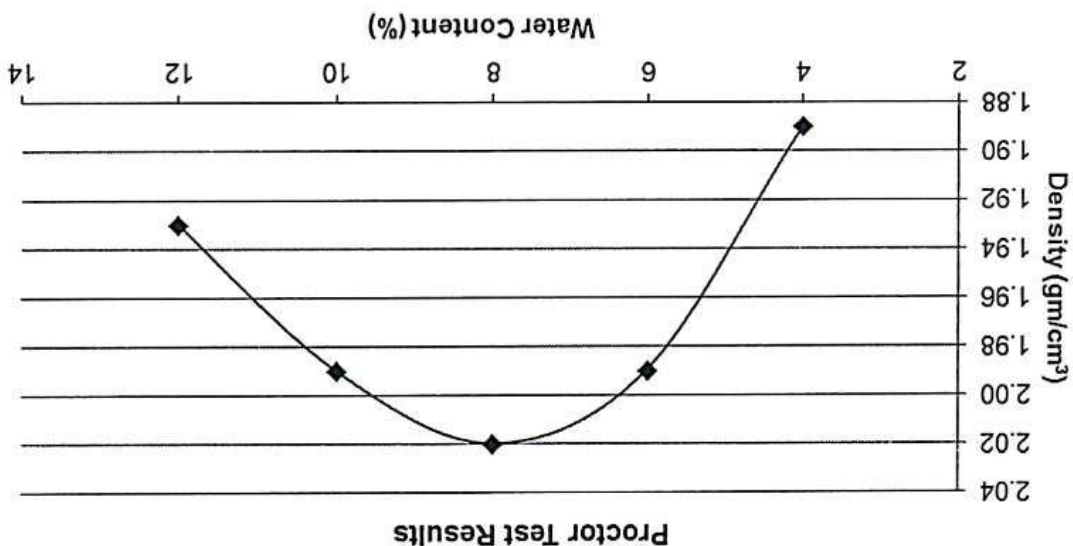[illegible]

የጥሬ ምርት ስኬት	:	ሃ%
የጥሬ ምርት ስኬት	:	አ.ፊ.ፊ.ፊ.

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشاري ا.د. / خالد قنديل

مدیر المعمل




في العمل
→
// احمد عادل

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.	المرتبطة فقط بالنتائج من اختبار المختبر، ولا تتحمل المختبر مسؤولية تفسير النتائج أو أي نتائج أخرى.
---	---



نتائج تجارب تحميل نسبة تليفونيا

تقرير رقم	٢٠٢٣/٩/٠٦	تاريخ توريد	العينة	٠٩/١٠٨.٤
الاختبارات	٢٠٢٣/٩/٠٦	تاريخ الاتصال	نسبة تحميل كالفونيون	١١٤٧٢٣
المعمل	١١٤٧٢٣	رقم الاتصال	شريحة الحساب للمقارلات المعوية	١١٤٧٢٣
المشروع	٢٠٢٣/٩/٣٠	تاريخ التقرير	تاريخ الاتصال	١١٤٧٢٣
الموقع	٢٠٢٣/٩/٣٠	تاريخ الاتصال	العينة	١١٤٧٢٣

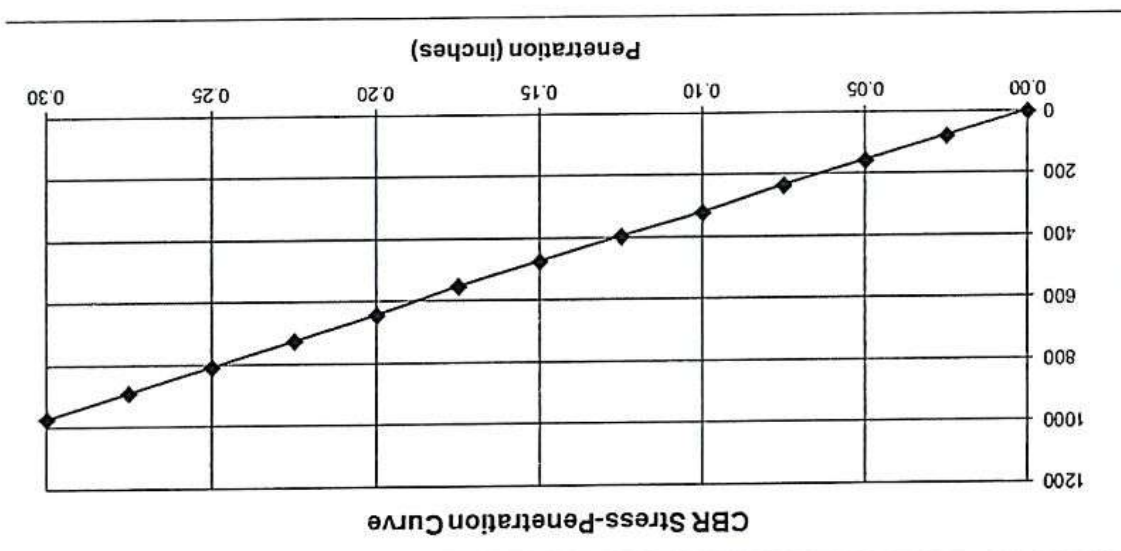

نسبة تحميل كالفونيون بعد المعالجة في الماء لمدة ٤ أيام : %٤٣

تم توريد العينة بمعرفة متدرب الاختباري ا.د. / خالد فتيل

في المعمل

ا.د. / احمد عادل



مدير المعمل
/ وائل نجيت


The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.



Grain Size Distribution Curve

CLIENT	شركة الحسام للمقاولات المعمارية
PROJECT	- العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - القطار الكهربائي السريع (العين السخنة) ٢٩٧+٥٠٠ كم إلى ٢٩٧+٥٠٠ م مطروح (قطاع غرب النيل) من ٢٩٧+٥٠٠ م إلى محطة ٢٩٧+٥٠٠ م
LOCATION	١ / ١ عين
LAYER TYPE	سنة قلبي
Receiving Date	19/07/2023
Cheque Date	24/07/2023
Receipt Number	985249
Report Date	03/08/2023
Lab. Ref.	G 21/08

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE

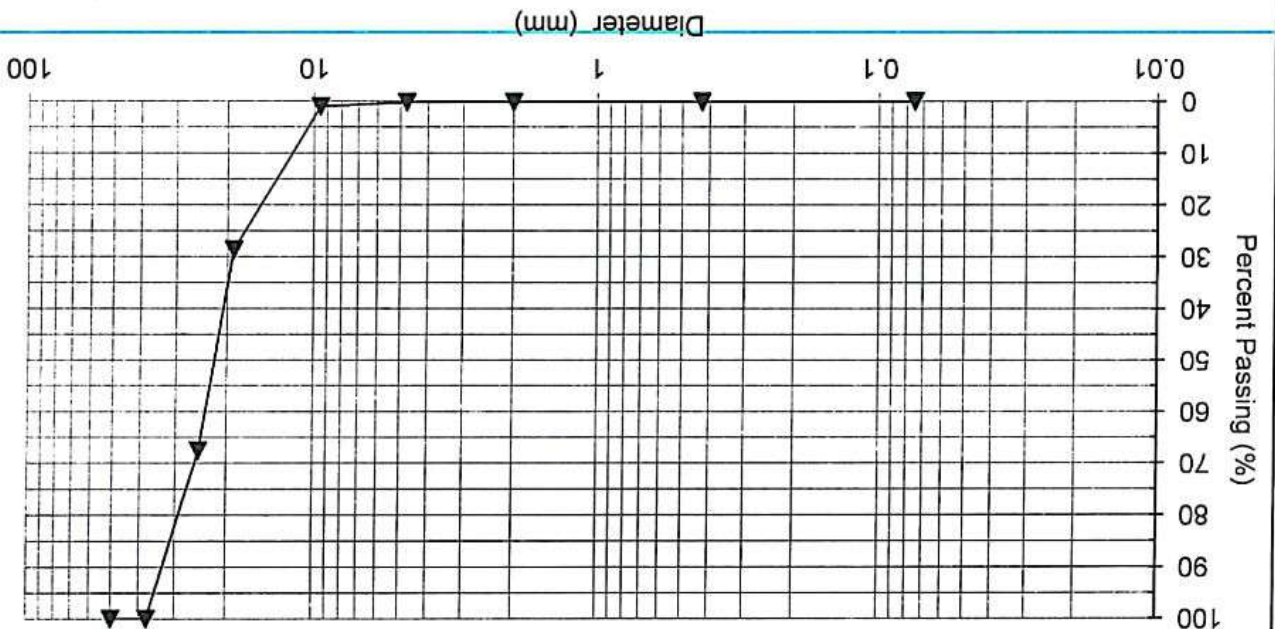

Sieve No.	Test Results
No. 200	0.0
No. 40	0.2
No. 10	0.2
No. 4	0.2
3/8"	1.0
3/4"	28.7
1"	67.6
1 1/2"	100.0
2"	100.0

PERCENT PASSING

وردت العينة التي اخري عليها الاختبار الى المعمل بمعرفه ملصقة بالاختبار ا.د. خالد خليل

Dr. Wael Bekheet

Laboratory Director

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اي نتائج مبنية على تلك

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

تجارت / ۲۰

مدير العمل
م/أ/د

فني العمل

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشاري أ.د. خالد قنديل

نسبة التكاثر	١٠٠%
وزن العينة بعد التجزئة	٣٨,٥%
وزن العينة قبل التجزئة	٦٩,٩٦%
عدد كرات الاختبار	١٢ كرتة
لوسيل الاختبار	٥٠٠

المستند رقم ١٨٢٥٤٦ في سجلات المحاكم الشرعية بدمشق

٢٠٢٣/٨/١٩	تاريخ توقيع	١٠/٨/٢٠٢١	رقم تقرير
٢٠٢٣/٨/٢٨	اسم	لؤي الخاوي و الاستشاري	الاستشارات
١٥٥٨٥٦	اسم	شركة محمد كامل	المقاول
٢٠٢٣/٨/٢٨	تاريخ التقرير	٢٨/٨/٢٠٢٣	المشروع
٢٠٢٣/٨/٢٨	اسم	٢٨/٨/٢٠٢٣	الموقع

אחרי כן יצאנו מן המדבר ויבאנו אל הנהר שרר וישבו שם



مراجعة بونات توريد
عقد رقم 2023/2022/616 اتجاه النوبارية ختامي

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣ قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|---|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / احمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / عبدالله جاسر | المهندس المقيم - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / حسام ماهر | مدير المشروع - شركة الحسام للمقاولات العمومية (المقاول) |


قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية لسن الفلتر الموردة من كسارة العروبة هي (٥,٣٦١,٧٣ م^٣) (سبعة الاف وثلاثمائة وواحد وستون ونصف مترا لاغير)
 - الكمية الاجمالية للتربة الموردة من محجر المصرية هي (٥,٥٥٧,١٣ م^٣) (خمسة الاف وخمسمائة وواحد وسبعون ونصف مترا لاغير)
 - الكمية الاجمالية للتربة الموردة من محجر المتحدة هي (٥,٢١٠,١٣ م^٣) (الفان ومائة وواحد ونصف مترا لاغير)
- علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.
- ❖ وعلي هذا وقع الجميع: -

م / حسام ماهر	مدير المشروع شركة الحسام للمقاولات العمومية
م / عبدالله جاسر	مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد نجاح	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد السعيد	مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يتم
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / أحمد أبو دققة



الدخول في سجلها الى الشركة والشركة مسؤولة مسؤولية

معا

31/1/2023
31/1/2023
31/1/2023

الرقم	التاريخ	القيمة	الرقم	التاريخ	القيمة	الرقم
1	11/08/2022	7364/4791	66	010303141450929	330	المصرية
2	11/08/2022	4911/3612	65.5	010303141450928	330	
3	11/08/2022	4911/3612	65.5	010303141450753	330	
4	11/08/2022	7364/4791	66	010303141450754	330	
5	30/07/2022	6172/4728	65	010303131007470	630	
6	30/07/2022	4792/2154	66	103031141007488	730	
7	31/07/2022	9748/9321	63	010303131008052	330	
8	01/08/2022	4487/8631	67	01030314994587	330	
9	02/08/2022	4322/8421	64	01030314995051	330	
10	02/08/2022	4487/8631	67	01030314995122	330	
11	02/08/2022	2154/4792	66	010303131009938	330	
12	02/08/2022	8126/1953	62	010303131009934	280	
13	02/08/2022	8695/7625	63	010303131009991	330	
14	02/08/2022	6172/4728	65	01030314995272	280	
15	02/08/2022	1582/6918	64.5	01030314995108	330	
16	02/08/2022	4322/8421	64	010303131010516	330	
17	02/08/2022	6172/4728	65	010303131009865	280	
18	02/08/2022	1582/6918	60	010303131010106	330	
19	02/08/2022	2154/4792	66	010303131010128	330	
20	02/08/2022	4487/8631	57	010303131010143	330	
21	02/08/2022	4322/8421	57	010303131010164	330	
22	02/08/2022	5172/4728	55	010303131010029	280	
23	03/08/2022	4322/8421	64	010303131010672	330	
24	03/08/2022	3694/1754	62	01030314995598	280	
25	03/08/2022	1834/3426	59	010303131011157	280	
26	03/08/2022	1834/3426	59	010303121018953	280	
27	03/08/2022	1834/3426	59	010303121018857	280	
28	03/08/2022	6273/4185	62	01030314995625	330	
29	03/09/2022	3948/3519	65.5	010303131038197	630	
30	04/08/2022	6432/4861	65.5	010303131011855	280	
31	09/09/2022	4276/1589	57.5	010303131043133	280	
32	09/09/2022	4276/1589	59.5	010303141020678	280	
33	09/09/2022	1386/5216	65.5	010303141020679	280	
34	09/09/2022	1386/5216	65.5	010303141020194	280	
35	09/09/2022	9329/2458	56	010303131042946	330	
36	10/09/2022	4276/1589	57.5	010303131048476	280	
37	10/09/2022	2917/6318	65	010303141021250	330	
38	10/09/2022	4276/1589	57.5	010303131043248	280	
39	10/09/2022	1386/5216	65.5	010303141021255	280	
40	10/09/2022	6318/2917	65	010303141020349	330	
41	10/09/2022	8914/3821	59.5	010303131048201	330	
42	10/09/2022	3821/8914	59.5	010303141021249	280	
43	10/09/2022	6318/2917	65	010303131043395	330	
المجموع		2694		14340		

31/1/2023
31/1/2023
31/1/2023

31/1/2023
31/1/2023
31/1/2023

31/1/2023
31/1/2023
31/1/2023

شركة النيل - الكبريات الشرق شركة الختم المطارات المتوسطة						
البيانات العامة						
اسم المشروع	الرقم (الجدول)	رقم الكارطة	الكمية (م ³)	رقم الشرائح	التاريخ	م
	14340	اجمالي مناطق (الجدول)	2694	اجمالي مناطق (م ³)		
المصرية	280	010303141020395	65.5	5216/1386	10/09/2022	44
	280	010303131043396	59.5	8914/3812	10/09/2022	45
	280	010303141021253	59.5	1589/4276	10/09/2022	46
	280	010303141021044	65.5	1386/5216	10/09/2022	47
	280	010303131043918	65.5	1386/5216	11/09/2022	48
	280	010303141021387	59.5	4276/1589	11/09/2022	49
	280	010303131044105	65.5	1386/5216	11/09/2022	50
	280	010303131043922	59.5	3821/8914	11/09/2022	51
	280	010303141021949	59.5	3821/8914	11/09/2022	52
	330	010303141021383	65	2917/6318	11/09/2022	53
	280	010303131044361	65.5	1386/5216	11/09/2022	54
	280	010303141021784	59.5	3821/8914	11/09/2022	55
	330	10303141021606	65	6318/2917	11/09/2022	56
	330	010303141021948	65	2917/6318	11/09/2022	57
	280	010303131044106	59.5	1589/4276	11/09/2022	58
	280	010303131044360	59.5	4276/1589	11/09/2022	59
	280	010303131044170	59.5	3821/8914	11/09/2022	60
	330	010303141021789	65	2917/6318	11/09/2022	61
	280	010303141022177	59.5	4276/1589	12/09/2022	62
	280	010303131044645	59.5	4276/1589	12/09/2022	63
	280	010303141021974	65.5	5216/1386	12/09/2022	64
	280	010303131044930	59.5	8914/3821	12/09/2022	65
	330	010303141022164	65	2917/6318	12/09/2022	66
	280	010303141022776	59.5	4276/1589	13/09/2022	67
	280	010303141022955	59.5	4276/1589	13/09/2022	68
	330	010303131045977	65	2917/6318	13/09/2022	69
	280	010303141022741	59.5	8914/3821	13/09/2022	70
	330	010303121064798	65	2917/6318	13/09/2022	71
	280	010303141022985	59.5	8914/3821	13/09/2022	72
	280	010303131046113	65.5	5216/1386	13/09/2022	73
	280	010303131045878	65.5	5216/1386	13/09/2022	74
	280	010303141023426	65	3759/4283	14/09/2022	75
	280	010303141023147	59.5	3821/8914	13/09/2022	76
	280	010303131046633	59.5	8914/3821	14/09/2022	77
	330	010303131046332	65	2917/6318	14/09/2022	78
	24540	اجمالي الرسوم (الجدول)	4875	اجمالي الكمية (م ³)		

المشروع رقم ٢٤٨
المخطط المراجعة من ٢٤٨
تاريخ المراجعة ٢٤/١١/٢٠٢٢
٣١/١/٢٠٢٣

عن الاستشاري مكتب لاس
١٣
٢٠٢٢

الشركة المعلقة
م. م. م. م. م.

اسم الشجر	الزمن (الجلنة)	رقم الكارن	الكمية (م ³)	رقم الفرنية	التاريخ	م
	24540	اجمالي ما سبق (الجلنة)	487.5	اجمالي ما سبق (م ³)		
	330	010303121065859	65.5	8394/9372	14/09/2022	79
	330	010303121065768	65	2917/6318	14/09/2022	80
	280	010303131046329	59.5	8914/3821	14/09/2022	81
	280	010303131046772	59.5	1589/4276	14/09/2022	82
	330	010303131046163	65	2917/6318	14/09/2022	83
	280	010303141023323	66	3456/4283	14/09/2022	84
	330	010303121066099	65	6318/2917	15/09/2022	85
	280	010303141023634	59.5	8914/3821	14/09/2022	86
	280	010303131046926	66	3759/4283	15/09/2022	87
	280	010303141023773	66	3759/4283	15/09/2022	88
	280	258-0031-5003	59.5	4267/1589	15/09/2022	89
	27820	اجمالي الزمزم بالجلنة =	5571.5	اجمالي الكمية (م ³) =		
		5571.5		اجمالي الكمية المعصورة (م ³) =		

الاسم	الاسم (الخطي)	رقم الكارت	الكمية (م)	رقم التوزيع	التاريخ	الاسم
	27820	اجمالي الزئيرم بالخطي =	5571.5		اجمالي الكمية المتبقية م =	
	330	260-0180-5003	66	6975/4162	11/08/2022	90
	330	260-181-5003	65	1876/2539	11/08/2022	91
	330	260-0170-5003	66	6975/4162	11/08/2022	92
	330	260-193-5003	65	6839/4195	12/08/2022	93
	330	260-174-5003	66	3136/3976	12/08/2022	94
	330	260-224-5003	65	1876/2539	12/08/2022	95
	330	260-225-5003	66	4487/8631	12/08/2022	96
	330	260-0189-5003	66	6975/4162	12/08/2022	97
	330	260-213-5003	66	1876/2539	12/08/2022	98
	330	260-194-5003	66	3136/3976	12/08/2022	99
	330	260-171-5003	65	1876/2539	12/08/2022	100
	330	260-173-5003	65.5	4637/1928	12/08/2022	101
	330	260-212-5003	66	6975/4162	12/08/2022	102
	330	260-204-5003	65.5	4637/1928	12/08/2022	103
	330	260-205-5003	65	6839/4195	12/08/2022	104
	330	260-203-5003	66	4487/8631	12/08/2022	105
	330	260-172-5003	66	4487/8631	12/08/2022	106
	330	260-223-5003	66	6975/4162	12/08/2022	107
	330	260-202-5003	65	1876/2539	12/08/2022	108
	330	260-0202-5003	66	6975/4162	12/08/2022	109
	330	260-226-5003	65.5	4637/1928	12/08/2022	110
	330	260-214-5003	66	4487/8631	12/08/2022	111
	330	260-182-5003	66	4487/8631	12/08/2022	112
	330	260-183-5003	65.5	4637/1928	12/08/2022	113
	330	260-190-5003	65	1876/2539	12/08/2022	114
	330	260-191-5003	66	4487/8631	12/08/2022	115
	330	260-192-5003	65.5	4637/1928	12/08/2022	116
	330	260-326-5003	66	6975/4162	13/08/2022	117
	330	260-245-5003	66	6975/4162	13/08/2022	118
	330	260-247-5003	66	4487/8631	13/08/2022	119
	330	260-238-5003	66	6975/4162	13/08/2022	120
	330	260-239-5003	65	1876/2539	13/08/2022	121
	38380	اجمالي الزئيرم الخطي =	7673		اجمالي الكمية (م) =	
		2101.5			اجمالي الكمية مخبر الكار (م) =	

محجر الحلو

ملحق (١) إيجاء التوابع

مستخرج القوائم الكفالات القانونية				مركز الخصم للقرارات العمومية		البنات المالية	
الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم
32350	010303131093426	56	0590442	3519/3948	22/11/2022	46	
630	010303131093206	57	0590435	3519/3948	22/11/2022	47	
630	010303141079025	59.5	0590444	2536/4235	22/11/2022	48	
730	010303121089311	58.5	0590440	8937/5372	22/11/2022	49	
730	010303131093449	59.5	0590441	9467/3743	22/11/2022	50	
730	010303141078778	65.5	0590436	2719/3552	22/11/2022	51	
730	010303131093158	56.5	0590432	8937/5372	22/11/2022	52	
730	010303121089058	59	0590428	3519/3948	22/11/2022	53	
630	010303121089297	56	0590443	2719/3552	22/11/2022	54	
730	010303131093521	58.5	0590446	1493/4369	22/11/2022	55	
730	0445244732-20223281-68	58.5	0590426	1493/4369	22/11/2022	56	
730	010303141079245	65.5	0590453	2719/3552	23/11/2022	57	
730	010303121089890	59.5	0590480	1493/4369	23/11/2022	58	
730	010303131093984	63	0590483	1234/9682	23/11/2022	59	
730	010303131093816	59.5	0590467	9467/3743	23/11/2022	60	
730	010303131093818	65.5	0590470	1497/8162	23/11/2022	61	
730	010303121089721	56	0590466	8937/5372	23/11/2022	62	
730	010303131093856	59.5	0590475	2536/4235	23/11/2022	63	
730	010303141079444	67	0590488	1795/2769	23/11/2022	64	
730	010303121089734	67	0590472	5231/7159	23/11/2022	65	
730	010303121089737	63	0590473	1234/9682	23/11/2022	66	
730	010303121089975	56	0590485	8937/5372	23/11/2022	67	
730	010303131094019	53	0590488	2714/8231	23/11/2022	68	
730	010303121089976	59.5	0590486	9467/3743	23/11/2022	69	
730	010303141079732	65.5	0590491	2719/3552	23/11/2022	70	
730	010303131094035	59.5	0590490	3519/3948	23/11/2022	71	
730	010303121089947	53	0590487	8367/9568	23/11/2022	72	
730	010303121089911	67	0590493	1795/2769	23/11/2022	73	
730	010303121089911	67	0590492	5231/7159	23/11/2022	74	
730	010303121089945	59.5	0590489	2536/4235	23/11/2022	75	
730	010303131094112	59.5	0590492	1589/4276	23/11/2022	76	
630	010303131093907	59.5	0590476	1589/4276	23/11/2022	77	
630	010303121089725	58.5	0590469	1493/4369	23/11/2022	78	
730	010303121089670	65.5	0590465	2719/3552	23/11/2022	79	
730	010303131093771	59.5	0590464	3519/3948	23/11/2022	80	
730	010303131093630	59.5	0590463	2536/4235	23/11/2022	81	
730	0445244732-20223281-41	59.5	0592412	2536/4235	23/11/2022	82	
730	0445244732-20223723-22	63	0592409	1234/9682	23/11/2022	83	
730	0445244732-20223280-27	67	0592410	5231/7159	23/11/2022	84	
60120	010303131093426	56	0590442	3519/3948	22/11/2022		

عن الاشراف على
مستخرج القوائم الكفالات القانونية
القطاع الرابع من الكفالات القانونية
تحت المراجعة
31/10/2023

عن الاشراف على
مستخرج القوائم الكفالات القانونية
القطاع الرابع من الكفالات القانونية
تحت المراجعة
31/10/2023

رقم

جہاز (۱) ایچ انویا رے

مستخرج القطار الكهربائي المشترك شركة الختام للمقاربات العمومية البريد الطي									
الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم
60120	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم
730	0445244732-202232723-21	65.5	0592411	1497/8162	23/11/2022	85.			
730	0445244732-202232723-7	58.5	0592408	1493/4369	23/11/2022	86.			
730	0445244732-20223280-33	53	0592413	2714/8231	23/11/2022	87.			
730	0445244732-20223280-34	53	0592414	8367/9568	23/11/2022	88.			
630	010303131094330	59.5	0592406	1589/4276	23/11/2022	89.			
730	010303121090191	67	0592405	1795/2769	23/11/2022	90.			
730	010303141079906	63	0590497	1234/9682	23/11/2022	91.			
730	010303121090122	59.5	0590494	1493/4369	23/11/2022	92.			
630	010303121090185	55.5	0590498	1462/6928	23/11/2022	93.			
730	010303141079961	65.5	0592404	2719/3552	23/11/2022	94.			
730	010303141079930	53	0590500	8367/9568	23/11/2022	95.			
730	010303141079931	53	0592401	2714/8231	23/11/2022	96.			
630	010303141079960	59.5	0590498	2538/4235	23/11/2022	97.			
730	010303131093962	65.5	0590481	1497/8162	23/11/2022	98.			
730	010303131094191	65.5	0590495	1497/8162	23/11/2022	99.			
730	010303131094179	67	0590496	5231/7159	23/11/2022	100.			
630	010303121090335	55.5	0592415	1462/6928	24/11/2022	101.			
730	010303121169990	67	0215794	1795/2769	05/07/2022	103.			
730	010303121185740	65.5	0215751	3552/2719	04/07/2022	104.			
730	010303121182740	65.5	0215750	3552/2719	05/07/2022	105.			
730	010303121106990	65.5	0215771	1497/8162	05/07/2022	106.			
730	010303121126740	65.5	0215745	1497/8162	05/07/2022	107.			
730	010303121102790	67	0215763	5231/7159	06/07/2022	108.			
730	010303121169740	65.5	0215766	1497/8162	06/07/2022	109.			
730	010303638178240	67	0215732	1795/2769	08/07/2022	110.			
730	0445244732-202230323-9	62	0590538	2173/2791	30/10/2022	111.			
730	010303141077914	65.5	0219247	3552/2719	12/11/2022	112.			
730	010303141073052	65.5	0219239	4217/9157	14/11/2022	113.			
730	010303121088526	65.5	0219226	3552/2719	14/11/2022	114.			
730	010303131087947	65.5	0219298	4281/9157	14/11/2022	115.			
730	010303121088798	68	0367845	1368/4928	14/11/2022	116.			
730	010303121085341	68	0052089	1368/4928	16/11/2022	117.			
730	010303121085136	68	0054292	1368/4928	16/11/2022	118.			
730	010303141077100	65.5	0215986	3552/2719	20/11/2022	119.			
730	010303141077660	65.5	0215937	3552/2719	20/11/2022	120.			
86000	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم
730	0445244732-202230323-9	62	0590538	2173/2791	30/10/2022	111.			

مستخرج القطار الكهربائي المشترك
شركة الختام للمقاربات العمومية
البريد الطي
3/11/2023

عن الاستشاري مكتب الهندسة
3/11/2023

عن الشركة المستشارة
3/11/2023

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

بالإشارة إلى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين النسخة - العاصمة الإدارية العالمية) مرسي مطروح

في مسافة من كم ٢٩٥+٠٠٠ إلى ٢٩٧+٥٠٠ كم بطول (٢,٥ كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣ م

بحضور كل من :-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري الهندسي
إ.د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة الحسام للمقاولات

١- م: أحمد أبو دققة
٢- م: أحمد عادل الشاعر
٣- م: أحمد سعيد
٤- م: حسام ماهر قرني

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة من المحجر المعتمد على الطبيعة (محجر المصرية) وجدت ان القطاع يبعد مسافة (٩٨) كم (فقط ثمانية وتسعون كيلومتراً) عن المحجر وعليه تم تصحيح مسافة النقل المعتمدة للقطاع لاعمال التربة هي (٩٨) كم (فقط ثمانية وتسعون كيلومتراً).

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

١- م: أحمد أبو دققة
٢- م: أحمد عادل الشاعر
٣- م: أحمد سعيد
٤- م: حسام ماهر قرني

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العالمين - مرسى مطروح).

في مسافه من كم 295+000 الي 297+500 كم بطول (2.5 كم) للاتجاهين

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/13 م

بحضور كل من :-

مدير الجودة مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل إستشاري المشروع
مهندس مدنى مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل إستشاري المشروع
ممثّل شركة الحسام للمقاولات

1- م/ احمد السعيد

2- م/ محمد عبدالغفار

3- م/ حسام ماهر قرنى

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة من المحجر المعتمد علي الطبيعة (طيبة A 214/ش) من خلال طريق وادى النطرون العلمين / مصر اسكندرية الصحراوى وجد أن القطاع يبعد مسافة (122) كم (فقط مائة واثنان وعشرون كيلومتراً) عن المحجر .
واقفل المحضر على ذلك

التوقيع :

3- م/ ماهر قرنى

2- محمد عبدالغفار

1- أحمد السعيد

٢٠٢٣ / ٦ / ١٣

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابودقيقة

أحمد ابودقيقة

محضر جلسة مجلس إدارة شركة كوكا كولا

بالإشارة إلى التظلم وأمر الإزالة الصادر من هيئة الطرق والكباري
لشركة الخصام للمقاولات الهندسية بشأن تنفيذ الجسر الخرساني والأعمال
الصناعية بمشروع القطار الكهنهائي الجديد (اليمين) السبيل الصناعية الإدارية
الطريق من مرسى مطروح

في مسافة من كم 295+000 إلى 297+500 كم بطول (2,5 كم) للتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2022/9/4 م

بحضور كل من :-

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1- م: أحمد أبو دة | رئيس اللجنة الفنية |
| 2- م: أحمد عادل الشاهر | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 3- م: أحمد عبد الحكيم | ممثل مكتب الاستشارات الهندسية |
| 4- م: حسام ماهر قرني | ممثل شركة الخصام للمقاولات |

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع بقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصناعية
من المخزن المخصص على الطبيعة (المساحة 3309861) وجدت أن القطاع وبعد
مسافة (116) كم (قطر مائة وستة عشر كيلومتراً) من المرسى من غاية تم تصحيح
مسافة النقل المستخدمة للقطاع لأعمال الأتربة هي (116) كم (قطر مائة وستة عشر
كيلومتراً).

واقبل المحضر على ذلك
التاليات

- | | |
|----|--|
| 1- | |
| 2- | |
| 3- | |
| 4- | |

محضر معاينة مقالب عمومية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣ تم قياس المسافة من قطاع الشركة المتمثل في المسافة ٢٩٥+٠٠٠ إلى ٢٩٧+٥٠٠ إلى المقالب العمومية المحددة وذلك لنقل مخلفات ناتج الحفر الخاص بقطاع شركة الحسام للمقاولات العمومية وقد تمت المعاينة تحت اشراف مكتب أ.د. خالد قنديل، للاستشارات الهندسية. وقد قام بالمعاينة كلا من:

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري.
ممثل مكتب د/خالد قنديل استشاري الهيئة.
ممثل شركة الحسام للمقاولات العمومية.

م/ احمد ابو دقيقة
م/ احمد سعيد
م/ حسام ماهر قرني

وقد نقل المخلفات للمقالب العمومية لمسافة ١٠ كم

والتزم جزيل الشكر
أ.د. خالد قنديل

١-

٢- احمد السعيد
٣- حسام ماهر قرني

محضر انبات حالة



الموضوع انبات الزيادة في سعر المادة المحجّرة

انه في يوم السبت الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- | | |
|---|---------------------------------|
| ١- السيد المهندس / احمد محمود ابو دقيرة | عن الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر | عن الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٣- السيد المهندس / احمد سعيد | عن مكتب د/خالد قنديل الاستشاري |
| ٤- السيد المهندس / احمد فضل | عن مكتب د/خالد قنديل الاستشاري |
| ٥- السيد المهندس / حسام ماهر قرني | عن شركة الحسام للمقاولات |

حيث تمت ازالة محجر التربة (المصرية) على طريق وادى النظرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجّرة وقد تبين الاتي:
سعر المادة المحجّرة ٣٥ ج (خمسة وثلاثون جنيه فقط لا غير) ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

واقفل المحضر على ذلك
التوقيعات

- ١- السيد المهندس / احمد محمود ابو دقيرة
- ٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
- ٣- السيد المهندس / احمد سعيد
- ٤- السيد المهندس / احمد فضل
- ٥- السيد المهندس / حسام ماهر قرني

محضر اجتماع

المجلس الإداري للهيئة العامة للمهندسين

أدلى في يوم السبت الموافق 2022/7/2 في اجتماع الهيئة بحضور كلا من:

- 1- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقينة
 - 2- السيد المهندس / أحمد عادل الشاذلي
 - 3- السيد المهندس / أحمد عبد الحكيم
 - 4- السيد المهندس / حسام ماهر قرني
- عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن مكتب د. خالد قنديل الاستشاري
عن شركة الحديام للمقاولات

حيث تمت زيارة منحجر التربة (المشجدة 0309861) على طريق مدين الإسكندرية
المنحجر الواقع للوقوف على بعض قيمة السادة المنحجرة وقد تبين الآتي:
منحجر المادة الحجرية (ج) (أريفة) وتحتوي حصى تحتية من الإسفلت من الإسفلت
2022/7/2 حتى الآن.

واقفل المحضر على ذلك
التوقيعات

- 1- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقينة
- 2- السيد المهندس / أحمد عادل الشاذلي
- 3- السيد المهندس / أحمد عبد الحكيم
- 4- السيد المهندس / حسام ماهر قرني



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- بخصوص / إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٩٥٠٠٠ الى كم ٢٩٧٠٠٠ بطول ٢٠ كم اتجاه النوبارية .
- تنفيذ شركة : الحسام للمقاولات العمومية .
- عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٦) .

- تشرف أن نرفق لسيادتكم طيه صورة لكتاب الشركة والتي تطلب مدة إضافية قدرها شهرين حيث أن

تاريخ إستلام الموقع ٢٠٢٢ / ١١ / ٠٨ .

تاريخ النهي طبقا للتعاقد ٢٠٢٣ / ٧ / ٧ .

وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٢ والذي يفيد بموافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمقهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضى نص المادة (٤٨) من القانون المذكور والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة شهرين . (مرفق)

لذا يرجى التكرم من سيادتكم بالموافقة على إضافة عدد (٢) شهر / ٩ / ٢٠٢٣

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس الإدارة المركزية
بالمنطقة الثالثة عشر بالبصرة وكفر الشيخ
السيد اللواء / ج / أحمد باسم حسني الكركلي

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

السيد اللواء أ.ح / احمد باسم حسنى الكردانى

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص :- أعمال إستكمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم ٢٩٥٠٠ الى كم ٢٩٧٠٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه النوبارية .

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على مدة اضافية قدرها شهرين العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦١٦)
اتجاه السادات حيث ان تاريخ العقد ٢٠٢٢/١٠/٣١ وتاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١١/٨ وتاريخ
النهاي التعاقدى ٢٠٢٣/٧/٧ ونرجو مد المدة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٦ .

التوقيع : (احمد باسم حسنى الكردانى)
مهندس / احمد محمود ابودقيقة
رئيس مجلس ادارة الشركة

١- راي السيد المهندس مدير المشروع

التوقيع : (احمد باسم حسنى الكردانى)
مهندس / احمد محمود ابودقيقة
مدير المشروع

استندم ارجو التكرم بالموافقة

٢- قرار السيد اللواء رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الثالثة عشر

التوقيع : (احمد باسم حسنى الكردانى)
لواء أ.ح / احمد باسم حسنى الكردانى
رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الثالثة عشر
بالبخيرة وكفر الشيخ

ادام



كتاب دوري لجميع السادة الوزراء
والماثلين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد ...

نسوة التماسك بالإنابة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرئها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطتها التنفيذية المقررة بمقتضى نص المادة (٤٨) من القانون المذكور والمادة (١٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مدة فترة تنفيذ العقود - للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة - دون فرض فواصل أو غرامات ناخير لعدة شهور ، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، دعماً للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية.

يرجي التكرم باتخاذ اللازم لتنفيذ القرار بمجلس الوزراء المشار إليه.

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام ...

لواء أ.ح/ عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن

٢٠٢٢ / ١

أمين عام مجلس الوزراء
