

مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء - C

قسم : المعقود
المبلغ المستحق إلى : شركة التجارة العامة المصرية

مجموع } الطلبات طيه ، أو :
م ج ا ع (ع)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : مستحق المصارف المصرفية
يسحب باسم
يرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكلمات المنوط

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

۸۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

٢٠١ ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد محب

شيد
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الحوالات

(٥) أدرج في كشف الشبكات
رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيفه
إدين صرف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠١

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقه (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 06/08/2023

التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-16 وحتى 2023-09-23

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم القطعة	البند	الوحدة	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة التنفيذ
B5	اعمال حفر في تربيه شديده التماسك	3م	410,346	381,921	28,425	93%
	اعمال حفر في تربيه صخريه		275,477	218,875	56,602	79%

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م/

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج

الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقه (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 06/08/2023

التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-23 وحتى 2023-09-30

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم القطعة	البند	الوحدة	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة التنفيذ
B5	اعمال حفر في تربيه شديده التماسك	3م	410,346	396,133	14,213	97%
	اعمال حفر في تربيه صخرية		275,477	247,175	28,302	90%

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

1 م

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسيلنج

الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقه (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 06/08/2023

التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-30 حتي 2023-10-07

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم القطعة	البند	الوحدة	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة التنفيذ
B5	اعمال حفر في تربه شديده التماسك	م3	410,346	410,346	0	100%
	اعمال حفر في تربه صخريه		275,477	275,477	0	100%

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م /

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج

الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقه (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 06/08/2023

التقرير الشهرى في الفترة من 2023-09-03 وحتى 2023-10-20

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم القطعة	البند	الوحدة	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة التنفيذ
B5	اعمال حفر في تربيه شديده التماسك	م3	410,346	410,346	0	100%
	اعمال حفر في تربيه صخريه		275,477	275,477	0	100%

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

مكتب إنترانس كونسلتنج

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

م /

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر
العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 06/08/2023

التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-16 حتي 2023-09-23

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم القطعة	البند	الوحدة	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة التنفيذ
B5	اعمال حفر في تربيه شديده التماسك	3م	410,346	381,921	28,425	93%
	اعمال حفر في تربيه صخرية		275,477	218,875	56,602	79%

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م /

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه



تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقه (B5) القطاع الاول بالامر المباشر

بتاريخ : 06/08/2023

العقد رقم : (149/2023/2024)

التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-23 حتي 2023-09-30

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم القطعة	البند	الوحدة	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة التنفيذ
B5	اعمال حفر في تربيه شديده التماسك	م3	410,346	396,133	14,213	97%
	اعمال حفر في تربيه صخريه		275,477	247,175	28,302	90%

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م /

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسولنج

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه



تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر
العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 06/08/2023

التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-30 وحتى 2023-10-07

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم القطعة	البند	الوحدة	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة التنفيذ
B5	اعمال حفر في تربه شديده التماسك	م3	410,346	410,346	0	100%
	اعمال حفر في تربه صخرية		275,477	275,477	0	100%

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

م /

مكتب إنترانس كونسلتنج



تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر
العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 06/08/2023

التقرير شهري في الفترة من 2023-09-03 حتي 2023-11-20

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم القطعة	البند	الوحدة	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة التنفيذ
B5	اعمال حفر في تربيه شديده التماسك	م3	410,346	410,346	0	100%
	اعمال حفر في تربيه صخرية		275,477	275,477	0	100%

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف


مكتب إنترانس كونسيلتنج

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

م /

EnTrans
CONSULTING

الشركة المنفذة
الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم 2 لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح القطاع الثانى B5 عقد 149 - 2023 - 2024 تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ 
نصر محمد نصر طيخ



١٣ / ١٤ / ٢٠٢٢



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) اسناد اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم بمنطقة الورش المركزية القطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

تنفيذ شركة / منشأة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٧

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

برنامج زمني

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

محضر مسافة نقل

خطاب محملات



يعتمد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقه (B5) القطاع الاول بالامر المباشر

عقد رقم (149/2023/2024)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 2023/08/08

تاريخ النھو المقرر : 2024/04/07

تاريخ النھو الفعلي : 2023/10/08

قيمة العملية : 20,000,000 مليون جنيه

قيمة العملية حسب الختامي : 18,801,572.70 مليون جنيه

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الشناوى للمقاولات

م / محمد م / محمد م / محمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / محمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

عقد رقم (149/2023/2024)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه : لم يستخدم ماده محجريه (قطع)

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة الشناوى للمقاولات

م /

م /

م /

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الثاني بالامر المباشر

عقد رقم (149/2023/2024)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد هانى محمد عطيه

بكالوريوس هندسة مدني : 2016

المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 152/5702616/2016/3

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

م /

م /

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكوابر منطقه (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

عقد رقم (149/2023/2024)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الشناوى للمقاولات

م /

م /

م /

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس /



إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقه (B5) القطاع الثاني بالامر المباشر عقد رقم (149/2023/2024) تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجزة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / 

الاستشاري

مكتب انترانس كونسلتنج

الشركة المنفذة

شركة الشناوى للمقاولات العموميه

م / 

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 

مدير عام مشروعات الطرق

م / 





الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



المنطقة الاولى المركزية

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة ختامية لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح القطاع الثانى B5 عقد 149 - 2023 - 2024 تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

نصر محمد نصر طبيخ



18/10/23



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) ختامى اسناد اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم بمنطقة الورش المركزية القطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

تنفيذ شركة / منشأة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٧

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

مقاييسه ختاميه

قوائم كميات ختاميه

اصل محضر الاستلام الابتدائي

شهادة مهندس - عمليه - معمل - محاجر

اصل محضر التقييم

خطا ٩٥١٤٤



يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيبخ



مشروع القطار الكهربائي السريع



مقاييسه معدله عقد رقم 149/2022/2023 (٢٠٢٣)

شركة الشاوي للمقاولات الصومية والتوريدات العامة اعمال الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

منطقة (B5) (القطاع الثاني)

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
اعمال الحفر					
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٩٥٦٩٣,٠٣	٣,٠٠	٢٨٧.٧٩.٧٧
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	م ^٣	٩٥٦٩٣,٠٣	٠,٨٠	٧٦٥٤,٤٢
	علاوة ٠,٨٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	م ^٣	٦٣٥٣٩,٣٨	-٠,٢٥	١٥٨٨٤,٨٥
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل - ٧٥ متر)	م ^٣	٢٢٣١٤,٦٥	-٠,٧٠	١٥٦٢,٢٦
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل - ١٢٠ متر)	م ^٣	٩٨٣٩,٠١	-١,٢٠	١١٨٠٦,٨٠
4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر 2-ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٠٥٠٧,٣٥	٨٢,٠٠	٢٥٠١٦٠٢,٧٠
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	٣٠٥٠٧,٣٥	٢,٢٠	٦٧١١٦,١٧
	علاوة ٢,٢٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	م ^٣	٨٥٧٥٦,٠٠	٨٨,٠٠	٧٥٤٦٥٢٨,٠٠
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	٨٥٧٥٦,٠٠	٢,٤٠	٢٠٥٨١٤,٤٠
	علاوة ٢,٤٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	م ^٣	٣٦٧٦٨,٠٠	٩٤,٠٠	٣٤٥٦١٩٢,٠٠
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	٣٦٧٦٨,٠٠	٢,٥٠	٩١٩٢,٠٠
	علاوة ٢,٥٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	م ^٣	١٨٣٤٦,٠٠	١٠٠,٠٠	١٨٣٤٦٠,٠٠
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١٨٣٤٦,٠٠	٢,٧٠	٤٩٥٣٤,٢٠
	علاوة ٢,٧٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	م ^٣	٥٧٨٤٥,٠٠	١,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠
	علاوة ١ جنيه / م ^٣ وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	م ^٣			
الاجمالي					
					١٨٨٠١٨٠٩,٥٦

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى
مهندس



عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

شركة / الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه			منطقة حفر B05 و منطقة حفر A04		توزيع الكميات المنصرفة على العقود حتى تاريخ 2023/ 11 / 20	
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية الاجمالية المصروفة - عقد ختامى رقم (2) القطاع الأول B05 (2024 / 2023 / 148)	الكمية الاجمالية المصروفة - عقد جاري رقم (2) القطاع الثانى B05 (2024 / 2023 / 149)	الكمية الاجمالية المصروفة علي العقود	الكمية الإجمالية المعتمدة في الحصر
3	حفرة تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	3م	314,652.62	90908	405,560.62	410,345
	علاوة السولار	3م	314,652.62	90908	405,560.62	410,345
	علاوة مسافة نقل 750 متر	3م	264,652.62	60362	325,014.62	327,492
	علاوة مسافة نقل 1200 متر	3م	0	21198	21,198.00	22,314
	علاوة مسافة نقل 1700 متر	3م	50,000	9347	59,347.00	60,539
4	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة الصخرية					
	إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢	3م	17,000.00	30507	47,507.00	47,507
	علاوة السولار بعد 4/5/2023		17,000.00	30507	47,507.00	47,507
	إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢	3م	18,500.00	85756	104,256.00	104,256
	علاوة السولار بعد 4/5/2023		18,500.00	85756	104,256.00	104,256
	إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم ^٢	3م	30,380.00	36768	67,148.00	67,148
	علاوة السولار بعد 4/5/2023		30,380.00	36768	67,148.00	67,148
	إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم ^٢	3م	38,220.00	18346	56,566.00	56,566
	علاوة السولار بعد 4/5/2023		38,220.00	18346	56,566.00	56,566
	كمية علاوة عمق من 8 متر الى 30 متر اسفل منسوب الأرض الطبيعية لبند الحفر	3م	221,872	57845	279,717	279,717

الهينة العامة للطرق و الكبارى

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

م /

م /

الإستشاري المشرف
مكتب إنترانس كونسولنج

استشاري المساحة
مشروع القطار الكهربائي السريع

الشركة المنفذة

شركة / الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

م /

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

الكميات المنفذة حتى تاريخ 20 / 11 / 2023

منطقة حفر B05 و منطقة حفر A04

شركة : الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

ملاحظات	إجمالي كميات القطعتين			Zone A04						Zone B05						الوحدة	البند
	إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 4 مايو 2023	الكمية الكلية م3	إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 4 مايو 2023	الكمية الكلية م3	تصنيف إجهاد الصخر			إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 4 مايو 2023	الكمية الكلية م3	تصنيف إجهاد الصخر				
							البند	متوسط الإجهاد حسب التقرير	الـ Zone				البند	متوسط الإجهاد حسب التقرير			
	410,345	0	410,345	22,314		22,314				388,031		388,031			3م	حفرة تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	
	0	0	327,492			0						327,492				3 مسافة نقل 750 متر	
	0	0	22,314			22,314						0				مسافة نقل 1200 متر	
	0	0	60,539			0						60,539				مسافة نقل 1700 متر	
															3م	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية	
ملخص إجهادات الصخر للقطعتين			43,033		43,033	كجم/سم2 400-500	485	A04 Z-1	32,764		32,764	كجم/سم2 300-400	388			B05 Z-1	
كل كميات الصخر بعد 04/05/2023 04 مايو 2023	0	كجم/سم1 100-200	14,935		14,935	كجم/سم2 400-500	427	A04 Z-2	14,669		14,669	كجم/سم2 500-600	460			B05 Z-2	
	0	كجم/سم2 200-300	14,743		14,743	كجم/سم2 300-400	382	A04 Z-3	3,846		3,846	كجم/سم2 400-500	460			B05 Z-3	
	47,507	كجم/سم3 300-400	3,492		3,492	كجم/سم2 400-500	463	A04 Z-4	52,479		52,479	كجم/سم2 500-600	546			B05 Z-4	
	104,256	كجم/سم2 400-500	9,007		9,007	كجم/سم2 400-500	428	A04 Z-5	29,943		29,943	كجم/سم2 400-500	454			B05 Z-5	
	67,148	كجم/سم3 500-600							39,778		39,778	كجم/سم2 700-800	715			B05 Z-6	
	56,566	كجم/سم4 600-700							9,781		9,781	كجم/سم2 600-700	682			B05 Z-7	
									7,007		7,007	كجم/سم2 800-900	870			B05 Z-8	
			685,822			107,524						578,298			3م	إجمالي كميات الحفر	
	0	0	279,717			0						279,717			3م	كمية علاوة عمق من 8 متر إلى 30 متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية لبند الحفر	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الإستشاري المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

شركة / الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة




**مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن طلب الشركة المنفذة بصرف كميات القطع بالقطعة A4 (ضمن أعمال القطع في الورش
المركزية) علي العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٩) لوجود فائض مالي به
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات العمومية
اشراف المنطقة الاولى المركزية**


أولاً :- الموضوع :
بشأن / طلب الموافقة علي صرف كميات القطع بالقطعة A4 (ضمن أعمال القطع في الورشة
المركزية) علي العقد عاليه لوجود فائض مالي علي العقد عاليه عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٩)
بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٦ .

ثانياً :- الاجراءات :
ورد كتاب الشركة المنفذة الذي تطلب قيمة صرف كميات القطع بالقطعة A4 (ضمن أعمال القطع
في الورش المركزية) علي العقد لوجود فائض مالي علي العقد عاليه .
ورد كتاب المنطقة الاولى (المركزية) بخصوص صرف كميات القطع بالقطعة A4 بالورشة
المركزية علي العقد عاليه .


المطالب
- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي رأي المنطقة بخصوص صرف كميات القطع
بالقطعة A4 بالورشة المركزية علي العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٦ شركة
الشناوي للمقاولات .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندس / منال السيد عمر
مدير عام صيانة الطرق

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / هسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أرسله

تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق
اكتوبر منطقه (B5) القطاع الثاني بالامر المباشر
العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 2023-08-06

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه منطقة B5

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير التنفيذ للطرق	1	10
2	مدير المكتب الفنى	1	5
3	مدير ضبط الجودة	1	5
4	مدير السلامة الوقائيه	1	10
5	مهندس تنفيذ طرق	1	5
6	مهندس صيانه (ميكانيكا وكهرباء)	1	5
7	مهندس تخطيط وبرامج زمني	1	5
8	مراقب تنفيذ / فنى مواد	2	5
9	حاسب كميات	1	5
10	فنى سلامه مروريه	2	5
11	مساح	2	7

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م /

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج

الشركة المنفذة
الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق
اكتوبر منطقه (B5) القطاع الاول بالامر المباشر
العقد رقم : (149/2023/2024) بتاريخ : 2023-08-06

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	حفار	20
2	قلاب	30
3	بلدوزر	3
4	لودر	5

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م /



الإستشارى المشرف

مكتب الترانس كونسلتنج



الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه





محضر معاينة مسافة النقل

بالإشارة الى قيام شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة بعملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B٥) القطاع الثاني عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٩ للقطعة A٤ فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٥

بحضور كلاً من :-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
ممثل سيسترا للإستشارات الهندسية
ممثل مكتب انترانس كونسلتنج استشارى الهيئة
ممثل مكتب XYZ
ممثل شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات

١- م- /
٢- م- /
٣- م- /
٤- م- /
٥- م- /
العامة

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نواتج الحفر من القطاع الى المقالب المحددة من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١٢٠٠) م منطقة (A٤) عن مكان المقالب المعتمد .

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

٥- م- /
٤- م- /
٣- م- /
٢- م- /
١- م- /

الاسم :

٥- م- /
٤- م- /
٣- م- /
٢- م- /
١- م- /



مشروع القطار الكهربائي السريع



قوائم كميات عقد رقم 149/2022/2023


شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة أعمال الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

منطقة (B5) (القطاع الثاني)

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
3	أعمال الحفر		
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتناسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والورش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	م ³	90692,00
	علاوة 80,00 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد 4 / 5 / 2023	م ³	90692,00
	علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل 750 متر)	م ³	61828,00
	علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل 1200 متر)	م ³	22314,00
4	علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل 1700 متر)	م ³	9829,00
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند		
	1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر		
	2- أرتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 ٪) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		
	ذات اجهاد (200-300) كجم/سم ²	م ³	3007,00
	علاوة 2,20 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد 4 / 5 / 2023	م ³	3007,00
	ذات اجهاد (400-500) كجم/سم ²	م ³	80706,00
	علاوة 2,40 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد 4 / 5 / 2023	م ³	80706,00
	ذات اجهاد (600-700) كجم/سم ²	م ³	36768,00
	علاوة 2,50 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد 4 / 5 / 2023	م ³	36768,00
	ذات اجهاد (700-800) كجم/سم ²	م ³	18346,00
	علاوة 2,70 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد 4 / 5 / 2023	م ³	18346,00
	علاوة 1 جنيه / م ³ وذلك بعد اول 8 متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	م ³	07840,00

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى
مهندس /





محضر تسليم مقلب شركة الشناوى

بالإشارة الى التكليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة بشأن أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B5) القطاع الأول والثانى عقد رقم : 2024/2023/148 وعقد رقم : 2024/2023/149 , تم تسليم المقلب الخاص بشركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة على المنسوب المطلوب وتم تسويته وخالى من كافة الشوائب .

الاسم :

1- كدهاى

2- على ربيع

3- شمس

4- عبد الله

5- علاء محمد البهارى

التوقيع :

1- كدهاى


2- على ربيع

3- شمس

4- عبد الله


5- علاء محمد البهارى

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة
احداثيات المشون

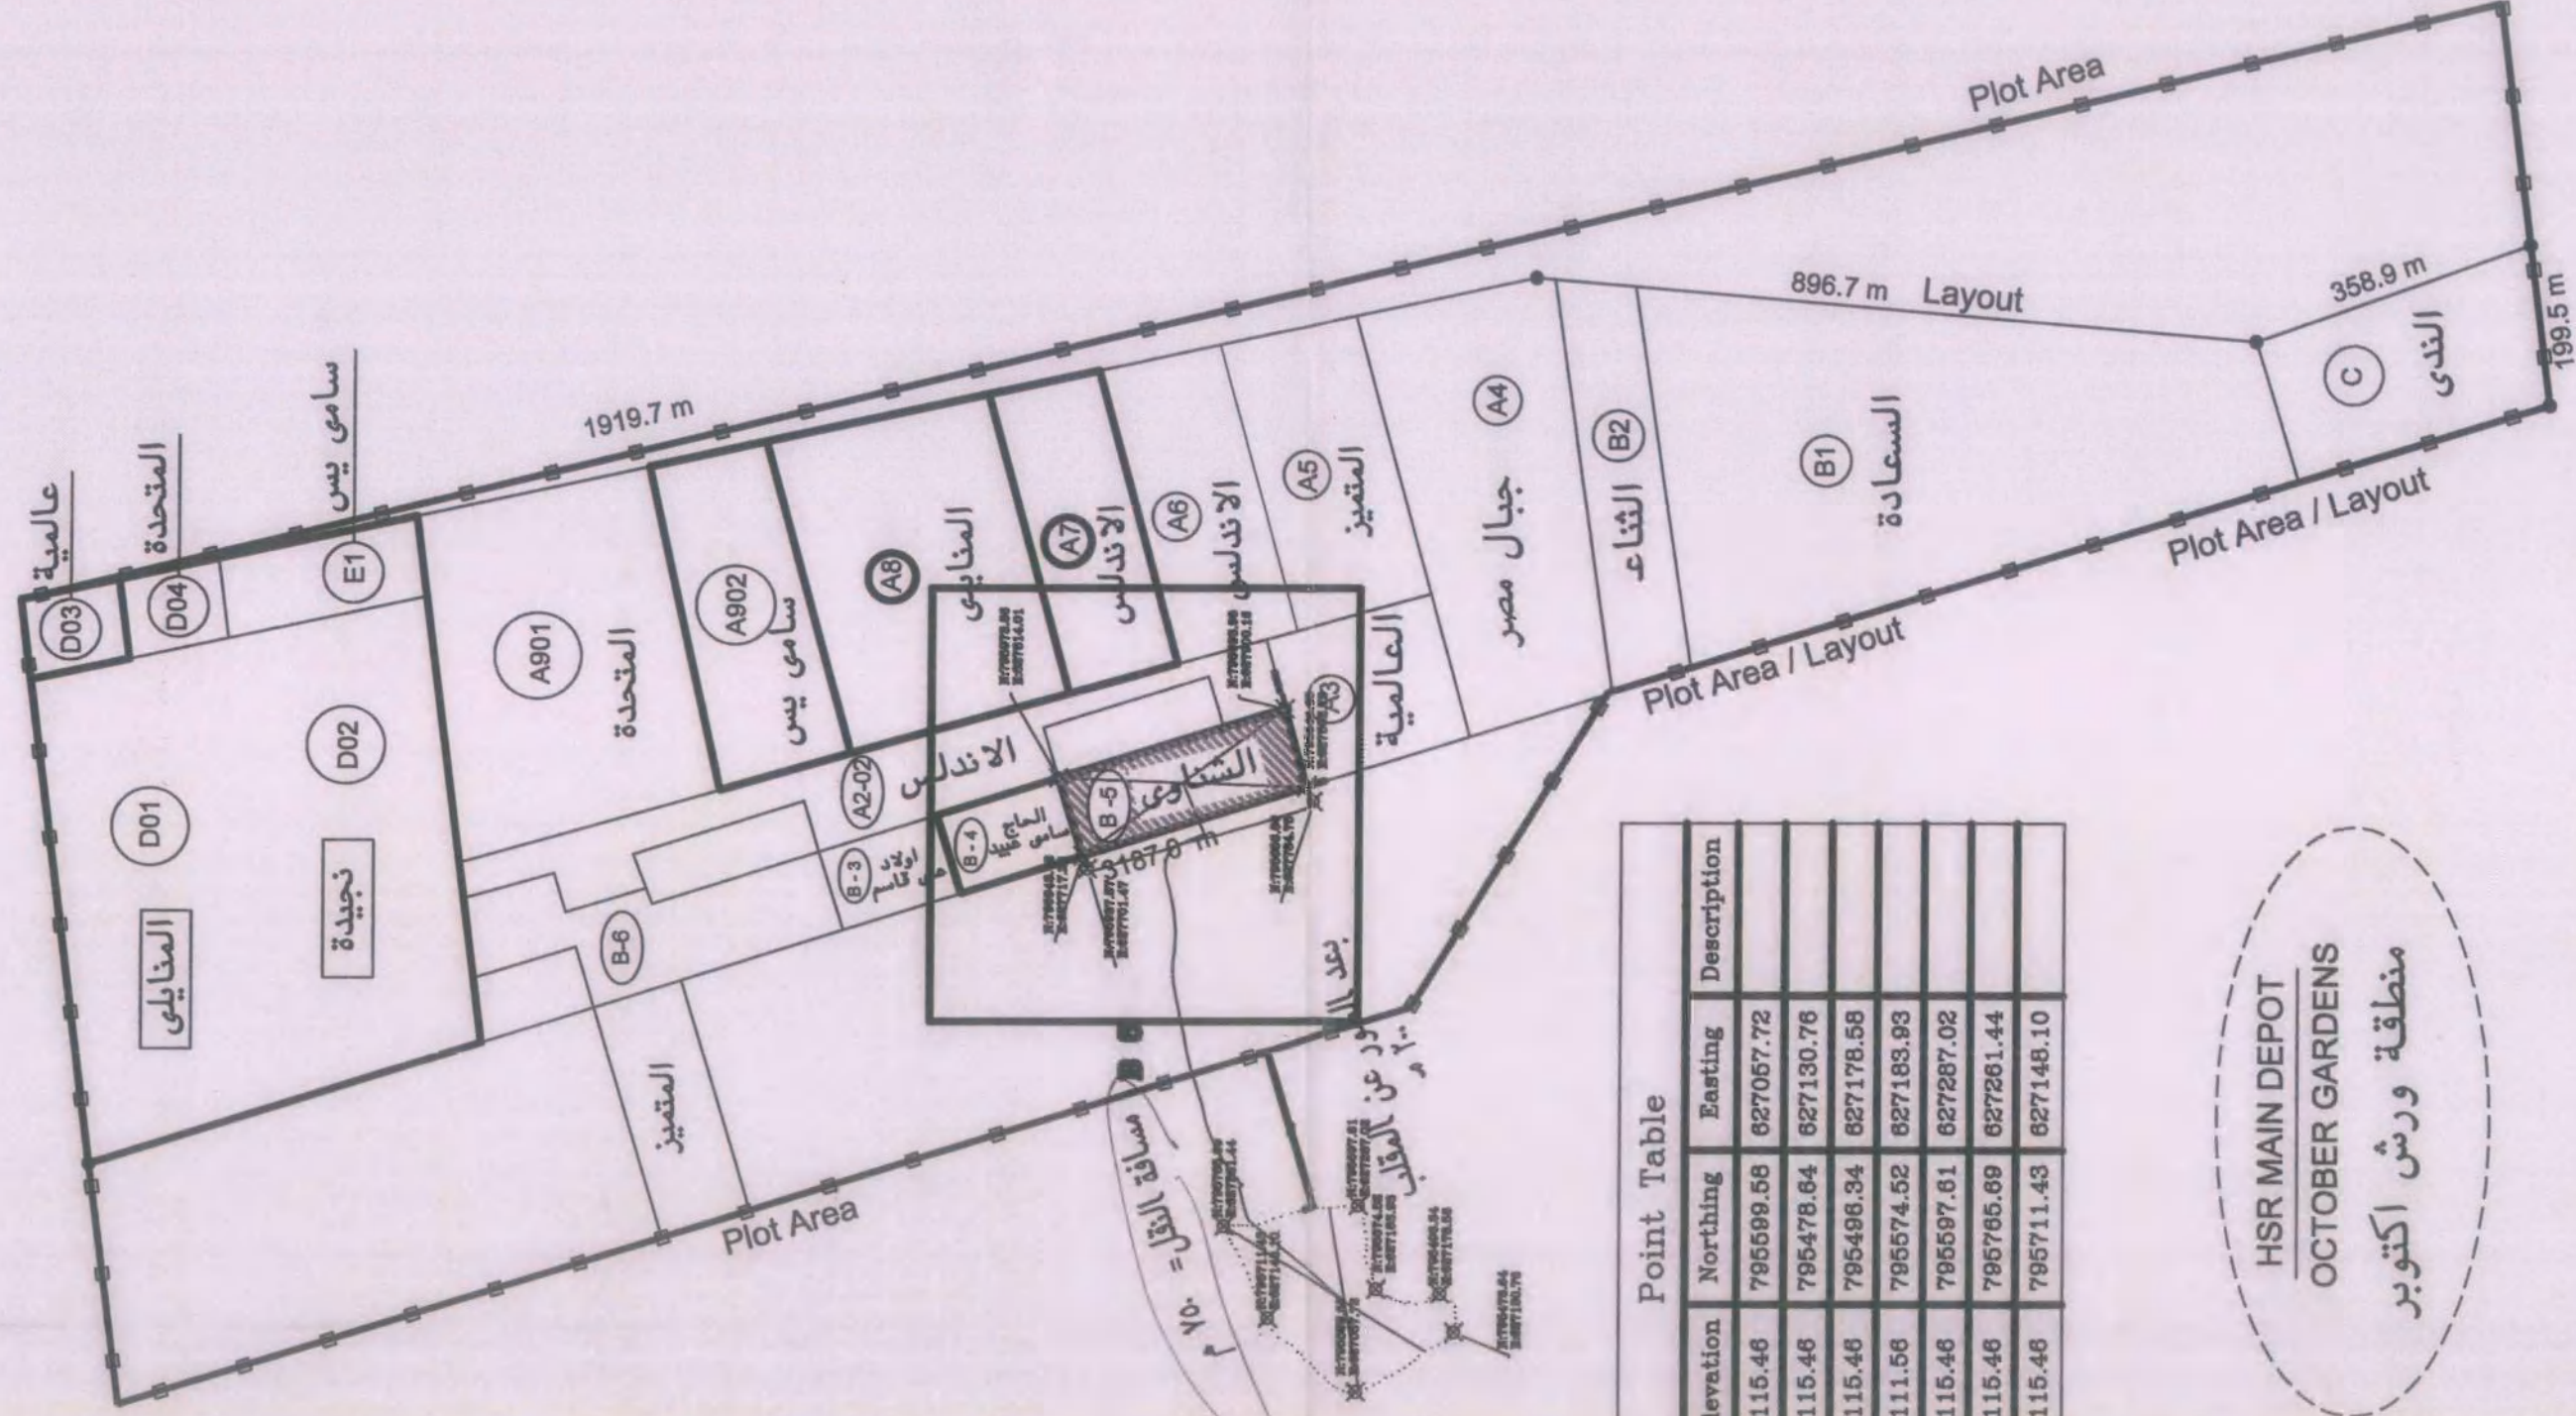

Point #	Elevation	Northing	Easting	Description
20908	115.46	795599.58	627057.72	
20909	115.46	795478.64	627130.76	
20910	115.46	795498.34	627178.58	
20911	111.56	795574.52	627183.93	
20912	115.46	795597.61	627287.02	
20913	115.46	795765.69	627261.44	
20914	115.46	795711.43	627148.10	

HSR MAIN DEPOT
OCTOBER GARDENS
منطقة ورش اكتوبر

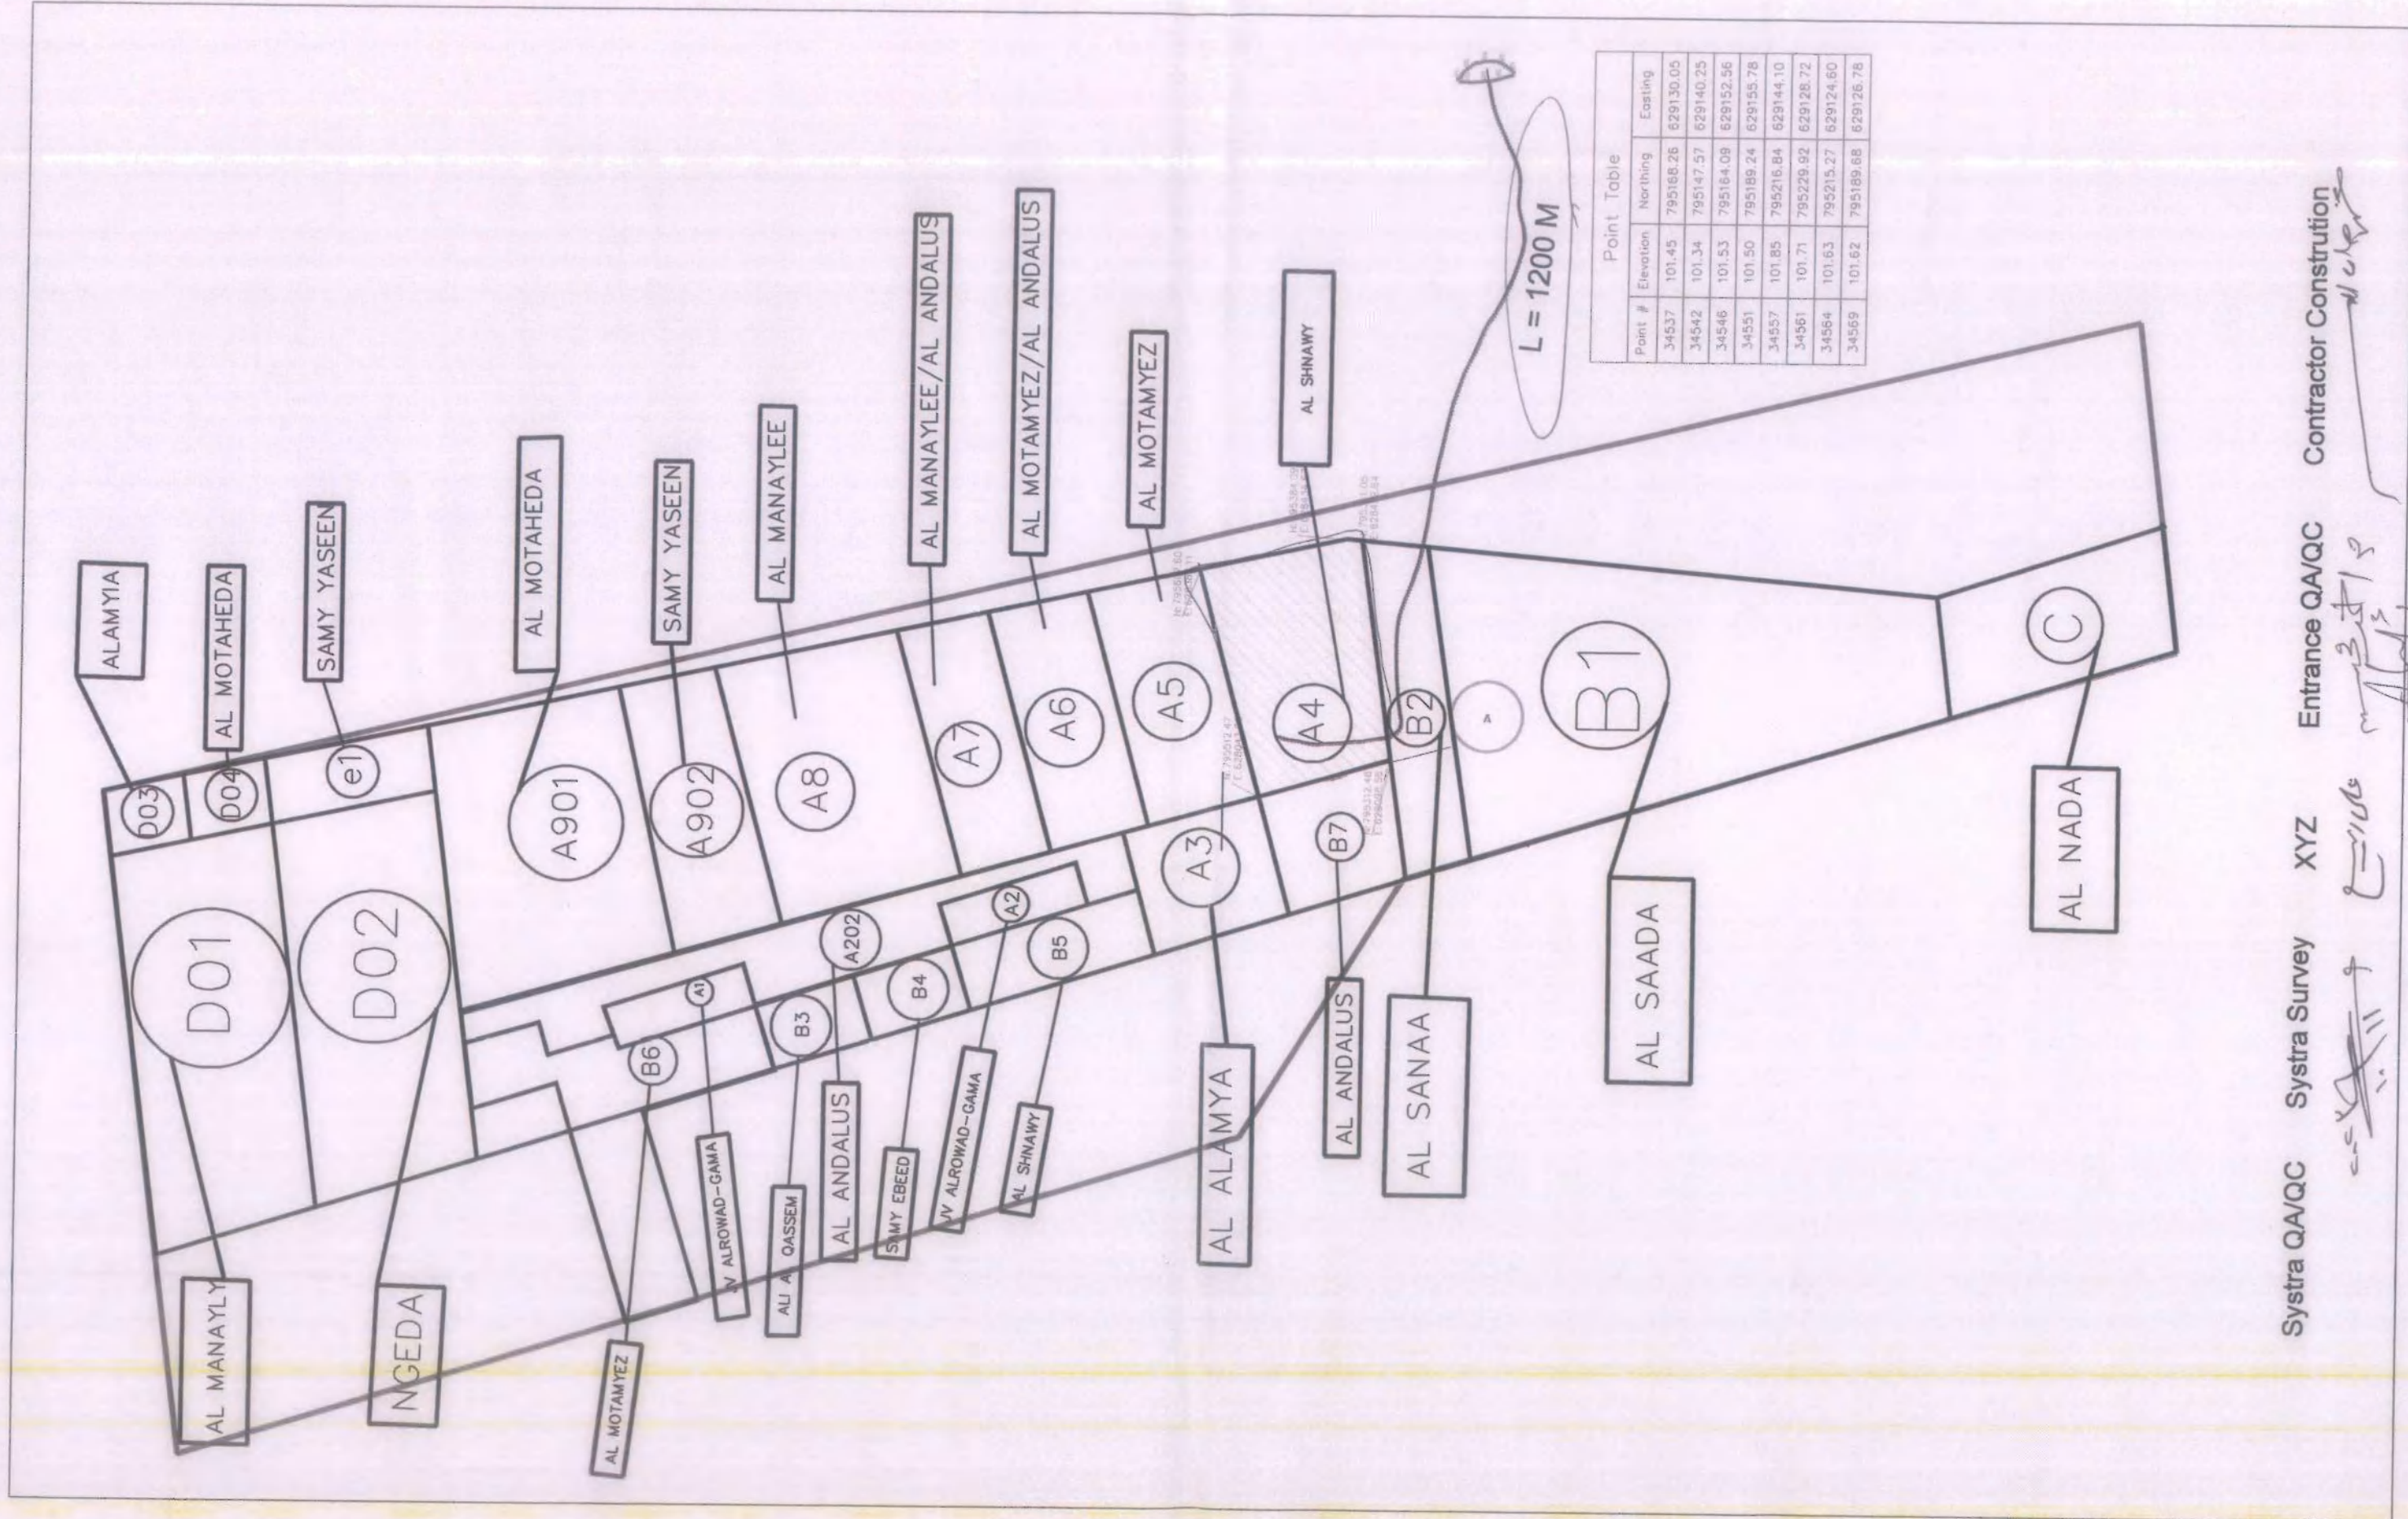

Sysra QA/QC Sysra Survey XYZ Entrance QA/QC Contractor Constrution
Handwritten signatures and initials are present below the labels.



محضر معاينة مسافة النقل

بالإشارة الى قيام شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة بعملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B٥) القطاع الثاني عقد رقم : ٢٠٢٣/١٤٩/٢٠٢٤ للقطعة A٤ فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٥

بحضور كلاً من :-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
ممثل سيسترا للاستشارات الهندسية
ممثل مكتب انترانس كونسولتنج استشارى الهيئة
ممثل مكتب XYZ
ممثل شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات

١- م /
٢- م /
٣- م /
٤- م /
٥- م /
العامة

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نواتج الحفر من القطاع الى المقالب المحددة من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١٢٠٠) م منطقة (A٤) عن مكان المقلب المعتمد .

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

٥- م /
٤- م /
٣- م /
٢- م /
١- م /

الاسم :

٥- م /
٤- م /
٣- م /
٢- م /
١- م /



محضر معاينة مسافة النقل

بالإشارة الى قيام شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة بعملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B٥) القطاع الثاني عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٠٢٤ فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/١٦

بحضور كلاً من :-

- ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ممثل سيسترا للاستشارات الهندسية
- ممثل مكتب انترانس كونسولتنج استشارى الهيئة
- ممثل مكتب XYZ
- ممثل شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات

١- م/ م. ل. محمد
٢- م/ م. محمد
٣- م/ م. محمد
٤- م/ م. محمد
٥- م/ م. محمد
العامة

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نواتج الحفر من القطاع الى المقالب المحددة من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١٢٠٠) م منطقة (B٥) عن مكان المقلب المعتمد .

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

٥- م. محمد

٥- م. محمد

٤- م. محمد

٤- م. محمد

٣- م. محمد

٣- م. محمد

٢- م. محمد

٢- م. محمد

١- م. محمد

١- م. محمد

المجلة ٥٤ ٨٤

