

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق جرجا/العسيرات بطول ٣.٨٢٥ كم من مدخل المنسأه وباتجاه جرجا من الكم ١٤.٥٢٥ حتى الكم ١٨.٣٥٠ ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة ابناء ابو خروف لانشاء الطرق والتوريدات العمومية) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢٩)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٤ / ٧

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢٠٢٥ ق٢٠٢٥ عن عملية

رفع كفاءة طريق ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ كم بإقليم قنا المنشاء باتجاه

جبل السلام ١٤,٥٠٠ متر الخ ١٨,٢٥٠ متر الإقليم ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ (في اتجاه كرم)

عن شهر مارس ٢٠٢٥ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٩٨٨ ٤٤٤١-	جملة الاعمال	١٦ ٠٥٥ ٠٠٠
١٩ ٦٦٧ ٢٢٤١-	السابق صرفه	٨١ ٦٦٠
	تأمين ٥%	
	دمغات	
	خصم معمل المنطقة	
٢٢١ ١١٠٠-	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
إدارة يوفرون لانشاء الطرق والتوسيع القومي وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برأى لمعاليه

تحريرا: ٢٠٢٥/٤/١٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



بيانات الفواتير				رقم
قرش	جنية	التاريخ	رقم	الختم ذو التاريخ
١٠	١٠	٢٠١١		
١٠	١٠	٢٠١١		

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى
الطلبات طبية أو ..
بموجب
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

عدد المرفقات		بيانات		نوع الخصم					
				بند	لصل	فرع	قسم	جنية	قرش
		أقنع كفاده طريقه لمراد العسرات بطول ٢٨٥٠ سم					٢٩١١٠	١١٠	١٠
		سرايم ١٨٠٠٠ من قبل المنشأة بإتجاه مراد العسرات ١٤/٥٢٥							
		من الم ١٨٠٢٥٠ من الماد ٥٠٠٠٠ (سرايم كريمة)		إجمالي الأصل				١١٠	١٠
		بيانات الاستقطاعات		جنية		مليم			
		عادي إضافي دمنغة توقيع							
		قرش جنية قرش جنية قرش							
		رسم الدمنغة							
		صافي القيمة المطلوب صرفها						١١٠	١٠

رئيس المصلحة

علامة

— سنّة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات. _____ الإمضاء _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف _____ الإمضاء _____
جاري _____
(أو) بأن للمبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____
الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح رقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ: (٣) سيجب / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ امضاء الكاتب المنوط _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

شيك / إذن صرف إضفاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة (٦) استلمت

شهادة

مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق جرجا / العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بدايه من مدخل المنشاه وباتجاه جرجا (من

لكم ١٤,٥٢٥ حتي الكم ١٨,٣٥٠) ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة سوهاج

نفيز : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والكباري والتوريدات العمومية

• **تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات**

المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

١٢ محمد العطا



رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين

شهادة المهندسين

• مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق جرجا / العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بدايه من مدخل المنشاه وباتجاه جرجا

(من الكم ١٤,٥٢٥ حتي الكم ١٨,٣٥٠) ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة سوهاج

• تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والكباري والتوريدات العمومية

• أسم مهندسي الشركة المنفذة :

١- السيد المهندس / محمد عبد اللطيف الوتيدي

٢- السيد المهندس / محمد ممدوح مجاهد

٣- السيد المهندس / محمد راضي علي مجاهد

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف



مدير المشروع / محمد عبد العاطي

١٣٠٠٠٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بدايه من مدخل المنشاه وباتجاه جرجا (من الكم ١٤,٥٢٥ حتي الكم ١٨,٣٥٠) ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة سوهاج
- تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والكباري والتوريدات العمومية
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .
بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف


مدير المعمل

مهندس / ابتسام احمد عارف



جهاز الاشراف

مهندس / محمد عبد العاطي



تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية




عماد حسين



شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق جرجا / العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بدايه من مدخل المنشاه وباتجاه جرجا (من الكم ١٤,٥٢٥ حتي الكم ١٨,٣٥٠) ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة سوهاج
- تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لانشاء الطرق والكبارى والتوريدات العمومية
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف العملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التى تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

مهندس / محمد عبد العاطي


المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين



مقاييس ختامية

مشروع :- رفع كفاءة طريق جرجا العسيرات بطول 3.510 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا
(من كيلو 14.205 إلى كيلو 17.715) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لأعمال الطرق والتوريدات العمومية

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
٦١٨١٦٤٤	٨٤	٧٣٥٩١	2م	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك 30سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح علي ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب .
٩١٨٠٦٠٠	٣٩٠٠,٠	٢٣٥٤	طن	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت بورتلاندى عادى رتبة 42.5 وطبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة و تعليمات المهندس المشرف و حسب النسبة المطلوبة .
٦٣٠٠٠	31.50	2,000.00	3م	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد علي طبقات بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
٤٥٦٣٢٠٠	٤٦٠	٩٩٢٠	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % وألا يزيد الإمتصاص عن 10 % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .مسافة النقل 60 كم . - يتم احتساب علاوة 1,7 جنية لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1,4 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .
.	٣٧,٥	.	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 0.75 كجم/م2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
.	٣١٩,٠	.	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
.	١٥٠٠,٠	.	وحدة	بالعدد ضبط مناسب أغشية غرف الصرف الصحي ومحابس المياه أو التليفونات وغرف التفتيش الخاصة بالمواطنين بالخفض أو الرفع والبند يشمل جميع ما يلزم من أعمال الفك والتركيب والتجيبش بالخرسانة العادية أو المسلحة (في حالة غرف المياه) والتثبيت طبقا لتعليمات و حسب مواصفات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والفئة شاملة بالمقطوعة و حسب تعليمات المهندس المشرف و العمل داخل نطاق المركز والفئة شاملة بالعدد .
١٩٩٨٨٤٤٤,٠				الاجمالي

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

تحريرا في 2025/ /

مقاييس ختامية

مشروع :- رفع كفاءة طريق جرجا العسيرات بطول 3.510 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا
(من كيلو 14.205 إلى كيلو 17.715) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لأعمال الطرق والتوريدات العمومية

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
٦١٨١٦٤٤	٨٤	٧٣٥٩١	2م	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك 30سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمر المسطح علي ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب .
٩١٨٠٦٠٠	٣٩٠٠,٠	٢٣٥٤	طن	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت بورتلاندى عادى رتبة 42.5 وطبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة و تعليمات المهندس المشرف وحسب النسبة المطلوبة .
٦٣٠٠٠	31.50	2,000.00	3م	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد علي طبقات بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
٤٥٦٣٢٠٠	٤٦٠	٩٩٢٠	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % والا يزيد الإمتصاص عن 10 % وفرداها علي طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ,مسافة النقل 60 كم . - يتم احتساب علاوة 1,7 جنية لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1,4 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .
.	٣٧,٥	.	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 0.75 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
.	٣١٩,٠	.	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
.	١٥٠٠,٠	.	وحدة	بالعدد ضبط مناسب أغشية غرف الصرف الصحي ومحابس المياه أو التليفونات وغرف التفتيش الخاصة بالمواطنين بالخفض أو الرفع والبند يشمل جميع ما يلزم من أعمال الفك والتركيب والتجيش بالخرسانة العادية أو المسلحة (في حالة غرف المياه) والتثبيت طبقا لتعليمات و حسب مواصفات شركة مياه الشرب والصرف الصحي و الفئة شاملة بالمقطوعية و حسب تعليمات المهندس المشرف والعمل داخل نطاق المركز والفئة شاملة بالعدد .
١٩٩٨٨٤٤٤,٠				الاجمالي

تحريراً في / / 2025

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

لهم

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وياتجاه جرجا (من كيلو 14+525 الى كيلو 18+350) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (1)		بالمتر المسطح اعمال FDR	
تنفيذ شركة : أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والكبارى والتوريدات العمومية			
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى 2م
	الى	من	
FDR أعمال	18+350	14+525	73591
الاجمالى			
73591	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		73591
73591	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		73591
0	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		0
73591	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		73591
مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى التوقيع /  مهندس الشركة المنفذة التوقيع / 			

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وابتجاه جرجا (من كيلو 14+525 الى كيلو 18+350) ضمن مبادرة حياة كريمة

بالطن اعمال توريد وضافة الاسمنت

رقم البند وبيانه: (2)

تنفيذ شركة : أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والكبارى والتوريدات العمومية

الاجمالى بالطن	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
		الى	من	
2354	3825	18+350	14+525	اعمال الاسمنت

الاجمالى

2354	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
2354	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
0	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
2354	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة و باتجاه جرجا (من كيلو 14+525 الى كيلو 18+350) ضمن مبادرة حماية كريمة

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة

رقم البند وبيانه: (3)

تنفيذ شركة : أبناء أبو خروف لانشاء الطرق والكبارى والتوريدات العمومية

الاجمالى 3م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
		الى	من	
2000	3825	18+350	14+525	أعمال الحفر

الاجمالى

2000	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
860	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
1,140	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
2,000	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص : (اختتامى)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.925 كم بداية من مدخل الى منشأة ويتجه جرجا (من كيلو 14+350 الى كيلو 18+350) ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسبك المحدد

رقم البند وبيانه: (4)

تنفيذ شركة : أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والكبارى والتوريدات العمومية

الاجمالى م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
		الى	من	
10000	3825	18+350	14+525	أعمال الاساس

الاجمالى

10000	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
9300	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
9300	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /

محضر أستلام أبتدائي

لمشروع:- اعمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة و باتجاه جرجا من الكم 14+525 حتى الكم 18+350 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد (2025/2024/729)

تنفيذ : شركة أبناء أبوخروف للطرق و المقاولات

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/ 4 / 8 وبناءا على القرار الإداري رقم (86) بتاريخ 2025 / 3 / 20 الصادر من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي للعملية عاليه فقد أجتملت اللجنة المشكلة من السادة الأتي أسماؤهم :-

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- مهندس / سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر رئيسا |
| 2- مهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق عضوا |
| 3- مهندس / محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة عضوا |
| 4- مهندس / محمد حسني | إدارة المعامل عضوا |
| 5- مهندس / محمد عبدالعاطي | المنطقة المشرفة عضوا |
| 6- مهندس / محمد مجاهد | الشركة المنفذة عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت اللجنة إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقد تبين من الفحص و المعاينة الظاهرية التالي :-

- الأعمال المنفذة عبارة عن :-

- طبقة تدوير الاسفلت القديم (FDR) من كم 0+000 إلى كم 7+100 .

حالة سطح الطريق :-

- تم تغطية الأعمال المذكورة ضمن أعمال عملية أخرى بطبقة أسفلتية سطحية 6 سم

توصيات اللجنة :-

- 1- علي المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها فورا
 - 2- علي المنطقة متابعة سلوك الأعمال المنفذة و ابلأغ الشركة بأصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان
 - 3- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - 4- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - 5- الحصر مسنولية المنطقة المشرفة .
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ 9 / 3 / 2025 م هو تاريخ النهو الفعلي و بدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

توقيع اللجنة :

6- 


5- 

4- 

3- 

2- 

1- 




التقييم الفني

**** عملية : رفع كفاءة طريق جرجا العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا من كم 14+525 الى 18+350 ضمن مبادرة حياة كريمة عقد**

رقم 2025-2024-729

**** تنفيذ :- شركة أبناء أبو خروف للطرق والمقاولات**

**** إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا**

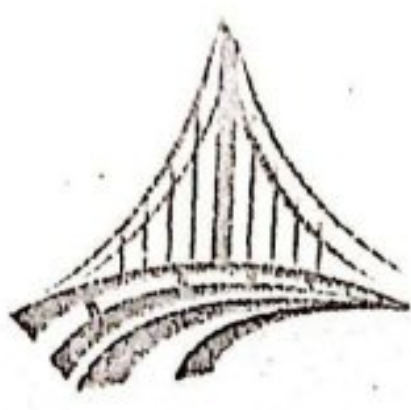

**** عملية : رفع كفاءة طريق جرجا العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا من كم 14+525 الى 18+350 ضمير مبادرة حياة كريمة عقد رقم 729-2024-2025**

**** إشراف: المنطقة الثامنة - قنا **** **تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف للطرق والمقاولات**

انه في يوم الموافق 2025/5/11 وبناء على القرار الإداري رقم (86) الصادر عن السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق بتاريخ 2025/3/20 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2025/4/8 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المهندس / السيد النبوي	مدير عام المشروعات المنطقة التاسعة - البحر الأحمر - رئيسا
المهندس / أشرف عزت	إدارة تنفيذ وصيانة الطرق - عضوا
المهندس / محمد عبد المنعم	إدارة ضبط الجودة- عضوا
المهندس / محمد حسنى عبد العليم	إدارة المعامل المركزية - عضوا
المهندس / محمد عبد العاطي	مندوب المنطقة المشرفة - عضوا
المهندس / محمد مجاهد	مندوب الشركة المنفذة - عضوا

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب العملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتى:

- الخصم على طبقة الأساس المثبت FDR : لا يوجد خصم طبقا لنتائج تجارب المنطقة المشرفة التى تمت اثناء التنفيذ
- الخصم على طبقة الأساس : لا يوجد خصم طبقا لنتائج تجارب المنطقة المشرفة التى تمت اثناء التنفيذ والاستلام
- الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي: لا يوجد خصم حيث تم تغطية الأعمال المنفذة ضمن أعمال أخرى

***** القيمة الإجمالية للخصم: صفر جنية**

التوقيعات :-
