

الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

### محضر استلام موقع

مشروع اعمال رفع كفاءه مسافة ٨٠٠ م . ط بوصطه الربط  
بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادي  
تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله

#### إشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

\* إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ٣ / ٦ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:-

- ١- السيد المهندس/ عبد الرحيم محمد حسين مدير عام التنفيذ والصيانة الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا
- ٢- السيد المهندس / أيمن منصور محمد مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا
- ٣- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون الخطيب ممثل الشركة المنفذة.

وقد قامت اللجنة باللزور على موقع العملية وتبين عدم وجود أي عوائق للتنفيذ ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع و تاريخ بدء العمل .

التوقعات :-

٣-السيد المهندس / عبد الكريم مأمون الخطيب

٢- السيد المهندس/ أيمن منصور محمد

١- السيد المهندس/ عبد الرحيم محمد حسين



مهندس/ عبد الرحيم محمد حسين  
رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا(سوهاج - قنا - الأقصر)

## حصر جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع  
حمادى

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٧ العقد رقم

بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج ٣٥ في اماكن استعدال المناسب

ملاحظات	الحجم			السمك المتوسط	عرض المتوسط	عرض	طول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
ترميم اماكن متفرقة لاستعدال الطريق	٦٢,٥٠						٦٠٠	.+٦٠٠	.+....	مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع حمادى	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج ٣٥ في اماكن استعدال المناسب	١
	٦٢,٥٠	الاجمالى										

مهندس المشروع:

مهندس الشركه:

## حصر جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الرابط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع  
Hamadi

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٧

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ٩٠ كم

ملاحظات	الحجم			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	١٧٥٤,٥٣			.٠,٢٣	١٤,٦٧٠		٥٢٠	.٠٦٠٠	.٠٠٨٠	مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الرابط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع Hamadi	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ٩٠ كم	٣
	١٧٥٤,٥٣	الاجمالى										

مهندس المشروع:


/م

مهندس الشركة:

/م

# حصر جاري ١

مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع حمادى



الإدارات المركزية للمناطق الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٤٢٣/٢٠٢٣

تنفيذ شركه:- الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تثrip من البيتومين السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى	الطول		عرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
				الى	من				الاجمالى	اضافه	خصم	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تثrip من البيتومين السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع حمادى	.+٦٠٠ .+٠٠٠	٦٠٠	١٣,٤٧				٨٠٨١,١٢			
			الاجمالى						٨٠٨١,١٢			

مهندس المشروع:

مهندس الشركة:

## حصر جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع  
Hamadi

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٦٧

بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدملك

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	عرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	٨٠٨١,١٢			١٣,٤٧		٦٠٠	.+٦٠٠	.+....	مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع Hamadi	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدملك		٥
	٨٠٨١,١٢	الاجمالى										

مهندس المشروع:

مهندس الشركه:

## حصر جاري ١



مشروع : - اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع حمادى

العقد رقم ٢٣/٢٠٢٤/١٠٦٧

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البنتونين السائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ٤,٠ كجم/٢م

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملحوظات
			إلى	من					الخصم	اضافه	الاجمالى	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البنتونين السائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ٤,٠ كجم/٢م	مشروع : - اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغري والطريق الصحراوى الغري بنجع حمادى	.+١٤٠	٠.٠٠٠	١٤٠	١١,٨٦			١٦٦٠,٥٥			
	الاجمالى								١٦٦٠,٥٥			

مهندس المشروع:

مهندس الشركة:

## حصر جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوى الغربى بنجع حمادى

العقد رقم ٢٤/٢٣/١٠٦٧

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدملك

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	١٦٦٠,٥٥			١١,٨٦			١٤٠	.+١٤٠	.+.٠٠٠	مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوى الغربى بنجع حمادى	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدملك	٧
	١٦٦٠,٥٥	الاجمالى										

مهندس المشروع:

مهندس الشركه:

تقرير رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩  
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
عمليّة / اعمال رفع كفاعة بوصلة الربط بين الطريق الزراعي  
والطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادى بطول ٨٠٠ متر  
تنفيذ / شركة الفهد للمقاولات

**السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة**

نشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار صلاحية عينات اساس تكسير	٤٦٣

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

قيمة إجراء التجارب	ضريبة القيمة المضافة %١٤	المبلغ الإجمالي
٢٨٦٠		
٤٠٠.٤		
٣٢٦٠.٤		

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥/٣/١٦

في المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسین)



مهندس /


تقرير رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩  
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعمليّة / اعمال رفع كفاءة بوصلة الربط بين الطريق الزراعي  
والطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادى بطول ٨٠٠ متر  
تنفيذ / شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/ ايمن منصور ( مهندس الهيئة )

حدود المواصفات	٤٦٣	أرقام العينات
	أساس تكسير	الطاقة المختبرة
	٤٠٠ م	الموقع الكيلومטרי
١٠٠	١٠٠	"٢٥
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٨.٩	"١.٥
٨٥-٥٥	٧٩.٣	"١
٨٠-٥٠	٦٢.٧٥	"٤/٣
٧٠-٤٠	٣٥.٢	"٨/٣
٦٠-٣٠	٢٥	رقم ٤
٥٠-٢٠	١٨.١	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٠.٥	رقم ٤٠
١٥-٥	٦.٠٥	رقم ٢٠٠
—	%٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م٣
لا تزيد عن %٢	صفر	الارتفاع
لا تقل عن %٨٠	%٨٣	C.B.R
لا تزيد عن %٣٠	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	حال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٤	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٣	نسبة الطبيعي

تحريراً في: ٢٠٢٥/٣/١٦  
في المعمل،

رئيس الإدارة المركزية  
( عماد حسين )

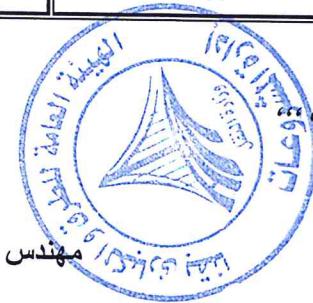

مدير المعمل

تقرير رقم / (١١٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩  
بخصوص/ نتائج الاختبارات العمليه التي تمت  
بعمليه/ وصلة حاجر هو  
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

## السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتعدد للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار دمك عينة اساس تكسير	٤٦٤

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

قيمة إجراء التجارب	ضريبة القيمة المضافة %١٤	المبلغ الإجمالي
٨٥٠		
١١٩		
٩٦٩		

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥/٣/١٨

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإداره المركزية

مهندس /

(عماد حسین)



تقرير رقم / (١١٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩  
بخصوص/ نتائج الاختبارات العمليّة التي تمت  
بعمليّة/ وصلة حاجر هو  
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

أرقام العينات	
٤٦٤	
اساس تكسير	الطبقة المختبرة
٥٠.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو مترى
%٥	نسبة المياه الملامنة
٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>
%٤.٦٤	نسبة المياه
٢.٢١	الكثافة الجافة طن/م <sup>٣</sup>
%٩٨.٧	نسبة الدمك

الإثبات  
بالمعمل  
عن المدحوك

تحرير في: ٢٠٢٥/٣/١٨

في المعمل

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عmad Hussain



تقرير رقم (١١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١  
 بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
 بعمليّة / اعمال رفع كفاءة بوصلة الربط بين الطريق الزراعي  
 والطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادى بطول ٨٠٠ متر  
 تنفيذ / شركة الفهد للمقاولات

**السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة**

ننشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار استخلاص عينة اسفلت رابطه	٤٨٢

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

١٠٠٠	قيمة إجراء التجارب
١٤٠	ضريبة القيمة المضافة %١٤
١١٤٠	المبلغ الإجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

٢٠٢٥/٣/٣٠

في المعمل

مدير المعمل  
*[Signature]*

*[Signature]*

رئيس الإداره المركزية

مهندس /  
*[Signature]*  
 عماد حسین



تقرير رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١  
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعمليّة / اعمال رفع كفاعة بوصلة الربط بين الطريق الزراعي  
والطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادى بطول ٨٠٠ متر  
تنفيذ / شركة الفهد للمقاولات


حضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/ ايمن منصور (مهندس الهيئة)

حدود المواقف	حدود السماح	٤٨٢	أرقام العينات	نسبة المئوية للamar من المناخل
		رابطة	الطبقه المختبرة	
		٣٦٠	الموقع الكيلو متري	
١٠٠-٧٥	١٠٠-٩٥	٩٧.٤	١٤/٣	
٧٠-٤٥	٥٦-٤٦	٥١.٣٣	"٨/٣	
٥٠-٣٠	٣٨.٢-٣٠.٢	٣٠.٥	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٢٩.١٥-٢٣.١٥	١٨.٧	رقم	
٢٠-٥	١٤.٧-٨.٧	٩.٢٨	رقم ٣٠	
١٢-٣	٩.٣-٣.٣	٤.٦	رقم ٥٠	
٨-٢	٤.١-٢	٢.٤٥	رقم ١٠٠	
٤-٠	٢.١-٠	١.٤٦	رقم ٢٠٠	
	%٢٠±%٤٠	%٤٦	نسبة الإسفالت	
		%٢٠	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٥/٣/٢٠

في المعلم

رئيس الإدارة المركزية

  
مهندس /  
(عماد حسين)

مدير المعلم

