

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكهات

قسم : ١١ - صرعة


المبلغ المستحق إلى : شركة مصرية للمقاولات وتجارة الحديد

الطلبات طيه ، أو : الكسوف للمرفق

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٢٧٤٠٤٠	
الجملة			

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الإدارة المالية
طارق يوسف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :

يسحب باسم : شركة مصرية للمقاولات وتجارة الحديد


ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
	بيانات			نوع الخصم			
	المبلغ	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
	٨٢٧٤٠٤٠				٨٢٧٤٠٤٠		
	٨٢٧٤٠٤٠				٨٢٧٤٠٤٠		
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع				
	قرش	قرش	قرش				
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء :


الإيرادات : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(د)

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

عملية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن
محسن طنطاى حتي كوبري الرفيع وانشاء حوائط
خرسانيه مركز سنورس بطول ٣,١٥ كم بمحافظه
الفيوم (بالامر المباشر)
بخصوص ::

تنفيذ : شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

عقد رقم : العقد رقم (١٢٢٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الثانى) عن العمليه عاليه من
اصل و صورته و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٤/٠٤/١٦

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة بنى سويف
مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن
محسن طنطاى حتي كوبري الرفيع و انشاء حوائط
خرسانيه مركز سنورس بطول ٣,١٥ كم بمحافظه الفيوم)
بخصوص :
بالامر المباشر

تنفيذ : شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

عقد رقم : العقد رقم (١٢٢٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

- بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
 - ٢ - لا يوجد سيارة محمله و متواجده .
 - ٣ - يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة ستون الف جنيها
لا غير) في مستخلص رقم (١) لحين توريد عدد (١٠) حبارات طابعات لحين توريد في الادارة
 - ٤ - لا يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٤/٠٤/١٦

مرفقات : ()



رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس / طارق يوسف الجزار

طارق يوسف الجزار



شركة المصريه للمقاوالات و تجارة الحديد و الاسمنت

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٤/١٦

بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص المرفق


بند	نوع الاعمال	الوحدة	كمية السابقة لكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع	
					من	الى
٢	توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطيه موزدة من خارج الموقع	م ^٣	١,١٠٤	٨٩٦	٢,٠٠٠	
٣	توريد و فرد و دمك تربه احلال عباره عن تربه من زلط التنظيف	م ^٣	٥٧٥	٥٣٠.٦	٦٢٨.٠٦	
٤	اصول خرس عليه الانسخت ولك بويله عمليه من ٠.٨ زلط و ٠.٢ رمل و ٢٠٠ ملم استمت لوراكش على بطون تقطع و دهقه كسر لا يقل عن ٢٠٠ ملم / ٢٠	م ^٣	٥٧٥	٥٣٠.٦	٦٢٨.٠٦	
٥	اصول خرقة مسحه الانسخت ولك بويله عمليه من ٠.٨ زلط و ٠.٢ رمل و ٢٠٠ ملم استمت لوراكش على بطون تقطع و دهقه كسر لا يقل عن ٢٠٠ ملم / ٢٠	م ^٣	٣٠٠	٣٠.٥٦	٣٣٠.٥٦	
٦	توريد و تركيب و رس التسليح (٤.١/٦) لزوم و السعر يشمل التقطيع	طن	٢٥	٢.٤٤	٢٧.٤٤	
٧	اصول خرقة مسحه لكوك الحواطة الجهد و لك بويله عمليه من ٠.٨ زلط و ٠.٢ رمل و ٢٠٠ ملم استمت لوراكش على بطون تقطع و دهقه كسر لا يقل عن ٢٠٠ ملم / ٢٠	م ^٣	٩٨٧	٩٩	١,٠٨٦	
٨	عمل طبقه عازله من البينوطين و الدهان وجبين علي البار	م ^٢	٧٢٧	٧٢.٦٨	٧٩٩.٦٨	
مهندس الشركة						
مهندس الاستشاري						
مهندس المشروع						
مدیر عام التنفيذ والصيانة						

12

17



مهندس الشركة

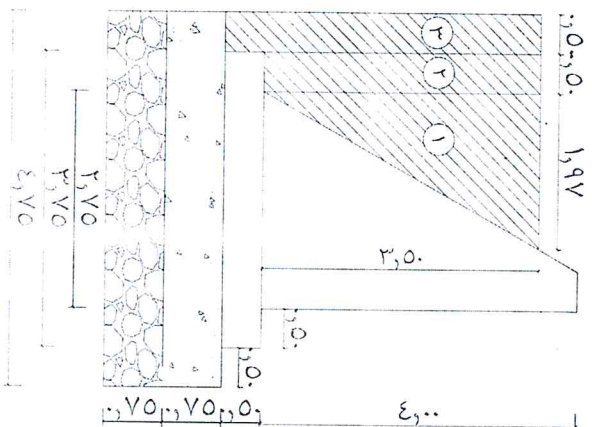

عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفع بمركز سفورس محافظة الفيوم

حصر كميات الردم بالقطاع الثاني

الكمية	العرض	الطول
١٩٨,٦٥١	$(٤,٠٠ * ٠,٥) + (٣,٥٠ * ٠,٥) + (٣,٥٠ * ١,٩٧ * ٠,٥)$	٢٧,٦
١٩٨,٦٥١	٧,١٩٧٥	
الإجمالي		

٣٤٥	٣٤٥	ردم الطريق المجاور
-----	-----	--------------------


٥٤٣,٦٥١

الكمية الاجمالية للترعة

م/ الاستشاري

م/ الشركة المنفذة



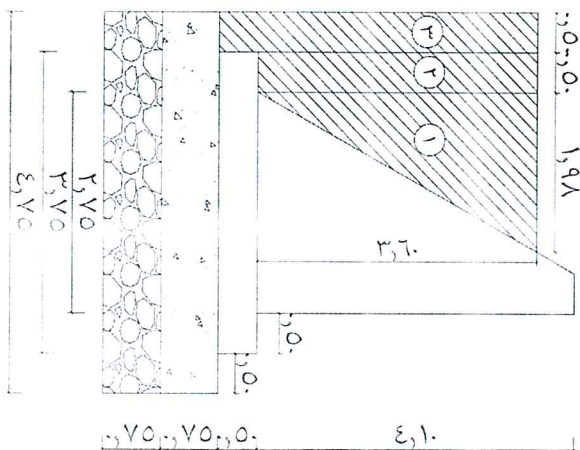

عملية / انشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الردم بالقطاع الأول


الكمية	العرض	الطول
٢٠٤,٦٢٦	$(٤,١ * ٠,٥) + (٣,٦٠ * ٠,٥) + (٣,٦٠ * ١,٩٨ * ٠,٥)$	٢٧,٦
٢٠٤,٦٢٦	٧,٤١٤	
٢٠٤,٦٢٦	الإجمالي	
٣٤٥	٣٤٥	ردم الطريق المجاور


٥٤٩,٦٢٦

الكمية الاجمالية للترعة

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



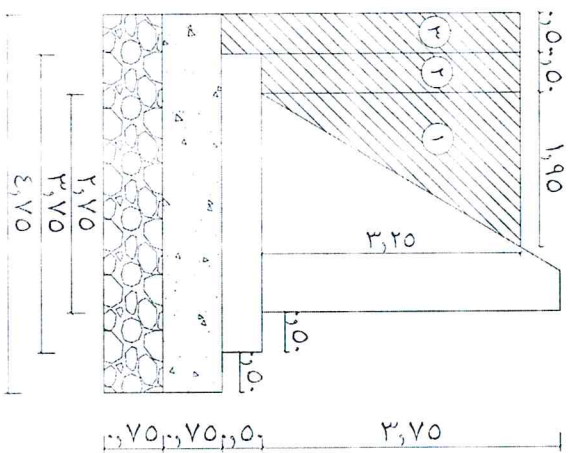

عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الربيع بمركز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الردم بالقطاع الثالث

الكمية	العرض	الطول
١٨٢,٧٧٩	$(٣,٧٥ * ٠,٥) + (٣,٢٥ * ٠,٥) + (٣,٢٥ * ١,٩٥ * ٠,٥)$	٢٧,٤٠
١٨٢,٧٧٩	٦,٦٧٠,٧٥	
١٨٢,٧٧٩	الإجمالي	

ردم الطريق المجاور

٣٤٢,٥	٣٤٢,٥	
-------	-------	--


٥٢٥,٢٧٩

الكمية الاجمالية للترعة

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



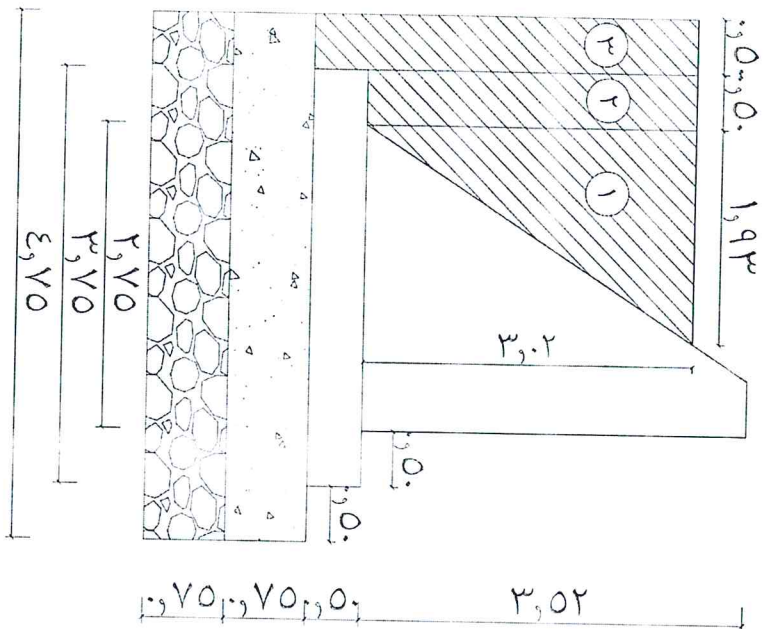

عملية / انشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الحفر بالقطاع

الكمية	العرض	الطول
٢٦١٨,١٨١	$(3,02 + 0,50 + 0,70) * 4,70$	١٠٩,٨٠
٢٦١٨,١٨١	٢٣,٨٤٥	
الإجمالي		


٢٦١٨,١٨١

الكمية الاجمالية للترعة

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



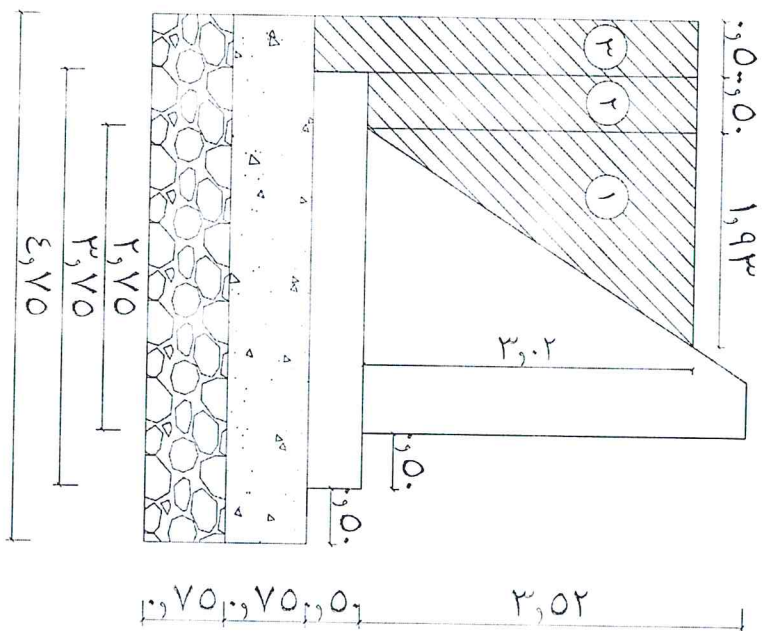

عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الردم بالقطاع الرابع

الكمية	العرض	الطول
١٦٨,٢١٣	$(٣,٥٢ * ٠,٥) + (٣,٠٢ * ٠,٥) + (٣,٠٢ * ١,٩٣ * ٠,٥)$	٢٧,٢٠
١٦٨,٢١٣	٦,١٨٤٣	
الإجمالي		
٣٤٠	٣٤٠	ردم الطريق المجاور


٥٠٨,٢١٣

الكمية الاجمالية للترعة

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



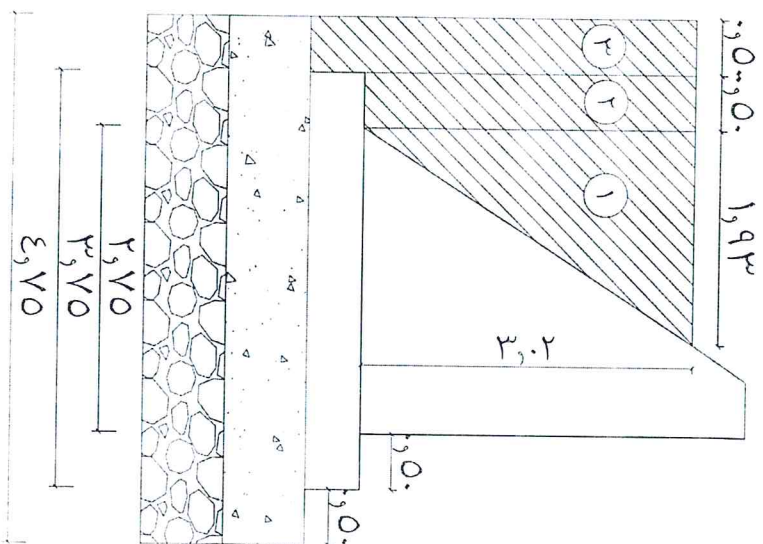

3.02 1.70 1.70 0.0

عملية / انشاء حائط ساند على طريق
الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الاساسيات (خرسانة عالية
قواعد) بالقطاع


الكمية	العمق	العرض	الطول
391,163	0,70	4,70	109,8
391,163	الإجمالي		

391,16 الكمية الاجمالية للترعة

م/ الاستشاري

م/ الشركة المنفذة



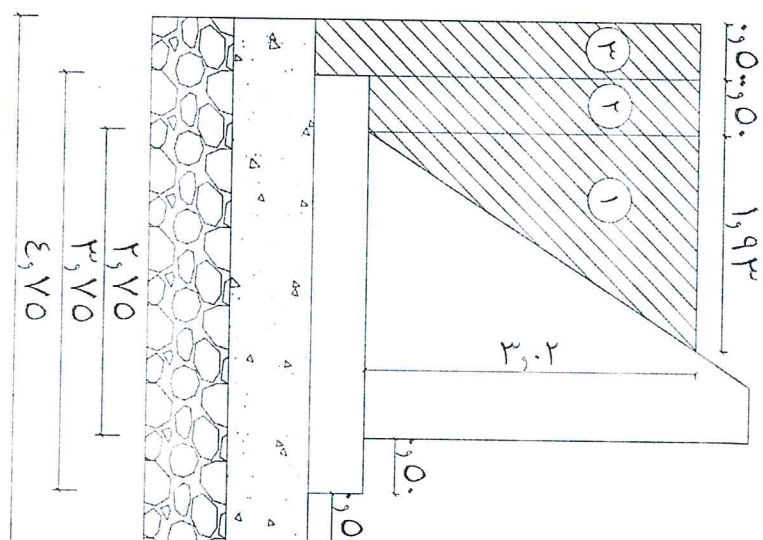

3,02 1,93 5,55 4,70 3,70

عملية / انشاء حائط ساند على طريق
الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الاحلال بالقطاع


الكمية	العمق	العرض	الطول
391,163	0,75	4,75	10,9,8
391,163	الإجمالي		

الكمية الاجمالية للترعة 391,16

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



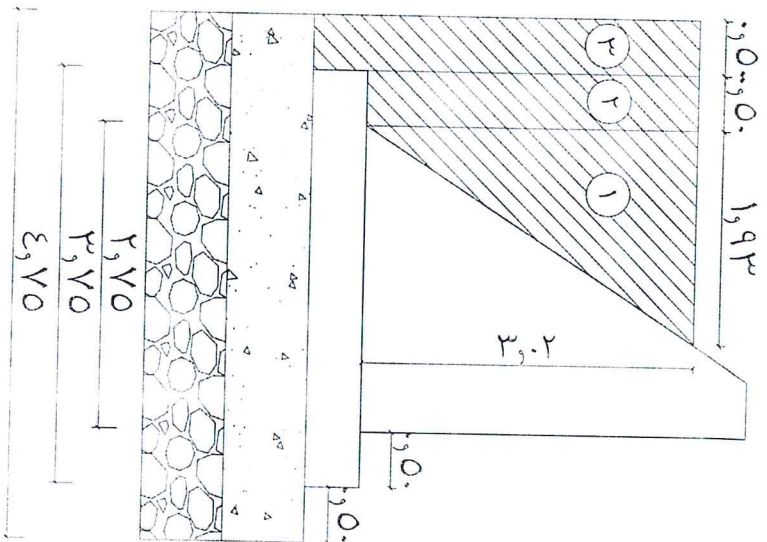

٣,٥٢ ٠,٧٥ ٠,٧٥ ٠,٥١

عملية / انشاء حائط ساند على طريق
الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الاساسات (خرسانة مسلحة
قواعد) بالقطاع


الكمية	العمق	العرض	الطول
٢٠٥,٨٧٥	٠,٥	٣,٧٥	١٠,٩,٨
٢٠٥,٨٧٥	الإجمالي		

٢٠٥,٨٨ الكمية الاجمالية للترعة

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



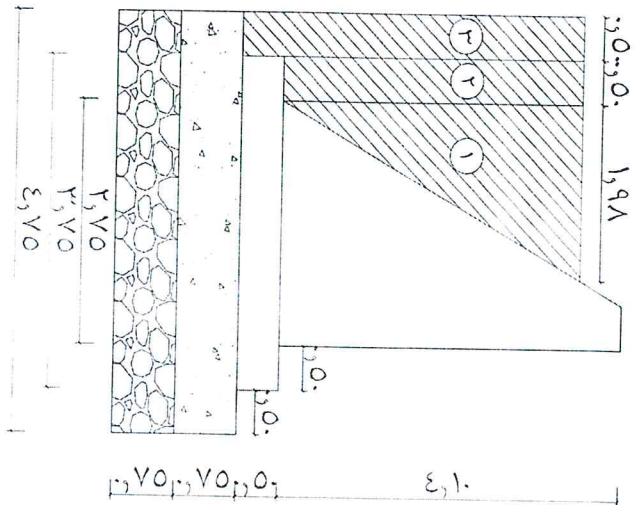

عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفع بمرکز سنورس محافظة الفيوم


حصر كميات خرسانة الحوائط المسلحة بالقطاع الاول بطول ٢٧,٦ م

الكمية	العمق (٢,٧٥+٠,٥)	العرض	الطول
١٨٣,٨٨٥	١,٦٢٥	٤,١٠	٢٧,٦
١٨٣,٨٨٥	الإجمالي		
١٨٣,٨٩	الكمية الإجمالية للترعة		

م/ الاستشاري

م/ الشركة المنفذة



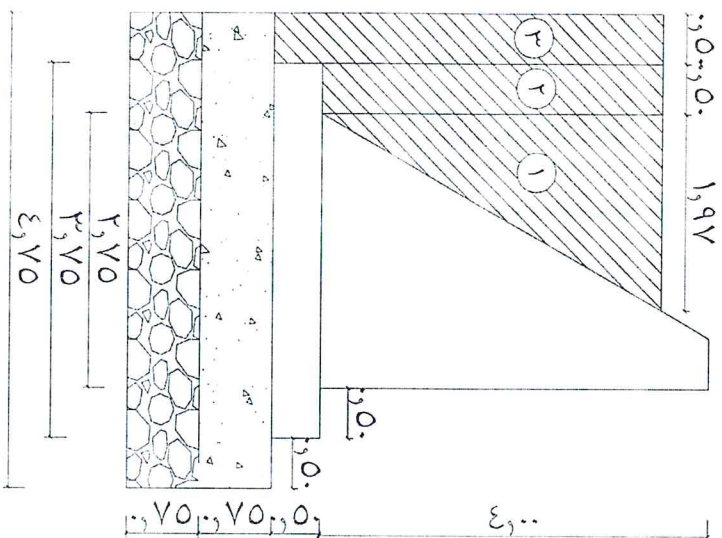


عملية / انشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم


حصر كميات خرسانة الحوائط المسلحة بالقطاع الثاني بطول ٢٧,٦٠ م

الكمية	المعق (٢/٧٥٠٠,٥)	العرض	الطول
١٧٩,٤٠٠	١,٦٢٥	٤,٠٠	٢٧,٦
١٧٩,٤٠٠	الإجمالي		
١٧٩,٤٠	الكمية الإجمالية للترعة		

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



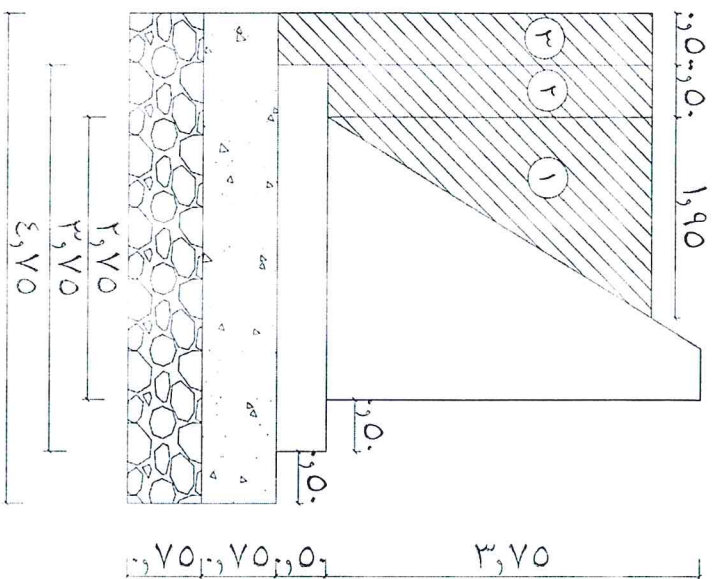

عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمركز سنورس محافظة الفيوم


حصر كميات خرسانة الحوائط المسلحة بالقطاع الثالث بطول ٢٧,٤ م

الكمية	المعق (٢ / ٢,٧٥ + ٠,٥)	العرض	الطول
١٦٦,٩٦٩	١,٦٢٥	٣,٧٥	٢٧,٤
١٦٦,٩٦٩	الإجمالي		
١٦٦,٩٧	الكمية الإجمالية للترعة		

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



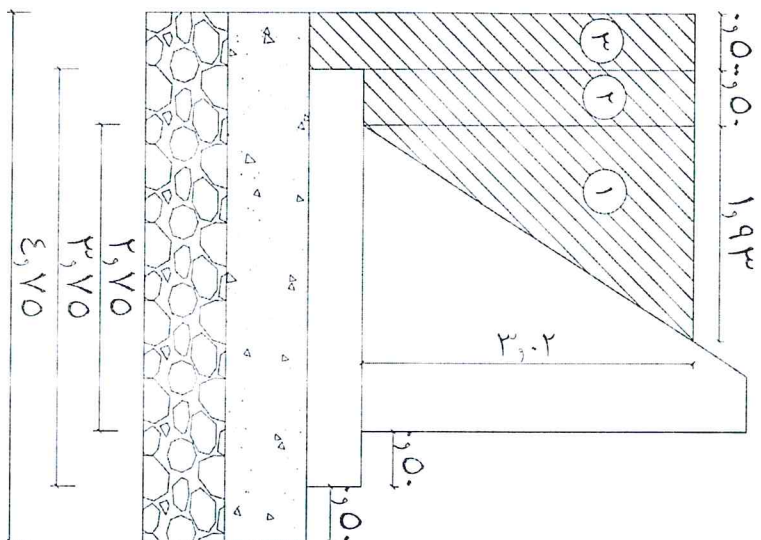

٣,٥٢ ٧٥,٧٥ ٧٥,٧٥ ٧٥,٧٥

عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفع بمرکز سنورس محافظة الفيوم			
حصر كميات خرسانة الحوائط المسلحة بالقطاع الرابع بطول ٢٧,٢ م			
الكمية	المق (٢/٢٧٥٠,٥)	العرض	الطول
١٥٥,٥٨٤	١,٦٢٥	٣,٥٢	٢٧,٢
١٥٥,٥٨٤	الإجمالي		
١٥٥,٥٨	الكمية الإجمالية للترعة		

م/الاستشاري

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة

م/الشركة المنفذة



عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الحديد قطاع بطول ٨, ١٠٩ م بالكجم

الاجمالي	الكمية بالكيلو جرام	النوع
١١٢٤٢,٠٣٦	١١٢٤٢,٠٣٦	حديد قواع
٥٩١٣,٩٧٣	٥٩١٣,٩٧٣	حديد حوائط
١٧١٥٦,٠٠٩	الاجمالي	

١٧١٥٦,٠٠٩

الكمية الاجمالي لحديد تسليح التربة

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة




حصر كميات حديد القواعد المسلحة للقطاع بطول ١٠٩,٨ م							
الاسم	عدد القطع	Ø	الطول	اجمالي الطول	عدد الاسياخ	وزن السيخ	اجمالي الوزن بالكجم
أ	٢٠٧	١٢	١٢	٢٤٨٤	٢٠٧	١٠,٦٦	٢٢٠٦,٦٢
ب	٢٣	١٢	١٠,٨	٢٤٨,٤	٢٠,٧	١٠,٦٦	٢٢٠,٦٦٢
ص	٢٠٧	١٢	١٢	٢٤٨٤	٢٠٧	١٠,٦٦	٢٢٠٦,٦٢
ض	٢٣	١٢	١٠,٨	٢٤٨,٤	٢٠,٧	١٠,٦٦	٢٢٠,٦٦٢
س	٦٥٩	١٢	٤,٠٥	٢٦٦٨,٩٥	٢٢٢,٤١٢٥	١٠,٦٦	٢٣٧٠,٩١٧٢٥
ش	٦٥٩	١٢	٤,٠٥	٢٦٦٨,٩٥	٢٢٢,٤١٢٥	١٠,٦٦	٢٣٧٠,٩١٧٢٥
ج	١٢٢٥	١٢	١,٥	١٨٥٢,٥	١٥٤,٣٧٥	١٠,٦٦	١٦٤٥,٦٣٧٥
اجمالي حديد القواعد المسلحة							
١١٢٤٢,٠٣٦							
حصر حديد الحوائط المسلحة القطاع الرابع بطول ٢٧,٢ م							
هـ	٤٦	١٢	١٢	٥٥٢	٤٦,٠٠	١٠,٦٦	٤٩٠,٣٦
د	٢٣	١٢	٥,٢	١١٩,٦	٩,٩٦٦٦٦٦٦٧	١٠,٦٦	١٠٦,٢٤٤٦٦٦٧
و	١٦٤	١٢	٥,٤٧	٨٩٧,٠٨	٧٤,٧٥٦٦٦٦٦٧	١٠,٦٦	٧٩٦,٩٠٦٠٦٦٧
الاجمالي بالكجم							
١٣٩٣,٥١١							
حصر حديد الحوائط المسلحة القطاع الثالث بطول ٢٧,٤ م							
ط	٤٦	١٢	١٢	٥٥٢	٤٦,٠٠	١٠,٦٦	٤٩٠,٣٦
ظ	٢٣	١٢	٥,٤	١٢٤,٢	١٠,٣٥	١٠,٦٦	١١٠,٣٣١
ع	١٦٥	١٢	٥,٧	٩٤٠,٥	٧٨,٣٧٥	١٠,٦٦	٨٣٥,٤٧٧٥
الاجمالي بالكجم							
١٤٣٦,١٦٩							
حصر حديد الحوائط المسلحة القطاع الثاني بطول ٢٧,٦ م							
ف	٥٠	١٢	١٢	٦٠٠	٥٠,٠٠	١٠,٦٦	٥٣٣
ق	٢٥	١٢	٥,٦	١٤٠	١١,٦٦٦٦٦٦٦٧	١٠,٦٦	١٢٤,٣٦٦٦٦٦٧
ك	١٦٦	١٢	٥,٩٥	٩٨٧,٧	٨٢,٣٠٨٣٣٣٣٣	١٠,٦٦	٨٧٧,٤٠٦٨٣٣٣
الاجمالي بالكجم							
١٥٢٤,٧٧٤							
حصر حديد الحوائط المسلحة القطاع الاول بطول ٢٧,٦٠ م							
ل	٥٠	١٢	١٢	٦٠٠	٥٠,٠٠	١٠,٦٦	٥٣٣
م	٢٥	١٢	٥,٦	١٤٠	١١,٦٦٦٦٦٦٦٧	١٠,٦٦	١٢٤,٣٦٦٦٦٦٧
ن	١٦٦	١٢	٦,٠٥	١٠٠٤,٣	٨٣,٦٩١٦٦٦٦٧	١٠,٦٦	٨٩٢,١٥٣١٦٦٧
الاجمالي بالكجم							
١٥٤٩,٥٢٠							
اجمالي حديد القطاع كاملا بطول ١٠٩,٨ م بالكجم							
١٧١٥٦,٠٠٩							

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



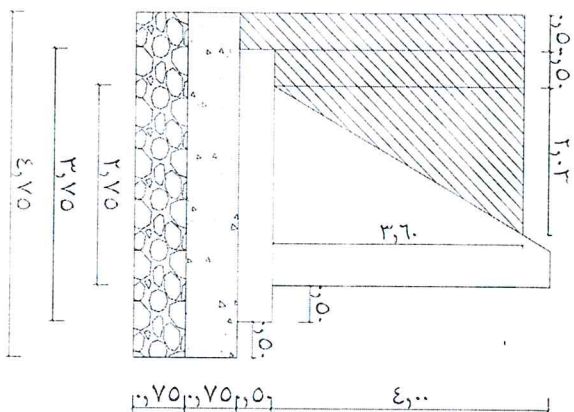


عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات حفر القطاع المرحلة الثانية بطول ٢٦,٥ م

الكمية	المعرض	الطول
١٦١٠,٩٦٣	$((3.10 + 0.5 + 0.75 + 0.75) * ٤,٧٥)$	٢٦,٥
١٦١٠,٩٦٣	الإجمالي	

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة






حصر كميات الردم (المرحلة الثانية) بالقطاع الاول بطول ٢٩ م بارتفاع ٢٤ م

٣٦٢,٥	٣٦٢,٥	ردم الطريق المجاور
-------	-------	--------------------

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



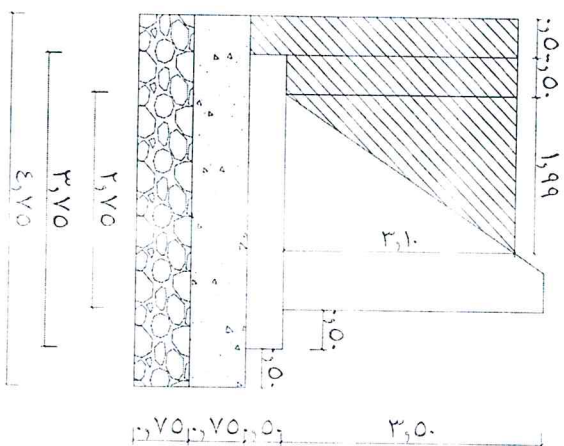

عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الردم (المرحلة الثانية) بالقطاع الثاني

الكمية	المريض	الطول
٢٤١,٢٩٤	$(٣,١ * ٠,٥) + (٣,١ * ٠,٥) + (٣,١ * ١,٩٩ * ٠,٥)$	٣٧,٥
٢٤١,٢٩٤	٦,٤٣٤٥	
	الإجمالي	

٤٦٨,٧٥	٤٦٨,٧٥	ردم الطريق المجاور
--------	--------	--------------------


٧١٠,٠٤٤

الكمية الاجمالية للترعة

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



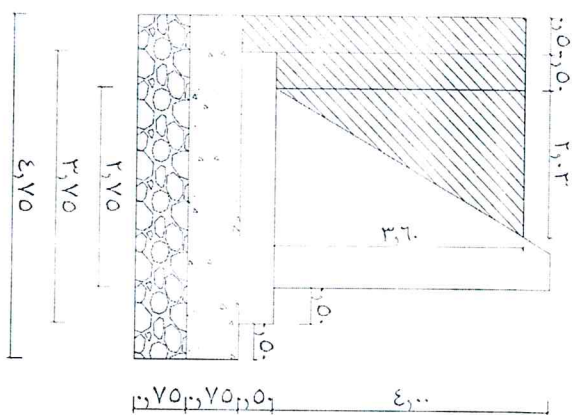

عملية / إنشاء حائط ساند على طريق
الرفيع بمركز سنورس محافظة الفيوم
حصر كميات الاحلال بالقطاع المرحلة
الثانية


الكمية	العمق	العرض	الطول
٢٣٦,٩٠٦	٠,٧٥	٤,٧٥	٦٦,٥
٢٣٦,٩٠٦	الإجمالي		


الكمية الاجمالية للترعة ٢٣٦,٩١

م/ الاستشاري



م/ الشركة المنفذة



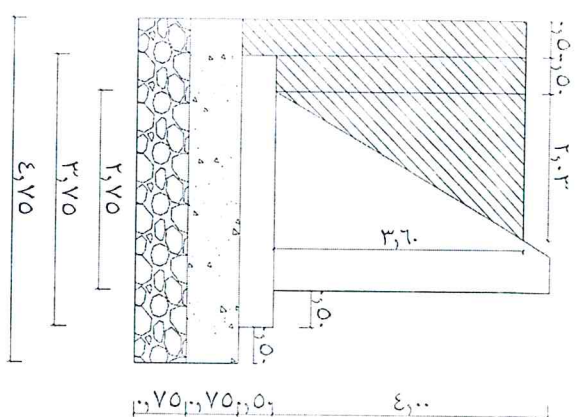


عملية / إنشاء حائط ساند على طريق
الرفيع بمركز سنورس محافظة الفيوم
حصر كميات الاساسات (خرسانة مسلحة
قواعد) بالمرحلة الثانية


الكمية	العمق	العرض	الطول
١٢٤,٦٨٨	٠,٥	٣,٧٥	٦٦,٥
١٢٤,٦٨٨	الإجمالي		

الكمية الاجمالية للترعة ١٢٤,٦٨٨

م/ الاستشاري

م/ الشركة المنفذة



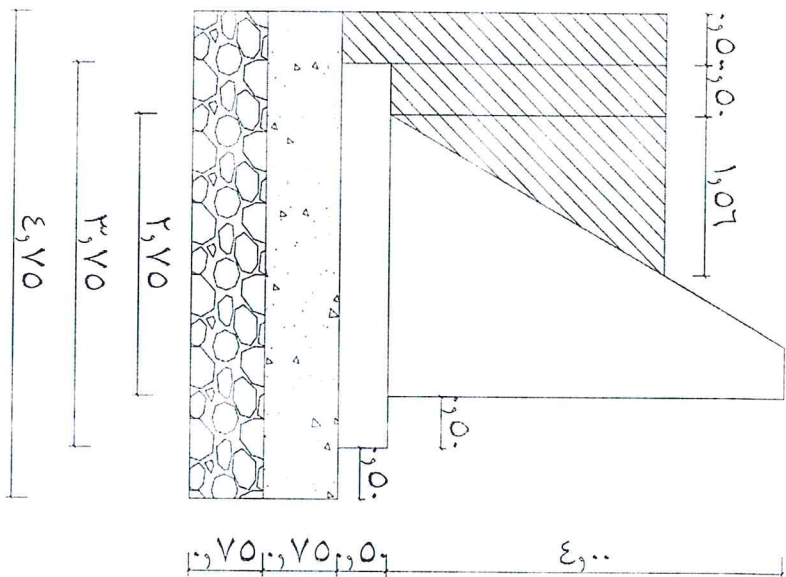


عملية / إنشاء حائط ساند على طريق الرفيع بمرکز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات خرسانة الحوائط المسلحة (المرحلة الثانية) بالقطاع الاول بطول ٢٩ م بارتفاع ٤ م

الكمية	العمق (٢/(٢,٧٥+٠,٥)	المعرض	الطول
١٨٨,٥٠٠	١,٦٢٥	٤,٠٠	٢٩
١,٨٩٠	٣*٠,٩*(٢/(٠,٩+٠,٥))	خضم فتحة الكوبري	
١٨٦,٦١	الإجمالي		
١٨٦,٦١	الكمية الاجمالية للترعة		

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



عملية / انشاء حائط ساند على طريق الرفع بمركز سنورس محافظة الفيوم

حصر كميات الحديد القطاع (المرحلة الثانية) بطول ٦٦,٥ م بالكجم


الاجمالي	الكمية بالكيلو جرام	النوع
٦٧٩٦,٦٣٨٣	٨٨٧٤,٤٥٠	حديد قواع
٣٤٨٩,١٩٥٧	٤٨١٨,١٨٧	حديد حوائط
١٠,٢٨٥,٨٣٤	الاجمالي	

١٠,٢٨٥,٨٣٤

الكمية الاجمالي لحديد تسليح التربة

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة



حصر كميات حديد القواعد المسلحة للقطاع بطول ٦٦,٥ م							
الاسم	عدد القطع	Ø	الطول	اجمالي الطول	عدد الاسياخ	وزن السبخ	اجمالي الوزن بالكجم
أ	١١٥	١٢	١٢	١٣٨٠	١١٥	١٠,٦٦	١٢٢٥,٩
ب	٢٣	١٢	١١,٥	٢٦٤,٥	٢٢,٠٤١٦٦٦٦٧	١٠,٦٦	٢٣٤,٩٦٤١٦٦٧
ص	١١٥	١٢	١٢	١٣٨٠	١١٥	١٠,٦٦	١٢٢٥,٩
ض	٢٣	١٢	١١,٥	٢٦٤,٥	٢٢,٠٤١٦٦٦٦٧	١٠,٦٦	٢٣٤,٩٦٤١٦٦٧
س	٤٠٠	١٢	٤,٠٥	١٦٢٠	١٣٥	١٠,٦٦	١٤٣٩,١
ش	٤٠٠	١٢	٤,٠٥	١٦٢٠	١٣٥	١٠,٦٦	١٤٣٩,١
ج	٧٤٨	١٢	١,٥	١١٢٢	٩٣,٥	١٠,٦٦	٩٩٦,٧١
اجمالي حديد القواعد المسلحة							
٦٧٩٦,٦٣٨٣٣٣							
حصر حديد الحوائط المسلحة القطاع الاول بطول ٢٩ م							
هـ	٥٠	١٢	١٢	٦٠٠	٥٠,٠٠	١٠,٦٦	٥٣٣
د	٢٥	١٢	٧	١٧٥	١٤,٥٨٣٣٣٣٣٣	١٠,٦٦	١٥٥,٤٥٨٣٣٣٣
و	١٧٥	١٢	٦	١٠٥٠	٨٧,٥	١٠,٦٦	٩٣٢,٧٥
خصم فتحة الكوبري	٢,٦	١٢	١٢	٣١,٢	٢,٦	١٠,٦٦	٢٧,٧١٦
الاجمالي بالكجم							
١٥٩٣,٤٩٢							
حصر حديد الحوائط المسلحة القطاع الثاني بطول ٣٧,٥ م							
ط	٦٦	١٢	١٢	٧٩٢	٦٦,٠٠	١٠,٦٦	٧٠٣,٥٦
ظ	٢٢	١٢	٤,٥	٩٩	٨,٢٥	١٠,٦٦	٨٧,٩٤٥
ع	٢٢٦	١٢	٥,٥	١٢٤٣	١٠٣,٥٨٣٣٣٣٣٣	١٠,٦٦	١١٠٤,١٩٨٣٣٣
الاجمالي بالكجم							
١٨٩٥,٧٠٣							
اجمالي حديد القطاع كاملا بطول ٦٦,٥ م بالكجم							
١٠٢٨٥,٨٣٤							

م/الاستشاري

م/الشركة المنفذة

م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة
م/الشركة المنفذة

