

الطباطبائي

三
六

A blue-tinted rectangular stamp with a decorative border. The text inside is in Persian, reading "سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" (Organization of Archives and National Library of the Islamic Republic of Iran) at the top, followed by "شماره ۱۳۷۵" (Number 1375) in the center, and "تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۸" (Date 20 Dey 1398) at the bottom.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

و المحمول عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالتالي
بالإحالة الى عملية رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البركتية / مفارق السعدني) القطاع
الأول بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمنمبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (٣٠) .
(مستخلص ١ جاري) تتفيد شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

تم رفع المحمولات في الفترة من ٢٠٢٤/٨/١٥ إلى ٢٠٢٤/٨/١٢ طبقاً لخطاب المنطقة لتأخر في استصدار التراخيص من الري اللازم لأعمال الحوائط الساندة بالطريق وتم استئناف الأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ وتم نزول عدد (١) سيارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ (مرفق) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

A photograph of a handwritten signature in blue ink. The signature reads "مهندس / محمد العدلي" (Engineer / Mohamed Al-Adly) above "مدبولي إدارة المركبات" (Mubarak City Roads and Vehicles Department). Below this, it says "والمشهور على السيارات المحملة" (Known for its loaded vehicles). To the left of the signature is a large, roughly drawn oval containing the numbers "٢٠٢٤" (2024) at the top and "١٢" (12) at the bottom. A thick blue arrow points from the right towards the oval. The entire signature is overlaid on a circular blue stamp. The stamp has "جهاز" (Device) at the top, "الإلكتروني" (Electronic) at the bottom, and "الذكي" (Smart) on either side. In the center of the stamp, there is a stylized graphic of a road or path.



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....


إيماءاً إلى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكية - مفارق السعدني) بطول ؛كم
مركز الحسينية محافظة الشرقية عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤/٣٠ تنفيذ شركة أحمد عبدالرحمن للمقاولات
والتوريدات العمومية.

وبالإحاله الى الطلب المقدم من الشركة المنفذة المتضمن رفع المحمولات عن السيارة في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥
الي ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنه تم إسلام الموقع في ٢٠٢٣/٨/١٥ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع
بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت الأعمال تماماً نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأنه لم يتم
صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلى توقفها وأيضاً التاخر في إصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال
الحوائط السائدة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول على تراخيص الري في ٨/١٢
٢٠٢٤ قامت الشركة باستئناف الأعمال في ٢٠٢٤/٨/١٢.

وترى المنطقة بعد الموافقة من سعادتكم التكرم في رفع المحمولات (السيارة) عن تلك الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ الي
٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة.

والامر مفوض لسعادتكم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

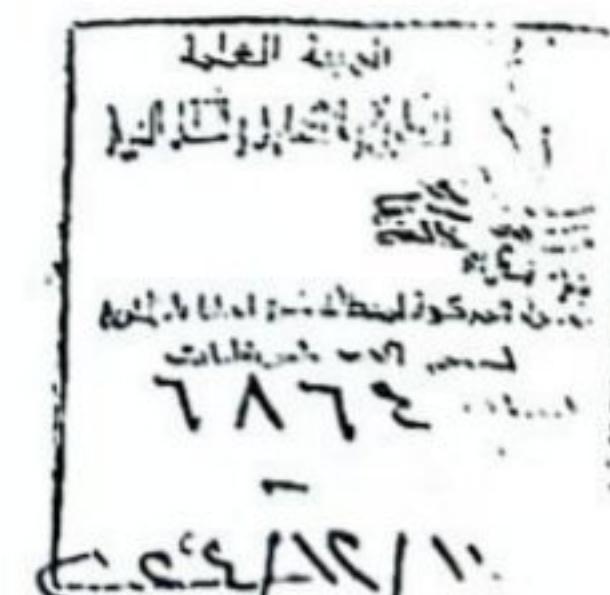



شركة
أحمد عبد الرحمن
للمقاولات والتوريدات العمومية (ش.م.م)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
تحية طيبة وبعد....

بالإحاله إلى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكية - مفارق المعدني) بطول ٤كم مركز الحسينية
محافظة الشرقية عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تحيط علیكم سعادتكم أنه تم استلام الموقع في ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت
الأعمال تماماً نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعليه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلى توقفها وأيضاً
التأخير في إصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوانط المساعدة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول على
تراخيص الري في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ قامت الشركة باستئناف الأعمال في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ .

لذا نأمل من سعادتكم التكرم بمساعدة الشركة في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسعادتكم

شركة / أحمد عبد الرحمن للمقاولات



٣/١٤٢
١٠/١٢

المقر الرئيسي : ٥٧ شارع عبد القادر حاتم - زيزيليا عالي٢ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
فرع الشركة : شارع البلاسي - فاقوس قسم أول - الشرقية

() اشتراطات ترخيص ()

بناء على الطلب المقدم من / الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل حانط ساند على ترعة بشاره بالبر الأيسر بأماكن متفرقه وهى كالتى :

- ١ - حانط ساند من (ك ٤٠٠) حتى (ك ٤٠٤٠) بطول ٠٥٠ م
- ٢ - حانط ساند من (ك ٥٠٠) حتى (ك ٦٠٤٠) بطول ٠٦٠ م
- ٣ - حانط ساند من (ك ٩٠٠) حتى (ك ١٠٠١) بطول ٠١٠٠ م
- ٤ - حانط ساند من (ك ١٥٠٠) حتى (ك ٢٠١٥) بطول ٠١٠٠ م
- ٥ - حانط ساند من (ك ٢٠٦٠) حتى (ك ٢٠٦٥) بطول ٠٥٠ م
- ٦ - حانط ساند من (ك ٢٠٩٦٠) حتى (ك ٢٠٩٦٥) بطول ٠٦٠ م

و على حساب الهيئة العامة للطرق والكبارى وبالرسومات المقدمة من الهيئة العامة للطرق والكبارى و مطابقة المباحث الهندسية والرسومات التنفيذية للعملية وفقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ يرخص للهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل حوانط سانده بأماكن متفرقه على ترعة بشاره بالبر الأيسر .

تنزيم الجيه المرخص لها بقانون الموارد المائية وائر رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ ويجميغ التنشيرات المنظمه لذلك وبما ذكر بالبيان رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ ويجميغ المنشورات الوزاريه المنظمه ذلك الخاصه بهذه تراخيص لغير اجزاء اعمال ذات صلة بمنافع الري والصرف والمرافق .

- ١ - تنزيم الجيه المرخص لها بتنفيذ الرسومات الإنشائيه الوارده من الاستشاري والمقدمه من الجيه الشهابي للترخيص .
- ٢ - تنزيم الجيه الشهابي والجهاز المركزي بالخطار الهندسى بمبعاد التنفيذ وذلك للمتابعة .
- ٣ - على الجيه المرخص لها بالالتزام بالقطاع التصعيدي للجري المائي فى م الواقع التنفيذ والحفاظ على الجسور والآلة كافية المعموقات التي تعوق سير المياه والتى تنشأ نتيجة التنفيذ وذلك بمعرفتها وعلى نفقتها بعد التنفيذ بأشهر ٣ منها كانت التكلفة طبقاً للمناسب والمدة التي تحددها الإداره والمحافظه على القطاع المائي للجري .
- ٤ - هذا الترخيص لا ينطوى للجهه المرخص لها سند ملكيه على الجسر أو المنشآ المنفذ .
- ٥ - الأعمال المرخص لها تصبح ملكاً لمصلحة الري وبيانها على الجيه المرخص لها .
- ٦ - على الجيه المرخص لها المحافظه على جميع أنواع المرافق من مواسير كهرباء / غاز / صرف صحي وخلافه على مسئولية التنسيق مع الجهات المعنية في حالة تعارض أحد هذه المرافق مع العمل .
- ٧ - اذا حدث ضرر للحوالط السانده نتيجة سوء التصميم او التنفيذ وخلافه فأن الجيه المرخص لها تكون مسؤولة مسئولية كامله عن اي ضرر يلحق بالأعمال المنفذه ولا مسئوليته على الإداره مصدر الترخيص وليس لهيئة الطرق والكبارى الجهي شهابي الذي تعييضات من اي نوع من الإداره العامه ارى شرق الشريقيه .
- ٨ - هذا الترخيص ينحل به لمدة ٦ أشهر من تاريخ اعتماده ولا يجوز تعديله والا يعتبر لاغيراً



الإدارية العليا

مذكرة للمعرض

يشان : طلب ممثلة إضافية لعملية أعمال رفع تلقاء طريق الحسينية/سان الحجر(وصلة البرائبية/مقارق السادس) (القطاع الأول) بطلول ؛ كم مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئيسية "حياة ذريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة: عبد الرحمن المقاولات والتوريدات العمومية

أولاً : الموضوع

يشان الموافقة على طلب ممثلة إضافية لعمارة أعمال رفع كلاء طريق الحسينية/سان الحجر(وصلة البرائبية/مقارق السادس) القطاع الأول بطلول ؛ كم مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئيسية "حياة ذريمة" (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة عبد الرحمن المقاولات والتوريدات العمومية بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٤/٣٠) عامي أن تبدأ الاعمال في ٢٠٢٣/٨/١٥ وتنتهي ٢٠٢٤/٨/١٤ طبقاً للتعاقد.

ثانياً الأدلة:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد. مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ الدهو في ٢٠٢٤/٨/١٤ (مرفق) طبقاً للآتي:

- رئاء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) المتعلق بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
- وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المتعلق بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
- وطبقاً لموقف السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
- وجود صعوبات تعيق التنفيذ بالموقع الخامسة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- عدم استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ.
- عدم توافر كميات البوتاسيوم في التوفيرات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر.

ثالثاً المطالب:

النكرم بإتخاذ ما ترون مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة للعملية المشار إليها عاليه بـ ٦ أشهر ليصبح الدهو في ٢٠٢٤/٨/١٤ .

- والأمر مفوض لسيادتكم

مساعد سار

التوكيل (١٨)
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجبار
مدير عام الطريق

نائب مدير الموارد - المختصة في هذه المسألة وفقاً لبياناته، لسنة ٢٠٢٣/٩/٢٧
شواص شهرين، مد. لم يتحقق ذلك لعدم توافر المقرر بمجلس إدارة الهيئة، نائب مدير الموارد -
شواص شهرين، مد. لم يتحقق ذلك لعدم توافر المقرر بمجلس إدارة الهيئة، نائب مدير الموارد -
نائب مدير الموارد - مد. لم يتحقق ذلك لعدم توافر المقرر بمجلس إدارة الهيئة، نائب مدير الموارد -
نائب مدير الموارد - مد. لم يتحقق ذلك لعدم توافر المقرر بمجلس إدارة الهيئة، نائب مدير الموارد -

التوكيل (١٦)
مهندس/ محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة

١٤١ رقم

التوكيل (١٦)
لواء مهندس/ مسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقوض
ملف رقم : ٨٩ / ١١ / ١٥

محضر استلام موقع

عملية : رفع كفاءة طريق الحسينية / صان العجر

(وصلة البراكية / مفارق السعدنى)

{ القطاع الأول } بطول ٤ كم مركز محافظة الشرقية

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية

بناءً على العقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع

• المهندس / أحمد سمير حسن


شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

• المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إسلام الموقع وبدء التشغيل .

وغير فناً يغير منا بزلزال ..

التوقيعان


 المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد

 المهندس / أحمد سمير حسن
 يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح





تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	احمد عبد الرحمن محمد حسین للمقاولات العامة والتوريدات
رقم العقد	(2024/2023/30)
العملية	اعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكنية / مفارق السعدني) القطاع الاول بطول 4 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)
الافادة	ليس عليها وثائق (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف سيارة ملاكي

تحرير في (2024-12-15)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الادارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة / أمل محمد
مدير عام البحوث

