



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح
قطاع العلمين _ فوهة المسافة من الكم ٤٢٢+١٠٠ الى الكم ٤١٩+٦٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه الاسكندرية)

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم

تنفيذ: شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٣م .,٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٨٥٠,٩٥٥	١,٩٤٠	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
٤٨٥٠,٩٥٥			الاجمالي الكلى (٣م)		

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخطاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجبوشي
م / مصطفى نجم ..

مهندس الاستشاري

XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبدالمنعم محمد

عبدالله



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)
قطاع العلمين _ فوهة المسافة من الكم ٤٢٢+١٠٠ الى الكم ٤١٩+٦٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه الاسكندرية

رقم البند وبيانه : (٤-١) قيمة المادة المحجرية

تنفيذ: شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٣٥ .٠٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٤٣٥,٣٣٩	٣,٣٧٤	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
اجمالي الكلي (٣م)					

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجبوشي
م / مصطفى نجم .

مهندس الاستشاري
XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبد المنعم محمد
علي للنجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)
قطاع العلمين - فوهة المسافة من الكم ٤٢٢+١٠٠ الي الكم ٤١٩+٦٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه الاسكندرية

رقم البند وبيانه : (١-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ: شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٣٠ .٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٤٣٥,٣٣٩	٢,٣٧٤	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
اجمالي الكلى (٣م)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجبوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبدالمنعم محمد

محمد طلحه

محظوظ

الستو



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) قطاع العلمين _ فوهة المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الى الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه الاسكندرية

رقم البند وبيانه : (١-٤) بالметр المكعب لأعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة

تنفيذ: شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٣م ٠,٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٤٣٥,٣٣٩	٣,٣٧٤	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
٨٤٣٥,٣٣٩			الاجمالي الكلى (٣م)		

مهندس الهيئة
م / إبراهيم العطاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجبوشي
م / مصطفى نجم -

مهندس الاستشاري
XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدالمنعم محمد
حسين



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع العلمين _ فوق المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الى الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه الاسكندرية

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم

تنفيذ: شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٣م .٠٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٤٣٥,٣٣٩	٣,٣٧٤	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
٨٤٣٥,٣٣٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٨٤٣٥,٣٣٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الكباوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبد المنعم محمد

عبد المنعم

السيد
حسفان



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) قطاع العلمين _ فوهة المسافة من الكم ٤٢٢+١٠٠ ؛ الي الكم ٤١٩+٦٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه الاسكندرية

رقم البند وبيانه : (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها
باستخدام ألات التسوية

تنفيذ: شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٣ .٠٠ م

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
٤٨٥٠,٩٥٥	١,٩٤٠	٢٥٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول	
٤٨٥٠,٩٥٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
٤٨٥٠,٩٥٥	الاجمالي الكلي (م)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطففي نجم

مهندس الاستشاري

XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبد المنعم محمد
عليه السلام



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) قطاع العلمين _ فوهة المسافة من الكم ٤٢٢+١٠٠ ة الى الكم ٤١٩+٦٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه الاسكندرية

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ: شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٣٠٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٨٥٠,٩٥٥	١,٩٤٠	٢٥٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
الاجمالي الكلي (٣م)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم العطاوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبد المنعم محمد
حسين طلعت

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،

بالإحالـة إلى مشروع القطار الكهربـائي السريع قطاع (العلمـين _ فوكـة)
نـتشرفـ بـأنـ نـرـفـقـ لـسيـادـتـكـمـ طـيـةـ المـقاـيسـةـ المـعـدـلـةـ بـعـدـ المـفاـوضـةـ لـبـنـوـدـ الـأـعـمـالـ بـتـارـيـخـ

٢٠٢٣-١٢-١٨ للقطاع الآتي :

الاتجاه	الشركة	الطول (كم)	المسافة		م
			إلى	من	
الاسكندرية	سيناء للمقاولات حسن أسعد طة	٢,٥	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	١

يرجـاءـ مـنـ سـيـادـتـكـمـ التـقـضـلـ بـالـأـحـاطـهـ وـالـتـوجـيهـ بـالـازـمـ .

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ وـالـتـقـديرـ ،

رئيس الإدارـةـ (الـحـرـ كـرـيـهـ)

(الـمـنـطـقـةـ الـخـامـسـةـ غـرـبـ الـدـلـتـاـ)

٢٠٢٣-١٢-١٨
مـعـدـلـةـ الـمـنـشـئـينـ /
الـهـادـيـ الـعـادـيـ الـحـمـيدـ طـهـ

Signature



أعمال لجسر الترالي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
مقاييسة المعدلة بعد المفاوضة لبنياد الأعمال بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ تنفيذ شركة سناء للمقاولات حسن أسعد طه اتجاه الاسكندرية
القطاع من المحطة ٤١٩,٦٠٠ إلى ٤٢٢,١٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتنية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ألات التسوية بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسب ٢ متر و يمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المتسب التصميم لتشكيل الجسر والاتفاق (تسوية تحمل كالمفروض) لا تقل عن ١٥ %) و ريشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى الصخور كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة المقصود) ويتم التنفيذ طبقاً للمتسب التصميمية والقطاعات العرضية المنوذجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، في حالة طلب جهاز الاتراف زيدة نسبة المدك عن ٩٥ % يحسب ١ جنيه على زيادة نسبة المدك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم	٣م	٤,٨٥٠,٩٥٥	٩٣,٤	٤٠٣,٠٧٩
١-٢	- يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تسوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المجرية	٣م	٤,٨٥٠,٩٥٥	٢٠٧,٠٠	١,٠٠٤,١٤٨
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية	٣م	٤,٨٥٠,٩٥٥	١٣	٦٣,٦٢
٤	طبقات الأساس بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطاطة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالمفروض عن ٢٥ % ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز اوس انجلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكارل و يتم فردها على طبقتين باستخدام ألات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سلك الطبقية بعد تمام المدك عن ٢٥ سم و ريشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد للهراسات للوصول الى الصخور كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٥ %) من الكثافة المعملية والفناء تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٣م	٨,٤٣٥,٣٣٩	١٣٠,١٠	١,٠٩٧,٤٣٨
	قيمة المادة المجرية	٣م	٨,٤٣٥,٣٣٩	١٦١,٠٠	١,٣٥٨,٠٩٠
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	٣م	٨,٤٣٥,٣٣٩	١٧٩,٤٠	١,٥١٣,٣٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية	٣م	٨,٤٣٥,٣٣٩	٢٥,٠٠	٢١٠,٨٨٣
	الاجمالي				٥,٧٠٠,٠٠
	(خمسة مليون و سبع مائة ألف جنيه فقط لغير)				

مدير عام المشروعات الهيئة

م/ محمد حسني فياض

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه " ١٢


مدير المشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحناوى



مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم



مدير المشروع

م/ عبد الفتاح محمد



UNIVERSAL
INSPECTION
REQUEST



مركز الاستشارات الهندسية
لنقل المطارات والطرق
(خيرة برلين)
GARIB شفاعة الجند

البنية التحتية
لطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

(H.A.F)-167

Contractor Company	HASSN ASAD TAHA		Designer Company*	SGAC							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
Received by ER	M.A	10 17-10-2022	UIR	C1 KP 421	C2 E.W	C3 C.S	DD 17	MM 10	YY 22	HH 10	MM 30

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp 421 Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	Item
(Ferma) Layer	Upper Embankment	From (421+560) To (421+820)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference		MS Reference

Comments by: Civil : visual inspection Approved. SGAC 17-10-2022	Comments by: Survey : Approved AS Master Sheet
Material : The Compaction Pass Kamel	


INSPECTION RESULT				
Organisation	Name	Sign	Date	Time
Contractor	El Amin	El Amin		A-AWC-R
QA/QC*	Kamel	Kamel		
GARB**	m. negm			
Comment by ER	Approved as noted there are no top approved cross section the survey offer open on profile No. (9) the contractor has implemented			
Employers Representative	M.A	10 30 2022		Awe

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only


(H.A.F)-164

Station	421+440	421+460	421+480	421+500	421+520	421+540	421+560	421+580	421+600	421+620
DL (27-04-2022)	16.909	16.981	17.054	17.126	17.198	17.270	17.343	17.415	17.487	17.559
Farma	16.009	16.081	16.154	16.226	16.298	16.370	16.443	16.515	16.587	16.659
Asbuilt-Ngl(Bed Levels)	14.452	14.581	14.654	14.726	14.798	14.870	14.943	14.515	14.587	14.659
Av Diff	1.557	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	2
0	16.009	16.081	16.154	16.226	16.298	16.37	16.443	16.515	16.587	16.659
0.25	15.759	15.831	15.904	15.976	16.048	16.12	16.193	16.265	16.337	16.409
0.5	15.509	15.581	15.654	15.726	15.798	15.87	15.943	16.015	16.087	16.159
0.75	15.259	15.331	15.404	15.476	15.548	15.62	15.693	15.765	15.837	15.909
1	15.009	15.081	15.154	15.226	15.298	15.37	15.443	15.515	15.587	15.659
1.25	14.759	14.831	14.904	14.976	15.048	15.12	15.193	15.265	15.337	15.409
1.5							14.943	15.015	15.087	15.159
1.75							14.693	14.765	14.837	14.909
2										
2.5										
3										
3.5										
4										
4.5										



جیف بروجن سیفی
C. Co. Ltd.

Station	421+640	421+660	421+680	421+700	421+720	421+740	421+760	421+780	421+800
DL (27-04-2022)	17.631	17.704	17.776	17.848	17.920	17.993	18.065	18.137	18.209
Farma	16.731	16.804	16.876	16.948	17.020	17.093	17.165	17.237	17.309
Asbuilt-Ngl(Bed Levels)	14.731	14.804	14.876	14.948	15.020	15.093	15.165	15.237	15.309
Av Diff	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	16.731	16.804	16.876	16.948	17.02	17.093	17.165	17.237	17.309
0.25	16.481	16.554	16.626	16.698	16.77	16.843	16.915	16.987	17.059
0.5	16.231	16.304	16.376	16.448	16.52	16.593	16.665	16.737	16.809
0.75	15.981	16.054	16.126	16.198	16.27	16.343	16.415	16.487	16.559
1	15.731	15.804	15.876	15.948	16.02	16.093	16.165	16.237	16.309
1.25	15.481	15.554	15.626	15.698	15.77	15.843	15.915	15.987	16.059
1.5	15.231	15.304	15.376	15.448	15.52	15.593	15.665	15.737	15.809
1.75	14.981	15.054	15.126	15.198	15.27	15.343	15.415	15.487	15.559
2									
2.5									
3									
3.5									
4									
4.5									




د. عصام جعفر

Station	421+820	421+840	421+860	421+880	421+900	421+920	421+940	421+960	421+980
DL (27-04-2022)	18.282	18.354	18.426	18.498	18.571	18.643	18.715	18.787	18.860
Ferma	17.382	17.454	17.526	17.598	17.671	17.743	17.815	17.887	17.960
Asbuilt-Ng!(Bed Levels)	15.382	14.454	14.526	14.598	14.671	14.213	13.815	13.887	13.960
Av Diff	2	3	3	3	3	3.53	4	4	4
0	17.382	17.454	17.526	17.598	17.671	17.743	17.815	17.887	17.96
0.25	17.132	17.204	17.276	17.348	17.421	17.493	17.565	17.637	17.71
0.5	16.882	16.954	17.026	17.098	17.171	17.243	17.315	17.387	17.46
0.75	16.632	16.704	16.776	16.848	16.921	16.993	17.065	17.137	17.21
1	16.382	16.454	16.526	16.598	16.671	16.743	16.815	16.887	16.96
1.25	16.132	16.204	16.276	16.348	16.421	16.493	16.565	16.637	16.71
1.5	15.882	15.954	16.026	16.098	16.171	16.243	16.315	16.387	16.46
1.75	15.632	15.704	15.776	15.848	15.921	15.993	16.065	16.137	16.21
2		15.454	15.526	15.598	15.671	15.743	15.815	15.887	15.96
2.5		14.954	15.026	15.098	15.171	15.243	15.315	15.387	15.46
3						14.743	14.815	14.887	14.96
4						14.243	14.315	14.387	14.46
4.5									



جنة ببر وصل ١٥٢٢

STATION	0.00				DL	LANE SLOPE		RIGHT	Width and Level	fema	منسوب الماء
	access	L1	R1	T.W.L.							
13.44	8.44	4	0	4	9.94						
15.905	16.105	16.283	16.443	16.283	16.045	17.343	-4.00%	-4.00%	-4.00%		23.38
421+560	+1	-1			+1	-2					
15.977	16.177	16.355	16.515	16.355	16.117	17.415	-4.00%	-4.00%	-4.00%		13.8
421+580	-1	-1	-2		+1	-1					
16.049	16.249	16.427	16.587	16.427	16.189	17.487	-4.00%	-4.00%	-4.00%		23.38
421+600					-2						
16.121	16.321	16.499	16.659	16.499	16.261	17.559	-4.00%	-4.00%	-4.00%		23.38
421+620	+1	-1	+1	-1	+1	-1					
16.194	16.394	16.572	16.732	16.572	16.334	17.632	-4.00%	-4.00%	-4.00%		23.38
421+640	+1	-1	+1	+1	-2	+1					
16.266	16.466	16.644	16.804	16.644	16.406	17.704	-4.00%	-4.00%	-4.00%		23.38
421+660											
16.338	16.538	16.716	16.876	16.716	16.478	17.776	-4.00%	-4.00%	-4.00%		23.38
421+680	-1	+1	+1		-1	x1	-1				
16.410	16.610	16.788	16.948	16.788	16.550	17.848	-4.00%	-4.00%	-4.00%		23.38
421+700	-1	-2	+1	-1	-1	-1	+1				



مختار


٢

STATION	0.00				LANE SLOPE				Width and Level	
	13.44	8.44	4	0	4	9.94	DL	LEFT	RIGHT	farma
421+720	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	T.W.L
421+740	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	
421+760	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	
421+780	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	
16.627	16.827	17.005	17.165	17.005	16.767	18.065	-4.00%	-4.00%	-4.00%	23.38
16.699	16.899	17.077	17.237	17.077	16.839	18.137	-4.00%	-4.00%	-4.00%	23.38
16.772	16.972	17.150	17.310	17.150	16.912	18.210	-4.00%	-4.00%	-4.00%	23.38
421+800	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	
421+820	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	



COORDINATES AND LEVELS FOR BED LEVELS FROM STATION 421+560 to 421+820

STATION	W-L	CATCH - L			CL			CATCH - R			W-R
		E	N	Z	E	N	Z	E	N	Z	
421+560	13.44	400214.068	917586.152		400223.6289	917596.1239		400230.768	917603.569		9.94
421+580	13.44	400199.631	917599.994		400209.1926	917609.9656		400216.332	917617.411		9.94
421+600	13.44	400185.195	917613.836		400194.7564	917623.8074		400201.895	917631.253		9.94
421+620	13.44	400170.759	917627.677		400180.3201	917637.6491		400187.459	917645.095		9.94
421+640	13.44	400156.323	917641.519		400165.8838	917651.4908		400173.023	917658.936		9.94
421+660	13.44	400141.886	917655.361		400151.4475	917665.3326		400158.586	917672.778		9.94
421+680	13.44	400127.45	917669.202		400137.0112	917679.1743		400144.15	917686.62		9.94
421+700	13.44	400113.014	917683.044		400122.5749	917693.0161		400129.714	917700.462		9.94
421+720	13.44	400098.577	917696.886		400108.1386	917706.8578		400115.278	917714.303		9.94
421+740	13.44	400084.141	917710.728		400093.7024	917720.6995		400100.841	917728.145		9.94
421+760	13.44	400069.705	917724.569		400079.2661	917734.5413		400086.405	917741.987		9.94
421+780	13.44	400055.269	917738.411		400064.8298	917748.383		400071.969	917755.829		9.94
421+800	13.44	400040.832	917752.253		400050.3935	917762.2247		400057.532	917769.67		9.94
421+820	13.44	400026.396	917766.095		400035.9572	917776.0665		400043.096	917783.512		9.94

*Signature**✓*

Station	421+520	421+540	421+560	421+580	421+600	421+620	421+640	421+660	421+680	421+700	421+720	421+740
DL (27-04-2022)	17.2	17.27	17.343	17.415	17.487	17.559	17.631	17.704	17.776	17.848	17.92	17.993
المرجع	16.298	16.37	16.443	16.515	16.587	16.659	16.731	16.804	16.876	16.948	17.02	17.093
Asbuilt-Ngl(Bed Levels)	14.798	14.87	14.443	14.515	14.587	14.659	14.731	14.804	14.876	14.948	15.02	15.093
Av Diff	1.5	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	16.298	16.37	16.443	16.515	16.587	16.659	16.731	16.804	16.876	16.948	17.02	17.093
0.25	16.048	16.12	16.193	16.265	16.337	16.409	16.481	16.554	16.626	16.698	16.77	16.843
0.5	15.798	15.87	15.943	16.015	16.087	16.159	16.231	16.304	16.376	16.448	16.52	16.593
0.75	15.548	15.62	15.693	15.765	15.837	15.909	15.981	16.054	16.126	16.198	16.27	16.343
1	15.298	15.37	15.443	15.515	15.587	15.659	15.731	15.804	15.876	15.948	16.02	16.093
1.25	15.048	15.12	15.193	15.265	15.337	15.409	15.481	15.554	15.626	15.698	15.77	15.843
1.5	14.943	15.015	15.087	15.159	15.231	15.304	15.376	15.448	15.52	15.593		
1.75	14.693	14.765	14.837	14.909	14.981	15.054	15.126	15.198	15.27	15.343		
2												
2.5												
3												
3.5												
4												
4.5												
5												



Station	0	421+780	421+800	421+820	421+840	421+860	421+880	421+900	421+920	421+940	421+960	421+980
DL (27-04-2022)	18.065	18.137	18.209	18.282	18.354	18.426	18.498	18.571	18.643	18.715	18.79	18.86
الفرمة	17.165	17.237	17.309	17.382	17.454	17.526	17.598	17.671	17.743	17.815	17.887	17.96
Asbuilt-Ngl(Bed Levels)	15.165	15.237	15.309	15.382	14.454	14.526	14.598	14.671	14.743	13.572	13.844	13.867
Av Diff	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3.53	4.243	4.093
0	17.165	17.237	17.309	17.382	17.454	17.526	17.598	17.671	17.743	17.815	17.887	17.96
0.25	16.915	16.987	17.059	17.132	17.204	17.276	17.348	17.421	17.493	17.565	17.637	17.71
0.5	16.665	16.737	16.809	16.882	16.954	17.026	17.098	17.171	17.243	17.315	17.387	17.46
0.75	16.415	16.487	16.559	16.632	16.704	16.776	16.848	16.921	16.993	17.065	17.137	17.21
1	16.165	16.237	16.309	16.382	16.454	16.526	16.598	16.671	16.743	16.815	16.887	16.96
1.25	15.915	15.987	16.059	16.132	16.204	16.276	16.348	16.421	16.493	16.565	16.637	16.71
1.5	15.665	15.737	15.809	15.882	15.954	16.026	16.098	16.171	16.243	16.315	16.387	16.46
1.75	15.415	15.487	15.559	15.632	15.704	15.776	15.848	15.921	15.993	16.065	16.137	16.21
2												
2.5												
3												
3.5												
4												
4.5												
5												

ملاحظات
جاءت من
الفرمة

جاءت من
الفرمة





وزارة النقل
الجامعة العامة للطرق والكباري
والنقل البري



مركز الاستشارات الهندسية
للنهر والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)

دكتور/ سعد الجبوشي

مشروع القطار المزدوج (العلمين - فوكا) قطاع د / مكتب سعد الجبوشي مكتب سجالك للاستشارات الهندسية

Project : High speed railway (New Al Alameen-fokka)


Date : 16 / 10 / 2022

Company:

سيناء للمقاولات (حسن أسعد طه)

location : from sta 419+600 to sta 422+100 / Zone : from sta 421 + 560 to 421 + 820 (19)

ASTM C-136 & C-117

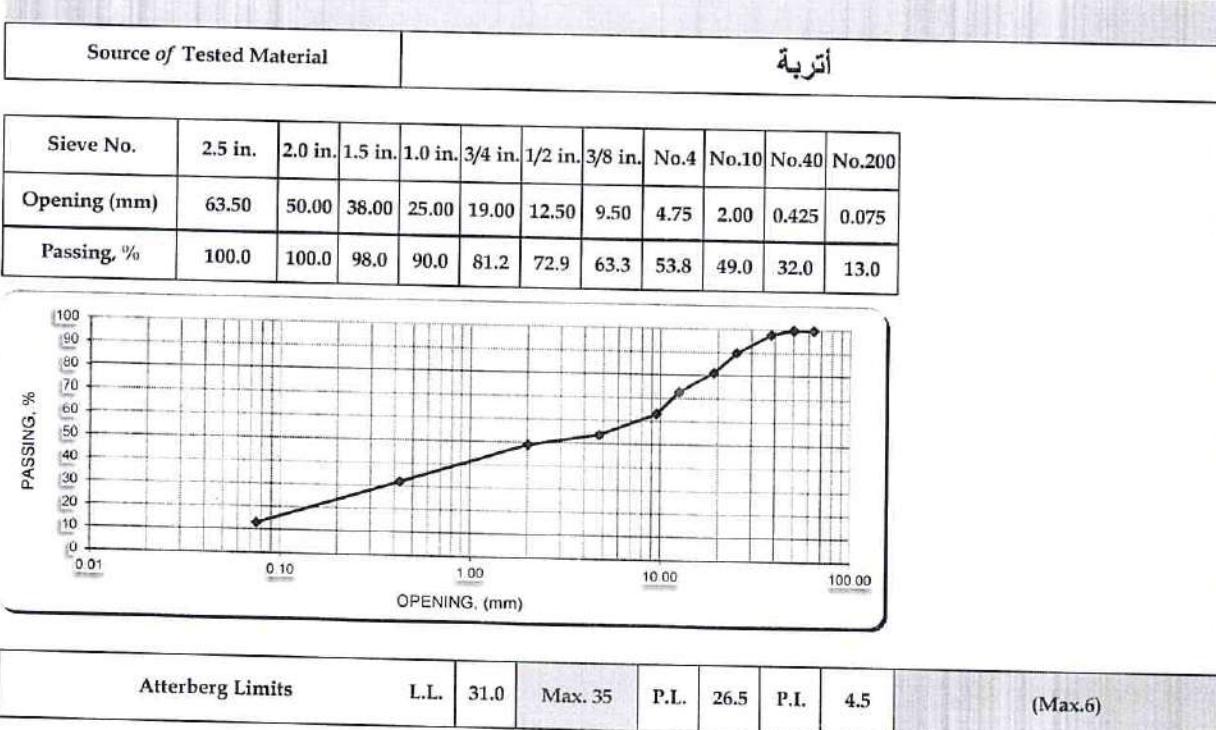

Atterberg Limits	L.L.	31.0	Max. 35	P.L.	26.5	P.I.	4.5	(Max.6)
------------------	------	------	---------	------	------	------	-----	---------

Classification, (ASTM D-2487)

(A-1- b)

GARP Consultant Engineer's Comments :

site engineer:-

Name :-

Signature :-

Consulting materials Engineer:-

Name :-

Signature :-



SYSTRA

مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور سعد الجبوشي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية


Company:	سيناء للمقاولات (حسن أسعد طه)	Sample No:	19
Description :	أتربة	Sample Date :	15/10/2022
Station Repres:	421 + 560 t0 421 + 820	Report Date:	16/10/2022

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. height, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5981	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2120
-----------------------------	------	--	------

Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	10,182	10,355	10,514	10,744	10,612
Wet Density, gm/cm ³	1.982	2.063	2.138	2.247	2.184
Weight of Wet Soil Portion, gm	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Weight after Drying, gm	145.8	143.6	141.1	138.6	136.4
Moisture Content, %	2.9	4.5	6.3	8.2	10.0
Dry Density, gm/cm ³	1.926	1.975	2.011	2.076	1.986

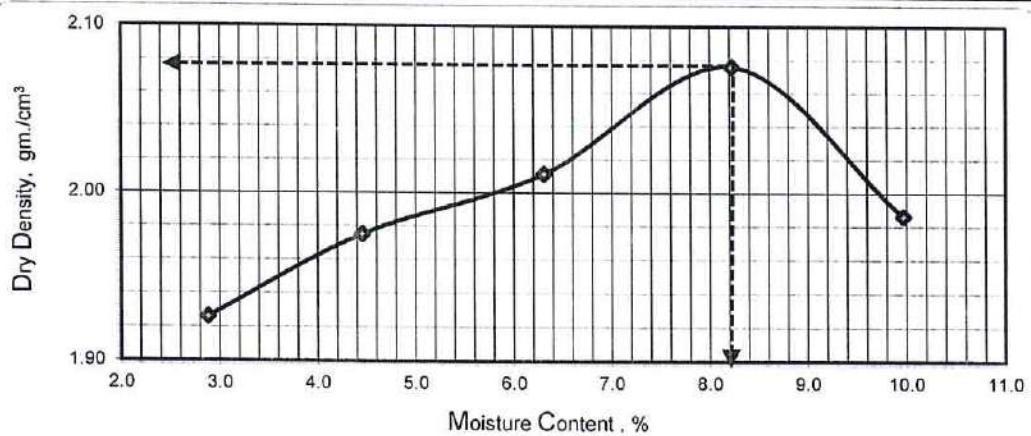Max. Dry Density = 2.078 t/m³

Optimum Moisture Content = 8.20 %

CONSULTANT COMMENTS

site engineer:-

Name :-

Signature :-

Consulting materials Engineer:-

Name :-

Signature :-

دكتور سعد الجبوشي

دكتور سعد الجبوشي
مكتب سعد الجبوشي
للهواء والمعابر
دكتور سعد الجبوشي
دكتور سعد الجبوشي



مركز الاستشارات الهندسية
للتغذى والطارات والطرق
(أخرج: دوليون)
دكتور/ سعد الجوهري



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشى مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

اختبار طبقة اتربة : Activity :

نتائج اختبارات المعمل

Date

20/09/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	حسن أسعد طه سيناء للمقاولات العامة	Layer NO:	(ferma)
Description :	اختبار طبقة اتربة	Layer Thickness:	25 CM
Station Represented :	421 +560 to 421 + 820	Sample Date :	19/09/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.078	8.20	95%	1.490

Compaction Testing Results & Calculations

STATION	421+575	421+600	421+625	421+650	421+675	421+700	421+725	421+750
Hole No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Wt. of Sand before Test, gm	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Wt. of Sand After Test, gm	4555	4602	4633	4591	4660	4701	4696	4502
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4445	4398	4367	4409	4340	4299	4304	4498
Wt. of Sand in Cone	1425	1530	1425	1530	1425	1530	1425	1530
Wt. of Sand at hole, gm	3020	2868	2942	2879	2915	2769	2879	2968
Volume of the Hole, cm ³	2027	1925	1974	1932	1956	1858	1932	1992
Wt. of Soil from Hole, gm	4266	4155	4141	4144	4169	4020	4171	4255
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.105	2.159	2.097	2.145	2.131	2.163	2.159	2.136
Moisture Content, %	6.0	6.2	6.2	5.9	6.0	6.2	6.1	5.9
Dry Density, gm/cm ³	1.986	2.033	1.975	2.025	2.010	2.037	2.035	2.017
Compaction, (%)	95.6%	97.8%	95.0%	97.5%	96.7%	98.0%	97.9%	97.1%

Acceptance Criteria

Comply

Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

site engineer:-

Nama :

—Signature

卷之三

1

Consulting materials Engineer

24

Signature:

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور سعد الجيوشي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية

Activity : اختبار طبقة اتربة

نتائج اختبارات المعمل

Date

20/09/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	حسن أسعد طه سيناء للمقاولات العامة	Layer NO:	(ferma)
Description :	اختبار طبقة اتربة	Layer Thickness:	25 CM
Station Represented :	421 +560 to 421 + 820	Sample Date :	19/09/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.078	8.20	95%	1.490

Compaction Testing Results & Calculations

STATION	421+775	421+800	421+820				
Hole No.	9	10	11				
Wt. of Sand before Test, gm	9000	9000	9000				
Wt. of Sand After Test, gm	4505	4539	4611				
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4495	4461	4389				
Wt. of Sand in Cone	1425	1530	1425				
Wt. of Sand at hole, gm	3070	2931	2964				
Volume of the Hole, cm ³	2060	1967	1989				
Wt. of Soil from Hole, gm	4366	4160	4188				
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.119	2.115	2.105				
Moisture Content, %	6.1	5.9	6.0				
Dry Density, gm/cm ³	1.997	1.997	1.986				
Compaction, (%)	96.1%	96.1%	95.6%				

Acceptance Criteria

Comply

Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

site engineer:-

Name :-


Signature :-



Consulting materials Engineer:-


Name :-

Signature :-



۲۱۰

卷之三



النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع

الطبعة الأولى

مکتبہ میرزا

卷之三

Company : شركة حسن اسعد طه

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6)
- Alamein to Foka

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements

Test Date : 18/10/2022

Report Date : 19/10/2022

Type of soil : A-1-a

Test level : Upper embankment (Firma)

Report No. : 41:46

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 %, and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
 2. Load Settlement curve
 3. The test report content the following:-
- location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Type of soil : A-1-a Job requirement : $E_{v2} > 600 \text{ Kg/cm}^2 (60 \text{ MPa})$.

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	18/10/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio	Remarks
	From	To	$E_{v1} (\text{kg/cm}^2)$	$E_{v2} (\text{kg/cm}^2)$		
1	421+540	421+590	1071	2045	1.9	OK
2	421+590	422+640	938	1875	2.0.	OK
3	421+640	421+690	1125	2045	1.8	OK
4	421+690	422+740	938	1667	1.8	OK
5	421+740	421+790	938	1731	1.8	OK
6	421+790	422+840	900	1552	1.7	OK

Signature / ...

