

المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقاوله / مكتب اركان للمقاولات العامة

بند رقم : (٧)	الكمية	الابعاد			اجمالى
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند		اعمال غرف صرف مطر (بالعدد)			
غرف صرف مطر	٤				٤
اجمالى البند		٤			

مهندس الاستشاري
انزكر المصطفى للاستشارات الهندسية
مستودع حيازة كبرى
مهندسة الشبكات
تت فاكس ٣٧٢٧٨٦٦٤ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس المقاول
مكتب اركان للمقاولات
ب.ض: ٩٦٣ - ١١٩ - ٥٥٥
م.ت: ٥٢٦٠٧ اتحاد مقاولين ٦٤٢٩١


المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي


عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقاوله / مكتب اركان للمقاولات العامة

بند رقم : (٦)	الكمية	الابعاد			اجمالى
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند					اعمال خرسانة عادية لزوم الطبانات (بالمتر المكعب)
٥٠	١٥	٠.٢٥	٠.١٥	٢٨.١٢٥	خرسانة عادية لزوم الطبانات للفاصل الواحد مكون من ٣ باكيات
اجمالى البند					٢٨.١٢٥

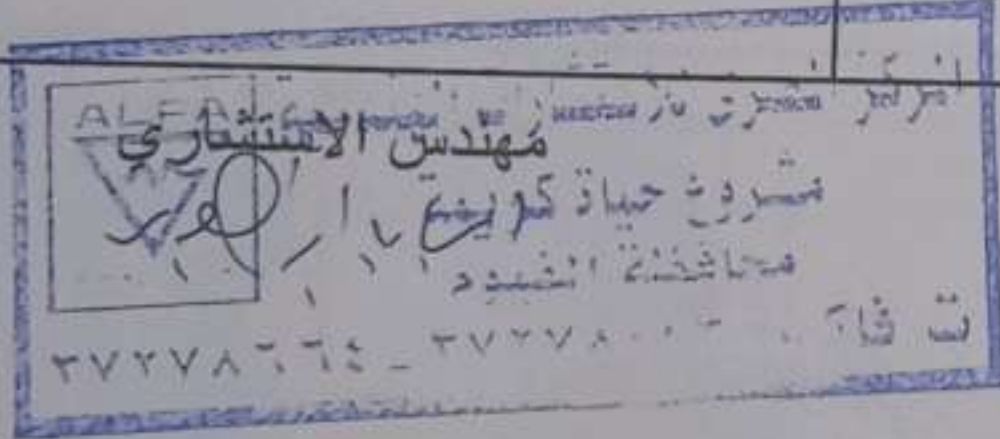

مهندس المقاول



المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب اركان للمقاولات العامة

بند رقم : (٢)	الكمية	الابعاد			اجمالى
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند					اعمال دهان البردورات (بالمتر الطولي)
شريحة رقم ١	١	٤١٥			٤١٥
شريحة رقم ٢	١	٤٢٥			٤٢٥
شريحة رقم ٣	١	٨٠			٨٠
اجمالى البند					٩٢٠

مهندس الاستشاري
مشاريع جيمانه كبري
مشاريع شبكة الطرق الكهربية
٢٧٧٧٨٣٣٩

مهندس المقاول
مكتب اركان للمقاولات
ب.ن. ٩٦٣ - ١١٩ - ٥٥٥
٢٢٢٩١ اتحاد مقاولين

المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم


مقاولة / مكتب أركان للمقاولات العامة

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩		معاينة / استبيان	
بند رقم : (٨)	الكمية	الابعاد	
		ارتفاع	عرض
توصيف البند	اعمال مواسير انحدار قطر ٤ " (بالمتر الطولي)		
	٤	٥	٢٠
مواسير انحدار ٤"			
اجمالي البند		٢٠	

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري



مهندس المقاول



مكتب اركان للمقاولات
ب. ف. ٩٦٢ - ١١٩ - ٥٥٥
س. ت. ٥٣٦.٧ اتحاد مقاولين ٦٤٢٩١

المنطقة السادسة ببنى سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب اركان للمقاولات العامة

بند رقم : (١٧)	الكمية	الابعاد			اجمالى
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند		اعمال توريد وتركيب كابل ٢٥*٢ مم الومنيوم (بالمتر الطولي)			
توريد وتركيب كابل ٢٥*٢ الومنيوم	١٠٠				١٠٠
اجمالى البند		١٠٠			

مهندس الاستشاري
مركز الدراسات والبحوث
مشاريع حيازة كبريا
مشاريع التنمية
٢٧٢٧٨٠٨٢ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

مهندس المقاول

مكتب اركان للمقاولات
ب. في ٩٦٣ - ١١٩ - ٥٥٥
ش. ت. ٢٣٦٧ اتحاد شاولين ٦٢٩١

المنطقة السادسة بني سويف



اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقاوله / مكتب أركان للمقاولات العامة

بند رقم : (٩)	الكمية	الابعاد			اجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند		مراشمة ودهان حديد مشغول واعادة الدهان (بالمتر الطولي)			
مراشمة ودهان حديد مشغول واعادة الدهان	٤٨				٤٨
اجمالي البند		٤٨			

مهندس المقاول

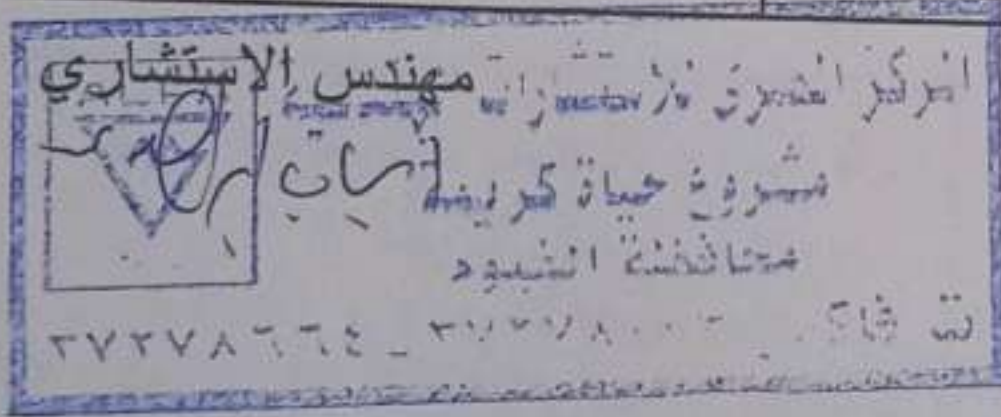

المنطقة السادسة بيني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقابلة / مكتب أركان للمقاولات العامة

بند رقم : (٥)	الكمية	الابعاد			اجمالى
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند					
اعمال الردم برمال نظيفة (بالمتر المكعب)					
شريحة رقم ١	١	٤١٥	١.٤	٠.٢	١١٦.٢
شريحة رقم ٢	١	٤٢٥	١.٦	٠.٢	١٣٦
شريحة رقم ٣	١	٩٠٠	١.٩٢	١	١٧٢٨
اجمالى البند					١٩٨٠.٢

۱۹۸۰.۲

۲۷۲۷۸-۲۷۲۷۸

مهذب المقاول

مكتب أركان للمقاولات
ب. فر. ٩٦٣ - ١١٩ - ٥٥٥
س. ت. ٥٢٦٠٧ : الهاتف : ٦٢٤٩١

المنطقة السادسة ببني سويف


اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم


رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقاوله / مكتب اركان للمقاولات العامة

بند رقم : (١٥)	الكمية	الابعاد			اجمالى
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند					اعمال توريد وتركيب بلافونيرة (بالعدد)
١٢٤	١٢٤				١٢٤
توريد وتركيب بلافونيرة					
اجمالى البند					١٢٤

مهندس الاستشاري

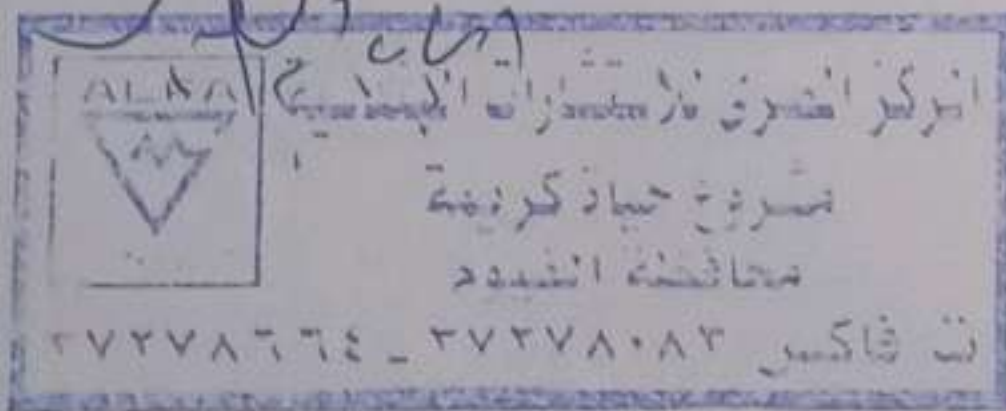

مهندس المقاول



المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق المشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب اركان للمقاولات العامة

بند رقم : (١٣)	الكمية	الابعاد			اجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند					اعمال دهانات جرافياتو للوجهات (بالمتر المسطح)
جلسة الباكية للفاصل الواحد	٣	٤.٩٥		١.٢٧	١٨.٨٥٩٥
وش العمود للفاصل الواحد	٤	٠.٥٥		٢.٤	٥.٢٨
جانب العمود اسفل طبانة الجلسة للفاصل الواحد	٦	٠.١٣		١.٢٧	٠.٩٩٠٦
اجمالي الفاصل الواحد				٢٥.١٣	٢٥.١٣٠١
اجمالي الفواصل	٣٤	٢٥.١٣٠١			٨٥٤.٤٢٣٤
اجمالي البند					٨٥٤.٤٢٣٤

مهندس الاستشاري
المرکز القومى للاستشارات
مدرج جبهة كبرى
محافظة الفيوم
ت فاكس ٢٧٢٧٨٦٦٤ - ٢٧٢٧٨٠٨٣

مهندس المقاول
مكتب اركان للمقاولات
ب نر : ٩٦٣ - ١١٩ - ٥٥٥
ب نر : ٥٢٦٠٧ اتحاد مقاولين ٦٤٢٩١



اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم
رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب أركان للمقاولات العامة

تابع بند رقم : (٥) الميزانية الشبكية لاعمال الردم برمال نظيفة

Pt	North	East	Elevation	(Y)net	(Z)net
٧٥	٣٢٥٩٣٢٤.٥٤٣	٢٦٨٦٤٤.٦٥٦	٩٨.٤١٨		
٧٦	٣٢٥٩٣٠٩.٧٨٤	٢٦٨٦٤٦.٦٣٧	٩٩.٣٩٧	١.٩٥	٠.٩٩
٧٧	٣٢٥٩٣١٠.٣١٦	٢٦٨٦٤٤.٦٨٧	٩٨.٤٠٧		
٧٨	٣٢٥٩٢٩٢.٩٦٦	٢٦٨٦٤٦.٦٦١	٩٩.٣٥٣	١.٩٧٣	١.٠٣٦
٧٩	٣٢٥٩٢٩٣.٧٢٣	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٣١٧		
٨٠	٣٢٥٩٢٧٧.٩٨١	٢٦٨٦٤٦.٦٧٣	٩٩.٣٤٢	١.٩١٧	٠.٩٧
٨١	٣٢٥٩٢٧٨.٣٢٢	٢٦٨٦٤٤.٧٥٦	٩٨.٣٧٢		
٨٢	٣٢٥٩٢٦٢.٢٢	٢٦٨٦٤٦.٦٥٨	٩٩.٤٣٥	١.٨٧٧	٠.٩٦٣
٨٣	٣٢٥٩٢٦٢.٢٥	٢٦٨٦٤٤.٧٨١	٩٨.٤٧٢		
٨٤	٣٢٥٩٢٤٥.٣٤١	٢٦٨٦٤٦.٦٢١	٩٩.٣٠٢	١.٨٩	٠.٩٨٣
٨٥	٣٢٥٩٢٤٥.٥٩٧	٢٦٨٦٤٤.٧٣١	٩٨.٣١٩		
٨٦	٣٢٥٩٢٢٥.٠١٤	٢٦٨٦٤٦.٦٤٥	٩٩.٣٥٤	١.٩١	١.٠٣٩
٨٧	٣٢٥٩٢٢٥.١٠٨	٢٦٨٦٤٤.٧٣٥	٩٨.٣١٥		
٨٨	٣٢٥٩٢١٠.٧٤٩	٢٦٨٦٤٦.٦٧٨	٩٩.٤٠١	١.٩٢	٠.٩٣٦
٨٩	٣٢٥٩٢١٠.٩٣٢	٢٦٨٦٤٤.٧٥٨	٩٨.٤٦٥		
٩٠	٣٢٥٩١٩٨.٨٥	٢٦٨٦٤٦.٦١٣	٩٩.٣٨٢	١.٩٤٧	٠.٩٨٨
٩١	٣٢٥٩١٩٨.٨٦٩	٢٦٨٦٤٤.٦٦٦	٩٨.٣٩٤		
٩٢	٣٢٥٩١٨٣.٢٤٨	٢٦٨٦٤٦.٦٠٣	٩٩.٤١٧	١.٩٢٦	٠.٩٨٦
٩٣	٣٢٥٩١٨٣.٤٤٦	٢٦٨٦٤٤.٦٧٧	٩٨.٤٣١		
٩٤	٣٢٥٩١٦٧.٥٩٨	٢٦٨٦٤٦.٦١١	٩٩.٣٢١	١.٩٤	٠.٩٨٦
٩٥	٣٢٥٩١٦٨.١٠١	٢٦٨٦٤٤.٦٧١	٩٨.٣٣٥		
٩٦	٣٢٥٩١٥٢.٣٧٢	٢٦٨٦٤٦.٦١٧	٩٩.٣٩٤	١.٩٦٦	١.٠٧٢
٩٧	٣٢٥٩١٥٢.٦٤	٢٦٨٦٤٤.٦٥١	٩٨.٣٢٢		
٩٨	٣٢٥٩١٣٩.٥١٨	٢٦٨٦٤٦.٦٠٣	٩٩.٣٩٣	١.٩٥٩	١.٠٤
٩٩	٣٢٥٩١٤٠.٢٥٤	٢٦٨٦٤٤.٦٤٤	٩٨.٣٥٣		
١٠٠	٣٢٥٩١٢٣.٥٨٤	٢٦٨٦٤٦.٦٠٩	٩٩.٣٨٧	١.٩٢١	١.٠٢١
١٠١	٣٢٥٩١٢٤.١٤٤	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٣٦٦		
١٠٢	٣٢٥٩١٠٨.٠٦٥	٢٦٨٦٤٦.٦٠٣	٩٩.٣٦٩	١.٩١٥	٠.٩٨٨
١٠٣	٣٢٥٩١٠٨.٨٥٦	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٣٨١		
١٠٤	٣٢٥٩٠٩٢.١٦٥	٢٦٨٦٤٦.٧٥٤	٩٩.٣٦٩	١.٨٨٢	٠.٩٨٨
١٠٥	٣٢٥٩٠٩٢.٧٥٦	٢٦٨٦٤٤.٨٧٢	٩٨.٣٨١		
١٠٦	٣٢٥٩٠٦٠.٢٥٥	٢٦٨٦٤٧.٧٠٣	٩٩.٣٦٩	١.٧١٥	٠.٩٨٨
١٠٧	٣٢٥٩٠٦٠.٦٨٦	٢٦٨٦٤٥.٩٨٨	٩٨.٣٨١		
١٠٨	٣٢٥٩٠٣٢.١٣٥	٢٦٨٦٤٧.٧٦٢	٩٩.٣٩	١.٨٤٤	١.٠١٤
١٠٩	٣٢٥٩٠٣٢.٢٥٦	٢٦٨٦٤٥.٩١٨	٩٨.٣٧٦		
اجمالي القراءات	٩٠٠.٤٣٤			١٠٣.٧٠٩	٥٣.٩٦٥
متوسط القراءات	٩٠٠.٣٤١			١.٩٢٠.٥٤	٠.٩٩٩٣٥٢
مكعب ردم الحفر					١٧٢٨.٠١٧
مكعب ردم الانتر لوك	٤١٥			١.٤	٠.٢
مكعب ردم الانتر لوك	٤٢٥			١.٦	٠.٢
اجمالي تكعيب الردم					١٩٨٠.٢١٧

المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب أركان للمقاولات العامة

بند رقم : (٤)	الكمية	الابعاد			اجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	
اوصيف البند					اعمال الانترلوك (بالمتر المسطح)
شريحة رقم ١	١	٤١٥	١.٤		٥٨١
شريحة رقم ٢	١	٤٢٥	١.٦		٦٨٠
شريحة رقم ٣	١	٨٠	١.٧٥		١٤٠
اجمالي البند					١٤٠١

انترگر انجنيئرنگ فارميشن
مهندس الاپيٹشاري
(ماہر)
تصميم و اجرا
سويچنگ انجنيئرنگ

٧٧٢٧٨

مهندس المقاول

مكتب أركان للمقاولات
ب.ض. ٩٦٢ - ١١٩ - ٥٥٥
س.ت. ٥٢٦٠٧ اتحاد مقاولين ٦٤٢٩١

المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

مقاوله / مكتب اركان للمقاولات العامة

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ -

بند رقم : (١٠)	الكمية	الابعاد			اجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند					
فك واعادة تركيب حديد مشغول قديم (بالمتري الطولي)					
٤٨	٤٨				٤٨
فك واعادة تركيب حديد مشغول قديم					
اجمالي البند					
٤٨					

مهندس الاستشاري
انور محمد احمد
مشروع حماية كبريتية
محافظة الفيوم
ت. فاكس : ٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

مهندس المقاول
مكتب اركان للمقاولات
ب. فاكس : ٩٦٣ - ١١٩ - ٥٥٥
٢٢٢٩١



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة ببني سويف


اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق المشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب اركان للمقاولات العامة

تابع بند رقم : (٥) الميزانية الشبكية لاعمال الردم برمال نظيفة

Pt.	North	East	Elevation	(Y)net	(Z)net
٣٥	٣٢٥٩٦٧٨.٢٠٤	٢٦٨٦٤٤.٧٠١	٩٨.٤١١		
٣٦	٣٢٥٩٦٦٣.٠٨٢	٢٦٨٦٤٦.٦٢٥	٩٩.٣٩٤	١.٩٤٧	٠.٩٩١
٣٧	٣٢٥٩٦٦٣.٣٨	٢٦٨٦٤٤.٦٧٨	٩٨.٤٠٣		
٣٨	٣٢٥٩٦٤٧.٥١٢	٢٦٨٦٤٦.٦٦٨	٩٩.٤١١	١.٩٧	٠.٩٨٨
٣٩	٣٢٥٩٦٤٧.٨٧٧	٢٦٨٦٤٤.٦٩٨	٩٨.٤٢٣		
٤٠	٣٢٥٩٦٣٣.١٧٤	٢٦٨٦٤٦.٦٧٨	٩٩.٣٩٤	١.٩٨٧	٠.٩٨٢
٤١	٣٢٥٩٦٣٣.٧٤٧	٢٦٨٦٤٤.٦٩١	٩٨.٤١٢		
٤٢	٣٢٥٩٦١٨.٦٩٧	٢٦٨٦٤٦.٦٠٣	٩٩.٣٥٤	١.٩٢٦	١.٠٣٩
٤٣	٣٢٥٩٦١٩.٤٣٣	٢٦٨٦٤٤.٦٧٧	٩٨.٣١٥		
٤٤	٣٢٥٩٦٠٣.٣٨٢	٢٦٨٦٤٦.٦٥٢	٩٩.٣٦٢	١.٩٨	٠.٩٧٧
٤٥	٣٢٥٩٦٠٣.٥٣٩	٢٦٨٦٤٤.٦٧٢	٩٨.٣٨٥		
٤٦	٣٢٥٩٥٨٨.٢٧١	٢٦٨٦٤٦.٥١٨	٩٩.٤٠٢	١.٩٤٦	١.٠١٥
٤٧	٣٢٥٩٥٨٨.٧٨٣	٢٦٨٦٤٤.٥٧٢	٩٨.٣٨٧		
٤٨	٣٢٥٩٥٧١.٦٩٥	٢٦٨٦٤٦.٥٥٣	٩٩.٤١٣	١.٩٠٢	١.٠١٤
٤٩	٣٢٥٩٥٧١.٩٩٧	٢٦٨٦٤٤.٦٥١	٩٨.٣٩٩		
٥٠	٣٢٥٩٥٥٦.٤٩٤	٢٦٨٦٤٦.٦٤٣	٩٩.٤٢٥	١.٧٨٦	٠.٩٨١
٥١	٣٢٥٩٥٥٦.٧٦٥	٢٦٨٦٤٤.٨٥٧	٩٨.٤٤٤		
٥٢	٣٢٥٩٥٤٢.١٥	٢٦٨٦٤٦.٦٣٤	٩٩.٤٠٦	١.٩٤٦	٠.٩٨٣
٥٣	٣٢٥٩٥٤٢.٢	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٤٢٣		
٥٤	٣٢٥٩٤٧٧.١٢٦	٢٦٨٦٤٦.٦٢٣	٩٩.٤٤٥	١.٩٣٥	٠.٩٥٦
٥٥	٣٢٥٩٤٧٦.٩٧٩	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٤٨٩		
٥٦	٣٢٥٩٤٥٨.٢٩٦	٢٦٨٦٤٦.٦١٣	٩٩.٤٣٥	١.٩٥٩	١.٠٢٧
٥٧	٣٢٥٩٤٥٨.١٩٥	٢٦٨٦٤٤.٦٥٤	٩٨.٤٠٨		
٥٨	٣٢٥٩٤٤٨.٤٨٩	٢٦٨٦٤٦.٦٧٣	٩٩.٣٨٨	١.٩٧٧	٠.٩٧٩
٥٩	٣٢٥٩٤٤٨.٦٤٥	٢٦٨٦٤٤.٦٩٦	٩٨.٤٠٩		
٦٠	٣٢٥٩٤٣٣.٥٤٦	٢٦٨٦٤٦.٦١٢	٩٩.٤٥٥	١.٩٦٩	٠.٩٦٨
٦١	٣٢٥٩٤٣٣.٣٩٩	٢٦٨٦٤٤.٦٤٣	٩٨.٤٨٧		
٦٢	٣٢٥٩٤١٥.٠٦٨	٢٦٨٦٤٦.٦٤٣	٩٩.٣٧٦	١.٩٥٥	٠.٩٧٧
٦٣	٣٢٥٩٤١٥.١٦٨	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٣٩٩		
٦٤	٣٢٥٩٤٠٣.٤٣٩	٢٦٨٦٤٦.٦٢٣	٩٩.٣٥٤	١.٩٩	١.٠٣٩
٦٥	٣٢٥٩٤٠٣.٨٤٢	٢٦٨٦٤٤.٦٣٣	٩٨.٣١٥		
٦٦	٣٢٥٩٣٨٦.٩٩٥	٢٦٨٦٤٦.٦٥٣	٩٩.٤٣٦	١.٩٦٥	١.٠١١
٦٧	٣٢٥٩٣٨٦.٤٤٢	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٤٢٥		
٦٨	٣٢٥٩٣٧٤.٤٢٦	٢٦٨٦٤٦.٦٧١	٩٩.٤٠٦	١.٩٨٣	٠.٩٩٥
٦٩	٣٢٥٩٣٧٤.٧٤٦	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٤١١		
٧٠	٣٢٥٩٣٥٨.٩٧٢	٢٦٨٦٤٦.٦٠٣	٩٩.٤١١	١.٩٢٦	٠.٩٧٥
٧١	٣٢٥٩٣٥٩.٢٢٤	٢٦٨٦٤٤.٦٧٧	٩٨.٤٣٦		
٧٢	٣٢٥٩٣٤١.٤٧٩	٢٦٨٦٤٦.٦٢٥	٩٩.٣٨٤	١.٨٩٢	٠.٩٨٨
٧٣	٣٢٥٩٣٤١.٣٨٨	٢٦٨٦٤٤.٧٣٣	٩٨.٣٩٦		
٧٤	٣٢٥٩٣٢٤.٣٦٦	٢٦٨٦٤٦.٦٤٥	٩٩.٤٢١	١.٩٨٩	١.٠٠٣

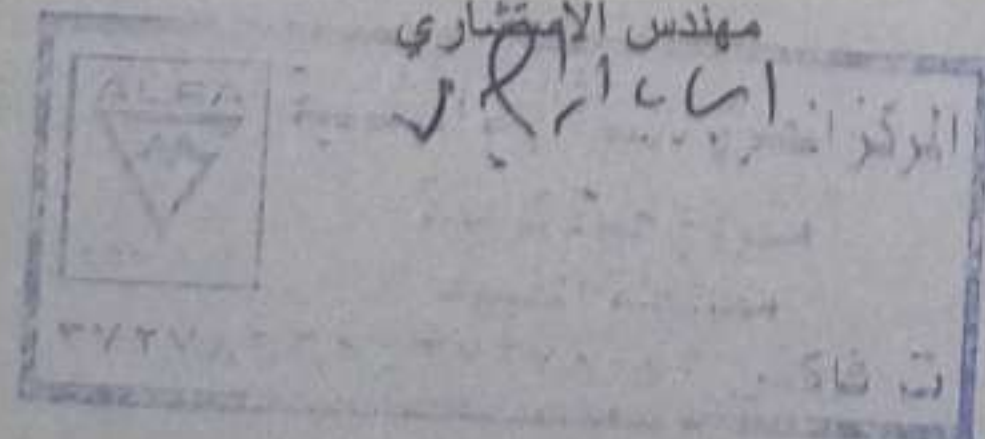

صفحة (٢)

مهندس الشركة

Signature of the Engineer of the Company



المنطقة السادسة بني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق المشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقاوله / مكتب أركان للمقاولات العامة

بند رقم : (١٢)	الكمية	الابعاد			اجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند					اعمال بياض تخشين اسمنتي للوجهات (بالمتر المسطح)
جلسة الباكية للفاصل الواحد	٣	٤.٩٥		١.٢٧	١٨.٨٥٩٥
وشن العمود للفاصل الواحد	٤	٠.٥٥		٢.٤	٥.٢٨
جانب العمود اسفل طبانة الجلسة للفاصل الواحد	٦	٠.١٣		١.٢٧	٠.٩٩٠٦
اجمالي الفاصل الواحد					٢٥.١٣٠١
اجمالي الفواصل	٣٤			٢٥.١٣٠١	٨٥٤.٤٢٣٤
اجمالي البند					٨٥٤.٤٢٣٤

مهندس المقاول

مكتب أركان للمقاولات
ب. ق. ١١٩ - ١١٩
ب. ق. ١١٩ - ١١٩

مهندس الاستشاري
م. ق. ١١٩ - ١١٩
م. ق. ١١٩ - ١١٩
م. ق. ١١٩ - ١١٩

المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب أركان للمقاولات العامة

بند رقم : (١٨)	الكمية	الابعاد			اجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند		اعمال توريد وتركيب مواسير ١.٥ " (بالمتري الطولي)			
توريد وتركيب مواسير ١.٥ "	١٠٠				١٠٠
اجمالي البند		١٠٠			

مهندس الاستشاري
مركز الدراسات والبحوث
مشروع حيازة كبريات
محافظة الفيوم
ت. فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس المقاول
مكتب أركان للمقاولات
ب. ف. ٩٦٣ - ١١٩ - ٥٥٥
س. ت. ٣٦٠٧ اتحاد مقاولين ٦٤٢٩١

المنطقة السادسة ببني سويف

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقاوله / مكتب اركان للمقاولات العامة

بند رقم : (١٤)	الكمية	الابعاد			اجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند					اعمال حجر هاشمي (بالمتر المسطح)
جلسة الباكية للفاصل الواحد	٣	٤.٩		٠.٦٧	٩.٨٤٩
طبانة الباكية للفاصل الواحد	٣	٤.٩	٠.٣٥		٥.١٤٥
تاج العمود للفاصل الواحد	٤	٠.٦٥	٠.٦	٠	١.٥٦
وش العمود للفاصل الواحد	٤	٠.٥٥		١.٨	٣.٩٦
جانب العمود اسفل طبانة الجلسة للفاصل الواحد	٦	٠.١٣		١.٢٧	٠.٩٩٠٦
جانب العمود اعلي طبانة الجلسة للفاصل الواحد	٦	٠.٦٥		١.١٣	٤.٤٠٧
اجمالي الفاصل الواحد					٢٥.٩١١٦
اجمالي الفواصل	٣٣	٢٥.٩١١٦			٨٥٥.٠٨٢٨
اجمالي البند					٨٥٥.٠٨٢٨

اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشى السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب أركان للمقاولات العامة

بند رقم : (٣)	الكمية	الابعاد			اجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	
اعمال قدمة من الخرسانة العادية (بالمتر الطولي)					
شريحة رقم ١	١	٤١٥			٤١٥
شريحة رقم ٢	١	٤٢٥			٤٢٥
شريحة رقم ٣	١	٨٠			٨٠
اجمالي البند					٩٢٠

[illegible]

مهندس المقاول

مكتب أركان للمقاولات

ب.ش. ٩٦٣ - ١١٩ - ٥٥٥

س.ت. ٢٦٦٠٧ اتحاد مقاولين ٦٤٢٩١

المنطقة السادسة ببني سويف


اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم


رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب أركان للمقاولات العامة

بند رقم : (١٦)	الكمية	الابعاد			اجمالى
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند		اعمال توريد وتركيب كابل ١٦*٢ مم الومنيوم (بالمتر الطولي)			
توريد وتركيب كابل ١٦*٢ الومنيوم	٩٠٠				٩٠٠
اجمالى البند					٩٠٠

مهندس الاستشاري

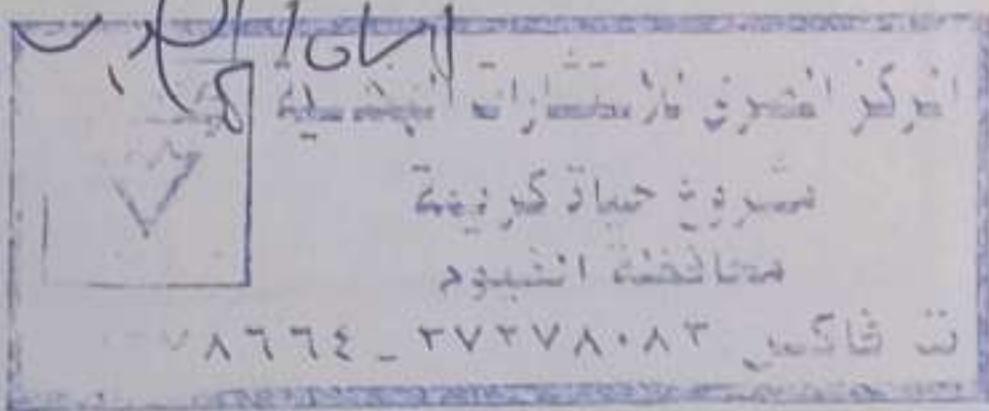

مهندس المقاول

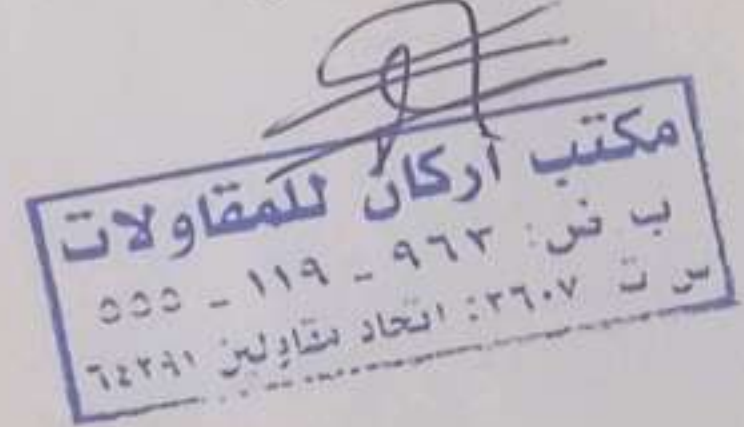



اعمال حصر مستخلص ختامي


عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقالة / مكتب أركان للمقاولات العامة

بند رقم : (٥) الميزانية الشبكية لاعمال الردم برمال نظيفة

Pt	North	East	Elevation	(Y)net	(Z)net
1-					
B	٣٢٥٩٩٣٢.٦٩	٢٦٨٧٢٠.٧٥٩	٩٨.٦٢٩		
١	٣٢٥٩٩٣٢.٥٩٧	٢٦٨٦٤٦.٦٠٣	٩٩.٣٥٤	١.٩١٥	٠.٩٦٩
٢	٣٢٥٩٩٣٢.٨٨٤	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٣٨٥		
٣	٣٢٥٩٩١٦.٣٦٨	٢٦٨٦٤٦.٦٠٥	٩٩.٣٦٤	١.٧٣٤	٠.٩٧٣
٤	٣٢٥٩٩١٦.٣٧٣	٢٦٨٦٤٤.٨٧١	٩٨.٣٩١		
٥	٣٢٥٩٩٠٠.٠٢٩	٢٦٨٦٤٦.٦٧٨	٩٩.٣٤٤	١.٩٦٦	١.٠٢٩
٦	٣٢٥٩٩٠٠.٠٨٧	٢٦٨٦٤٤.٧١٢	٩٨.٣١٥		
٧	٣٢٥٩٨٨٣.٣٦٦	٢٦٨٦٤٦.٥٧٨	٩٩.٣٧٤	١.٩٧٦	٠.٩٧٦
٨	٣٢٥٩٨٨٣.٦٧	٢٦٨٦٤٤.٦٠٢	٩٨.٣٩٨		
٩	٣٢٥٩٨٦٦.٦٢	٢٦٨٦٤٦.٦٤٣	٩٩.٣٩٤	١.٩٣١	٠.٩٩٢
١٠	٣٢٥٩٨٦٦.٣٣٦	٢٦٨٦٤٤.٧١٢	٩٨.٤٠٢		
١١	٣٢٥٩٨٥٠.٨٦٧	٢٦٨٦٤٦.٦٥٤	٩٩.٤٠٤	١.٩٦٦	١.٠٣١
١٢	٣٢٥٩٨٥٠.٥٠٧	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٣٧٣		
١٣	٣٢٥٩٨٣٥.٩٧٣	٢٦٨٦٤٦.٦٠٣	٩٩.٣٦٤	١.٩١٥	١.٠٣٦
١٤	٣٢٥٩٨٣٥.٩٣٥	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٣٢٨		
١٥	٣٢٥٩٨٢٥.٦٤٤	٢٦٨٦٤٦.٦٧٩	٩٩.٤٠١	١.٨٠٨	١.٠٠٩
١٦	٣٢٥٩٨٢٥.٦٢٥	٢٦٨٦٤٤.٨٧١	٩٨.٣٩٢		
١٧	٣٢٥٩٨٠٩.٣٢٦	٢٦٨٦٤٦.٦٢٣	٩٩.٣٩٦	١.٩٣٦	١.٠١٢
١٨	٣٢٥٩٨٠٨.٩٢٤	٢٦٨٦٤٤.٦٨٧	٩٨.٣٨٤		
١٩	٣٢٥٩٧٩٢.٠٩٨	٢٦٨٦٤٦.٦٥٢	٩٩.٤٠٢	١.٦٩١	١.٠١٣
٢٠	٣٢٥٩٧٩١.٥٤٦	٢٦٨٦٤٤.٩٦١	٩٨.٣٨٩		
٢٢	٣٢٥٩٧٧٥.٤٨٥	٢٦٨٦٤٦.٦٦٣	٩٩.٣٩٨	١.٨٩٢	٠.٩٩٣
٢٣	٣٢٥٩٧٧٤.٦٤٥	٢٦٨٦٤٤.٧٧١	٩٨.٤٠٥		
٢٤	٣٢٥٩٧٥٧.٩٩	٢٦٨٦٤٦.٥٧١	٩٩.٤١٣	١.٩٨٢	١.٠٢٥
٢٥	٣٢٥٩٧٥٨.١١٧	٢٦٨٦٤٤.٥٨٩	٩٨.٣٨٨		
٢٦	٣٢٥٩٧٣٩.٣١٢	٢٦٨٦٤٦.٥٧٣	٩٩.٤٠٩	١.٨٨٥	١.٠٢٢
٢٧	٣٢٥٩٧٣٩.٢٦٧	٢٦٨٦٤٤.٦٨٨	٩٨.٣٨٧		
٢٨	٣٢٥٩٧٢٢.٧٧٦	٢٦٨٦٤٦.٦٥٨	٩٩.٤٠٦	١.٨٦٥	١.٠٠٧
٢٩	٣٢٥٩٧٢٢.٧٦٨	٢٦٨٦٤٤.٧٩٣	٩٨.٣٩٩		
٣٠	٣٢٥٩٧٠٧.٤٦١	٢٦٨٦٤٦.٦٢٩	٩٩.٣٩٨	١.٩٧١	١.٠٢١
٣١	٣٢٥٩٧٠٨.٠٨	٢٦٨٦٤٤.٦٥٨	٩٨.٣٧٧		
٣٢	٣٢٥٩٦٩١.٦٣	٢٦٨٦٤٦.٦٦٣	٩٩.٣٩٨	١.٩٨٢	٠.٩٩١
٣٣	٣٢٥٩٦٩٢.٠٤٩	٢٦٨٦٤٤.٦٨١	٩٨.٤٠٧		
٣٤	٣٢٥٩٦٧٨.١٥٥	٢٦٨٦٤٦.٦١٣	٩٩.٤٠١	١.٩١٢	٠.٩٩

مهندس الاستشاري



صفحة (١)

مهندس الشركة



اعمال حصر مستخلص ختامي

عملية : الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

رقم عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩ - مقاوله / مكتب اركان للمقاولات العامة

بند رقم : (١)	الكمية	الابعاد			اجمالى
		طول	عرض	ارتفاع	
توصيف البند		اعمال البردورات (بالمتر الطولي)			
شريحة رقم ١	١	٤١٥			٤١٥
شريحة رقم ٢	١	٤٢٥			٤٢٥
شريحة رقم ٣	١	٨٠			٨٠
اجمالى البند		٩٢٠			

مهندس المقاول
مكتب اركان للمقاولات
ب. ف. ١١٩ - ٥٥٥
ت. ٢٢٦٠٧ اتحاد مقاولين ٦٤٢٩١

مهندس المقاول

مكتب اركان للمقاولات
ب. ف. ١١٩ - ٥٥٥
ت. ٢٢٦٠٧ اتحاد مقاولين ٦٤٢٩١

مقايمة الختامية الخاصة بعملية

الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم
ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة العاجلة ٢٠٢٣)

عقد رقم : ١٠٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مقاوله / مكتب اركان للمقاولات العامة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	اللمة	سعر التكلفة
١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بابعاد ١١.٥/١٥*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣م.٨ سن دلويمت لايزيد اكبر بعد للحبيبات عدد ١.٥ سم + ٣م.٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة اعلى فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملئ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٩٢٠	١٣٥	١٢٤٢٠٠
٢	بالمتر الطولي دهان البردورة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٩٢٠	١٨	١٦٥٦٠
٣	بالمتر الطولي توريد وصب قذمة من الخرسانة العادية اسفل البردورات بابعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٩٢٠	٤٦	٤٢٣٢٠
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للبيئة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم/م٢ وباللون المطلوب يتم تركيبة علي طبقة من الرمل سمك ٤٠ سم في الاماكن المطلوبة ومحمل علي البند جميع مايلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة مقاس ١٠٠*٢٠٠*٦٠ سم	م.م	١٤٠٠	١٧٩	٢٥٠٦٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وشغل رمل لظيفة مودة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل ردم طبقات لتركيب سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه جيدا باستخدام ادوات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافة ونهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٩٨٠	٢٤٠	٤٧٥٢٠٠
٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية لزم الطبقات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٢ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ .	م.م	٢٨.١٢٥	٢١٣٥	٦٠٠٤٦.٨٨
٧	بالعددي توريد وتنفيذ غرفة تجميع صرف مطر بالابعاد الاتية ١٥*٦٠*٦٠ سم والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٤	٥٦٠٠	٢٢٤٠٠
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير انحدار قطر ٤" من البلاستيك بضغط تشغيل لا يقل عن ٦ جو طبقا للاماكن والميول الموضحة بالرسم والبلد يشمل كافة انواع الحفر والردم ونهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٠	٣٠٠	٦٠٠٠
٩	بالمتر الطولي مراشمة ودهان حديد مشغول وتنظيفه من الصدأ واي شوائب واعادة الدهان باستخدام الطرق الهندسية الصحيحة والمواد المعتمدة من المهندس المشرف ونهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٨	٣٠٠	١٤٤٠٠
١٠	بالمتر الطولي فك واعادة تركيب حديد مشغول قديم بالموقع باستخدام الطرق الهندسية الصحيحة والسعر يشمل النقل من والى الموقع ونهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٨	٢٥٠	١٢٠٠٠
١١	بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول فورجيه بالموقع والسعر يشمل جميع الوصلات والمعدات اللازمة للتركيب والدهان بوجهين تحضيري بالبريمر ودهان وجهين من مادة ايبوكسية او اللاكية من مواد معتمدة من قبل الاستشاري والنقل اي الموقع وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	كجم	١٤٦٠٠	٨٠	١١٦٨٠٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد عمل بياض تخشين اسمنتي خارجي لزوم الوجهات والسعر يشمل جميع مايلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٨٥٠	١٩٠	١٦١٥٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد عمل دهانات جرافيتو ذات اساس اكليرك مائعة للنفاذية وانتاج احدي الشركات المتخصصة لزوم الوجهات والسعر يشمل جميع مايلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٨٥٠	٢٠٠	١٧٠٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هاشمي من نوعية معتمدة علي ان يلصق بمونة اسمنتية مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل والبند شامل مما جعيه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٨٥٠.٠٨	٥٥٠	٤٧٠٢٩٤
١٥	بالعدد توريد وتركيب بلاطولييره من نوع معتمد تركيب علي الاسوار والبند محمل عليه كافة التوصيلات الكهربائية من خراطيم واسلاك والبند شامل مما جعيه وعمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٢٤	١٧٠٠	٢١٠٨٠٠
١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل الومنيوم قطاع ١٦*٢ مم لزوم التوصيلات الرئيسية والسعر يشمل النقل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٩٠٠	٣٠٠	٢٧٠٠٠٠
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل الومنيوم قطاع ٢٥*٢ مم لزوم التوصيلات الرئيسية والسعر يشمل النقل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠٠	٥٢٠	٥٢٠٠٠
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ١.٥ بوصة PVC وكل مايلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠٠	٥٠	٥٠٠٠
الاجمالي					٣٥٣١٣٢١

مهندس الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة


بعضد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة بني سويف

مهندس طارق يوسف الجزار

وزارة النقل







تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن "مكتب اركان للمقاولات العامة" ليس لديها محملات (مركبات - معلومات) عن عملية "الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشى السياحي القديم محافظة الفيوم المنطقة السادسة/ بني سويف.

- عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٩) .

- تحرير في ٢٠٢٤/٣/٦

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



١٦ ٤٤١٣
التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة بحوث صيانة الجسور

حور هـ حليم الزميل



محمد سعيد

تم المراجعة
٣١٦
٢٠٢٤

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان مكتب اركان للمقاولات العامه
قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية الاعمال
التكميلية لرصف الممشي السياحي القديم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بني
سويف) (بالأمر المباشر) ورقم (١٠٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

وهذه شهادة منا بذلك .


مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

العملية : عملية الاعمال التكميلية لرصف الممشي السياحي القديم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بني سويف) (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة مكتب اركان للمقاولات العامه
العقد رقم (١٠٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	عبد الله كريم محمد	مهندس تنفيذ	جيد
٢	عبد الرحمن رفعت	مراقب جودة	جيد
٣	محمد ايمن ايما	مساح	جيد


مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية الاعمال التكميلية لرصف الممشي السياحي القديم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بني سويف) " (بالأمر المباشر) والتي قامت بتنفيذها شركة مكتب اركان للمقاولات العامه العقد رقم (١٠٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بالاتي
- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
 - ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
 - ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
 - ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار


العملية : عملية الاعمال التكميلية لرصف الممشي السياحي القديم محافظة الفيوم (المنطقة
السادسة - بني سويف) (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة مكتب اركان للمقاولات العامة
العقد رقم (١٠٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٣٥٥٧٤٤٨ جنيه
مدة العملية طبقا للعقد: ٦ أشهر
تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤/٠١/٢٨ م
تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٤/٠٧/٢٧ م
قيمة العملية طبقا لأخر مقايضة معتمدة: ٣٥٩٠٩١٨ جنيه
قيمة العملية طبقا للختامي: ٣٥١٣٦٦٤.٢٧ جنيه
تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

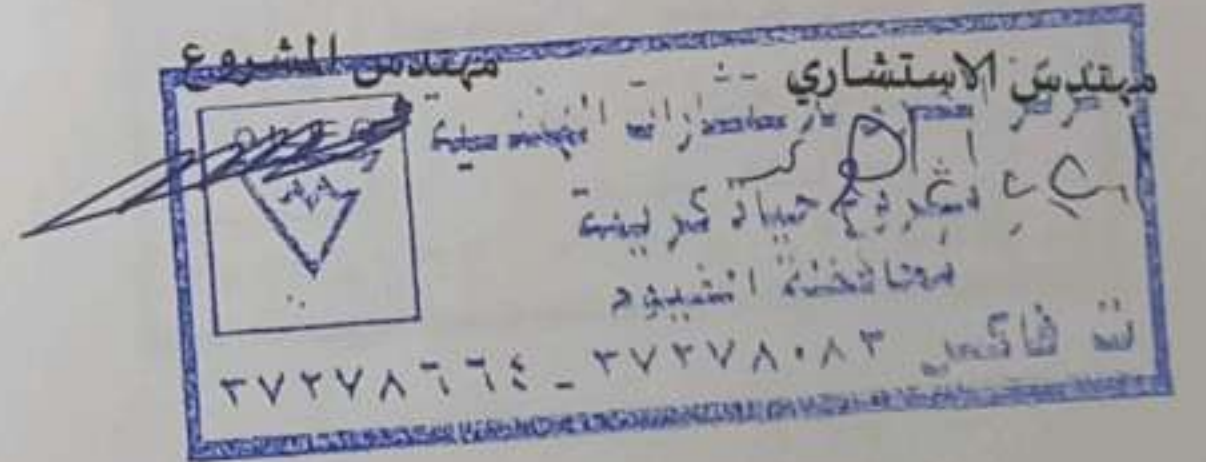

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص الاعمال التكميلية لرصف الممشي
السياحي القديم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بني سويف) " (بالأمر المباشر) والتي قامت
بتنفيذها شركة مكتب اركان للمقاولات العامه العقد رقم (١٠٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ انه تم
خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من
المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك


مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

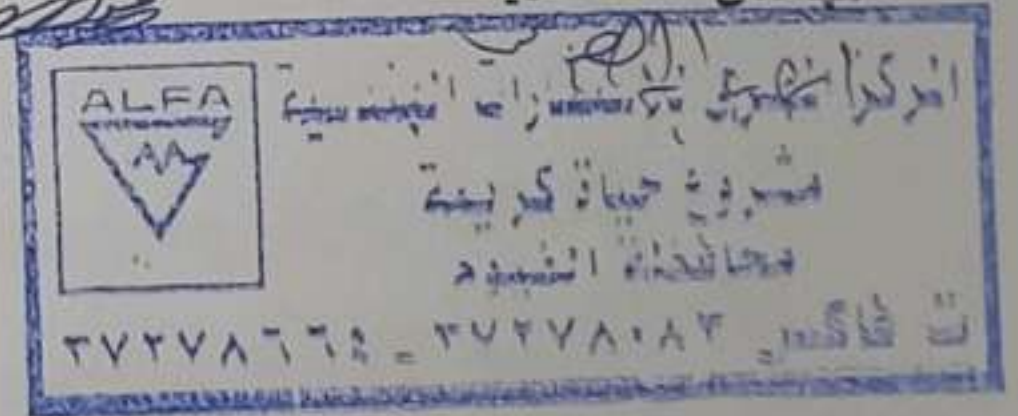

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



كشف خاص بأعمال المقاولين

- العملية: الاعمال التكميلية لرصف الممشي السياحي القديم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بني سويف) (بالأمر المباشر)
- تنفيذ: شركة مكتب اركان للمقاولات العامة
- العقد رقم (١٠٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
- قيمة العملية طبقا للعقد: ٣٥٥٧٤٤٨ جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: ٣٥١٣٦٦٤.٢٧ جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٤/٠١/٢٨ م
- تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م


مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

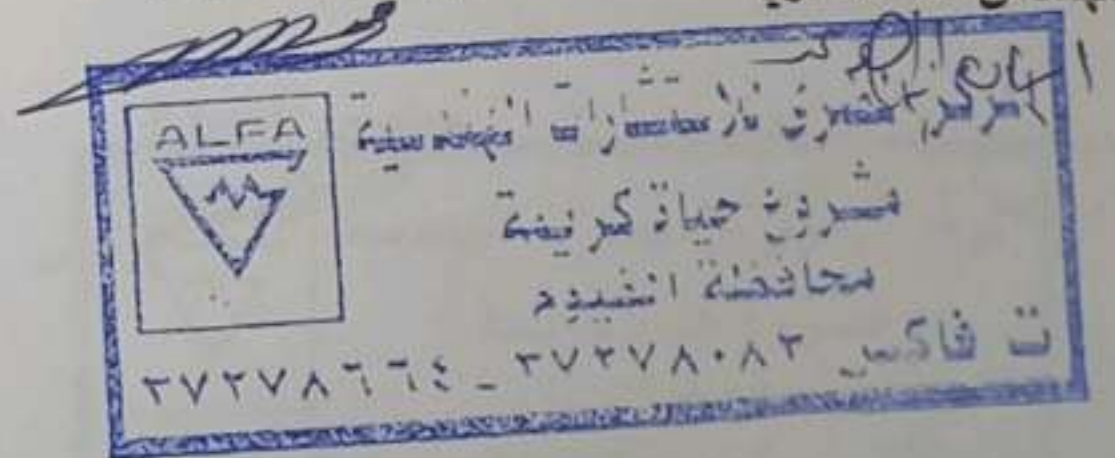

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار




شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة مكتب اركان للمقاولات العامه
العقد رقم (١٠٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص
الختامي عملية عملية الاعمال التكميلية لرصف الممشي السياحي القديم محافظة الفيوم
(المنطقة السادسة - بني سويف) " (بالأمر المباشر) وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على
الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا
بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

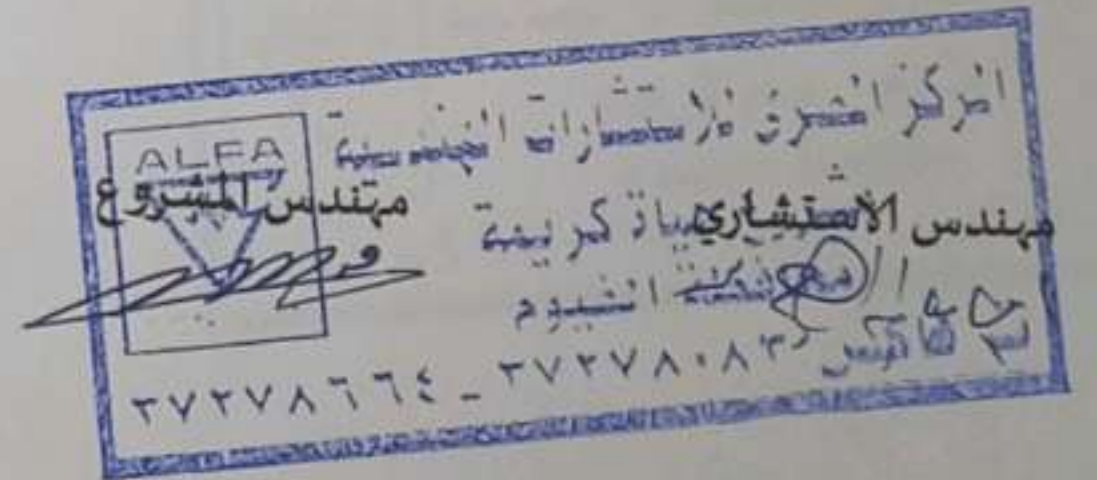

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار

سادسا: اعمال دهان الجرافياتو مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٠% من مسطحات الجرافياتو .

سابعا: اعمال الحجر الهاشمي مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من مسطحات الحجر الهاشمي .

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- ١- خصم نسبة ٢% من البند الاول (اولا)
 - ٢- خصم نسبة ٢% من البند الثاني (ثانيا)
 - ٣- خصم نسبة ١٠% من البند الثالث (ثالثا)
 - ٤- خصم نسبة ١% من البند الرابع (رابعا)
 - ٥- خصم نسبة ٥% من البند الخامس (خامسا)
 - ٦- خصم نسبة ٥% من البند السادس (السادس)
 - ٧- خصم نسبة ٥% من البند السابع (السابع)
 - ٨- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوك التشطيبات أثناء فترة الضمان وإخطار الهيئة بأى عيوب تظهر اثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فورا .
 - ٩- موافاة اللجنة بالتجارب المعملية التى تمت أثناء التنفيذ .
 - ١٠- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشئ لاصله لاعمال المرافق حتى يتم مراعاتها اثناء التسليم النهائي .
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للاعمال المذكورة وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

٦-
٤-
٢-
.....

٧-
٥-
٣-
١-

مجلس المدينة المختص
مديرية الطرق والمباني
٤٩٦٤٥

عملية / الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم
(الخطه العاجله ٢٠٢٣)

اشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)
الاستشاري / (مكتب الفا كونسلت)

الشركة المنفذة / مكتب اركان للمقاولات العامة
(عقد ١٠٣٩ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ وبناءً على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ م.

بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطه الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسمائهم:-

- | | |
|--|--|
| ١- السيد المهندس / عاطف سعد توفيق | مهندس عن مديرية الطرق والنقل بالفيوم (رئيس اللجنة) |
| ٢- السيد المهندس / عادل صلاح عبد الحميد | وكيل مديرية الاسكان والمرافق بالفيوم (عضوا) |
| ٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري (عضوا) |
| ٤- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد العزيز | مندوب استشاري هيئة الطرق والكباري (عضوا) |
| ٥- السيد المهندس / نجاح حافظ احمد | مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة الفيوم (عضوا) |
| ٦- السيد المهندس / رجب الصوفي عبد العزيز | مشرف الرصف بمجلس مدينة الفيوم (عضوا) |
| ٧- السيد المهندس / ابراهيم رفعت رشاد | مهندس الشركة المنفذة (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال في الموقع
ظاهرياً على الطبيعة وذلك لاختذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتى :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولاً: اعمال البردورات مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية على اجمالي البند .


ثانياً: اعمال دهان البردورات مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه على اجمالي البند .


ثالثاً: اعمال الانترلوك مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من
مسطحات الانترلوك .

رابعاً: اعمال غرف صرف المطر مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه على اجمالي البند .

خامساً: اعمال الحديد المشغول الجديد مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة

بنسبة ٥ % من كمية الحديد .

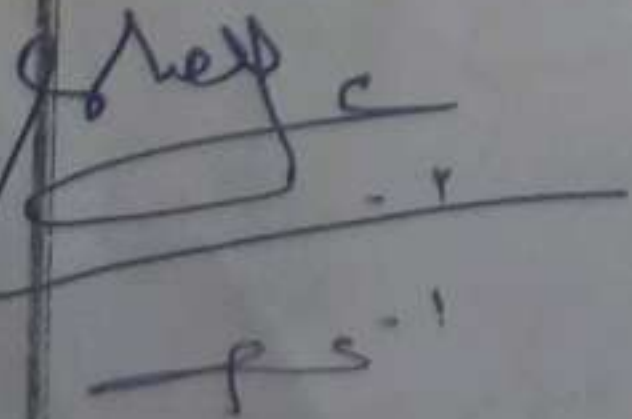
١- 


٢- 

٣- 

٤- 


٥- 

٦- 

٧- 

المركز المصري للاستشارات الهندسية (الفاكونسلت)	محضر تقييم الاستلام الابتدائي لعملية الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشى السياحي القديم بمحافظة الفيوم	الجهة المالكة: الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
تنفيذ / مكتب اركان للمقاولات العامة عينة رقم (1) لون احمر		
بند / اعمال الانترلوك :-		
المسطح =	700.00 م ²	جنيه مصري
سعر المتر من الطبقة =	179.00	جنيه مصري
اجهاد التكسير المطلوب =	250 كجم / سم ²	مقبول
اجهاد التكسير =	400 كجم / سم ²	مقبول او مرفوض
الاجراء :-	0	جنيه مصري
الخصم المقابل =	0	جنيه مصري
اجمالي الخصم لعينة (1) للانترلوك	0 جنيه مصري	

المهندس احمد مساري

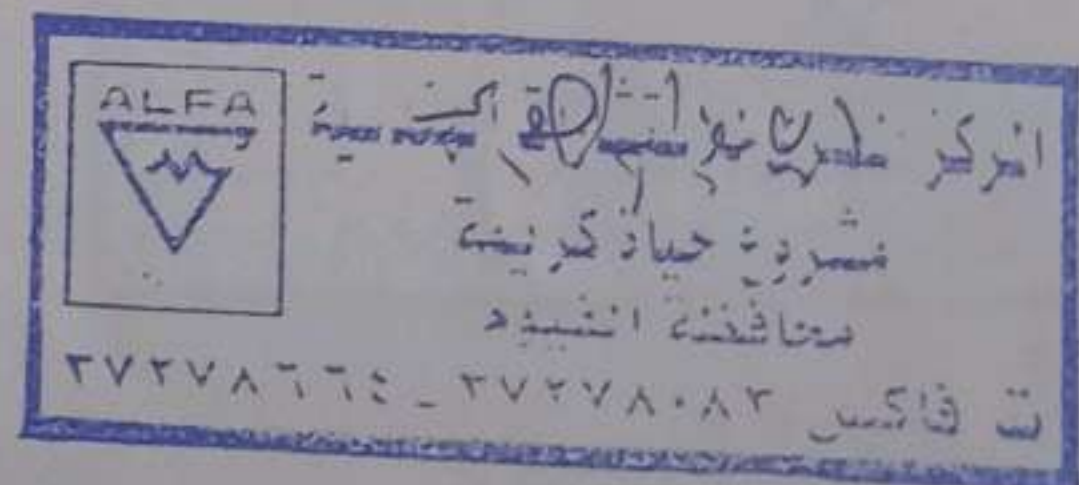

محضر تقييم

عملية / الاعمال التكميلية لرصف طريق المشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم

تنفيذ / مكتب اركان للمقاولات العامة

اشراف / المنطقة السادسة ببني سويف

العقد رقم / (١٠٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

بناء على العقد الصادر بتاريخ ٢٣-١-٢٠٢٤ و المدرجة ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة العاجلة ٢٠٢٣) اجتمعت اللجنة المشكلة لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات المالية و بيانها كالآتي :-

أولا / بند اعمال البردورات :-

- إجمالي خصم التقييم الظاهري لبند اعمال البردورات = ٢٤٨٤ جنية

ثانيا / بند اعمال دهان البردورات :-

- إجمالي خصم التقييم الظاهري لبند اعمال دهان البردورات = ٣٣١.٢ جنية

ثالثا / بند اعمال الانترلوك :-

- إجمالي خصم التقييم الظاهري لبند اعمال الانترلوك = ٢٥٠.٦ جنية

- إجمالي الخصم طبقا لنتائج العينات (الانترلوك) = ٠ جنية

- القيمة الإجمالية للخصم لبند اعمال الانترلوك = ٢٥٠.٦ جنية

رابعا / بند اعمال غرف صرف المطر :-

- إجمالي خصم التقييم الظاهري لبند اعمال غرف صرف المطر = ٢٢٤ جنية

خامسا / بند اعمال الحديد المشغول الجديد :-

- إجمالي خصم التقييم الظاهري لبند اعمال الحديد المشغول الجديد = ٢٩٢٠ جنية

سادسا / بند اعمال دهان الجرافياتو :-

- إجمالي خصم التقييم الظاهري لبند اعمال دهان الجرافياتو = ٨٥٠ جنية

سابعا / بند اعمال الحجر الهاشمي :-


- إجمالي خصم التقييم الظاهري لبند اعمال الحجر الهاشمي = ١١٧٥.٨ جنية

• القيمة الإجمالية للخصم = ١٠٤٩١ جنية


مهندس المشروع



مهندس الاستشاري

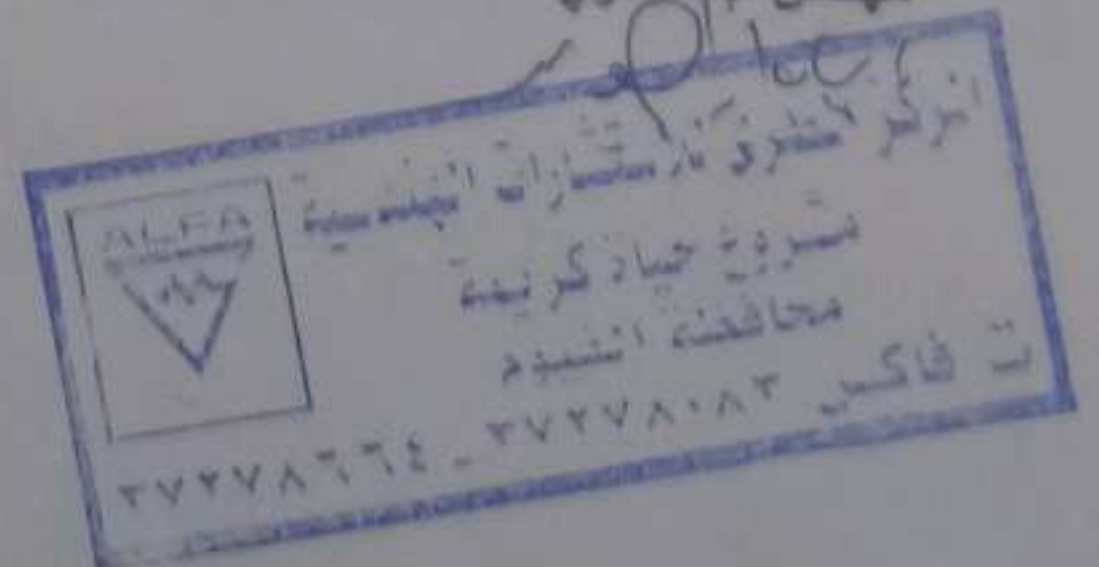

المركز المصري للاستشارات الهندسية (الفاكونسلت)	محضر تقييم الاستلام الابتدائي لعملية الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم بمحافظة الفيوم	الجهة المالكة: الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
تنفيذ / مكتب اركان للمقاولات العامة عينة رقم (2) لون رمادي		
بند / اعمال الانترلوك :-		
المسطح =	700.00	م ²
سعر المتر من الطبقة =	179.00	جنيه مصري
اختيار اجهاد التكسير -		
اجهاد التكسير =	306	كجم / سم ²
اجهاد التكسير المطلوب =	250	كجم / سم ²
الاجراء :-	0	مقبول او مرفوض
الخصم المقابل =	0	مقبول
جنيه مصري	0	جنيه مصري
إجمالي الخصم لعينة (2) للانترلوك	0 جنيه مصري	

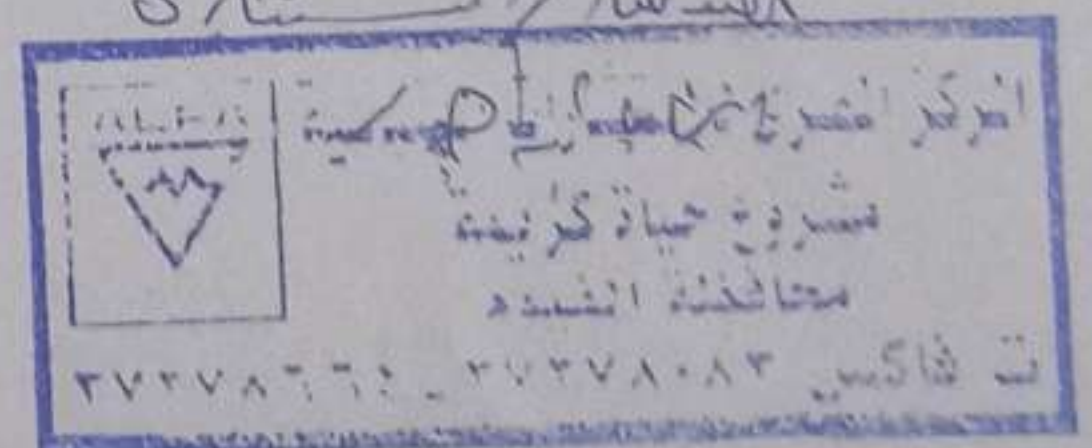



تقرير رقم (٤٠٢)

المشروع :- الاعمال التكميلية لسور المشى السياحى الخطة العاجلة
شركة : مكتب اركان للمقاولات العامة
نوع العينة : عدد ٢ بلاطة انترلوك ١٠ سم * ٢٠ سم
الاختبار : جهد الكسر

أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

اللون	جهد الكسر كجم / سم ٢	المواصفات
١ - احمر	٤٠٠	لا يقل الجهد عن ٢٥٠ كجم / سم ٢
٢ - رمادى	٣٠٦	



تقرير رقم (٠٢)

المشروع :- الاعمال التكميلية لسور المشي السياحي

(الخطة العاجلة بالفيوم)

شركة :- مكتب اركان للمقاولات العامة

السيد المهندس / مدير مكتب اركان للمقاولات العامة

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة انتر لوك
مستطيل الشكل المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٧/٨

مرفقات

عدد

(٢)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار



تقرير (٤٠٢)

المشروع : الاعمال التكميلية لسور الممشى السياحى
شركة : اركان للمقاولات
نوع العينة : عدد ٢ انترلوك
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى

التجارب	العدد	تكاليف	اجمالى
تكاليف انترلوك			
اجهاد انترلوك	2	175	350
اعداد تقرير	1	250	250
قيمة الاعمال			1080
ق. م ١٤ %			151.2
اجمالى			1231.2

