



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

محضر استلام موقع

عملية : اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابو راضي بطول ٦٣٠م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ متر حله اولي محافظة بني سويف
تنفيذ شركة (الهنا للمقاولات المتكاملة)
عقد رقم (٢٠٢٥/١٠١٤/١٦١)
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٨ / ١٥ تم الاجتماع والمرور علي طبيعة كل من جهاز الاشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي للشركة
وبعد المرور علي الطبيعة بالعملية بعلية بكامل الطول وتبين انه لا توجد عوائق ظاهرة تمنع البدء في التنفيذ
الاعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/١٥ هو تاريخ استلام الموقع
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

١- السيد المهندس /محمد طه

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة

٢- السيد المهندس / احمد رضا عبدالرحمن

مهندس عن الشركة المنفذة

وأقل المحضر علي ذلك .

٢- احمد رضا
١- ش.م

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة السادسة

ببني سويف

مهندسة / منال سعد

ش.م

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادة ببني سويف

مهندس / طارق الجزار



٣٠٨٧

عملية تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابوزاوى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة اولى بمحافظة بنى سويف

حصر اعمال القطع لطريق ٢٢٠٠ من محطه الى ١+٢٠٠

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١	مستخلص رقم ١		
Station	CUT Area	CUT Volume	Cumulative CUT Volume
0+000	9.90	0.00	0.00
00+020	8.90	187.98	187.98
00+040	11.97	208.70	396.68
00+060	0.16	121.35	518.03
00+080	0.20	3.59	521.62
00+100	0.03	2.32	523.94
00+120	0.04	0.78	524.72
00+140	0.00	0.44	525.16
00+160	0.00	0.00	525.16
00+180	0.00	0.00	525.16
00+200	0.00	0.00	525.16
00+220	0.00	0.00	525.16
00+240	0.00	0.00	525.16
00+260	0.00	0.06	525.22
00+280	11.90	119.06	644.27
00+300	20.02	319.19	963.46
00+320	23.50	435.20	1398.66
00+340	16.49	399.92	1798.58
00+360	11.86	283.54	2082.13
00+380	5.04	169.09	2251.21
00+400	0.00	50.44	2301.66
00+420	0.00	0.00	2301.66

مهندس الهيئة
م/ شوقيه

مهندس الشركة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد رضا

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابوزاضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة اولى بمحافظة بنى سويف

حصر اعمال القطع لطريق ٢٢٠٠ من محطه الى ١٠٣٠٠.

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١		مستخلص رقم ١		
Station	CUT Area	CUT Volume	Cumulative CUT Volume	
00+440	0.00	0.00	2301.66	
00+460	0.00	0.00	2301.67	
00+480	0.00	0.00	2301.67	
00+500	0.00	0.00	2301.68	
00+520	0.00	0.00	2301.68	
00+540	0.00	0.00	2301.68	
00+560	0.00	0.00	2301.68	
00+580	0.00	0.00	2301.68	
00+600	0.00	0.00	2301.68	
00+620	0.00	0.09	2301.77	
00+640	2.72	27.32	2329.09	
00+660	7.10	98.23	2427.32	
00+680	17.67	247.65	2674.96	
00+700	26.53	441.95	3116.91	
00+720	35.36	618.92	3735.83	
00+740	38.86	742.25	4478.08	
00+760	46.26	851.18	5329.26	
00+780	45.31	915.65	6244.92	
00+800	40.80	861.12	7106.04	
00+820	65.60	1063.97	8170.01	
00+840	5.48	710.72	8880.73	
00+860	4.99	104.65	8985.38	
00+880	3.88	88.72	9074.10	

مهندس الهيئة
م/ محمد محمد

مهندس الشركة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد رضا

شركة / الهنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابوزاضى بطول ٦٣٠ م وإنشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بنى سويف

حصر اعمال القطع لطريق ٢٢٠٠ من محطه الى ١٣٠٠.

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١		مستخلص رقم ١		
Station	CUT Area	CUT Volume	Cumulative CUT Volume	
00+900	2.04	59.20	9133.30	
00+920	0.00	20.36	9153.66	
00+940	0.00	0.00	9153.66	
00+960	0.00	0.00	9153.67	
00+980	0.00	0.00	9153.68	
01+000	0.00	0.00	9153.68	
01+020	0.00	0.00	9153.68	
01+040	0.00	0.00	9153.69	
01+060	0.00	0.00	9153.69	
01+080	0.00	0.00	9153.69	
01+100	0.00	0.00	9153.69	
01+120	0.00	0.00	9153.69	
01+140	0.00	0.00	9153.69	
01+160	0.00	0.00	9153.69	
01+180	4.75	47.53	9201.22	
01+200	30.56	353.12	9554.34	
01+220	41.78	723.39	10277.73	
01+240	36.10	778.82	11056.55	
01+260	26.96	630.63	11687.18	
01+280	20.43	473.87	12161.05	
01+300	22.08	428.31	12589.36	
الإجمالي		12589.36		

مهندس الهيئة
م/ محمد محمد
شكر

مهندس الشركة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد رضا

شركة / الهنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم أبو راضى بطول ٦٣٠ م وإنشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بنى سويف

حصر اعمال القطع لطريق ٦٣٠ م من محطه الى ٥٧٣+٠٠

رقم العقد ١٦١/٢٠٢٤/٢٠٢٥

مستخلص رقم ١

Station	CUT Area	CUT Volume	Cumulative CUT Volume
0+000	0.00	0.00	0.00
00+020	3.52	14.08	14.08
00+040	0.45	23.81	37.89
00+060	0.17	6.23	44.12
00+080	0.30	4.80	48.92
00+100	0.06	3.66	52.58
00+120	0.11	1.75	54.33
00+140	2.69	28.06	82.39
00+160	2.52	52.09	134.48
00+180	1.83	43.42	177.90
00+200	0.74	25.63	203.53
00+220	0.58	13.14	216.66
00+240	0.27	8.51	225.18
00+260	0.60	8.79	233.97
00+280	2.04	26.47	260.44
00+300	0.16	22.02	282.45
00+320	0.04	2.00	284.45
00+340	0.00	0.41	284.86
00+360	0.00	0.00	284.86
00+380	0.00	0.00	284.86
00+400	0.00	0.00	284.86

مهندس الهيئة

م/ محمد خديجة

ش.م

مهندس الشبكة

م/ احمد رضا عبدالرحمن

احمد فا

شركة / الهنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابراضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة اولى بمحافطة بنى سويف

حصر اعمال القطع لطريق ٦٣٠ م من محطه ٠٠٠+٥٧٣ الى ٠٠٠+٥٧٣

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١

مستخلص رقم ١

Station	CUT Area	CUT Volume	Cumulative CUT Volume
00+420	0.00	0.00	284.86
00+440	0.00	0.00	284.86
00+460	0.00	0.00	284.86
00+480	0.00	0.00	284.86
00+500	0.00	0.00	284.86
00+520	0.01	0.10	284.96
00+540	0.06	0.75	285.71
00+560	0.00	0.70	286.40
00+580	0.00	0.05	286.46
0+572.950	0.00	0.00	286.46
الإجمالي		286.46	

مهندس الهيئة
م/ محمد رجب

مهندس الشبكة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد رجب

شركة / الهنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابراهيم بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة اولى بمحافظة بنى سويف

حصر اعمال طبقات الردم (التراب) لطريق ٢٢٠٠ م من محطه ٠٠٠٠+٠٠٠ الى ١٠٣٠٠+٠٠٠

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١

للمستخلص رقم ١

Station	FILL Area	FILL Voulme	Cumulative FILL Volume
0+000	0.00	0.00	0.00
00+020	0.00	0.04	0.04
00+040	0.00	0.04	0.08
00+060	31.17	311.70	311.78
00+080	36.00	671.75	983.53
00+100	44.73	807.35	1790.87
00+120	47.50	922.28	2713.16
00+140	50.66	981.63	3694.79
00+160	58.04	1087.01	4781.79
00+180	51.59	1096.26	5878.05
00+200	39.69	912.80	6790.85
00+220	30.56	702.49	7493.34
00+240	25.87	564.25	8057.59
00+260	13.33	391.98	8449.57
00+280	10.13	234.67	8684.25
00+300	6.35	164.85	8849.09
00+320	5.01	113.59	8962.68
00+340	7.10	121.13	9083.81
00+360	10.06	171.61	9255.42
00+380	12.18	222.37	9477.79
00+400	16.34	285.20	9762.99
00+420	20.16	365.02	10128.01

مهندس الهيئة
م/ محمد محمد

مهندس الشركة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد رضا

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابراضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة اولى بمحافظة بنى سويف

حصار اعمال طبقات الردم (التراب) لطريق ٢٢٠٠ م محطة الى ١٠٣٠٠ .

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١

للمستخلص رقم ١

Station	FILL Area	FILL Voulme	Cumulative FILL Volume
00+440	22.03	421.93	10549.94
00+460	23.72	457.52	11007.47
00+480	22.05	457.69	11465.16
00+500	21.68	437.27	11902.43
00+520	17.54	392.19	12294.62
00+540	16.52	340.59	12635.21
00+560	16.38	329.01	12964.22
00+580	18.66	350.44	13314.66
00+600	21.03	396.94	13711.60
00+620	9.77	307.98	14019.58
00+640	4.08	138.51	14158.09
00+660	5.13	92.17	14250.25
00+680	1.42	65.51	14315.76
00+700	0.03	14.53	14330.29
00+720	0.00	0.34	14330.64
00+740	0.09	0.86	14331.50
00+760	0.00	0.86	14332.36
00+780	0.00	0.03	14332.39
00+800	0.00	0.03	14332.42
00+820	0.01	0.15	14332.57
00+840	2.37	23.88	14356.44
00+860	7.69	100.64	14457.08
00+880	11.08	187.68	14644.76

مهندس الهيئة
م/ محمد عبد الحليممهندس الشركة
م/ احمد رضا عبدالرحمن

عملية: تنفيذ اعمال مشروع الدواج طريق امام ورش كوم أبو راضي بطول 1٣٠ م والبناء طريق مزلاج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة اول بمحاذية بلي سويلف

حصص اعمال طبقات الردم (التراب) لطريق ٢٢٠٠ م من محطة ١٠٠٠٠٠ الى ١٠٣٠٠٠

رقم العقد ١٠١٢/٢٠١٦/١٦١

للمستخلص رقم ١

Station	FILL Area	FILL Voulime	Cumulative FILL Volume
00+000	19.37	304.43	14949.19
00+020	24.70	441.25	15390.45
00+040	20.14	449.00	15839.44
00+060	16.13	362.68	16202.12
00+080	19.97	361.02	16563.14
01+000	21.34	413.15	16976.29
01+020	24.40	457.40	17433.70
01+040	32.04	564.40	17998.10
01+060	41.38	734.17	18732.27
01+080	49.78	911.55	19643.82
01+100	54.68	1044.64	20688.45
01+120	60.83	1155.31	21843.76
01+140	42.37	1032.15	22875.91
01+160	19.06	614.27	23490.17
01+180	0.12	191.76	23681.93
01+200	0.00	1.17	23683.10
01+220	0.00	0.00	23683.10
01+240	0.00	0.00	23683.10
01+260	0.00	0.00	23683.10
01+280	0.63	6.81	23689.91
01+300	0.90	15.46	23705.37
الإجمالي		23705.37	

مهندس الهيئة
م/مهندس الشركة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد رضا

وزارة النقل		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		المنطقة السادسة بنى سويف	
شركة / الهنا		عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابوراضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى		بمحافظة بنى سويف	
حصر اعمال طبقات الردم (التراب) أماكن المظلات		رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١		للمستخلص رقم ١	
Station	FILL Area	FILL Voulme	Cumulative FILL Volume		
0+000	40.00	0.00	0.00		
00+010	40.00	400.00	400.00		
00+020	40.00	400.00	800.00		
00+030	40.00	400.00	1200.00		
الإجمالي		1200.00			

مهندس الهيئة
م / محمد حبيب
شركة

مهندس الشركة
م / احمد رضا عبدالرحمن
احمد رضا

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابوزاضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة اولى بمحافظة بنى سويف			
حصار اعمال طبقات الردم (التراب) لطريق ٦٣٠ م من محطه الى ٥٧٣+٠٠			
رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١	للمستخلص رقم ١		
Station	FILL Area	FILL Vouime	Cumulative FILL Volume
0+000	0.00	0.00	0.00
00+020	0.26	1.04	1.04
00+040	1.18	8.66	9.70
00+060	0.92	21.02	30.71
00+080	1.68	25.87	56.59
00+100	4.47	61.33	117.92
00+120	1.09	55.56	173.47
00+140	0.07	11.54	185.01
00+160	0.08	1.46	186.47
00+180	0.19	2.72	189.19
00+200	0.39	5.79	194.99
00+220	0.73	11.13	206.11
00+240	1.35	20.76	226.88
00+260	0.58	19.30	246.18
00+280	0.24	8.23	254.40
00+300	2.50	27.41	281.81
00+320	4.03	65.28	347.09
00+340	8.60	126.29	473.38
00+360	7.82	164.18	637.56
00+380	12.96	207.82	845.38
00+400	15.87	288.37	1133.75

مهندس الهيئة

م/ محمد مصطفى

مهندس الشبكة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد رضا

شركة / الهنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم ابوراضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بنى سويف			
حصر اعمال طبقات الردم (التراب) لطريق ٦٣٠ م من محطه الى ٥٧٣+٠٠			
رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١	للمستخلص رقم ١		
Station	FILL Area	FILL Voulme	Cumulative FILL Volume
00+420	12.82	286.96	1420.71
00+440	14.73	275.55	1696.26
00+460	13.96	286.88	1983.14
00+480	14.51	284.65	2267.79
00+500	15.41	299.18	2566.97
00+520	14.85	302.63	2869.60
00+540	13.00	278.49	3148.08
00+560	16.88	298.76	3446.84
00+580	18.43	353.09	3799.93
0+572.950	21.84	260.71	4060.64
الإجمالي	4060.64		

مهندس الهيئة
م/ محمد محمد
٢٠٢٤

مهندس الشبكة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد رضا

شركة / الهنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: تنفيذ اعمال مشروع اذدواج طريق امام ورش كوم ابوراضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بنى سويف			
حصر اعمال السن لطريق ٢٢٠٠ م من محطة (٠٠+٠٠٠) الي (١+٣٠٠)			
رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١		المستخلص رقم ١	
Station	Area	Volume	Comulive Quatity
00+420	5.39	107.70	2274.00
00+440	5.39	107.70	2381.70
00+460	5.39	107.70	2489.40
00+480	5.39	107.70	2597.10
00+500	5.39	107.70	2704.80
00+520	5.39	107.70	2812.50
00+540	5.39	107.70	2920.20
00+560	5.39	107.70	3027.90
00+580	5.39	107.70	3135.60
00+600	5.39	107.70	3243.30
00+620	5.39	107.70	3351.00
00+640	5.39	107.70	3458.70
00+660	5.39	107.70	3566.40
00+680	5.39	107.70	3674.10
00+700	5.39	107.70	3781.80
00+720	5.39	107.70	3889.50
00+740	5.39	107.70	3997.20
00+760	5.39	107.70	4104.90
00+780	5.39	107.70	4212.60
00+800	5.39	107.70	4320.30
00+820	5.39	107.70	4428.00

مهندس الهيئة
م/ محمد عبد الرحمن

مهندس الشركة
م/ احمد رضا عبد الرحمن
احمد ر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

شركة / الهنا

عملية: تنفيذ اعمال مشروع اذدواج طريق امام ورش كوم ابو راضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بنى سويف			
حصر اعمال السن لطريق ٢٢٠٠ م من محطه (٠٠+٠٠٠) الي (١+٣٠٠)			
رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١		للمستخلص رقم ١	
Station	Area	Volume	Comulative Quaity
00+840	5.39	107.70	4535.70
00+860	5.39	107.70	4643.40
00+880	5.39	107.70	4751.10
00+900	5.39	107.70	4858.80
00+920	5.39	107.70	4966.50
00+940	5.39	107.70	5074.20
00+960	5.39	107.70	5181.90
00+980	5.39	107.70	5289.60
01+000	5.39	107.70	5397.30
01+020	5.39	107.70	5505.00
01+040	5.39	107.70	5612.70
01+060	5.39	107.70	5720.40
01+080	5.39	107.70	5828.10
01+100	5.39	107.70	5935.80
01+120	5.39	107.70	6043.50
01+140	5.39	107.70	6151.20
01+160	5.39	107.70	6258.90
01+180	5.39	107.70	6366.60
01+200	5.39	107.70	6474.30
01+220	5.39	107.70	6582.00
01+240	5.39	107.70	6689.70

مهندس الهيئة
م/ محمد عيسى
شركة

مهندس الشركة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

شركة / الهنا

عملية: تنفيذ اعمال مشروع اذدواج طريق امام ورش كوم ابوراضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بنى سويف			
حصر اعمال السن لطريق ٢٢٠٠ م من محطه (٠٠+٠٠٠) الي (١+٣٠٠)			
رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١		للمستخلص رقم ١	
Station	Area	Volume	Comulive Quatity
01+260	5.39	107.70	6797.40
01+280	5.39	107.70	6905.10
01+300	5.39	107.70	7012.80
الإجمالي		7012.80	

مهندس الهيئة
م/ محمد محمد
شركة

مهندس الشركة
م/ احمد رضا عبدالرحمن
احمد

شركة / الهنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: تنفيذ اعمال مشروع اذدواج طريق امام ورش كوم ابوراضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بنى سويف			
حصر اعمال السن لطريق ٦٣٠ م من محطة (٠٠+٠٠٠) الى (٠٠+٥٧٣)			
رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١		للمستخلص رقم ١	
Station	Area	Volume	Comulative Quatity
00+000	5.20	0.00	0.00
00+020	5.20	104.00	104.00
00+040	2.69	53.80	157.80
00+060	2.69	53.80	211.60
00+080	2.69	53.80	265.40
00+100	2.69	53.80	319.20
00+120	2.69	53.80	373.00
00+140	2.69	53.80	426.80
00+160	2.69	53.80	480.60
00+180	2.69	53.80	534.40
00+200	2.69	53.80	588.20
00+220	2.69	53.80	642.00
00+240	2.69	53.80	695.80
00+260	2.69	53.80	749.60
00+280	2.69	53.80	803.40
00+300	2.69	53.80	857.20
00+320	2.69	53.80	911.00
00+340	2.69	53.80	964.80
00+360	2.69	53.80	1018.60
00+380	2.69	53.80	1072.40
00+400	2.69	53.80	1126.20

مهندس الهيئة
م/ محمد خديجة
ب. ج. م.

مهندس الشركة
م/ أحمد رضا عبد الرحمن
أحمد رضا

شركة / الهنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: تنفيذ اعمال مشروع اذدواج طريق امام ورش كوم ابو راضى بطول ٦٣٠ م وانشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بنى سويف			
حصر اعمال السن لطريق ٦٣٠ م من محطه (٠٠+٥٧٣) الى (٠٠+٥٧٣)			
رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١		للمستخلص رقم ١	
Station	Area	Volume	Comulive Quatity
00+420	2.69	53.80	1180.00
00+440	2.69	53.80	1233.80
00+460	2.69	53.80	1287.60
00+480	2.69	53.80	1341.40
00+500	2.69	53.80	1395.20
00+520	2.69	53.80	1449.00
00+540	2.69	53.80	1502.80
00+560	2.69	53.80	1556.60
00+573	2.69	53.80	1610.40
الإجمالي		1610.40	

مهندس الهيئة
م/ محمد محمد طه

مهندس الشركة
م/ أحمد رضا عبد الرحمن
أحمد رضا

عملية: تنفيذ اعمال مشروع ازدواج طريق امام ورش كوم أبو راضي بطول ٦٣٠ م وإنشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠ م مرحلة أولى بمحافضة بني سويف

حصر اعمال مواسير البرابخ السابقة التجهيز

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦١				للمستخلص رقم ١	
ملاحظات	الكميه	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	١٧١	.	١٧١	ازدواج طريق الورش كوم أبو راضي	1
١٧١ متر طولي				الإجمالي	

مهندس محمد مصطفى
١٤/٥/٢٠٢٥

3

مهندس أحمد رضا
٢٠٢٥

الهيئة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٢٤٨)

المشروع: صرف طريق ورش كوم ابو راضي
تنفيذ شركة: الهنا للمقاولات

عدد رقم

السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة شركة
الهنا للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

تشرف بأن ترفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربة رملية حصىه المتخونة
من التثبيتات بلعليه عليه وقد أحضرت اللجنة بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

تحريراً في ٢٠٢٤/٢/١٨

مرفقات
عدد
(١)



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤٨)

عقد رقم

المشروع :صرف طريق ورش كوم ابو راضى
تنفيذ شركة : -الهنا للمقاولات

نوع العينة :- عدد ١ عينة اتربه رمليه حصويه

نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ
أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة ----- سعة المنخل	عينة رقم ٢٤٨	المواصفات
"٢	١٠٠	
"١ ٢/١	٩٨	
"١	٩١	
"٤/٣	٧٨	
"٨/٣	٦٤	
رقم ٤	٥٥	
رقم ١٠	٤٥	
رقم ٤٠	٢٠	
رقم ٢٠٠	١٠.٢	
حد السيولة	---	
حد اللدونه	عديمه	
مجال اللدونه	----	
تصنيف التربه	١-١	
اقصى كثافه جافه طن/م ^٣	٢.٠٣ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه%	%٤.٩٦	
نسبة تحمل كاليفورنيا%	%٣٤	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ%	صفر	

ملاحظات :-العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحيه
مقابل خدمه

قيمة الاعمال:-١٩٧٠٠+٢٥٠

ض.م ١٤%:-٣١٠.٨٠

٢٥٣٠.٨٠



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٣٦٧)

المشروع: -رصف طريق ورش كوم ابو راضى
تنفيذ شركة: -الهنا للمقاولات

عقد رقم

المسيد المهندس/ رئيس مجلس ادارة شركة
الهنا للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد


نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٤ عينة اتربه رمليه حصويه الماخوذه
من العمله عاليه لتحديد نسبة الدمك وقد أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

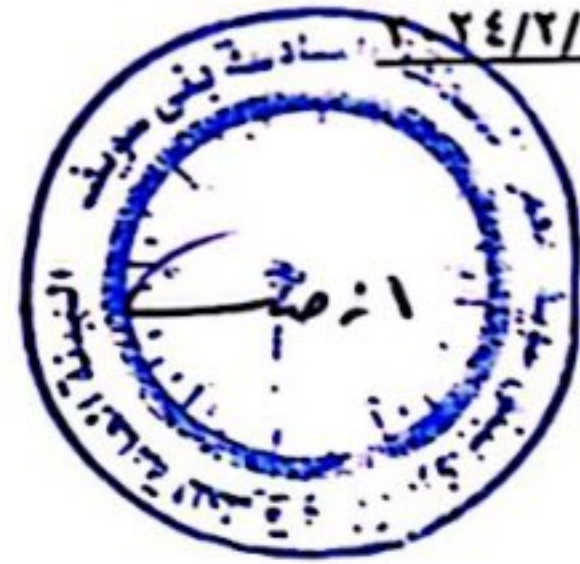

مرفقات

عدد

(١)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٢٦٧)
بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦

عقد رقم

المشروع : برصف طريق ورش كوم ابو راضى
تنفيذ شركة : - الهنا للمقاولات

نوع العينة :- عدد ٤ عينة اتربه رمليه حصويه طبقة اولى
نوع الاختبار :- اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /الكثافة الجافة بالموقع/نسبة الرطوبة/نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة
تتبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ٦٦٩ ك. ٠.٢٠٠	عينة رقم ٦٧٠ ك. ٠.٤٠٠	عينة رقم ٦٧١ ك. ٠.٦٠٠	عينة رقم ٦٧٢ ك. ١.٠٥٠	المواصفات
سعة المنخل	٢.٠٣ طن/م	٢.٠٣ طن/م	٢.٠٣ طن/م	٢.٠٣ طن/م	
اقصى كثافة جافة طن/م	٢.٠٣ طن/م	٢.٠٣ طن/م	٢.٠٣ طن/م	٢.٠٣ طن/م	
نسبة المياه الملائمة %	٤.٩٦ %	٤.٩٦ %	٤.٩٦ %	٤.٩٦ %	
الكثافة الجافة بالموقع طن/م	١.٩٨ طن/م	٢.٠٣ طن/م	٢.٠٣ طن/م	٢.٠١ طن/م	
نسبة الرطوبة %	٥.١ %	٥.٣ %	٥.٣ %	٥.٨ %	
نسبة الدمك %	٩٨ %	١٠٠ %	١٠٠ %	٩٩.١ %	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات : - العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للدمك
مقابل خدمه

قيمة الاعمال : ٢٥٠٠ + ٢٢٠٠٠

ض.م ١٤ % : ٢٤٢.٠٠٠



٢٧٩٣

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٣٠٠)

المشروع: مرصف طريق ورش كوم ابو راضي
تنفيذ شركة: الهنا للمقاولات

عند رقم

المهندس المهندسين / ونيس مجتهد ادارة شركة
الهنا للمقاولات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طوبه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عند ٤ عينة اتربة رملية حصويه المأخوذه
من العمله عاليه لتحديد نسبة النكم وقد أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٨/٣/٢٠٢٤

مرفات
عدد
(١)



رئيس الاداره المركزيه
مهندس / طارق يوسف الجزار



المشروع: درصف طريق وادش كوم ابو راضي
تنفيذ شركة: - الهندسة المعمارية

نوع العينة: - عند عينه لتريه رملية حصوية طبقة نهائية
نوع الاختبار: - فحص كثافة جافة لمية للملته / الكثافة الجافة بالموقع لمية الرطوبة كسبة للملته
أحضرت العينة بمعرفة لمصل المنطقة
تتبعه هام (العينة مسؤولة من المصنوع)

رقم العينة	عينة رقم ٧٧٩	عينة رقم ٧٨٠	عينة رقم ٧٨١	عينة رقم ٧٨٢	المواصفات
سعة المختل	٠.١٧٥ ك	٠.٤٠٠ ك	٠.٦٠٠ ك	١.٠٧٥ ك	
الفحص كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٠٣ طن/م ^٣	٢.٠٣ طن/م ^٣	٢.٠٣ طن/م ^٣	٢.٠٣ طن/م ^٣	
نسبة المياه للملته %	%٤.٩٦	%٤.٩٦	%٤.٩٦	%٤.٩٦	
الكثافة الجافة بالموقع طن/م ^٣	٢.٠٣ طن/م ^٣	٢.٠٣ طن/م ^٣	٢.٠٢ طن/م ^٣	١.٩٨ طن/م ^٣	
نسبة الرطوبة %	%٤.١	%٥.٤	٥.٦	%٦	
نسبة الدمك %	%١٠٠	%١٠٠	%٩٩.٥	%٩٧.٦	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات: - العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للدمك
مقابل خدمه

قيمة الاعمال: ٢٥٠ + ٢٢٠٠٠

ض، م ١٤ %: ٢٤٣.٠٠٠

٢٧٩٣





تقرير رقم (٤١٦)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧
عقد رقم

المشروع: -رصف طريق ورش كوم ابو راضى
تنفيذ شركة: -الهنا للمقاولات

السيد المهندس/ رئيس مجلس ادارة شركة
الهنا للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ المأخوذه من التشوينات
بالعملية عاليه وقد احضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٧/٢٨

مرفقات
عدد
(١)

رئيس الاداره المركزيه
مهندس/ طارق يوسف الجزار

مستحق



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤١٦)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧

عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ورش كوم ابو راضى
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات

نوع العينة :- عدد ١ عينة س ٦ تكسير كسارات عبارة عن احجار سليسيه جبريه
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/التاكل بجهاز لوس انجلوس/الامتصاص/التفتت /اقصى كثافة جافة -نسبة المياه
الملائمه/نسبة تحمل كاليفورنيا/الانتفاخ

أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة ----- سعة المنخل	عينة رقم ١٠١٣ تشوينات	المواصفات تدرج ب
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٧	١٠٠-٧٠
"١	٧٦	٨٥-٥٥
"٤/٣	٥٩	٨٠-٥٠
"٨/٣	٤٤	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٣	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٤	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٥	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	١١.٤	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يزيد عن ٢٥%
حد اللدونه	عديمه	----
مجال اللدونه	----	لا يزيد عن ٦%
التاكل بجهاز لوس انجلوس%	٣١%	لا يزيد عن ٤٠%
الامتصاص%	٣.٦٠%	لا يزيد عن ٨%
التفتت%	٠.٤%	لا يزيد عن ٥%
اقصى كثافه جافه طن/م ^٣	٢.٢٦٥ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه%	٤.٧٥%	
نسبة تحمل كاليفورنيا%	٨٤%	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ%	صفر	

ملاحظات:- العينات تتفق مع جدول المواصفات بالنسبة لمنحنى التدرج (ب) والصلاحية
التكاليف

قيمة الاعمال ٢٦٤٠ + ١٥٠
ض.م ١٤% ٤٠٤.٦٠

الاجمالى ٣٢٩٤.٦٠



موقع
