

محضر استلام موقع

مشروع :- اعمال تعديل الطريق الساحلى سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات فى المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكة حديد ابو طرطور بطول 5 كم مزدوج بالامر المباشر .
عقد رقم :- 2025/2024/370 **بتاريخ** 2024/10/17 م

تنفيذ :- شركة النيل العامة لانشاء الطرق .

اشراف :- المنطقة التاسعة بالبحر الاحمر
انه فى يوم الاحد 2024/11/3 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المهندسين الاتى اسمائهم بعد :-

- | | | |
|--|------------------|------------------------------|
| 1- السيد المهندس / سيد النبوى احمد | مدير عام الصيانة | الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| 2- السيد المهندس / احمد محمد رزق | مدير اعمال | الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| 3- السيد المهندس / محمد حسنين عبد الباسط | مهندس العملية | الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| 4- السيد المهندس / محمد مسلم | مهندس الشركة | شركة النيل لانشاء الطرق |
- وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية عالية وقد تلاحظ عدم وجود اى معوقات تعوق التنفيذ وعليه يعتبر هذا التاريخ وهو 2024/11/3

اعضاء اللجنة

السيد المهندس / محمد مسلم
السيد المهندس / محمد حسنين عبد الباسط
السيد المهندس / احمد محمد رزق
السيد المهندس / سيد النبوى احمد

يعتمد...

تحريراً فى :- 2024/11/3

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

" خالد سعد على "

٢٦٨٤٠

دفتر حصر أعمال للمستخلص الجارى رقم (١)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مهندس الشركة : 

مدير الأعمال (الهيئة)


مهندس الهيئة 



عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد
ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			جزئي	خصم	إجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية							
	مابقا							٠,٠٠
١	٠+٠٠٠ حتى ٣+٧٥٠ اتجاة سفاجا					٦٩٧٧٤,٤٤		
٢	٤+٢٢٥ حتى ٤+٣٧٥ اتجاة سفاجا					٣٣٢٥,٩٩		
٣	٠+٠٠٠ حتى ٢+٦٢٥ اتجاة القصير					١٢٧٠٠٢,٨١		
٤	٣+١٢٥ حتى ٣+٢٧٥ اتجاة القصير					١٨٦٥,٤٩		
	الإجمالى حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ م							
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجارى رقم (١) حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠							
						٢٠١٩٦٨,٧٣		٢٠١٩٦٨,٧٣
								٢٠٠٠٠٠,٠٠

الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسانتين عبد الجاسط



مهندس التنفيذ /

مهندس / السيد محمد السيد



عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد
ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			جزني	خصم	إجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم وتشغيلها							
	ما قبله							٠,٠٠
١	٠+٠٠٠ حتى ٣+٧٥٠ اتجاه سفاجا					٢١٢٢٢٢,٦٢		
٢	٤+٢٢٥ حتى ٤+٧٠٠ اتجاه سفاجا					٤٣٧٢٧,٠١		
٣	٠+٠٠٠ حتى ٢+٦٢٥ اتجاه القصير					٥٧٢٨٥,٠١		
٤	٣+١٢٥ حتى ٣+٧٧٥ اتجاه القصير					٢١٢٧٣,٠٩		
	الإجمالي حتى ٢٠٢١/١١/٣٠					٣٣٤٥٠٧,٧٣		٣٣٤٥٠٧,٧٣
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (١) حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠							٣٣٥٠٠٠,٠٠

الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /

مهندس / السيد محمد السيد

المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

<u>رقم البند</u>	<u>نوع الأعمال والتوريدات</u>	<u>عدد</u>	<u>مقاســــــــــــات</u>				
			ارتفاع	عرض	طول	جزئي	إجمالي
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج مهزات						
	ماقبله						
١	حتى ٠+٠٠٠ اتجاة سفاجا ١+٣٠٠					٨٠٤٣,١٠	
٢	حتى ١+٩٠٠ اتجاة سفاجا ٣+٠٥٠ جزئى					٥٩٥٤,٩٨	
٣	حتى ٠+٠٠٠ اتجاة القصير ١+٩٥٠					١٠٠٥٣,٨٧	
	الإجمـــــالى حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ١٢ م						
							٢٤٠٥١,٩٥
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (١) حتي تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠						٢٣٠٠٠,٠٠

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط



مهندس / السيد محمد السيد

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة

من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج).

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاســ		
--------------	------------------------	-----	--	--	--

مهندس التنفيذ /

مهندس / السيد محمد السيد



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من

المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	إجمالي
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم						
	ما قبل						
	٠+٦٥٠ الي ١+٩٠٠ اتجاه القصير		١٢٥٠,٠٠	١٢,٨٠		١٦٣٢٠,٠٠	
	٠+٢٢٥ الي ١+٠٥٠ اتجاه سفاجا		٨٢٥,٠٠	٤,٣٠		٣٦٥٥,٠٠	
	٢+٣٢٥ الي ٢+٩٧٥ اتجاه سفاجا		٦٥٠,٠٠	١٢,٨٠		٨٤٨٠,٠٠	
	الإجمالي الي حتى ٢٠٢١/١١/٣٠م						٢٨٤٥٥,٠٠
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (١) حتي تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠						٢٨٠٠٠,٠٠

الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /

مهندس / السيد محمد السيد

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء
الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو
طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			جزئي	خصم	إجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١٠	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١متر وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة							
	مقابله							٠,٠٠
١	٠+٣٧٥	١٣	٣			٣٩		
٢	٠+٦٢٥	٥٥	٣			١٦٥		
٣	١+٤٢٥	١٩	٣			٥٧		
٤	٢+٣٠٠	١٩	٣			٥٧		
٥	٠+٣٥٠	١٢	٣			٣٦		
٦	٠+٩٢٥	١٨	٣			٥٤		
٧	١+٢٠٠	١٣	٣			٣٩		
٨								
	الإجمالي	حتى ٢٠٢١/١١/٣٠م				٤٤٧,٠٠		٤٤٧,٠٠
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (١) حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠							٤٤٧,٠٠

الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /

مهندس / السيد محمد السيد

المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

			الإجمـــالي حتى ٢٠٢٤/١١/١٢ م						
إجمالي	خصم	جزئي	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (١) حتي تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ م						
			بالطن اعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح						
٠,٠٠			ماقبلاً هـ						
		٦٠٠							١
		٢٥٠٠						٠+٦٢٥	٢
		٩٠٠						١+٤٢٥	٣
		٥٥٠						٠+٣٥٠	٥
		٨٠٠						٠+٩٢٥	٦
		٦٠٠						١+٢٠٠	٧
٥,٩٥		٥٩٥٠	الإجمـــالي حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ م						
٥,٥٠			إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (١) حتي تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠						

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط



مهندس / السيد محمد السيد

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد
ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال


رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			جزئي	خصم	إجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١٦	بالمتر الطولى اعمال انشاء حاجز خرسانى وجهيين بارتفاع ٩٠ سم من الخرسانة العادية							
	ماقبا							٠,٠٠
١	١+٣٦٠ حتى ١+٩٥٠ اتجاه سفاجا					٥٩٠,٠٠		
	الإجمالى حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ م					٥٩٠,٠٠		٥٩٠,٠٠
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجارى رقم (١) حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠							٥٠٠,٠٠

الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسانين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /


مهندس / السيد محمد السيد

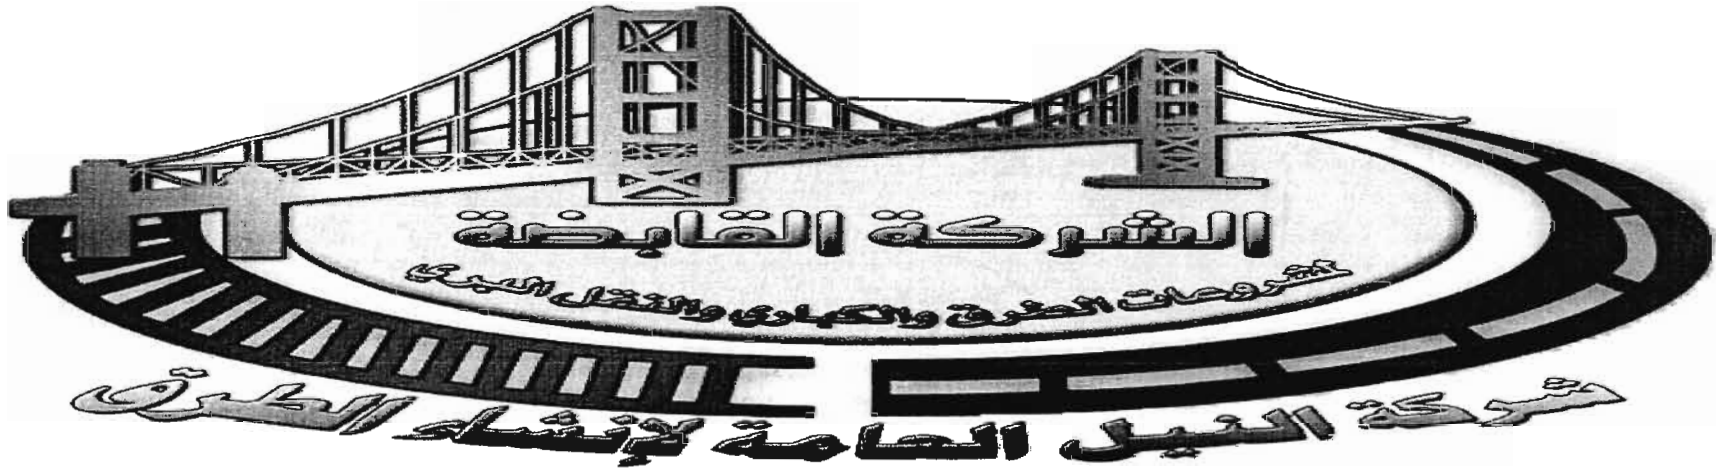

ملخص بالاختبارات المعملية عملية

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (١)

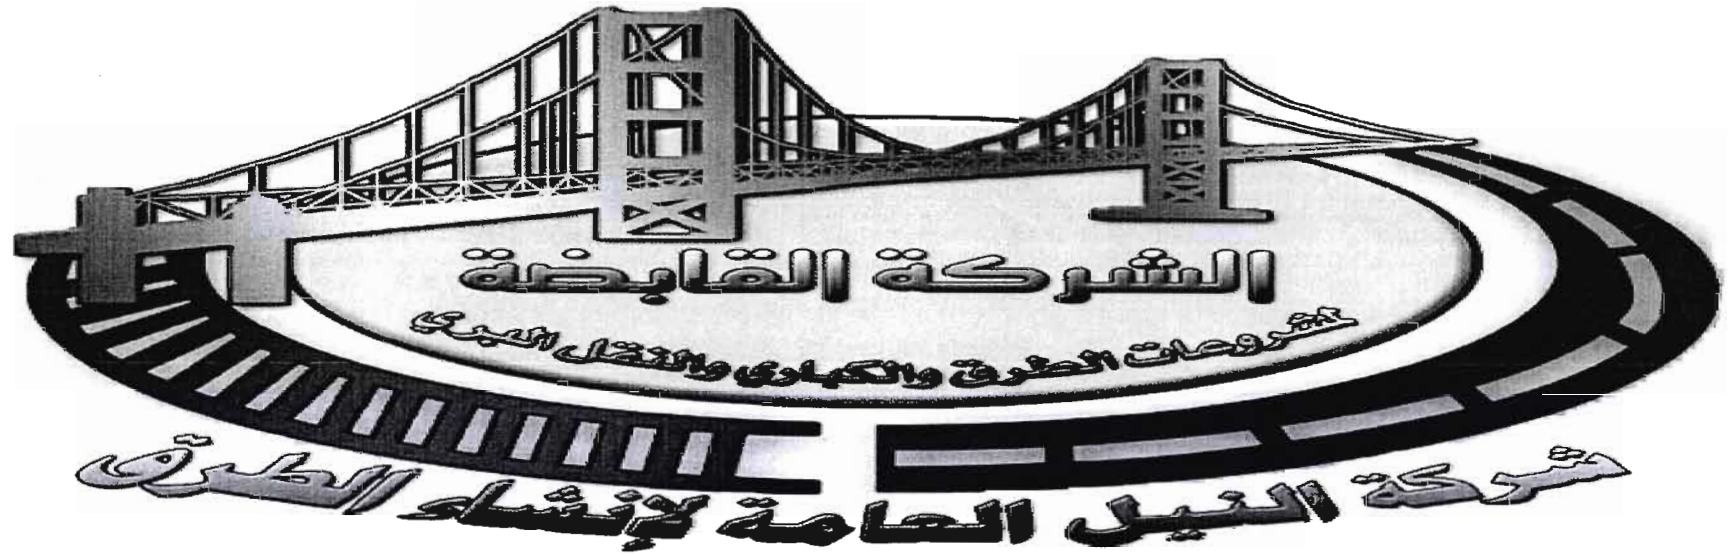

ملخص الاختبارات المعملية (للأتربة)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (١)

بيان متابعة اعمال دمك الاتربة

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) اتجاه سفاجا

رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	رقم الطبقة	الموقف * القبول أو الرفض	الاتجاه	ملاحظات
			من	الى					
1	جديد	١٥ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-7.00	مقبول	سفاجا	
2	جديد	١٦ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-6.50	مقبول	سفاجا	
3	جديد	١٧ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-6.00	مقبول	سفاجا	
4	جديد	١٨ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-5.50	مقبول	سفاجا	
5	جديد	١٩ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-5.00	مقبول	سفاجا	
6	جديد	٢٠ فبراير ٢٠٢٤	1300	1400	100	-4.50	مقبول	سفاجا	
7	جديد	٢٥ مارس ٢٠٢٤	1400	1800	400	-5.00	مقبول	سفاجا	
8	جديد	٢٦ مارس ٢٠٢٤	1400	1800	400	-4.50	مقبول	سفاجا	
9	جديد	٢٧ مارس ٢٠٢٤	1400	1800	400	-4.00	مقبول	سفاجا	
10	جديد	٢٨ مارس ٢٠٢٤	1400	1800	400	-3.50	مقبول	سفاجا	
11	جديد	٤ أبريل ٢٠٢٤	1400	1800	400	-3.00	مقبول	سفاجا	
12	جديد	٥ أبريل ٢٠٢٤	1400	1800	400	-2.50	مقبول	سفاجا	
13	جديد	٦ أبريل ٢٠٢٤	1400	1800	400	-2.00	مقبول	سفاجا	
14	جديد	٨ مايو ٢٠٢٤	1400	1850	450	-1.50	مقبول	سفاجا	
15	جديد	٩ مايو ٢٠٢٤	1400	1850	450	-1.00	مقبول	سفاجا	
16	جديد	١٠ مايو ٢٠٢٤	1400	1850	450	-0.75	مقبول	سفاجا	
17	جديد	١١ مايو ٢٠٢٤	1400	1850	450	-0.50	مقبول	سفاجا	
18	جديد	٢٥ مايو ٢٠٢٤	1800	2050	250	فرمة	مقبول	سفاجا	
19	جديد	٧ يونيو ٢٠٢٤	2375	2550	175	-3.00	مقبول	سفاجا	
20	جديد	٨ يونيو ٢٠٢٤	2375	2550	175	-2.50	مقبول	سفاجا	
21	جديد	٩ يونيو ٢٠٢٤	2375	2550	175	-2.00	مقبول	سفاجا	
22	جديد	١٠ يونيو ٢٠٢٤	2375	2575	200	-1.50	مقبول	سفاجا	
23	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	2375	2575	200	-1.25	مقبول	سفاجا	
24	جديد	١٢ يونيو ٢٠٢٤	2300	2575	275	-1.00	مقبول	سفاجا	
25	جديد	١٣ يونيو ٢٠٢٤	2300	2575	275	-0.75	مقبول	سفاجا	
26	جديد	٢٠ يونيو ٢٠٢٤	2300	2575	275	-0.50	مقبول	سفاجا	
27	جديد	٢١ يونيو ٢٠٢٤	2300	2575	275	-0.25	مقبول	سفاجا	
28	جديد	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	2275	2525	250	فرمة	مقبول	سفاجا	
29	جديد	٨ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-3.00	مقبول	سفاجا	
30	جديد	٩ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-2.50	مقبول	سفاجا	
31	جديد	١٠ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-2.25	مقبول	سفاجا	
32	جديد	١١ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-2.00	مقبول	سفاجا	
33	جديد	١٢ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-1.75	مقبول	سفاجا	
34	جديد	٢٠ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-1.50	مقبول	سفاجا	
35	جديد	٢١ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-1.25	مقبول	سفاجا	
36	جديد	٢٢ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-1.00	مقبول	سفاجا	
37	جديد	٢٣ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-0.75	مقبول	سفاجا	
38	جديد	٢٤ يوليه ٢٠٢٤	2500	2625	125	-0.25	مقبول	سفاجا	
39	جديد	٩ أغسطس ٢٠٢٤	2625	3075	450	-1.00	مقبول	سفاجا	
40	جديد	١٠ أغسطس ٢٠٢٤	2625	3075	450	-0.75	مقبول	سفاجا	
41	جديد	١١ أغسطس ٢٠٢٤	2625	3075	450	-0.50	مقبول	سفاجا	
42	جديد	١٢ أغسطس ٢٠٢٤	2625	3075	450	-0.25	مقبول	سفاجا	
43	جديد	٢٥ أغسطس ٢٠٢٤	2500	3075	575	فرمة	مقبول	سفاجا	
44	جديد	١ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4700	200	-7.00	مقبول	سفاجا	
45	جديد	٢ سبتمبر ٢٠٢٤	4500	4700	200	-6.50	مقبول	سفاجا	

محمد صلاح


ملاحظات	الاتجاه	الموقف * القبول أو الرفض	رقم الطبقة	المسافة	الموقع الكيلو مترى		التاريخ	جديد / اعاده	رقم الطلب
					الى	من			
	سفاجا	مقبول	-6.25	200	4700	4500	٣ سبتمبر ٢٠٢٤		46
	سفاجا	مقبول	-6.00	225	4725	4500	٤ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	47
	سفاجا	مقبول	-5.75	225	4725	4500	٥ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	48
	سفاجا	مقبول	-5.50	225	4725	4500	٦ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	49
	سفاجا	مقبول	-5.25	225	4725	4500	٧ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	50
	سفاجا	مقبول	-5.00	250	4750	4500	٨ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	51
	سفاجا	مقبول	-4.75	250	4750	4500	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	52
	سفاجا	مقبول	-4.50	250	4750	4500	١٠ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	53
	سفاجا	مقبول	-4.25	250	4750	4500	١١ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	54
	سفاجا	مقبول	-4.00	250	4750	4500	١٢ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	55
	سفاجا	مقبول	-3.75	275	4750	4475	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	56
	سفاجا	مقبول	-3.50	275	4750	4475	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	57
	سفاجا	مقبول	-3.25	375	4850	4475	٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	58
	سفاجا	مقبول	-3.00	425	4875	4450	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	59
	سفاجا	مقبول	-4.50	225	475	250	٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	60
	سفاجا	مقبول	-4.00	225	475	250	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	جديد	61
	سفاجا	مقبول	-3.50	225	475	250	١ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	62
	سفاجا	مقبول	-3.00	225	475	250	٢ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	63
	سفاجا	مقبول	-2.50	225	475	250	٣ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	64
	سفاجا	مقبول	-2.00	225	475	250	٤ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	65
	سفاجا	مقبول	-1.50	250	475	225	٥ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	66
	سفاجا	مقبول	-7.00	200	1400	1200	٩ يناير ٢٠٢٤	جديد	67
	سفاجا	مقبول	-6.00	200	1400	1200	١٠ يناير ٢٠٢٤	جديد	68
	سفاجا	مقبول	-5.00	200	1400	1200	١١ يناير ٢٠٢٤	جديد	69
	سفاجا	مقبول	-4.50	200	1400	1200	١٢ يناير ٢٠٢٤	جديد	70
	سفاجا	مقبول	-4.00	200	1400	1200	١٣ يناير ٢٠٢٤	جديد	71
	سفاجا	مقبول	-3.50	200	1400	1200	١٤ يناير ٢٠٢٤	جديد	72
	سفاجا	مقبول	-3.00	200	1400	1200	١٥ يناير ٢٠٢٤	جديد	73
	سفاجا	مقبول	-2.50	200	1400	1200	١٦ يناير ٢٠٢٤	جديد	74
	سفاجا	مقبول	-2.00	175	1375	1200	١٧ يناير ٢٠٢٤	جديد	75
	سفاجا	مقبول	-1.50	200	1400	1200	١٨ يناير ٢٠٢٤	جديد	76
	سفاجا	مقبول	فرمة	225	2275	2050	٨ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	77
	سفاجا	مقبول	فرمة	250	1150	900	٩ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	78
	سفاجا	مقبول	فرمة	400	900	500	١٠ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	79
	سفاجا	مقبول	فرمة	225	225	0	١١ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	80
	سفاجا	مقبول	فرمة	275	500	225	١٢ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	81
	سفاجا	مقبول	فرمة	650	1800	1150	١٣ أكتوبر ٢٠٢٤	جديد	82
				0				جديد	83

محمد صلاح

بيان متابعة اعمال دمك الاتربة

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) اتجاه القصير

رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	رقم الطبقة	الموقف من القبول أو الرفض *	الاتجاه	ملاحظات
			من	الى					
1	جديد	٢٢ يناير ٢٠٢٤	0	200	200	فرمة	مقبول	القصير	
2	جديد	١٧ يناير ٢٠٢٤	200	400	200	فرمة	مقبول	القصير	
3	جديد	٣٠ يناير ٢٠٢٤	400	600	200	فرمة	مقبول	القصير	
4	جديد	٥ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-3.00	مقبول	القصير	
5	جديد	٦ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-2.75	مقبول	القصير	
6	جديد	٧ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-2.50	مقبول	القصير	
7	جديد	٨ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-1.75	مقبول	القصير	
8	جديد	٥ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-1.50	مقبول	القصير	
9	جديد	٦ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-1.00	مقبول	القصير	
10	جديد	٧ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.75	مقبول	القصير	
11	جديد	٨ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.50	مقبول	القصير	
12	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.25	مقبول	القصير	
13	جديد	١٢ يونيو ٢٠٢٤	600	850	250	فرمة	مقبول	القصير	
14	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	1100	1400	300	فرمة	مقبول	القصير	
15	جديد	٦ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-3.50	مقبول	القصير	
16	جديد	٧ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-3.00	مقبول	القصير	
17	جديد	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-2.50	مقبول	القصير	
18	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-2.00	مقبول	القصير	
19	جديد	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-1.50	مقبول	القصير	
20	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-1.00	مقبول	القصير	
21	جديد	١ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.75	مقبول	القصير	
22	جديد	٢ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.50	مقبول	القصير	
23	جديد	٣ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.25	مقبول	القصير	
24	جديد	٤ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	2050	650	فرمة	مقبول	القصير	
25	جديد	١٦ ديسمبر ٢٠٢٣	1650	1975	325	فرمة	مقبول	القصير	
26	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	2225	2600	375	فرمة	مقبول	القصير	
27	جديد	٥ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-6.00	مقبول	القصير	
28	جديد	٦ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.75	مقبول	القصير	
29	جديد	٧ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.50	مقبول	القصير	
30	جديد	٨ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.25	مقبول	القصير	
31	جديد	٩ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-5.00	مقبول	القصير	
32	جديد	١٠ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.75	مقبول	القصير	
33	جديد	١١ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.50	مقبول	القصير	
34	جديد	١٢ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.25	مقبول	القصير	
35	جديد	١٣ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-4.00	مقبول	القصير	
36	جديد	١٤ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.75	مقبول	القصير	
37	جديد	١٥ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.50	مقبول	القصير	
38	جديد	١٦ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.25	مقبول	القصير	
39	جديد	١٧ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.00	مقبول	القصير	
40	جديد	١٧ سبتمبر ٢٠٢٤	850	1100	250	فرمة	مقبول	القصير	
41	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	2050	2225	175	فرمة	مقبول	القصير	
42	جديد							القصير	






ملخص الاختبارات المعملية (الأساس)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (١)

بيان متابعة اعمال دمك طبقة الأساس

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	الموقف من * القبول أو الرفض	رقم الطبقة	الاتجاه
			من	الى				
1	جديد	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	0	600	600	مقبول	س ١	القصير
2	اعاده	١١ فبراير ٢٠٢٤	650	900	250	مقبول	س ١	القصير
3	جديد	٢٢ فبراير ٢٠٢٤	900	1300	400	مقبول	س ١	القصير
4	جديد	٢١ يناير ٢٠٢٤	1325	1950	625	مقبول	س ١	القصير
5	جديد	٥ سبتمبر ٢٠٢٤	650	900	250	مقبول	نهائي	القصير
6	جديد	٨ سبتمبر ٢٠٢٤	900	1300	400	مقبول	نهائي	القصير
7	جديد	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	1325	1950	625	مقبول	نهائي	القصير
8	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	0	900	900	مقبول	أولى	سفاجا
9	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	900	1300	400	مقبول	أولى	سفاجا
10	جديد	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤	1325	1900	575	مقبول	أولى	سفاجا
11	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1900	2300	400	مقبول	أولى	سفاجا
12	جديد	١٨ يناير ٢٠٢٤	2300	2500	200	مقبول	أولى	سفاجا
13	جديد	٢١ يناير ٢٠٢٤	2500	3050	550	مقبول	أولى	سفاجا
14	جديد	٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤	0	800	800	مقبول	نهائي	سفاجا
15	جديد	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤	800	1300	500	مقبول	نهائي	سفاجا
16	جديد	١٨ سبتمبر ٢٠٢٤	2300	2600	300	مقبول	نهائي	سفاجا
17	جديد	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	2600	3050	450	مقبول	نهائي	سفاجا






ملخص الاختبارات المعملية (MCO)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (١)

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)



المقاول شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال رصف (طبقة MC-30)



التجارب		الاتجاه	الموقع الكيلو متر	
المعدل gm/m2	الحالة		الى	من
1514	مطابق	القصير	1900	650
1510	مطابق	سفاجا	1050	225
1520	مطابق	سفاجا	2975	2325

مهندس / الهيئة

مهندس / محمد حسنين

توقيع /

مدير التنفيذ

مهندس / محمد سيد مسلم

توقيع /

فني مواد الشركة

أ / أسامة حمدي ونيس

توقيع /



ملخص الاختبارات المعملية (الطبقة الرابطة)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (١)

عملية :- مشروع أعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من
القاعدة البحرية حتى كوبري سكك حديد ابو طرطور بطول ه كم (ازدواج)

CONTRACTOR :



شركة النيل العامة لأشياء الطرق

أعمال رصف (الطبقة الرابطة)

مستل	تاريخ اخذ العينة	المحطة	الحالة	التدرج												
		كم		الثبات	الاسياح	الجساعة	1	3/4	3/8	4	8	30	50	100	200	نسبة البيتومين %
المواصفات			لا يقل عن ٧٠٠													
1	20/11/2024	R 1+350		869.4	2.8	310.5	100	94.6	64.1	45	32.4	16.5	9.1	4.2	2.3	4.49
2	25/11/2024	L 2+750		895.5	2.67	335.80	100	95.6	60.2	47.3	33	14.7	5.9	4.3	3	4.42
3	26/11/2024	R 0+570		934.7	2.7	346.20	100	94.6	64.7	43.8	33.5	15.6	8.9	4.9	2.5	4.61

مهندس الهيئة

م/محمد حسنين

مدير التنفيذ

م / محمد سيد مسلم

فني مواد الشركة

أ/ أسامة حمدي ونيس



ملخص الاختبارات المعملية (الخرسانة العادية)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (١)



بيان متابعة اعمال صب وتكسير المكعبات الخرسانية

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك

حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) .

الهيئة العامة
للطرق والمواصلات و
البنية التحتية
(GARBLT)
مدرسة شقة الطرق القومية



م	الموقع	نوع الصبة	الاتجاه	نوع الخرسانة	العدد	تاريخ الصب	بعد ٧ ايام	بعد ٢٨ يوم	بعد ٧ ايام	بعد ٢٨ يوم	المتوسط	بعد ٢٨ يوم	المتوسط
1	0+375	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	10/10/2023	17/10/2023	07/11/2023	172	170	167	222	170
2	0+625	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	11/10/2023	18/10/2023	08/11/2023	169	173	172	220	171
3	1+425	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	13/10/2023	20/10/2023	10/11/2023	169	161	171	221	167
4	2+300	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	24/10/2023	31/10/2023	21/11/2023	174	167	168	225	170
5	0+350	عادية اسفل المواسير	سفاجا	عادية	6	27/10/2023	03/11/2023	24/11/2023	217	209	196	224	207
6	0+925	عادية اسفل المواسير	سفاجا	عادية	6	28/10/2023	04/11/2023	25/11/2023	163	167	165	218	165
7	1+200	عادية اسفل المواسير	سفاجا	عادية	6	28/10/2023	04/11/2023	25/11/2023	169	170	168	219	169
9	1+425	تغليف	القصير	عادية	6	30/11/2023	07/12/2023	28/12/2023	167	177	172	224	172
10	0+375	تغليف	القصير	عادية	6	7/12/2023	14/12/2023	04/01/2024	168	171	167	221	169
12	0+625	تغليف	القصير	عادية	6	18/12/2023	25/12/2023	15/01/2024	167	165	167	222	166
14	1+200	تغليف	سفاجا	عادية	6	20/03/2024	27/03/2024	17/04/2024	190	180	185	218	185
15	0+350	تغليف	سفاجا	عادية	6	21/03/2024	28/03/2024	18/04/2024	190	187	192	224	190
16	0+925	تغليف	سفاجا	عادية	6	29/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	188	179	193	222	187
17	2+300	عادية اسفل المواسير	سفاجا	عادية	6	17/10/2024	24/10/2024	14/11/2024	163	167	165	226	165

مهندس الهيئة

مهندس المواد الشركة المنفذة

أحمد محمد



بيان متابعة اعمال صب نيروجيرسي

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سقاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) .

الهيئة العامة
للطرق والنقل
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية



م	الموقع	نوع الصبة	الاتجاه	نوع الخرسانة	العدد	تاريخ الصب	بعد ٧ ايام	بعد ٢٨ يوم	بعد ٧ ايام	المتوسط	بعد ٢٨ يوم	المتوسط
1	2750+3050	صب عادية نيروجيرسي	وجهين	عادية	6	26/09/2024	03/10/2024	24/10/2024	201	213	216	210
2	2+500	نيوجرسي	وجهين	عادية	6	9/10/2024	16/10/2024	06/11/2024	215	199	225	213
3	2+700	نيوجرسي	وجهين	عادية	6	10/10/2024	17/10/2024	07/11/2024	216	221	209	215
4	2+900	نيوجرسي	وجهين	عادية	6	11/10/2024	18/10/2024	08/11/2024	217	221	226	221
5	3+050	نيوجرسي	وجهين	عادية	6	12/10/2024	19/10/2024	09/11/2024	221	215	208	215
6				عادية								0
7				عادية								0
9				عادية								0
10				عادية								0
12				عادية								0
14				عادية								0
15				عادية								0
16				عادية								0

مهندس المصمم
١٤ محمد حسنين

مهندس المواد الشركة المنفذة
محمد صلاح
