

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى أعمال الجسر الترابي الإزدواج طريق جرجا / مطار سوهاج الصحراوي الغربى بطول ٢٢ كم القطاع الثاني)
في المسافة من كم ١٠ الى كم ٢٢ بطول ١٢ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣١

تنفيذ شركة :- محمود على أحمد عبد العال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة

العامه لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٢/٢٣ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



٢٠٢٤/١٢/٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابى ازدواج طريق
جرجا/المطار سوهاج الصحراوى الغربى بطول ٢٢ كم (القطاع الثانى) من الكم ١٠ الى الكم ٢٢ بطول ١٢ كم
تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال ابو خروف).

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

اعداد الجداول اذ ذواتها طريق جها / المطار - وهاج لعمارة الفرب
بطول ٢٢ كم (القطاع الثاني) من المخطط الك ١٠ من الخ ٢٢ بطول ٢٢ كم

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق

جنيه

تأمين ٥%

جملة الاعمال ٩٥٠ ٤٥٠ ٢٠

١٩ ٠٠ ٩ ٠٠ ٥ / -

دمغات

السابق صرفه ٤٥ ٦٦ ١٦ ١٠

٠٠

خصم معمل المنطقة

٥ ٦ ٦ ٥ ٨٠

٠٠

المستحق صرفه

٠٠

١٩ ٠٠ ٩ ٠٠ ٥ / -

جملة الاستقطاعات

٠٠

١ ٤ ١ ٢ ٧ ٢ ٢ ٠ ٠

الصافي

١٧ ٥ ٩ ٦ ٢ ٧ ٢ ٠ ٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

لمحور على المربع الاعلى ابو فريش

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أ

تحريرا ٢٠٢٤/٨٢/٢٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

٢٧٦ - ٢٧٥ - ٢٤٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



محضر استلام موقع

مشروع : اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من
الكم 10 حتى الكم 22 بطول 12 كم
تنفيذ : شركة محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف

اشراف: المنطقة الثامنة قنا

انه فى يوم الاثنين الموافق 9 / 12 / 2024 م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى | الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة |
| 2- السيد المهندس / حسن عبيد | الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة |
| 3- السيد المهندس / محمد مدوح على | ممثل الشركة المنفذة |


. وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع
والبدأ في التنفيذ

التوقيعات :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / محمد عبد العاطى |  |
| 2- السيد المهندس / حسن عبيد |  |
| 3- السيد المهندس / محمد مدوح على |  |

رئيس الإدارة المركزية

م / عماد محمد حسين

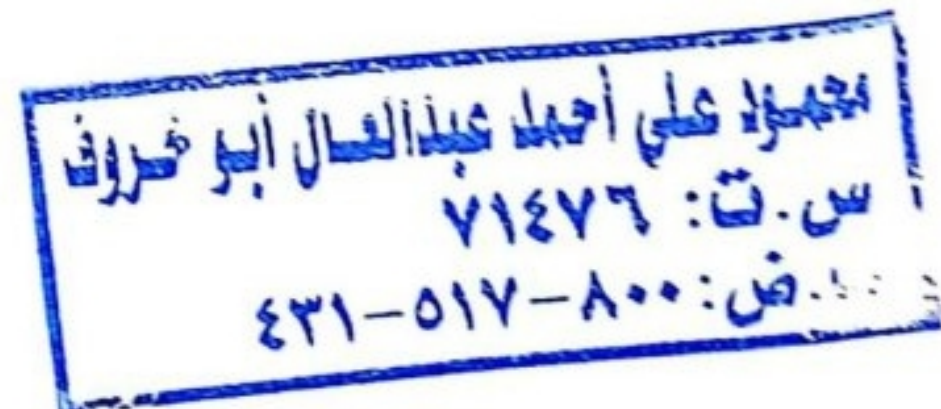

تقرير رقم (٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ازدواج جرجا / مطار سوهاج
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٦٩٦ الى ٧٠١	اختبار جهد الكسر لعدد ٦ مكعب صخر

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٠٦٠
١٤ % ضريبة القيمة المضافة	١٤٨.٤
المبلغ الاجمالي	١٢٠٨.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٣

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ م/

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / جرجا / مطار سوهاج
تنفيذ/ شركة محمود ابو خروف للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /حسن عبيد (مهندس الهيئة)

٢١.٨٠٠ كم						الموقع الكيلو متري
صخور						النوع
٧٠١	٧٠٠	٦٩٩	٦٩٨	٦٩٧	٦٩٦	أرقام العينات
٧٣٧	٣٧٠	٦٨٠	٣٢٠	٢٥٠	٥٠٧	جهد الكسر

تحريرا في : ٢٠٢٤/١٢/٢٣

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٧٥) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ازدواج جرجا / مطار سوهاج
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٦٨٧ الى ٦٩٥	اختبار جهد الكسر لعدد ٩ مكعب صخر

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٤٦٥
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٢٠٥.١
المبلغ الاجمالي	١٦٧٠.١

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٣/١٢/٢٠٢٤

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٧٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / جرجا / مطار سوهاج
تنفيذ/ شركة محمود ابو خروف للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /حسن عبيد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري									٢١.٨٠٠ كم
النوع									صخور
أرقام العينات									٦٩٥ ٦٩٤ ٦٩٣ ٦٩٢ ٦٩١ ٦٩٠ ٦٨٩ ٦٨٨ ٦٨٧
جهد الكسر									٤٠١ ٤٩٨ ٣٧٢ ٤٢٥ ٤٩١ ٤٤٤ ٣٩٧ ٤٥٠ ٤٩٧

تحريرا في : ٢٠٢٤/١٢/٢٣

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع

(عماد حسين)



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم 10 حتي الكم 22 بطول 12 كم
بعقد رقم : (2025/2024/531)

رقم البند وبيانه:(1) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة			١٠٠٠٠٣		
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	2م	الاجمالى 2م
	من	الى			
أعمال التطهير	١٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٠٠٠٠٣	٩٨٠٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الهيئة


التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة


التوقيع/

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم 10 حتي الكم 22 بطول 12 كم
بعقد رقم : (2025/2024/531)

رقم البند وبيانه: (2)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ

تنفيذ شركة محمود على احمد عبدالعال أبو خروف

١٤٨٠٠٠

الكمية بالقايصة

بيان الأعمال بالمقايصة

الموقع الكيلو مترى

الى

من

الطول (م)

3م

الاجمالى 3م

أعمال الردم

١٠٠٠٠

٢٢٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٨٠٠٠

١٤٨٠٠٠

الاجمالى

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

١٤٨٠٠٠

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

.

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

١٤٨٠٠٠

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

١٤٨٠٠٠

مهندس الشركة المنفذه

مهندس الهيئة

التوقيع/

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم 10 حتي الكم 22 بطول 12 كم
بعقد رقم : (2025/2024/531)

رقم البند وبيانه: (3)

أعمال تحجير باستخدام البلدوزر الخ

تنفيذ شركة محمود على احمد عبدالعال أبو خروف

١٤٨٠٠٠

الكمية بالقياسة

الاجمالى 3م

3م

الطول (م)

الموقع الكيلو مترى

بيان الأعمال بالمقاييس

الى

من

١٤٨٠٠٠

١٤٨٠٠٠

١٢٠٠٠

٢٢٠٠٠

١٠٠٠٠

أعمال التحجير

الاجمالى

١٤٨٠٠٠

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

.

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

١٤٨٠٠٠

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

١٤٨٠٠٠

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم 10 حتي الكم 22 بطول 12 كم
بعقد رقم : (2025/2024/531)

رقم البند وبيانه:(4)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة عدا التربة الصخرية

تنفيذ شركة محمود على احمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالقياسة		٥٠٠٠٠			
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الطول (م)	3م
أعمال الحفر	١٠٠٠٠	٢٢٠٠٠		١٢٠٠٠	٢٥٠٠٠
الاجمالى					
	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم 10 حتي الكم 22 بطول 12 كم
بعقد رقم : (2025/2024/531)

رقم البند وبيانه: (5)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)

تنفيذ شركة محمود على احمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالمقايضة		٥٠٠٠٠			
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الطول (م)	م3
أعمال الحفر	١٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
الاجمالى					
٥٠٠٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
٥٠٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
٥٠٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم 10 حتى الكم 22 بطول 12 كم
بعقد رقم : (2025/2024/531)

رقم البند وبيانه:(6)

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية الخ

تنفيذ شركة محمود على احمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالمقاييس		الكمية بالمقاييس	
بيان الأعمال بالمقاييس		الموقع الكيلو مترى	
		من	الى
أعمال الحفر		١٠٠٠٠	٢٢٠٠٠
الاجمالى		الطول (م)	
		٣م	
		٣١٩٠٦	
الاجمالى		٣١٩٠٠	
الاجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٠	
الاجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٣١٥٠٠	
الاجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		٣١٥٠٠	

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

مهندس الهيئة

التوقيع /
