

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق
جرجا/العسيرات بطول ٣.٣٧٥ كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا من الكم ١٨.٣٥٠ الى
الكم ٢١.٧٢٥ ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال ابوخروف) .

عقد رقم (٧٢٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٤

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

رفع كفارة طريق ج ١/٢ السير بطول ٢,٧٥ كم بدارية مدخل لمنشأه
باتجاه ج ١/٢ من الك ١٨,٢٥٠ الى ٢١,٧٥٠ متر بدارية ك ١/٢

عن شهر فبراير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

جنيه

ق

جملة الاعمال ٩٨٢,٤٨,٨٠ تأمين ٥% ١٩ ٦٦٠ ٩٧٥,١-

السابق صرفه ٤٧٤ ٢٦٢,٤٠ دمغات

خصم معمل المنطقة ٢٨٥٠,١-

المستحق صرفه ١٢٠٠,١- دفعه من ج ١/٢ من الك ١٨,٢٥٠ الى ٢١,٧٥٠

جملة الاستقطاعات ١٢٠٠,١- ٢٨٥٠,١- ٢٠٢٥/٢/٢٠٢٥

المصافي ١٨ ١٩٠ ٨٢٤,٨٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

محمود السيد عبد العال ابو فزون وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

تحريرا: ٢٠٢٥/٢/٢٠٢٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ٨٨

محضر استلام موقع

مشروع : عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.375 كم بداية من مدخل المنشأة
وبإتجاه جرجا (من كيلو 18+350 الى كيلو 21+725) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : محمود علي احمد عبدالعال

اشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 2025 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى

1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى

الهيئة العامة للطرق والكبارى.

2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط

ممثل الشركة المنفذة .

3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا
محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى

2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط

3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى

محضر استلام موقع
س. ق. ١٤٧٦
ب. ق. ٨٠٠٠



رئيس الادارة المركزية

مهندس /
ع. ح. ١٨
عماد حسين

محضر استلام موقع

مشروع : عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.375 كم بداية من مدخل المنشأة
وباتجاه جرجا (من كيلو 18+350 الى كيلو 21+725) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : محمود علي احمد عبدالعال

اشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 2025 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى
الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط
الهيئة العامة للطرق والكبارى.
- 3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى
ممثل الشركة المنفذة .

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا
محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

- 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى
- 2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط
- 3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى



رئيس الادارة المركزية

مهندس /
علاء حسين



محضر استلام موقع

مشروع : عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.375 كم بداية من مدخل المنشأة
وبإتجاه جرجا (من كيلو 18+350 الى كيلو 21+725) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : محمود علي احمد عبدالعال

اشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 2025 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى

1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى

الهيئة العامة للطرق والكبارى.

2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط

ممثلى الشركة المنفذة .

3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى

. وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا
محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى

2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط

3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

اعمال حسين

بيان الاعمال بالمستخلص : (جاري)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٣٧٥ كم بداية من مدخل المنشأة ويأتجاه جرجا (من كيلو ١٨٣٥٠ الى كيلو ٢١٧٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (١)

بالمتر المسطح اعمال FDR

تنفيذ شركة محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م٢
	من	الى		
أعمال FDR	18+350	21+725	٣٣٧٥	.


الاجمالى

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	.
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	.
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	.
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	.



مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



بيان الاعمال بالمستخلص : (جاري)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٣٧٥ كم بداية من مدخل المنشأة ويتجاه جرجا (من كيلو ١٨٣٥٠ الى كيلو ٢١٧٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه:(٢)		بالطن اعمال توريد وازافة الاسمنت	
تنفيذ شركة محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف			
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى بالطن
	من	الى	
اعمال الاسمنت	18+350	21+725	٣٣٧٥
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى			
التوقيع/			

الهيئة العامة للطرق والكبارى


م.س.ت. ب.ض.

٧٦٤٢٠٠

٥١٢٠٠٠٠٠

٢٠٢١

CS CamScanner

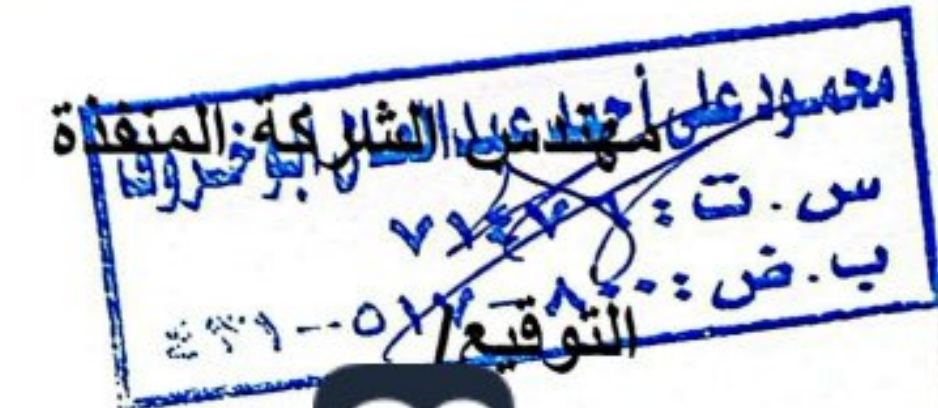

بيان الاعمال بالمستخلص : (جاري)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٣٧٥ كم بداية من مدخل المنشأة وياتجاه جرجا (من كيلو ١٨٣٥٠ الى كيلو ٢١٧٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه:(٣)			بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسبك المحدد	
تنفيذ شركة محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف				
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م٣
	من	الى		
أعمال الاساس	18+350	21+725	٣٣٧٥	٠,٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٠,٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٠,٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٠,٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		٠,٠		
مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى				
التوقيع/				

محمود علي مهندس الشركة المنفذة

س.ت: ٧٢٤٧٧

ب.ض: ٥٧-٤٣١

التوقيع

محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف
س.ت : ٧٢٤٦٠
ب.ض : ٥٧-٤٣٦
التوقيع

بيان الاعمال بالمستخلص : (جاري)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٣٧٥ كم بداية من مدخل المنشأة وياتجاه جرجا (من كيلو ١٨٣٥٠ الى كيلو ٢١٧٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه:(٤)

بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب M.C.O

تنفيذ شركة محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م٢
	من	الى	
أعمال MCO	18+350	21+725	٥٦٠٠٠

الاجمالى

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف
س.ت : ٦٠٠٠
ب.ض : ٤٣١-٥١٧٠٠٠

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى ١

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٣٧٥ كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا (من كيلو ١٨٣٥٠ الى كيلو ٢١٧٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٥)			بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	
تنفيذ شركة محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف				
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	الاجمالى م٢
	من	الى		
أعمال الطبقة السطحية	18+350	21+725	٣٣٧٥	٥٦٠٠٠
الاجمالى				
	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٥٦٠٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠,٠٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٥٥١٥٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٥٥١٥٠
مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى				
التوقيع /				
محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف مهندس س.ت. : ٧٦٤٧٢١ ب.ض. : ٨٠٠٠ - ٥٦٧ - ٤٣٦ التوقيع				

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٣٧٥ كم بداية من مدخل المنشأة وبياتجاه جرجا (من كيلو ١٨,٣٥٠ الى كيلو ٢١,٧٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

شركة / محمود علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٢/٢٥

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٧٢٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم بند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنه				جنه		جنه	جنه	جنه	
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة تكوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القلعة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و	٨٤	م	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت بورتلاند على رتبة ٤٢,٥ وطبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف وحسب النسبة المطلوبة.	٣٩٠٠	الطن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أسس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتخرج الوارد بالإستراطات العامة والخاصة بالمشروع - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المدة لمحجيرة وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	٣٢٤	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام نمكها وتنظيفها جيداً	٣٧,٥	م	٢	٥٥١٥٠	٥٥١٥٠	٠	٢,٠٦٨,١٢٥	٠	٢,٠٦٨,١٢٥	تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد النمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات	٣١٩	م	٢	٥٥١٥٠	٥٥١٥٠	٠	١٧,٥٩٢,٨٥٠	٠	١٧,٥٩٢,٨٥٠	السيارة متواجدة
الإجمالي											١٩,٦٦٠,٩٧٥,٠٠

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

الجهة المالكة
مهندس المشروع / احمد عبد الباسط
جشنى المشروع / محمد عبد العاطي

تاريخ: ٢٠٢٥ / /

الشركة المنفذة
م/ محمد الوتيدى

يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ ر.ماني ارميا

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / عماد حسين

محمود علي احمد عبد العال ابو خروف
س.ت: ٧١٤٧٦
ب.ض: ٨٠٠-٥١٧
CS CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

جملة الاعمال	١٩٦٦.٩٧٥
السابق صرفه	.
المستحق صرفه	١٩٦٦.٩٧٥

الاستقطاعات	
تأمين	٩٨٣.٤٨.٨
دمغات	٤٧٢٢٦٣.٤٠
معمل قنا	٢٥٠.٠٠٠
١٤%	٣٥.٠٠٠
خصم عدم وجود عدد سيارة لمدة ٨ ايام	١٢٠.٠٠٠
جملة الاستقطاعات	١٤٧.١٦٢.١٥

تقارير معمل قنا (٨٧)

الاستقطاعات	١٤٧.١٦٢.٢
الصافي	١٨١٩.٨١٢.٨٠



تقرير رقم (٨٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / جرجا / العسيرات بدايه من مدخل
المنشأه باتجاه جرجا
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٨٩-٣٨٨-٣٨٧	اختبار استخلاص عينات اسفلت سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٥٠٠	قيمة اجراء التجارب
٣٥٠	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
٢٨٥٠	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٤

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/



رئيس الإدارة المركزية

ع/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٨٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / جرجا / العسيرات بدايه من مدخل المنشأه باتجاه جرجا
تنفيذ/ شركة احمد ابو خروف للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/ احمد عبد الباسط (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٣٨٩	٣٨٨	٣٨٧	أرقام العينات
		طبقة سطحية			الطبقة المختبرة
		2.500km	1.700km	0.400km	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٥.٤٦-٧٥.٤٦	٨٥.٠٢	٨٥	٨٤	"٢/١"
٨٥-٦٠	٧٥.٩٩-٦٥.٩٩	٧٤.٠١	٧٥.٦	٧٦	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٣.١٨-٣٥.١٨	٣٦.٦	٤١.٦	٤٢.٠٥	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٢.٥-٢٦.٥	٢٧.٨	٣٢.٥	٣١.٠٧	رقم ٨
٢٢-١٠	٢٠.٥-١٤.٥	١٨.٦٣	٢٤	١٩.٢٥	رقم ٣٠
١٦-٦	١٤.٢٩-٨.٢٩	٨.٥	٩.١٣	٩.٢	رقم ٥٠
١٢-٤	٩.٦٤-٣.٦٤	٣.٩	٢.٤	٣.٧	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٦٨-٢.٦٨	٢.٨	١.٨	١.٥	رقم ٢٠٠
%٠.٢٥±%٤.٨		%٤.٧٢	%٤.٦	%٤.٦٠	نسبة الإسفلت
		%٢.٥	%٢.٥	%٢.٤	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للار من المناخل



مدير المعمل

(Handwritten signature)

تحريرا في ٢٠٢٥/٢/٢٤

فني المعمل
(Handwritten signature)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / *(Handwritten signature)*

(عماد حسين)
