

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اسناد تنفيذ اعمال حفر
وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر
لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية -
العلمين - مطروح) منطقة (A902-A) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات / سامى محمد ياسين وهادان

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٧

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

صورة وثيقة التأمين

اصل محضر مسافة

برنامج زمنى

مقاييس معرلة

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحطة الاولى المركزية
قسم المرفقات العامة
الاسناد
عدد المرفقات
تاريخ
٢٠٢٣ / ١٢ / ١٧
٧٨٠٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الى العقد رقم (٥٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧

اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار
محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A902-A) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات / سامي محمد ياسين وهذان

- برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل توريد عدد (١) حاسب الى (بجميع
مشمولاته) باحدث مواصفات الفحص عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات
بالهيئة ويسلم لمخازن الهيئة
- ولا يشمل اي محملات اخري .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٢/١٩

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



مهندس /

الهيئة العامة للغرباء

المكتب الإداري

الهيئة العامة للغرباء

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على الخارج

شيك على البنك المركزي في

بموجب

دورسل إليه بالعنوان الآتي

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

عدد المرفقات

نوع الخصم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

(١)

رقم :

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

رؤس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١١

(١) إقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مغشاك بحساب : حيازي

الإيرادات

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح : برقم :

ردج في سنة ٢٠١١

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١١ مبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٩٩/٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح :)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

(٣) سحب

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

في سنة ٢٠١١

في سنة ٢٠١١

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين -
مطروح) منطقة E1 & A902 القطاع الثاني

تنفيذ شركة أبناء ياسين للمقاولات.

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17 وبناء على عقد العملية رقم (2024/2023/525)





اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد وهم :-

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى	السيد المهندس / كرام امام
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى	السيد المهندس / اسلام محمد
سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام	السيد المهندس / مصطفى علي السيد
مكتب الترانس كونسلتنج استشاري الهيئة	السيد المهندس / تامر شرف الدين
مكتب XYZ استشاري المساحة	السيد المهندس / احمد هشام
شركة ابناء سامي ياسين	السيد المهندس / محمد جمال بكر

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا متاع من استلام
الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023/10/17 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

التوقيع :

- 6-  السيد المهندس / كرام امام
- 5-  السيد المهندس / اسلام محمد
- 4-  السيد المهندس / تامر شرف الدين
- 3-  السيد المهندس / احمد هشام
- 2-  السيد المهندس / محمد جمال بكر
- 1-  السيد المهندس / محمد هشام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية - المنطقة الاولى

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة A902 & E1 القطاع الثانى
تنفيذ شركة ايناء ياسين للمقاولات.





انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17 وبناء على عقد العملية رقم (2024/2023/525)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / كرام امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 2- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / مصطفى على السيد | مستشارا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب الترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 5- السيد المهندس / احمد هشام | مكتب XYZ استشاري المساحة |
| 6- السيد المهندس / محمد جمال بكر | شركة ايناء سامي ياسين |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023/10/17 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

التوقيع :

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 6-  | 5-  | 4-  | 3-  | 2-  | 1-  |
|--|--|--|--|--|--|



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس / 

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية - المنطقة الأولى

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة A902 & E1 القطاع الثاني
تنفيذ شركة ابناء ياسين للمقاولات.





انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17 وبناء على عقد العملية رقم (2024/2023/525)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / كرام امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 2- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / مصطفى علي السيد | مستشارا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 5- السيد المهندس / احمد هشام | مكتب XYZ استشاري المساحة |
| 6- السيد المهندس / محمد جمال بكر | شركة ابناء سامي ياسين |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023/10/17 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

التوقيع :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 6-  | 6- السيد المهندس / كرام امام |
| 5-  | 5- السيد المهندس / اسلام محمد |
| 4-  | 4- السيد المهندس / مصطفى علي السيد |
| 3-  | 3- السيد المهندس / تامر شرف الدين |
| 2-  | 2- السيد المهندس / احمد هشام |
| 1-  | 1- السيد المهندس / محمد جمال بكر |



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس / 

تنفيذ أعمال حفر و ترجيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حداثق اكوير ضمن اعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة A902 .
العقد رقم : (2024/2023/525) بتاريخ : 17/10/2023 - ١٨

منطقة A902

شركة : ابناء ياسين للمقاولات

فريق العمل الموجود بالموقع

سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة	العدد	التخصص	م
10	1	مدير مشروع	1
6	1	مهندس تنفيذ	2
6	1	مهندس مكتب في	3
4	2	مساح	4
1	4	مساعد مساح	5
4	3	مشرف	6
10	2	ميكانيكي	7
5	30	سائق حفار	8
3	47	سائق	9

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م

المستشار المشرف

مكتب إلكترونى كونسولتج

م

الشركة المتابعة

شركة / ابناء ياسين للمقاولات

م

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة A902 .
العقد رقم : (2024/2023/525) بتاريخ : 17/10/2023

منطقة E1 & A902 شركة : ابناء ياسين للمقاولات

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

العدد	نوع المعدة	م
1	سيارة ملاكي	1
2	سيارة نصف نقل	2
3	لودر كاتربيلر 972	3
4	لودر كاتربيلر 980	4
1	جرير	5
3	تاتك مياة	6
25	عربية نقل 20 م	7
1	بلدوزر D10	8
1	هراس	9

الإستشارى المشرف

مكتب الرئيس كونسلتنج

الشركة المنفذة

شركة / ابناء ياسين للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

١٠

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الى التكاليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة
البناء بشأن تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع

الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة (A902) (القطاع الثاني) عقد رقم 2024/2023/525

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2023/10/17

بحضور كلاً من:-

1. م/ م. محمد البهادي

2. م/ م. محمد البهادي

3. م/ م. محمد البهادي

4. م/ م. محمد البهادي

5. م/ م. محمد البهادي

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

ممثل سيسترا للاستشارات الهندسية

ممثل مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة



ممثل مكتب XYZ

ممثل شركة ابناء ياسين للمقاولات

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحه
من نواتج الحفر من القطاع الى المقابل المحدده من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد
ان منتصف القطاع يبعد مسافة (1000) م عن مكان المقلب المعتمد
واقفل المحضر على ذلك.

التوقيعات

التوقيع:



الاسم:

5- م. محمد البهادي

4- م. محمد البهادي

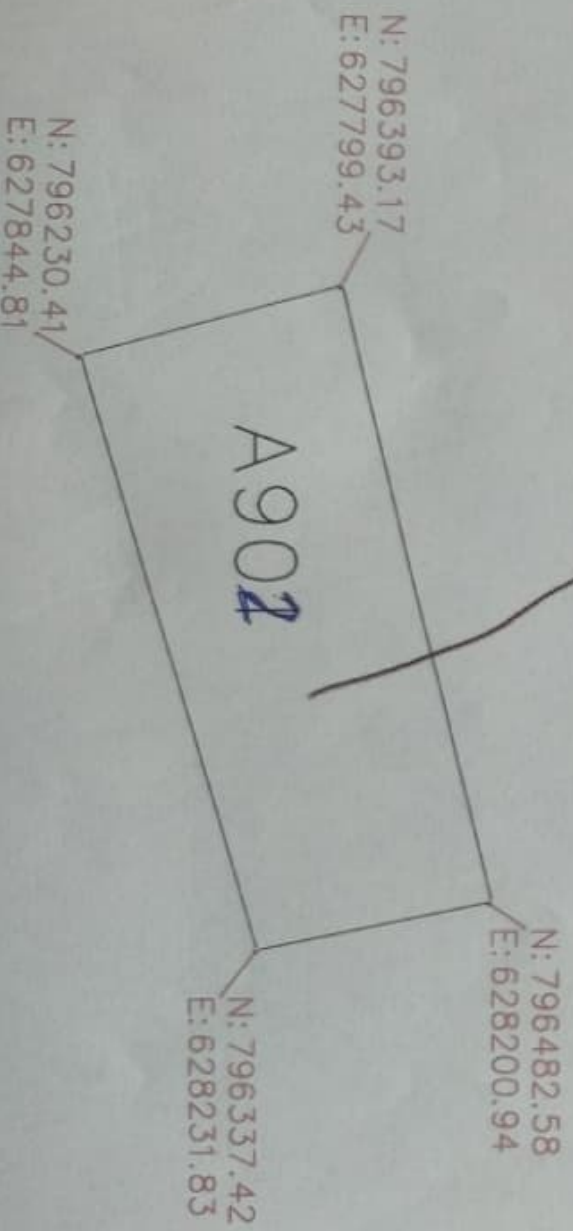

3- م. محمد البهادي

2- م. محمد البهادي

1- م. محمد البهادي



1000 m



Handwritten signature and date: 15/7/15

11/11/11
مجلس إدارة جامعة القاهرة
مجلس إدارة جامعة القاهرة


 10/10/2020

2024												
ردیف	شرح	توضیحات	مبلغ	توضیحات	مبلغ	توضیحات	مبلغ	توضیحات	مبلغ	توضیحات	مبلغ	
5	تجهیزات و اثاثیه	تجهیزات و اثاثیه	441,781	353,421	265,070	176,714	88,359	3	2	1	مبلغ اولیه	
			88,356	88,356	88,356	88,356	88,356	88,356	1	1	مبلغ اضافی	
			63,798	35,038	26,279	17,519	8,760	8,760	0	0	0	مبلغ کسر
			8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	0	0	0	مبلغ اضافی
2	تجهیزات و اثاثیه	تجهیزات و اثاثیه	1,088,792	952,883	818,594	680,435	544,396	408,297	272,198	136,099	136,099	
			136,099	136,099	136,099	136,099	136,099	136,099	136,099	136,099	136,099	136,099
			300,688	262,927	225,366	187,805	150,244	112,683	75,122	37,561	37,561	37,561
			37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561
1	تجهیزات و اثاثیه	تجهیزات و اثاثیه	300,688	262,927	225,366	187,805	150,244	112,683	75,122	37,561	37,561	
			37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561
			300,688	262,927	225,366	187,805	150,244	112,683	75,122	37,561	37,561	37,561
			37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561
4	تجهیزات و اثاثیه	تجهیزات و اثاثیه	441,781	353,421	265,070	176,714	88,359	3	2	1	مبلغ اولیه	
			88,356	88,356	88,356	88,356	88,356	88,356	1	1	مبلغ اضافی	
			63,798	35,038	26,279	17,519	8,760	8,760	0	0	0	مبلغ کسر
			8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	0	0	0	مبلغ اضافی

A902 & E01 Table 1a

מאמרים : 15

[illegible]

تاریخ: 2023/10/17
 (2024/2023/525)
 2023/10/17

الهيئة العامة للطرق والكباري

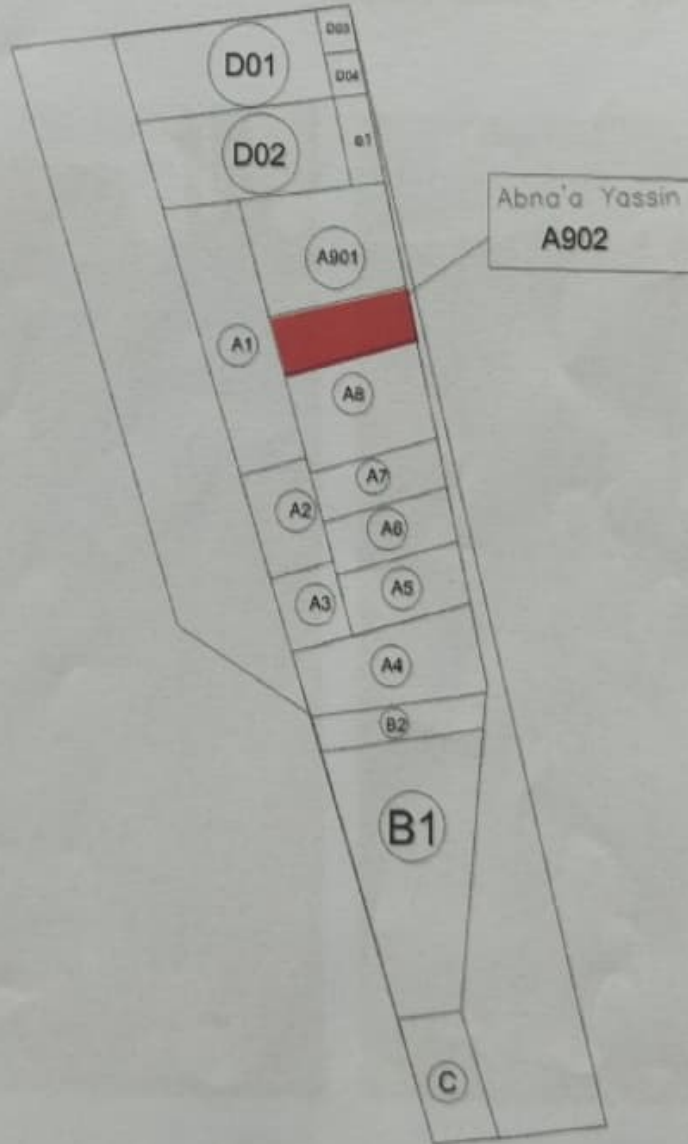
الإدارة المركزية - المنطقة الأولى

التقرير المبدئي لعملية مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة A902 القطاع الثاني

تنفيذ شركة ابناء ياسين للمقاولات .

أولا :- موقع العمل :

هي الورشة المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر وتعتبر الورشة الرئيسية لصيانة قطارات خطوط القطار السريع (الخط الأول والثاني) منطقة A902 طبقا لتقسيم الهيئة العامة للاتفاق والهيئة العامة للطرق والكباري والسادة الاستشاريين



صورة للموقع العام و مكان القطعة

ثانياً :- وصف المشروع :

تم النزول علي الطبيعة في حضور كل من :

- 1- السيد المهندس / كرم امام
 - 2- السيد المهندس / اسلام محمد
 - 3- السيد المهندس / مصطفى علي السيد
 - 4- السيد المهندس / *سليم*
 - 5- السيد المهندس / *عمر*
 - 6- السيد المهندس / تامر شرف الدين
 - 7- السيد المهندس / محمود حسام
 - 8- السيد المهندس / احمد عبد المحسن
 - 9- السيد المهندس / احمد هشام
 - 10- السيد المهندس / محمد جمال بكر
- مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب XYZ استشاري المساحة
شركة ابناء ياسين للمقاولات

وتبين الاتي :

الموقع عبارة عن

- 1- تربة متماسكة تم قطعها باستخدام البلدوزر تصنيف (A-1-b & A4) طبقا لتقرير المعمل الذي تم بمعرفة السادة الاستشاريين (مرفق تقرير التربة المتماسكة وتصنيفها) .



صورة للتربة



صورة للتربة

ثالثاً :- منهجية التنفيذ :

تم الاتفاق على ازالة ناتج الحفر للتربة الغير صالحة الي مشون يبعد عن حدود الورشة مسافة لا تقل عن 200 م ويبعد عن حدود الدفاع الجوي مع الرفع المساحي للمشون وتقسيم المشون الي قسمين قسم تربة طفلة غير صالحة وقسم اخر للتربة الصالحة للزرم

التوقيع :

-10-

-9-

-8-

-7-

-6-

-5-

-4-

-3-

-2-

-1-

لقرن العمل الممنوع
بسم الله
اللودر

ع /

بوس الاطلاع

والاندو الايمان

الملاطحة الكسوة

لقرن العمل الممنوع

بسم الله

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر

اللودر



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايمة معدلة رقم 1 لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح عقد 525 - 2023 - 2024 منطقة A902-A تنفيذ شركة ابناؤ ياسين للمقاولات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

نصر محمد نصر طيخ



م.ب.ب.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٨٨
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ١٩ / ٩
الموقع /



رقم الوثيقة 20 143 / 3 / 4
رقم الايصال / 49056
تحريرا في / 2023/12/19

مطالبة سداد

الفرع / الرئيسي
نوع التأمين / حوادث شخصية
القطاع / خاص
مطلوب من / شركة أبناء ياسين للمقاولات (سامي محمد ياسين وهذان)
العنوان / -شارع الشهيد احمد صقر -متفرع من شارع رضا -حي السلام -القاهرة
مبلغ التأمين / 130000
الصلاحية / الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان حساب الرسوم

المدة من	الى	2024/12/19	2023/12/19
التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يغطي الحوادث الناتجة عن خطر الارهاب و التخريب و الشغب و الاضطرابات الاهلية.			
القسط الصافي	411.75		
دمغة نسبة	4.15		
مصاريف الاصدار	77.35		
مصاريف الاشراف	2.50		
دمغة الاتساع	3.00		
رسوم خدمات مراجعة و اعتماد	0.42		
صندوق حملة وثائق	0.83		
القسط الاجمالى	500.00		
جنية مصرى			
قسط خمسمائة جنية مصرى لا غير			

41.18 10.00 %

العمولة الاصلية قبل الاستقطاعات

ايمن عبد الحميد عبد المجيد مرسال

11143

GOMIC
GOMI ANDER INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الكوادر المتوسطة

المؤمنون والمؤمنات في مثل هذه الحالة يجب ان يكونوا على علم من الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة اعادة تجديد الوثائق الخاصة بهم

تقوم الشركة بحاسبة بملحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
الفرع المصنوع	القياس	رقم الوثيقة	و/و	تاريخ طلب التأمين	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية على الحوادث التي تقع أثناء وبسبب العمل فقط وفي مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم غير مذكوري الأسماء التامة تنفيذ عملية (تنفيذ أعمال حفر وتحويل نواتج الحفر وأعمال رمل لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حادق اكتوير ضمن أعمال مشروع القطر وذلك بشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع (A902-A) الكهربائي السريع الخط الأول (العين المنصورة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) منطقة الحادث عن عدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة ولا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ فولت
تعد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٥
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٧

القسمة الاجمالي	صندوق حيلة الوثائق	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	مصاريف الاشغال	مصاريف الاصدار	نصف ادمغة الاشعاع	نصف ادمغة النسبية	القسمة الصافي
500.00	0.83	0.42	2.50	77.35	3.00	4.15	411.75

لحظة خمسة جنة مصرى لا غير

الحالات المغطاة

أولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له بؤدى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستقيم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له بؤدى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستقيم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له بؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة

رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له بؤدى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمس في الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلي المستقيم الوارد بالبنود ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بعد الفس ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

خامسا : تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسراف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

سابع : تغطية مصاريف الجراحة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

أيمن عبد الحميد عبد المجيد مرسل

11143

MIC
MICHANAH INSURANCE CO.
شركة المحنة للتأمين

إدارة المصارف المتعددة
www.michanah.com

Head Office: 3 El Mesaha Sq, Dokki - Giza
Cairo - EGYPT
Tel: 43364101 - 7
Fax: 33337697 - 43361365

المركز الرئيسي: ٣ ميدان المساحة - الجيزة
تلفون: ٤٣٣٦٤١٠١ - ٧
بريد: ١٢ الجيزة - الدقي - مصر
فاكس: ٣٣٣٣٧٦٩٧ - ٤٣٣٦١٣٦٥
Info@michanah.com

هذه الوثيقة مقدمة ومحتوية

تقوم الشركة بحسابات محاسبة المصاريف على طريقة الخدمة التأمينية والتأمينية

وثيقة تأمين حوادث شخصية



2023/12/19 تاريخ طلب التأمين 4 / 20143 رقم الوثيقة الفرع المصدر الرئيسي
2024/12/19 ظهور الى مدة التأمين من جنية مصرى العملة

من المطبوع والمعلق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة وعددها (١) والكشوف المرتقة للوثيقة وعددها
تحريرا فى 2023/12/19

COMIC
MOHAMED INSURANCE CO.
شركة التأمين
إدارة الحوادث للشركة 1/11

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com
المقر الرئيسي: 3 ميدان الصحافة - الدقى - الجيزة
تليفون: 33363114 - 33363115
بريد: 33363114 - الدقى - مصر
فاكس: 33363115 - 33363116
Head office: 3 Elkhayma Sq. Dokki - Giza
P.O. Box: 62 ORMAN - EGYPT
Tel: 33363114 - 33363115
Fax: 33363115 - 33363116
www.mohins.com
9318

هذه الوثيقة ملزمة ومتداولة



كشف باسماء المساهدة المؤمن عليهم

كشف متمم لتوثيقة 4 / 20143

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	المعبر	القسم
تامياً على عدد (١) مهندس مهني بدون ذكر اسماء	شركة المعول الثاني او الجزئي المستثمر	75000	75000	0	0.00
تامياً على عدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ او ملاحظ فني	شركة المعول الثاني او الجزئي المستثمر	30000	30000	0	0.00
تامياً على عدد (١) سائق سعة او سيرة و من فني حكمهم	شركة المعول الثاني او الجزئي المستثمر	15000	15000	0	0.00
تامياً على عدد (١) عامل عمل عشرين	شركة المعول الثاني او الجزئي المستثمر	10000	10000	0	0.00

اجمالي مبلغ التأمين 130000

جنية مصرى

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم 25.00

اسماء الممنفذين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التعطية على الوارث التي تقع أثناء وبسبب العمل فقط وفي مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم غير متكوري
الاسماء أثناء تنفيذ صلية (تنفيذ اصل حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق لكتوير ضمن
(A902-A) اصل مشروع التطوير الكورني السريخ الخط الاول (المين السخرة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة
وتلك بشرط الا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن الحد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه في الانتفاع بزاي التأمين
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كورني لالتزيين عن ٢٢٠ فوات
الحد رقم ٢٠٢٣/١٠/١٧
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٧

OMIC
MOHANDSES INSURANCE CO.

شركة المحسنين للتأمين
إدارة العقود المتنوعة ١١١١

صافي القسط

411.75

رقم الوثيقة 20144
رقم الاتصال 0
تحريرا في 2023/12/19

الفرع الرئيسى
نوع التأمين مسئولية مدنية عامة
القطاع خاص

مطالبة سداد

مطلوب من: / (شركة أبناء ياسين للمقاولات) سامى محمد ياسين وهذان

العنوان شارع الشهيد احمد صقر - متفرع من شارع رضا - حي السلام - القاهرة--

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

مبلغ التأمين	100000	جنية مصرى	للفترة من 2023/12/18 حتى 2024/12/18
القسط الصافى	435.00		
دمغة نسبية	4.35		
مصاريف الاصدار	53.65		
رسم الاشراف	2.65		رسوم خدمات مراجعة و اعتماد 0.45
دمغة الاتساع	3.00		صندوق حملة وثائق 0.90
القسط الاجمالى	500.00		فقط خمسمائة جنية مصرى لا غير
ايمن عبد الحميد عبد المجيد مرسل	11143	العقولة الاصلية قبل الاستقطاعات	43.50 % 10.00

2023/12/19

43.50 %

10.00

العقولة الاصلية قبل الاستقطاعات

11143

ايمن عبد الحميد عبد المجيد مرسل

المستوفى والمصدق على: اولى عملية استلام التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية بربط اوراق سدادها التأمينية

تقوم الشركة برحاسية معالجة المطالبات
على طريقة الدفعة الفورية والنوعية

جدول وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية العامة

رقم الوثيقة 20144 4 / 3

اسم المؤمن له (شركة أبناء ياسين للمقاولات) سامى محمد ياسين وهدان
لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى
طبيعة النشاط تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم للخط الاول لمشروع القطر الكهربائى السريع
العنوان شارع الشهيد احمد صقر - متفرع من شارع رضا - حى السلام - القاهرة --

مدة التأمين تبدأ من يوم 2023/12/18 الساعة الثانية عشر ظهرا
وتنتهى فى يوم 2024/12/18 الساعة الثانية عشر ظهرا

من المعلوم والمتفق عليه صراحة :

إن التأمين بموجب هذه الوثيقة يغطى عواقب المسؤولية المدنية القانونية التي قد يتعرض لها المؤمن له طبقا للتشريع الحالي من المواد 163 إلى 178 من القانون المدني المصري والتي تثبت في حقه بموجب حكم قضائي نهائي وذلك عن أي أضرار جسمانية قد تلحق بالغير أثناء قيام المؤمن له بمزاولة عمله تنفيذ عملية (تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطر الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A902-A) العقد رقم 2024 / 2023 / 525 تاريخ استلام الموقع 2023 / 10 / 17

الحدود الجغرافية / داخل جمهورية مصر العربية

الحد الأقصى لمسئولية الشركة

100000 جم (مائة ألف جنيه مصرى لا غير) الحد الأقصى لالتزام الشركة للشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية .
100000 جم (مائة ألف جنيه مصرى) الحد الأقصى لالتزام الشركة للحادث الواحد عن الأضرار الجسمانية
100000 جم (مائة ألف جنيه مصرى) الحد الأقصى لالتزام الشركة خلال مدة التأمين مهما بلغ عدد الحوادث عن الأضرار الجسمانية
** لا يجوز إلغاء أو إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى
وتشمل حدود المسئولية المبينة عليه كافة الأتعاب والمصروفات القضائية وجميع مصروفات الدفاع أيما كان نوعها المترتبة عن الحادث والتي توافق عليها الشركة.

حساب القسط و الدفقات

القسط المصافي	435.00	نصف مئة الاتساع	3.00
نصف المئة النسبية	4.35	مصاريف الإصدار	53.65
رسم الأثراف والرقية	2.65	رسوم خدمات مراجعة و اعتماد	0.45
القسط الاجملى	500.00	فقط خمسة مئة جنيه مصرى لا غير	0.90

ومن المعلوم والمتفق عليه صراحة أن المؤمن له تسلم الشروط العامة للوثيقة وعدد صفحاتها (4).

إنتاج / ايمن عبد الحميد عبد المجيد مرسل

2023/12/19 تاريخ الطباعة
MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة 1/18



للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq, Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ / ٣٣٣٦٨١٠٧
بريد : ٦٢ النورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٦١٣٦٥ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

هذه الوثيقة مؤهلة ومحفوظة .


تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدخل النسبية والنوعية .



EnTrans
CONSULTING

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
(القطار السريع - الخط الجديد - مطروح) - (قطاع غرب النيل)

استكمال أعمال الجسر الثنائي بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الخط - العاصمة الإدارية - العنبرين الجديد - مطروح) - (قطاع غرب النيل)



عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

شركة : أبناء سامي ياسين للمقاولات											
منطقة A902 و منطقة E01											
الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 11 / 27											
إجمالي كميات القطعتين			Zone E01			Zone A902					
ملاحظات	إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 2023 / 5 / 4	الكمية الكلية م3	إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 2023 / 5 / 4	الكمية الكلية م3	إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 2023 / 5 / 4	الكمية الكلية م3	الوحدة	البند
تمت الموافقة على صرف كميات ردم القطعة E01 ضمن عقد 525/2023/2024 لنفس المقاول ضمن أعمال الورش حسب مذكرة السيد رئيس الهيئة	11,493	101,190	112,683	11,493	4,565	16,058	0	96,625	96,625	3م	1 حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية
	19,015	389,282	408,297	0	0	0	19,015	389,282	408,297	3م	2 حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة باستخدام البلدوز
	0	0	520,980			16,058			504,922	3م	إجمالي كميات الحفر
	0	0	43,124			0			43,124	3م	كمية علاوة عمق من 8 متر إلى 30 متر أسفل متوسط الأرض الطبيعية لبند الحفر
إجمالي كميات القطعتين											
إجمالي كميات القطعتين			Zone E01			Zone A902					
ملاحظات	إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 2023 / 5 / 4	الكمية الكلية م3	إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 2023 / 5 / 4	الكمية الكلية م3	إجمالي الكميات بعد 2023 / 5 / 4	إجمالي الكميات قبل 2023 / 5 / 4	الكمية الكلية م3	الوحدة	البند - أعمال الردم
	0	0	17,519	0	0	17,519	0	0	0	2م	1 أعمال إستبدال و تسوية و تشغيل الأرض الطبيعية
	97,227	79,484	176,711	97,227	79,484	176,711	0	0	0	3م	2 تحميل و توريد و نقل أتربة - أعمال الردم

الهيئة العامة للطرق و الكباري

الاستشاري العام

مستشار للاستشارات الهندسية

الاستشاري المباشر



مكتب القرائن كونسولت

الاستشاري المصنعة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة أبناء سامي ياسين للمقاولات



عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

شركة / أبناء سامي ياسين للمقاولات			منطقة A902 و منطقة E01			توزيع الكميات المنصرفة على العقود حتى تاريخ 2023/ 11 / 27		
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية الاجمالية المنصرفة - عقد (2024 / 2023 / 40) ختماسي رقم (2) A902 B	الكمية الاجمالية المنصرفة - عقد (2024 / 2023 / 525) جاري رقم (1) A902 A	الكمية الاجمالية المنصرفة - عقد (--- / --- / ---) جاري رقم (1) القطاع ---	الكمية الاجمالية المنصرفة على العقود	الكمية الاجمالية المعتمدة في الحصر	
1	حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	3م	96,625.61	15,058		111,683.61	112,683.00	
	علاوة السولار	3م	0	11,493		11,493	11,493	
2	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة باستخدام البلدوز	3م	244,909	163,388		408,297	408,297	
	علاوة السولار	3م	0	19,015		19,015	19,015	
	كمية علاوة عمق من 8 متر إلى 30 متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية لبند الحفر	3م	39,202.64	3,921		43,123.64	43,124.00	
1	أعمال إستبدال و تسوية و تشغيل الأرض الطبيعية	2م	0	17,519		17,519.00	17,519.00	
2	تحميل و توريد و نقل أتربة - أعمال الردم	3م	0	173,711		173,711.00	176,711.00	
	علاوة السولار	3م	0	97,227.00		97,227.00	97,227.00	

تمت الموافقة على صرف كميات ردم القطعة E01 ضمن عقد
525/2023/2024 لتفصيل المقاول ضمن أعمال الورش حسب مذكرة السيد
رئيس الهيئة

الهيئة العامة للطرق و القاهرة

1/

الاستشاري العام

مستشار الاستشارات الهندسية

1/

الاستشاري

مكتب الترخيص

1/

الاستشاري

مكتب XYZ

1/

شركة تملك

مكة / أبناء سامي ياسين للمقاولات

1/
