

مشروع انشاء كوبري علوي


اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس كم (١٨٠+٤٥٠)

مستخلص رقم (٥) جاري

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



قوائم الكميات



قوائم الكميات مستخلص (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الاجمالي
أولا :- أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٨٠,٠٠
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١,٠٠
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	٢٩٢٢,٠٠
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م٣	٣٩٨٠,٠٠
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م٣	١٤٤,٠٠
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٣١٠٠,٠٠
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم٢ بزيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم/م٣ الي ٤٥٠ كجم/م٣	م٣	٣١٠٠,٠٠
١٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م٣	٨٥٠,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	٨٣٢,٠٠
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م٣ الي ٥٠٠ كجم/م٣	م٣	٠,٠٠
١٨-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	م٣	٢٢٢,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	١٢٣,٠٠
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١٦٩٧,٠٠
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م٢	١٤٢٦,٠٠
التشوينات			
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١٠٠,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	عدد	٦,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	عدد	١٢,٠٠
٣٢-أ	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم	م٣	٣٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

كاسر الجور






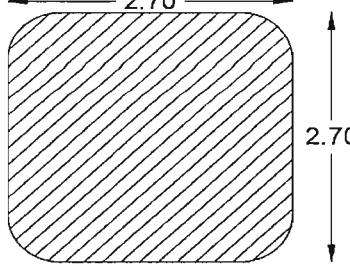
١٣

١١٣

دَفْطَرُ الْحَصْرِ

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

بند رقم (١٧) بالمر المكدب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات

م	رقم المحور	عدد	الأبعاد		المقادير	الاجمالي	قطاعات الأعمدة
			مساحة	ارتفاع	جزئي		
١	A01 RIGHT	٤	٠,٧٥	٩,٢٥٨	٢٧,٧٧	٢٧,٧٧٤	 
٢	A01 LEFT	٤	٠,٧٥	٨,٩٢١	٢٦,٧٦	٢٦,٧٦٣	 
٣	A02 LEFT(1) (الجزء العدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٩٤٠	٢٦,٤٢	٢٦,٤٢	 مساحة قطاع العمود الجزء العدل AREA = 2.955 m2
	A02 LEFT(1) (التاج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٤	A02 LEFT(2) (الجزء العدل)	١	٢,٩٥٥	٩,٢٠	٢٧,١٩	٢٧,١٩	
	A02 LEFT(2) (التاج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٥	A02 RIGHT(1) (الجزء العدل)	١	٢,٩٥٥	٩,١٥	٢٧,٠٤	٢٧,٠٤	
	A02 RIGHT(1) (التاج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٦	A02 RIGHT(2) (الجزء العدل)	١	٢,٩٥٥	٩,٢٨٦	٢٧,٤٤	٢٧,٤٤	
	A02 RIGHT(2) (التاج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٧	A03 LEFT(1) (الجزء العدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٧١٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	
	A03 LEFT(1) (التاج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٨	A03 LEFT(2) (الجزء العدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٩٥٥	٢٦,٤٦	٢٦,٤٦	 مساحة قطاع العمود نهاية التاج AREA = 7.0754 m2
	A03 LEFT(2) (التاج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٩	A03 RIGHT(1) (الجزء العدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٨٢٥	٢٦,٠٨	٢٦,٠٨	
	A03 RIGHT(1) (التاج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
١٠	A03 RIGHT(2) (الجزء العدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٩٩٥	٢٦,٥٨	٢٦,٥٨	
	A03 RIGHT(2) (التاج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
١١	A04 RIGHT (الجزء العدل)	٢	٢,٩٥٥	٦,٦٥٥	٣٩,٢٣	٣٩,٢٣	
	A04 RIGHT (التاج)	٢	٥,٠٢	٣,٦٠	٣٦,١١	٣٦,١١	

استشاري الهيئة


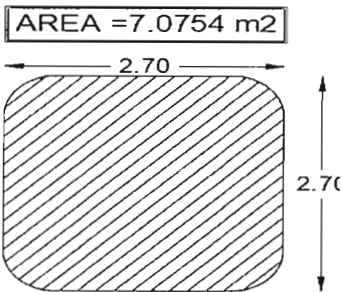


مهندس الشركة

١٣

١٣

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

بند رقم (١٧) بالتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات

م	رقم المحور	عدد	الابعاد		الاجمالي	المقادير		قطاعات الأعمدة
			ارتفاع	مساحة		جزئي	خصم	
١٢	A04 LEFT (الجزء العدل)	٢	٦,٦٣٥	٢,٩٥٥	٣٩,٢١	٣٩,٢١		
	A04 LEFT (التاج)	٢	٣,٦٠	٥,٠٢	٣٦,١١	٣٦,١١		
١٣	A05 RIGHT(1) (الجزء العدل)	١	٦,٥٠٥	٢,٩٥٥	١٩,٢٢	١٩,٢٢		
	A05 RIGHT(1) (التاج)	١	٣,٦٠	٥,٠٢	١٨,٠٥	١٨,٠٥		
١٤	A05 RIGHT(2) (الجزء العدل)	١	٦,٧٤٥	٢,٩٥٥	١٩,٩٣	١٩,٩٣		
	A05 RIGHT(2) (التاج)	١	٣,٦٠	٥,٠٢	١٨,٠٥	١٨,٠٥		
١٥	A06 RIGHT(1) (الجزء العدل)	١	٤,٨٠٠	٢,٩٥٥	١٤,١٨	١٤,١٨		
	A06 RIGHT(1) (التاج)	١	٣,٦٠	٥,٠٢	١٨,٠٥	١٨,٠٥		
١٦	A06 RIGHT(2) (الجزء العدل)	١	٥,٠٩٤	٢,٩٥٥	١٥,٠٥	١٥,٠٥		
	A06 RIGHT(2) (التاج)	١	٣,٦٠	٥,٠٢	١٨,٠٥	١٨,٠٥		
١٧	A05 LEFT(1) (الجزء العدل)	١	٦,٦١٥	٢,٩٥٥	١٩,٥٥	١٩,٥٥		
	A05 LEFT(1) (التاج)	١	٣,٦٠	٥,٠٢	١٨,٠٥	١٨,٠٥		
١٨	A05 LEFT(2) (الجزء العدل)	١	٦,٧٨٥	٢,٩٥٥	٢٠,٠٥	٢٠,٠٥		
	A05 LEFT(2) (التاج)	١	٣,٦٠	٥,٠٢	١٨,٠٥	١٨,٠٥		
١٩	A06 LEFT(1) (الجزء العدل)	١	٥,٠٨٠	٢,٩٥٥	١٥,٠١	١٥,٠١		
	A06 LEFT(1) (التاج)	١	٣,٦٠	٥,٠٢	١٨,٠٥	١٨,٠٥		
٢٠	A06 LEFT(2) (الجزء العدل)	١	٥,١٩٠	٢,٩٥٥	١٥,٣٤	١٥,٣٤		
	A06 LEFT(2) (التاج)	١	٣,٦٠	٥,٠٢	١٨,٠٥	١٨,٠٥		
٢١	A07 RIGHT	٤	٦,٠٩٠	٠,٧٥	١٨,٢٧٠	١٨,٢٧		
الاجمالي الأعمدة حتي ٦ متر					١٨,٢٧٠			
الاجمالي الأعمدة أعلى ٦ متر					٨٤٥,٤٦٦			
الاجمالي					٨٦٣,٧٣٦			

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

١٣

١٣

تفريد حديد العمود على محور (A05R1) كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الأسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١	شابر العمود الرئيسية	١٠,٤٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٥,٢٥٠		٥,٢٥٠
٢	شابر العمود الرئيسية	٥,٨٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٢,٩٢٨		٢,٩٢٨
٣	شابر العمود الرئيسية	٨,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٤,٠٣٨		٤,٠٣٨
٤	شابر داخل العمود	٩,٧٠	١٦	١,٥٨٠	٢	٠,٠٣١		٠,٠٣١
٥	شابر داخل العمود	١١,٧٠	١٦	١,٥٨٠	٢	٠,٠٣٧		٠,٠٣٧
٦	كانات العمود الرئيسية يكمل الارتفاع	٦,٥٠	١٢	٠,٨٨٨	١٠٣	٠,٥٩٥		٠,٥٩٥
٧	كانات العمود الرئيسية	٤	١٢	٠,٨٨٨	٦١٨	٢,١٩٥		٢,١٩٥
٨	كانات العمود الرئيسية	٢,٠٠	١٢	٠,٨٨٨	١٥٢	٠,٢٧٠		٠,٢٧٠
٩	كورنر العمود	١٠,١٣	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٩٢		٠,١٩٢

١٥

١٣

تقرير حديد العمود على محور (A05R1) كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١٢	كورنر العمود	٨,١٣	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٥٤		٠,١٥٤
١٣	تاج العمود	٦,٥٠	١٦	١,٥٨٠	٤٨	٠,٤٩٣		٠,٤٩٣
الاجمالي								
								١٦,١٨٣

استشاري الهيئة

١٢

مهندس الشركة

١٢

تقرير حديد العمود على محور (A05R2) كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاستياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١	اشبار العمود الرئيسية	١٠,٧٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٥,٤٠١		٥,٤٠١
٢	اشبار العمود الرئيسية	٦,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٣,٠٢٩		٣,٠٢٩
٣	اشبار العمود الرئيسية	٨,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٤,٠٣٨		٤,٠٣٨
٤	اشبار داخل العمود	٩,٩٠	١٦	١,٥٨٠	٢	٠,٠٣١		٠,٠٣١
٦	اشبار داخل العمود	١١,٩٠	١٦	١,٥٨٠	٢	٠,٠٣٨		٠,٠٣٨
٧	كانات العمود الرئيسية بكامل الارتفاع	٦,٥٠	١٢	٠,٨٨٨	١٠٤	٠,٦٠٠		٠,٦٠٠
٨	كانات العمود الرئيسية	٤	١٢	٠,٨٨٨	٦٢٤	٢,٢١٦		٢,٢١٦
٩	كانات العمود الرئيسية	٢,٠٠	١٢	٠,٨٨٨	١٥٢	٠,٢٧٠		٠,٢٧٠
١٢	كوتر العمود	١٠,٢٣	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٩٤		٠,١٩٤

١٢

١٢

تفريد حديد العمود علي محور (A05R2) كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

[illegible]

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

4/12/20

تفريد حديد العمود على محور (A06L1) كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الإجمالي (طن)
١	شابر العمود الرئيسية	١٠,٧٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٥,٤٠١		٥,٤٠١
٢	شابر العمود الرئيسية	٨,٧٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٤,٣٩٢		٤,٣٩٢
٤	شابر داخل العمود	١٠,١٠	١٦	١,٥٨٠	٢	٠,٠٣٢		٠,٠٣٢
٦	شابر داخل العمود	٨,١٠	١٦	١,٥٨٠	٢	٠,٠٢٦		٠,٠٢٦
٧	كانات العمود الرئيسية يكمل الارتفاع	٦,٥٠	١٢	٠,٨٨٨	٩١	٠,٥٢٥		٠,٥٢٥
٨	كانات العمود الرئيسية	٤	١٢	٠,٨٨٨	٥٤٦	١,٩٣٩		١,٩٣٩
٩	كانات العمود الرئيسية	٢,٠٠	١٢	٠,٨٨٨	١٥٢	٠,٢٧٠		٠,٢٧٠
١٢	كورنر العمود	٨,٥٣	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٦٢		٠,١٦٢

استشهاد
١٣

تفريد حديد

تقرير حديد العمود علي محور (A06L1) كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاستساخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١٢	كورنر العمود	٦,٥٠	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٢٣		٠,١٢٣
١٣	قوس لاج العمود	٦,٥٠	١٦	١,٥٨٠	٤٨	٠,٤٩٣		٠,٤٩٣
الاجمالي								
								١٢,٣٦٣




استشاري الهيئة

مهندس الشركة

استشاري الهيئة
١٣

١٣

تقرير حديد العمود على محور (A06L2) كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تقرير الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الإجمالي (طن)
١	شابر العمود الرئيسية 	١٠,٨٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٥,٤٥٢		٥,٤٥٢
٢	شابر العمود الرئيسية 	٩,٣٠ ٨,٨٠	٣٢	٦,٣١٠	٨٠	٤,٦٩٥		٤,٦٩٥ ٤٤٤٩,٤٠
٣	شابر داخل العمود 	٨,٢٠	١٦	١,٥٨٠	٢	٠,٠٢٦		٠,٠٢٦
٤	شابر داخل العمود 	١٠,٢٠	١٦	١,٥٨٠	٢	٠,٠٣٢		٠,٠٣٢
٥	كانات العمود الرئيسية بكامل الارتفاع 	٦,٥٠	١٢	٠,٨٨٨	٩٢	٠,٥٣١		٠,٥٣١
٦	كانات العمود الرئيسية 	٤	١٢	٠,٨٨٨	٥٥٢	١,٩٦١		١,٩٦١
٧	كانات العمود الرئيسية 	٢,٠٠	١٢	٠,٨٨٨	١٦٠	٠,٢٨٤		٠,٢٨٤
٨	كورنر العمود 	٨,٦٣٥	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٦٤		٠,١٦٤

محمد البقرة
المهندس

تفريد حديد العمود على محور (A06L2) كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١٢	لوزن العمود	٧,٧٦٥	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٤٧		٠,١٤٧
١٣	ممر تاج العمود	٦,٥٠	١٦	١,٥٨٠	٤٨	٠,٤٩٣		٠,٤٩٣
١٣,٨٨٤ الاجمالي								

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

١٨٥٢١/٤٥

١٨٥٢١/٤٥

١٨٥٢١/٤٥

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد العمود علي محور (A07 LEFT)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاستساخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١	شابر العمود الرئيسية ٧,٥٠	٧,٥٠	٣٢	٦,٣١٠	٨	٠,٣٧٩		٠,٣٧٩
٢	شابر العمود الرئيسية ٧,٥٠	٨,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٨	٠,٤٠٤		٠,٤٠٤
٣	شابر العمود الرئيسية ٤,٠٠	٤,٠٠	٢٥	٣,٨٥٠	٧	٠,١٠٨		٠,١٠٨
٤	شابر العمود الرئيسية ٧,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٣,٨٥٠	٧	٠,١٨٩		٠,١٨٩
٥	شابر العمود الرئيسية ٥,٠٠	٥,٠٠	٢٥	٣,٨٥٠	٧	٠,١٣٥		٠,١٣٥

استشاري الهيئة










مهندس الشركة

١٣

١٣

مشروع إنشاء كوبري علوي علي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد العمود علي محور (A07 LEFT)

م	تفريد الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر (الطول/كم)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
٦	ZONE (1) 	٤,٣٤	١٢	٠,٨٨٨	٢٧	٠,١٠٤		٠,١٠٤
٧	ZONE (1) 	٣,٩	١٢	٠,٨٨٨	٢٧	٠,٠٩٤		٠,٠٩٤
٨	ZONE (1) 	١,٥٨	١٢	٠,٨٨٨	٨١	٠,١١٤		٠,١١٤
٩	ZONE (2) 	٣,٣٤	١٢	٠,٨٨٨	٢٥	٠,٠٧٤		٠,٠٧٤
١٠	ZONE (2) 	٢,٩٠	١٢	٠,٨٨٨	٢٧	٠,٠٧٠		٠,٠٧٠
١١	ZONE (2) 	١,٤٦	١٢	٠,٨٨٨	٥٤	٠,٠٧٠		٠,٠٧٠
١٥	ZONE (3) 	٢,٦٦	١٢	٠,٨٨٨	١١	٠,٠٢٦		٠,٠٢٦
١٦	ZONE (3) 	٢,٢٢	١٢	٠,٨٨٨	١١	٠,٠٢٢		٠,٠٢٢
١٧	ZONE (3) 	١,٣٤	١٢	٠,٨٨٨	٢٢	٠,٠٢٦		٠,٠٢٦
الاجمالي لعدد (١) عمود								
١,٨١٢								
الاجمالي لعدد (٤) أعمدة								
٧,٢٥٠								

محضر التّشويّقات

محضر تشوينات

مشروع / انشاء كوبرى علوى اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس

الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ وبحضور كل من :-

استشاري الهيئة (مكتب بنتا للاستشارات الهندسية)

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

انه في يوم الاربعاء

١- السيد المهندس / 

٢- السيد المهندس / 

بالمرور والمعاينة علي الطبيعة :-

٤- تم حصر الحديد الموجود بالموقع تبين وجود كمية (١٠٠) طن تشوينا (مائة طنا) .

وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدني مسؤولية علي الهيئة واستشاريها.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

التوقيع

١- 

٢- 

كشوفات المهندسين
والمعدات والمعمل





التاريخ: ٢٠٢٤/ /

أسماء المهندسين والمراقبين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بمشروع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م/ أحمد فهمي رفعت	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنة مدير مشروع
٢	م/ محمد شاكر خطاب	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنوات كباري
٣	م/ محمد رأفت قناوي	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنوات طرق
٤	م/ ابانوب جمال جرجس	مهندس مساحة
٥	م/ محمد عمر تهامي	مهندس ضبط جودة
٦	أ / انور ابراهيم غنيم	مراقب

يعتمد

مهندس الرئيس
(مكتب نيتالاستشارت)
١٢/١٢/٢٠٢٣

يعتمد

مهندس الشركة
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

١٢/١٢/٢٠٢٣



التاريخ : ٢٠٢٤ / /

بيان بالمعدات العاملة بموقع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	افيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	جريد	١	Komatsu
٦	هراس تربة	١	Danyaback 104
٧	سيارات خلاطة خرسانة	٣	مرسيدس - افيكو - مان
٨	سيارات ملاكي	١	N300 شيفروليه فان
٩	مولد مصانع	١	60 KW
١٠	مولد Danyo	١	100 KW
١١	مولد Perkins	١	80 KW

يعتمد

المهندس الاستشاري
مكتب بنتا للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة المنفذة
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
