

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١/١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثانى } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ مكتب أرم للمقاولات .

يرجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ج

عدد { } حصر الأعمال

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } مقايسة معدلة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



تمتاد الصرف

(ג)

سٺيڪ
۽ ٻڌڻ صرف

رقة المعقود

شاملة المدّة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١

مع مكتب أرم للمقاولات

٢٠٢٣ / ٣ / ٢ بتاريخ

Y-33 /

الصفحة رقم ١٥٧٤ / ٧٠٧٧ / ٧٠٧٣

رقة المعقود

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة به مقبولة وقدرت : ٠٠٠٠
تحريراً في
سنة
مهندس الإخفاف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
أقر بصحة ذلك
سنة
رودج فوجد على صحة
تحريراً في



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الكمية	الإجمالي
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية، وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لاسيما في أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	1500	30000	
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهالكة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	1500	121500	
3	بالمتر المكعب أعمال إزالة ونقل مخلفات والمواد غير مناسبة وكل ما لا تحتاج إليه ونقله للمقال، العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومسافة نقل لا تقل عن 30 متر.	م ³	3800	163400	
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مساحية أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقال العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والتمتددة مما جميعه بالمتر المكعب ومسافة نقل لا تقل عن 30 كم	م ³	5	400	
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي تشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات الموزونة العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ³			
	السعر يشمل المادة المحسنة مع قيام الشركة المانحة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر.				
	مسافة النقل لا تقل عن (154) كم		2:4.8	800	187840
6	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة رتبة 12 بالأقطار الداخلية المبينة بنسخة 350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات 3م0.08 + زلط 3م0.4 رمل (باستخدام شبكة من حديد التسليح المشري عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 50/10) للتمر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بفصوص من الحديد مع عزل الوصلة بالخيش المنة غرن والتمتددة مما جميعه بالمتر المكعب ومسافة نقل لا تقل عن 30 كم	م ط	900	3	2700
	مواسير خرسانية قطر 50 سم	م ط	1020	3	3060
	مواسير خرسانية قطر 70 سم	م ط	1:40	30	34200
	مواسير خرسانية قطر 80 سم	م ط	1:60	30	37800
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الانكماش عن 10 % مع الفرض والدمك على طبقات باستخدام آلات التسوية اليدوية علي أن لا يزيد سماك الطبقة الواحدة عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى(98%) ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ³			
	السعر يشمل المادة المحسنة مع قيام الشركة المانحة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر.				
	مسافة النقل لا تقل عن (262) كم		4.58	5000	229000
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقاً لرسومات التنفيذ ذات محدد اسمنت 250 كجم/م ³ اسمنت بورتلاند مع الدمك الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم / سم ³ مع إجراء اختبارات الازمة ويتم تنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات المعتمدة والبنود للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ³	1:50	45	65250
9	أعمال توريد وتوضيب وربط صلب التسليح (52/36) لزوم جميع العناصر الإضافية للكوبري والمشمول بالنقل طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الخطة السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل وربط الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل ونحوه كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمشمول بالتمتددة مما جميعه بالمتر المكعب ومسافة نقل لا تقل عن 30 كم	م ³	3000	0.25	7500

✓ (15)



مَنْ كَفَرَ بآيَاتِهِ لَذِقْ أَلَامَ الْعَذَابِ

مقاييسه معدله رقم (1) بعد المفاوضاته طريق شرين - راس الخليج القطاع الثاني مقاوله شركة ارم للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفترة	الكمية	الاجمالي
10	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل 1.2 كجم / م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م ²	27.5	14500	398750
11	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000) بمعدل 0.4 كجم / م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م ²	5.2	50	460
12	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطته من الخرسانة الاسفلتية تدرج (3 د) بسبك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردر شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفلتة لعمل اجراء التجارب المعملة والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م ²	146	14500	2117000
13	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70 / 60 واردر شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفلتة لعمل اجراء التجارب المعملة والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م ²	140	50	7000
14	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برديوزة اسمنتية (عجالي) بأبعاد 30x30x25 سم مصنوعة تتكون من 3 سم + 0.4 م ² رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البرديوزة على فريقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم ويمرش 35 سم طبقة للمخلوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن 2 سم والى تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 البرديوزة والسمر يعمل النسوية اسفل البرديوزات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م/ط	134	25	3350
15	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية أسفل التبليطات والارضيات الخرسانية وتشكيل الدكة أسفل وحدات الانترلوك وخلافه بسبك 10 سم من 0.8 م ² سن دلويميت متدرج 3م0.4 رمل حرش 300+ كجم اسمنت ولا يقل جهد الخرسانة 250 كجم/سم ² على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والإملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م ²	142	25	3550
16	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برديوزة اسمنتية (وسط) بأبعاد 30x30x11.5/15 سم مصنوعة بطريقة الإحتزاز الميكانيكي تتكون من 0.8 م ² 3م سن دلويميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن 1.5 سم + 0.4 م ² رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البرديوزة على فريقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم ويمرش 20 سم طبقة للمخلوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن 2 سم والى تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 البرديوزة والسمر يعمل النسوية اسفل البرديوزات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م/ط	128	25	3200
17	بالمعدن اعمال رفع او خفض منسوب المطابق اوغرف التفتيش الخاصة بالمراقب (مياه او صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	عدد	475	18	8550
18	بالمعدن توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بغطاء GRB ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	عدد	4500	5	22500
19	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برديوزة من الخرسانة العادية بأبعاد 30x25/20 سم مصنوعة بطريقة الإحتزاز الميكانيكي تتكون من 0.8 م ² 3م سن دلويميت + 250 كجم اسمنت ويتم صب البرديوزة على فريقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم ويمرش 20 سم طبقة للمخلوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن 1 سم والى تملأ بالهجوم المضغوط سمك 1 سم والسمر يعمل النسوية اسفل البرديوزات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م/ط	120	10	1200
20	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحملت من الانترلوك الخرساني طبقاً للنمينة المعتمدة واجهاذ 250 كجم/سم ² و 2 لون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسبك 40 مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية والفلتة شاملة كل ما يلزم لنهوا عمل بالمتر المسطح مفاس 100*200*60م	م ²	170	10	1700
21	بالمتر الطولي دهان برديوزة بحد 10x30 سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م/ط	17.25	20	345
22	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمن بورتلاندي نادي ومحتوي اسمني لايفل عن 350 كجم / م ³ واجهاذ لايفل عن 300 كجم / سم ³ والسمر لايفل حديد التسليح	م ³	2420	1	2420

محکمات ۷۷
۱۶

محمد علی





مقاييسه معدله رقم (1) بعد المفاوضات طريق شربين - راس الخليج القطاع الثاني مقاوله شركة ارم للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الاجمالي
23-أ	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط المساعدة للطريق في البر لزوم أعمال التوسعة او معالجة أماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط الدمك ميكانيكيا وعلى الا تقل المقاومة للخرسانة بعد 28 يوم من الصب عن 250 كجم / سم ³ بمحتوي اسمنتية 300 كجم / سم ³ اسمنت بورتلاندي عادي و السعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول على سطح (fair face) للأسطح الظاهرة وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر وإزالة نواتج الحفر حتى المنسوب التصميمي ل او حسب طبيعة العمل وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح و يشمل سعر التطهير والحفر حتى منسوب التأسيس و ارتفاع الحائط حتى 6 م	م ³	2150	2150
23-ب	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط المساعدة للطريق لزوم أعمال التوسعة او معالجة أماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط الدمك ميكانيكيا وعلى الا تقل المقاومة للخرسانة بعد 28 يوم من الصب عن 250 كجم / سم ³ بمحتوي اسمنتية 300 كجم / سم ³ اسمنت بورتلاندي عادي و السعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول على سطح (fair face) للأسطح الظاهرة و عمل المنود اللازمة (القمصه) ونزع المياه وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر وإزالة نواتج الحفر والردم من المجري المائي (إزالة القمصه) حتى المنسوب التصميمي او حسب طبيعة العمل وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح و يشمل سعر التطهير والحفر حتى منسوب التأسيس و ارتفاع الحائط حتى 6 م	م ³	2500	2500
24	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأرصفة والميول الجانبية تتكون من 3م ² 0.8 سم دولوميت متدرج 3م ² 0.4 سم رمل حرس 250 كجم / سم ³ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومفصول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والإملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الغرساته إجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعات والرسومات الخاصة بصليبه المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	228	228
25	بالمتر المكعب أعمال غرساته عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم / سم ³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ³	1750	1750
5520303		الاجمالي بالجنيه		
كارتات	كارتات طبقه اساس (سن 6)	م ³	25	125000
	كارتات اتربه	م ³	13	10400
	كارتات اسفلت	م ²	3	43650
179050		اجمالي الكارتات		

EGP 5,699,353

اجمالي المقاييسه + اجمالي الكارتات

م الهيئة

م الاستشاري

م الشركة



Handwritten signature of the consultant.



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج (القطاع الثاني)

تنفيذ شركه : ارم للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٥٤) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٣/٩/٥

قام باحضار العينات : / سعيد طه

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٦) عينات دمك طبقة نهائي واولي اساس من مواقع مختلفة .

عدد (٢) عينه اساس سن ٦ ك ١,٣٠٠ اساس نهائي & ك ٠,٦٠٠ اولى اساس لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج و الصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحلل والسن الطبيعي

الكشف عن الكثافه الجافه طن / ٣م ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

اولا : الدمك

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اساس نهائي				
ك ٠,١٥٠	٢,٢٠	٤,٦	٩٨	
ك ٠,٦٠٠	٢,٢٢	٤,٥	٩٩	
ك ١,٣٠٠	٢,٢٢	٤,٧	٩٩	
طبقة اساس اولى				
ك ٠,١٥٠	٢,٢١	٤,٦	٩٩	
ك ٠,٦٠٠	٢,٢٠	٤,٦	٩٨	
ك ١,٣٠٠	٢,٢٣	٤,٧	٩٩	

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم لاساس ٢,٢٤ طن / ٣م ونسبة المياه الملائمة ٦,٩ %

دعاه كوكرك

م

من ٢/١

ثانياً :- صلاحية سن ٦

المواصفات	ك ١,٣٠٠ أساس نهائي	ك ٠,٦٠٠ طبقة أولى	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهزه سعة ٢"
١٠٠-٧٠	٩١	٩١	مهزه سعة ١,٥"
٨٥-٥٥	٧٢	٦٧	مهزه سعة ١"
٨٠-٥٠	٥٨	٥٥	مهزه سعة ٤/٣"
٧٠-٤٠	٤٩	٤٧	مهزه سعة ٨/٣"
٦٠-٣٠	٣٩	٣٨	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٠	٢٩	مهزه رقم ١٠
٣٠-١٠	١٨	١٧	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	١١	١١	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	مجال اللدونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٣٠	٣٠	الصلابه %
—	٢,٢٣	٢,٢٤	أقصى كثافه جافه طن/م³
—	٧,٠	٦,٩	نسبة المياه الملائمه %
لا يقل عن ٨٠%	٨٣	٨٥	نسبة تحمل كاليفورنيا %
—	—	—	الانتفاخ %
—	٢,٤٠٢	٢,٤٠٨	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤٦٧	٢,٤٧٢	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٥٦٨	٢,٥٥٨	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٧	٢,٤	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٥	٠,٣	التحلل %
—	٧	٦	نسبه السن الطبيعي %

العينات تتفق مع حدود المواصفات العامه من حيث التدرج والنوعيه.

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية اساس	٢	٢٠٢٥	٤٠٥٠
عينات دمك	٦	٥٠٥	٣٠٣٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٧٢٣٠
م ١٥ ١ %			١٠٨٤,٥
ض.ق.م ١٤ %			١١٦٤,٠٥
الاجمالي			٩٤٧٨,٥٥

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٩/١٠

مهندس المعمل / *محمد كرد*

رئيس الاداره المركزيه

مدير المعمل

مهندس /

مهندس /

سلوي سامي صالح

حازم عبد المنعم

٩٢٣٥
٢٠٢٣/٩/١١

العقود

من ٢/٢



شخص إلى الحسابات العامة



المملكة العربية السعودية
الطاقة والكهرباء والمياه
الطاقة والكهرباء والمياه
الطاقة والكهرباء والمياه

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج (القطاع الثاني) بطول 2 كم مركز شربين - محافظة الدقهلية - ضمن مبادرة حياة كريمة (شركة ارم)					
حصر مستخلص رقم (ج)					
رقم البند	البند	الوحدة	السابق	خلال العدة	التكمية
3	بالمتر المكعب أعمال إزالة ونقل مخلفات والمواد غير مناسبة وكل ما لا تحتاج إليه ونقله للمقلب العمومي	3م	0.00	3574.60	
الإجمالي					3574.60

مهندس الاستشاري

مهندس الشريعة

تطهير الطبان جانب التربة

ن.ت	عرض	قبل التطهير		بعد التطهير		السمك	الكمية	اجمالي الكمية
08+820	0	18.25	18.65	17.94	17.94	0.5	0	0
08+800	4	18.45	18.55	17.99	17.99	0.5	40.8	40.8
08+780	2.5	19.75	19.75	18.06	18.06	1.7	84.5	125.3
08+760	2	18.9	19.4	18.12	18.12	1.0	41.2	166.5
08+740	4	18.65	19.05	17.86	17.86	1.0	79.2	245.7
08+720	4	17.99	18.19	17.83	17.83	0.3	20.8	266.5
08+700	2.4	18.19	18.39	17.91	17.91	0.4	18.24	284.74
08+680	2.5	18.19	18.56	17.82	17.82	0.6	27.75	312.49
08+660	3	18.09	18.01	17.8	17.8	0.3	15	327.49
08+640	2	18.44	18.69	17.79	17.79	0.8	31	358.49
08+620	2.3	18.39	18.65	17.82	17.82	0.7	32.2	390.69
08+600	3	18.33	18.36	17.88	17.88	0.5	27.9	418.59
08+580	3.6	19.69	19.69	17.86	17.86	1.8	131.76	550.35
08+560	3.2	19.69	19.69	17.89	17.89	1.8	115.2	665.55
08+540	3	18.44	18.57	17.89	17.89	0.6	36.9	702.45
08+520	2.8	19.79	19.79	17.85	17.85	1.9	108.64	811.09
08+500	2.6	18.39	18.79	17.84	17.84	0.8	39	850.09
08+480	2.7	18.44	18.77	17.8	17.8	0.8	43.47	893.56
08+460	2	18.64	19.04	17.88	17.88	1.0	38.4	931.96
08+440	2.5	18.61	18.91	17.97	17.97	0.8	39.5	971.46
08+420	2.4	18.61	19.11	17.9	17.9	1.0	46.08	1017.54
08+400	3	18.16	17.98	17.69	17.69	0.4	22.8	1040.34
08+380	3.6	18.12	18.42	17.7	17.7	0.6	41.04	1081.38
08+360	4.3	18.17	18.75	17.75	17.75	0.7	61.06	1142.44
08+340	2.5	18.09	18.35	17.71	17.71	0.5	25.5	1167.94
08+320	4	18.6	18.09	17.77	17.77	0.6	46	1213.94
08+300	2.5	17.93	18.13	17.71	17.71	0.3	16	1229.94
08+280	2.5	19.73	19.73	17.73	17.73	2.0	100	1329.94
08+260	2.7	19.73	19.73	17.99	17.99	1.7	93.96	1423.9
08+240	3	18.93	18.93	18.04	18.04	0.9	53.4	1477.3
08+220	3	19.33	19.38	17.94	17.94	1.4	84.9	1562.2
08+200	3.3	19.52	19.52	17.84	17.84	1.7	110.88	1673.08
08+180	4	18.26	18.77	17.83	17.83	0.7	54.8	1727.88
08+160	3	18.08	18.61	17.92	17.92	0.4	25.5	1753.38
08+140	3	19.52	19.52	17.87	17.87	1.7	99	1852.38
08+120	3.3	19.52	19.52	17.89	17.89	1.6	107.58	1959.96
08+100	3	18.12	18.19	17.89	17.89	0.3	15.9	1975.86
08+080	2	18.17	18.42	17.91	17.91	0.4	15.4	1991.26
08+060	2.5	18.07	18.1	17.87	17.87	0.2	10.75	2002.01
08+040	2.5	18.38	18.62	17.96	17.96	0.5	27	2029.01
08+020	2	18.25	18.37	18.07	18.07	0.2	9.6	2038.61
08+000	4	18.34	18.56	17.98	17.98	0.5	37.6	2076.21
07+980	3	18.22	18.45	17.89	17.89	0.4	26.7	2102.91
07+960	2	18.51	18.93	18.04	18.04	0.7	27.2	2130.11
07+940	2	18.37	18.31	17.97	17.97	0.4	14.8	2144.91
07+920	3	18.19	18.39	17.99	17.99	0.3	18	2162.91
07+900	3	18.44	18.79	18.06	18.06	0.6	33.3	2196.21
07+880	4	18.37	18.75	17.92	17.92	0.6	51.2	2247.41
07+860	2	18.37	18.7	17.85	17.85	0.7	27.4	2274.81
07+840	2	18.27	18.79	17.93	17.93	0.6	24	2298.81
07+820	2	18.2	18.6	17.92	17.92	0.5	19.2	2318.01
07+800	2	18.33	18.67	17.94	17.94	0.6	22.4	2340.41
07+780	2.5	18.47	19.02	18.06	18.06	0.7	34.25	2374.66
07+760	2	18.47	18.97	18.03	18.03	0.7	27.6	2402.26
07+740	2.5	18.4	18.8	17.93	17.93	0.7	33.5	2435.76
07+720	2	18.21	18.43	17.99	17.99	0.4	15.2	2450.96
07+700	2	18.26	18.87	17.89	17.88	0.7	27.2	2478.16
07+680	3	18.31	18.6	17.86	17.86	0.6	35.7	2513.86
07+660	2	18.18	18.38	17.89	17.89	0.4	15.6	2529.46
07+640	2	18.23	18	18.04	18.04	0.1	3	2532.46
07+620	3	18.07	18.57	17.98	17.98	0.3	20.4	2552.86
07+600	3	18.06	18.54	17.99	17.99	0.3	18.6	2571.46
07+580	2.5	18.07	18.22	17.91	17.83	0.3	13.75	2585.21
07+560	2	18.37	18.83	17.89	17.91	0.7	28	2613.21
07+540	4	18.27	18.52	17.95	17.96	0.4	35.2	2648.41
07+520	4	18.09	18.09	17.81	17.8	0.3	22.8	2671.21
07+500	4	17.97	18.12	17.91	17.89	0.1	11.6	2682.81
07+480	3	18.17	18.32	17.89	17.87	0.4	21.9	2704.71
07+460	4	18.17	18.27	17.95	17.96	0.3	21.2	2725.91
07+440	3.5	19.44	19.44	17.79	17.79	1.7	115.5	2841.41
07+420	3	18.52	18.66	17.86	17.86	0.7	43.8	2885.21
07+400	2.5	18.24	18.04	17.88	17.88	0.3	13	2898.21
07+380	2	18.74	19.05	17.95	17.95	0.9	37.8	2936.01
07+360	2	18.14	18.18	17.99	17.99	0.2	6.8	2942.81

الإجمالي

2942.8

محرم شاه

محمد حليم

تطهير الطبيان جانب الأراضي الزراعية

ST	قبل التطهير	طبيان بعد التطهير	عرض الطبيان	السمك	الكمية	اجمالي الكمية
					0	0
07+360	18.61	18.01	0	0.6	12.5	12.5
07+380	18.38	17.88	1.25	0.5	14.4	26.9
07+400	18.45	17.85	1.2	0.6	4.8	31.7
07+420	18.23	17.93	0.8	0.3	7.65	39.35
07+440	18.32	17.87	0.85	0.45	3.84	43.19
07+460	18.04	17.88	1.2	0.16	5.4	48.59
07+480	18.04	17.86	1.5	0.18	6	54.59
07+500	18.07	17.87	1.5	0.2	15.6	70.19
07+520	18.45	17.85	1.3	0.6	21	91.19
07+540	18.61	17.86	1.4	0.75	10.2	101.39
07+560	18.2	17.9	1.7	0.3	3.8	105.19
07+580	18.08	17.89	1	0.19	4	109.19
07+600	18.11	17.91	1	0.2	6.6	115.79
07+620	18.15	17.93	1.5	0.22	4.68	120.47
07+640	18.12	17.94	1.3	0.18	12	132.47
07+660	18.58	17.98	1	0.6	11	143.47
07+680	18.49	17.94	1	0.55	10.6	154.07
07+700	18.44	17.91	1	0.53	15.12	169.19
07+720	18.38	17.84	1.4	0.54	14.4	183.59
07+740	18.62	18.02	1.2	0.6	9.6	193.19
07+760	18.53	17.93	0.8	0.6	5.6	198.79
07+780	18.33	17.98	0.8	0.35	11.2	209.99
07+800	18.25	17.9	1.6	0.35	16.2	226.19
07+820	18.38	17.93	1.8	0.45	10.8	236.99
07+840	18.57	17.97	0.9	0.6	8.8	245.79
07+860	18.35	17.91	1	0.44	6.8	252.59
07+880	18.23	17.89	1	0.34	10.4	262.99
07+900	18.52	18	1	0.52	19.44	282.43
07+920	18.67	18.13	1.8	0.54	24	306.43
07+940	18.7	18.1	2	0.6	11.76	318.19
07+960	18.52	18.03	1.2	0.49	10.08	328.27
07+980	18.54	18.12	1.2	0.42	3.2	331.47
08+000	18.32	18.16	1	0.16	4.4	335.87
08+020	18.38	18.16	1	0.22	4.68	340.55
08+040	18.22	18.09	1.8	0.13	3.6	344.15
08+060	18.14	17.96	1	0.18	13.8	357.95
08+080	18.61	17.92	1	0.69	13.6	371.55
08+100	18.64	17.96	1	0.68	26.6	398.15
08+120	18.66	17.96	1.9	0.7	5.04	403.19
08+140	18.07	17.89	1.4	0.18	5.12	408.31
08+160	18.05	17.89	1.6	0.16	4	412.31
08+180	18.03	17.83	1	0.2	5	417.31
08+200	18.11	17.86	1	0.25	6.6	423.91
08+220	18.15	17.82	1	0.33	10.2	434.11
08+240	18.25	17.91	1.5	0.34	3.2	437.31
08+260	18.08	17.92	1	0.16	18	455.31
08+280	18.34	17.89	2	0.45	10.92	466.23
08+300	18.23	17.81	1.3	0.42	10.64	476.87
08+320	18.14	17.76	1.4	0.38	10.5	487.37
08+340	18.14	17.79	1.5	0.35	22.72	510.09
08+360	18.55	17.84	1.6	0.71	5.04	515.13
08+380	18.09	17.91	1.4	0.18	6.6	521.73
08+400	18.1	17.88	1.5	0.22	7.5	529.23
08+420	18.21	17.96	1.5	0.25	5.04	534.27
08+440	18.2	18.02	1.4	0.18	5.2	539.47
08+460	18.18	17.92	1	0.26	8.7	548.17
08+480	18.19	17.9	1.5	0.29	6	554.17
08+500	18.2	17.9	1	0.3	5	559.17
08+520	18.25	18	1	0.25	7	566.17
08+540	18.33	17.98	1	0.35	18	584.17
08+560	18.63	18.03	1.5	0.6	24	608.17
08+580	18.67	17.92	1.6	0.75	2.56	610.73
08+600	18.11	17.95	0.8	0.16	2.1	612.83
08+620	18.09	17.94	0.7	0.15	2.4	615.23
08+640	18.07	17.91	0.75	0.16	4	619.23
08+660	18.02	17.82	1	0.2	12.6	631.83
08+680	18.32	17.9	1.5	0.42		


الإجمالي

631.8

مجلس التعاون الخليجي
الجمهورية العربية السورية
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي
الجمهورية العربية السورية
مجلس التعاون الخليجي

قطاع عرضي لتطهير الطبان

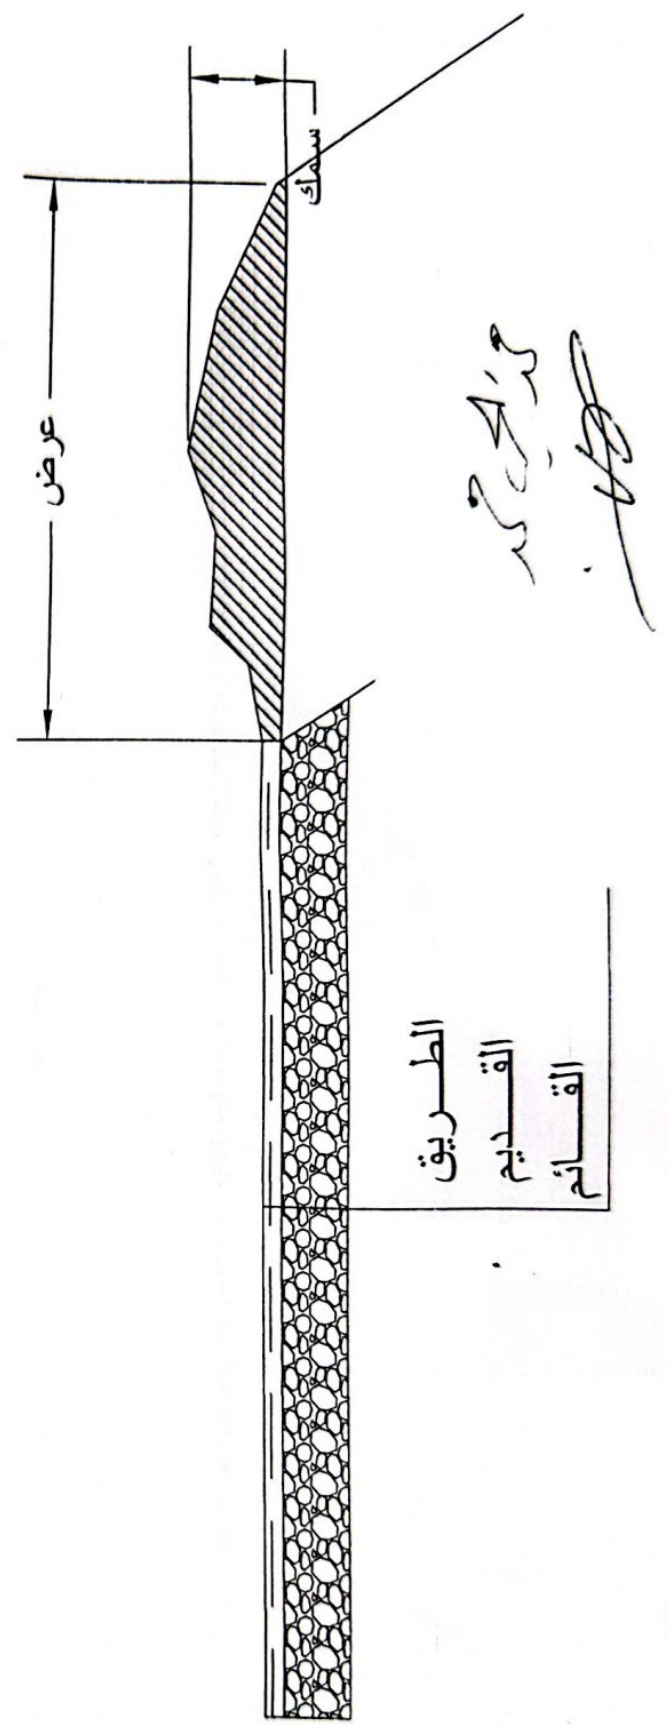



مملكة العربية السعودية - الرياض



الهيئة العامة للغذاء والدواء
وزارة الصحة - الرياض

مشروع اعمل رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج (القطاع الثاني) بطول 2 كم مركز شربين - محافظة الشرقية - ضمن مبادرة حيوة كريمة (شركة ادم)

حصر مستقلص رقم (2)

الكمية	خلال المدة	المبلغ	الوحدة	البيد	رقم البيد
4128.20	1816.20	2312.00	م3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اسفل ناتج تكسير الكسارات	7
كمية الاسفلط لطريق الدفر و طريق الصرف م3 590.4 كمية الاسفلط لطريق الاولى و التهيئة م3 3537.8					
4128.20	الاوجه				

مهندس المسئول
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



شركة المياه العامة - الرياض



شركة المياه العامة - الرياض

اساس طرئش المياه

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
7+360	1.55	1.85	0.3	0.6	0	0
7+380	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	3.6
7+400	1.53	1.83	0.3	0.6	3.6	7.2
7+420	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	10.8
7+440	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	14.4
7+460	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	18
7+480	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	21.6
7+500	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	25.2
7+520	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	28.8
7+540	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	32.4
7+560	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	36
7+580	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	39.6
7+600	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	43.2
7+620	1.7	2	0.3	0.6	3.6	46.8
7+640	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	50.4
7+660	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	54
7+680	1.68	1.98	0.3	0.6	3.6	57.6
7+700	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	61.2
7+720	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	64.8
7+740	1.51	1.81	0.3	0.6	3.6	68.4
7+760	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	72
7+780	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	75.6
7+800	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	79.2
7+820	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	82.8
7+840	1.56	1.86	0.3	0.6	3.6	86.4
7+860	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	90
7+880	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	93.6
7+900	1.53	1.83	0.3	0.6	3.6	97.2
7+920	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	100.8
7+940	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	104.4
7+960	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	108
7+980	1.19	1.49	0.3	0.6	3.6	111.6
8+000	1.15	1.45	0.3	0.6	3.6	115.2
8+20	1.18	1.48	0.3	0.6	3.6	118.8
8+40	1.22	1.52	0.3	0.6	3.6	122.4
8+60	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	126
8+80	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	129.6
8+100	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	133.2
8+120	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	136.8
8+140	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	140.4
8+160	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	144
8+180	1.48	1.78	0.3	0.6	3.6	147.6
8+200	1.45	1.75	0.3	0.6	3.6	151.2
8+220	1.49	1.79	0.3	0.6	3.6	154.8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

اساس طرئش المياه

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
8+240	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	158.4
8+260	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	162
8+280	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	165.6
8+300	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	169.2
8+320	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	172.8
8+340	1.52	1.82	0.3	0.6	3.6	176.4
8+360	1.47	1.77	0.3	0.6	3.6	180
8+380	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	183.6
8+400	1.43	1.73	0.3	0.6	3.6	187.2
8+420	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	190.8
8+440	1.29	1.59	0.3	0.6	3.6	194.4
8+460	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	198
8+480	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	201.6
8+500	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	205.2
8+520	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	208.8
8+540	1.32	1.62	0.3	0.6	3.6	212.4
8+560	1.27	1.57	0.3	0.6	3.6	216
8+580	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	219.6
8+600	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	223.2
8+620	1.36	1.66	0.3	0.6	3.6	226.8
8+640	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	230.4
8+660	1.48	1.78	0.3	0.6	3.6	234
8+680	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	237.6
8+700	1.45	1.75	0.3	0.6	3.6	241.2
8+720	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	244.8
8+740	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	248.4
8+760	1.2	1.5	0.3	0.6	3.6	252
8+780	1.13	1.43	0.3	0.6	3.6	255.6
8+800	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	259.2
8+820	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	262.8
8+840	1.41	1.71	0.3	0.6	3.6	266.4
8+860	1.49	1.79	0.3	0.6	3.6	270
8+880	1.58	1.88	0.3	0.6	3.6	273.6
8+900	1.58	1.88	0.3	0.6	3.6	277.2
8+920	1.47	1.77	0.3	0.6	3.6	280.8
8+940	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	284.4
8+960	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	288
8+980	1.51	1.81	0.3	0.6	3.6	291.6
9+000	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	295.2
الإجمالي					295.2	

أساس طرنش الغاز

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
7+360	1.52	1.82	0.3	0.6	0	0
7+380	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	3.6
7+400	1.68	1.98	0.3	0.6	3.6	7.2
7+420	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	10.8
7+440	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	14.4
7+460	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	18
7+480	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	21.6
7+500	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	25.2
7+520	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	28.8
7+540	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	32.4
7+560	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	36
7+580	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	39.6
7+600	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	43.2
7+620	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	46.8
7+640	1.59	1.89	0.3	0.6	3.6	50.4
7+660	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	54
7+680	1.59	1.89	0.3	0.6	3.6	57.6
7+700	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	61.2
7+720	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	64.8
7+740	1.51	1.81	0.3	0.6	3.6	68.4
7+760	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	72
7+780	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	75.6
7+800	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	79.2
7+820	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	82.8
7+840	1.56	1.86	0.3	0.6	3.6	86.4
7+860	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	90
7+880	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	93.6
7+900	1.53	1.83	0.3	0.6	3.6	97.2
7+920	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	100.8
7+940	1.43	1.73	0.3	0.6	3.6	104.4
7+960	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	108
7+980	1.19	1.49	0.3	0.6	3.6	111.6
8+000	1.15	1.45	0.3	0.6	3.6	115.2
8+20	1.15	1.45	0.3	0.6	3.6	118.8
8+40	1.22	1.52	0.3	0.6	3.6	122.4
8+60	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	126
8+80	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	129.6
8+100	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	133.2
8+120	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	136.8
8+140	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	140.4
8+160	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	144
8+180	1.48	1.78	0.3	0.6	3.6	147.6
8+200	1.45	1.75	0.3	0.6	3.6	151.2
8+220	1.49	1.79	0.3	0.6	3.6	154.8
8+240	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	158.4
8+260	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	162



محمد علی

مناشيب الأرض الطبيعية						مناشيب الأساس			العمق	السمك	العرض	المساحة	إجمالي
ST	طابق	L	C	R	طابق	L	C	R					
07-100	18.01	17.99	17.99	17.99	17.99	18.285	18.23	18.235	0	0.26	7.00	0.0	0.0
07-100	17.88	17.85	17.85	17.92	17.95	18.256	18.221	18.186	20	0.35	7.00	49.1	49.1
07-100	17.85	17.83	17.83	17.85	17.88	18.227	18.192	18.157	20	0.36	7.00	49.7	98.9
07-100	17.83	17.88	17.88	17.83	17.86	18.198	18.163	18.128	20	0.30	7.00	42.0	140.8
07-100	17.87	17.85	17.85	17.84	17.79	18.175	18.14	18.105	20	0.28	7.00	39.2	180.0
07-100	17.88	17.87	17.87	17.83	17.95	18.172	18.137	18.102	20	0.28	7.00	39.2	219.3
07-100	17.86	17.85	17.85	17.84	17.89	18.187	18.152	18.117	20	0.29	7.00	40.9	260.2
07-100	17.87	17.85	17.85	17.84	17.91	18.207	18.172	18.137	20	0.31	7.00	43.7	303.8
07-100	17.85	17.82	17.82	17.82	17.81	18.227	18.192	18.157	20	0.37	7.00	52.1	355.9
07-100	17.86	17.85	17.85	17.84	17.95	18.246	18.211	18.176	20	0.35	7.00	49.1	405.1
07-100	17.9	17.88	17.88	17.84	17.93	18.261	18.226	18.191	20	0.35	7.00	48.4	453.5
07-100	17.89	17.87	17.91	17.91	17.91	18.268	18.233	18.198	20	0.34	7.00	47.1	500.6
07-100	17.91	17.89	17.91	17.92	17.98	18.266	18.231	18.196	20	0.33	7.00	45.7	546.3
07-100	17.93	17.91	17.96	17.95	17.98	18.268	18.233	18.198	20	0.29	7.00	41.0	587.3
07-100	17.94	17.92	17.95	18.01	18.04	18.268	18.233	18.198	20	0.27	7.00	38.2	625.5
07-100	17.98	17.96	18.01	17.99	17.99	18.268	18.233	18.198	20	0.25	7.00	34.5	660.0
07-100	17.94	17.92	17.98	17.99	17.96	18.268	18.233	18.198	20	0.27	7.00	37.8	697.8
07-100	17.92	17.89	17.97	18.04	17.99	18.268	18.233	18.198	20	0.27	7.00	37.3	735.0
07-100	17.84	17.82	17.86	17.87	17.99	18.268	18.233	18.198	20	0.35	7.00	49.0	784.0
07-100	18.02	18	17.97	18.01	17.93	18.268	18.233	18.198	20	0.24	7.00	31.6	817.6
07-100	17.93	17.91	17.96	18.01	18.03	18.268	18.233	18.198	20	0.27	7.00	38.7	855.8
07-100	17.98	17.96	17.96	18.01	18.06	18.268	18.233	18.198	20	0.26	7.00	35.9	891.7
07-100	17.9	17.88	17.88	17.87	17.94	18.268	18.233	18.198	20	0.36	7.00	49.9	941.5
07-100	17.93	17.91	17.86	17.93	17.92	18.268	18.233	18.198	20	0.33	7.00	46.6	988.2
07-100	17.97	17.95	17.9	17.89	17.93	18.275	18.24	18.205	20	0.33	7.00	45.7	1033.9
07-100	17.91	17.89	17.85	17.86	17.85	18.294	18.259	18.224	20	0.39	7.00	54.9	1088.8
07-100	17.89	17.87	17.89	17.92	17.92	18.294	18.259	18.224	20	0.40	7.00	55.4	1144.2
07-100	18	17.98	17.96	17.95	18.06	18.355	18.32	18.285	20	0.36	7.00	49.9	1194.2
07-100	18.13	18.11	18.06	18.02	17.99	18.386	18.351	18.316	20	0.29	7.00	40.1	1234.3
07-100	18.1	18.08	18.05	17.98	17.97	18.417	18.382	18.347	20	0.35	7.00	48.3	1282.8
07-100	18.03	18.01	18.03	18.06	18.04	18.443	18.408	18.373	20	0.34	7.00	47.8	1330.6
07-100	18.12	18.1	18.09	17.97	17.89	18.446	18.411	18.376	20	0.36	7.00	50.1	1380.8
08-000	18.16	18.14	18.13	18.1	17.98	18.425	18.39	18.355	20	0.27	7.00	37.3	1418.0
08-000	18.16	18.14	18.12	18.09	18.07	18.394	18.359	18.324	20	0.24	7.00	33.9	1451.9
08-000	18.09	18.07	18.04	17.97	17.96	18.363	18.328	18.293	20	0.30	7.00	42.2	1494.1
08-000	17.96	17.94	17.94	17.89	17.87	18.332	18.297	18.262	20	0.37	7.00	52.3	1546.4
08-000	17.92	17.9	17.89	17.89	17.91	18.301	18.266	18.231	20	0.37	7.00	52.2	1598.6
08-100	17.96	17.94	17.89	17.94	17.89	18.27	18.235	18.2	20	0.31	7.00	43.6	1642.2
08-100	17.96	17.94	17.94	17.87	17.89	18.239	18.204	18.169	20	0.29	7.00	40.2	1682.4
08-100	17.89	17.87	17.86	17.83	17.87	18.211	18.176	18.141	20	0.32	7.00	45.2	1727.6
08-100	17.89	17.87	17.87	17.86	17.92	18.193	18.158	18.123	20	0.29	7.00	40.8	1768.4
08-100	17.83	17.81	17.8	17.76	17.83	18.188	18.153	18.118	20	0.36	7.00	50.8	1819.2
08-200	17.86	17.84	17.79	17.76	17.84	18.188	18.153	18.118	20	0.36	7.00	49.9	1869.1
08-200	17.82	17.8	17.84	17.87	17.84	18.188	18.153	18.118	20	0.32	7.00	44.3	1913.4
08-200	17.91	17.89	17.91	17.89	18.04	18.188	18.153	18.118	20	0.26	7.00	35.9	1949.3
08-200	17.92	17.9	17.89	17.87	17.95	18.188	18.153	18.118	20	0.27	7.00	37.3	1986.6
08-200	17.95	17.87	17.84	17.74	17.73	18.188	18.153	18.118	20	0.34	7.00	47.1	2033.6
08-200	17.81	17.79	17.74	17.71	17.71	18.188	18.153	18.118	20	0.41	7.00	58.9	2090.5
08-200	17.76	17.74	17.74	17.74	17.71	18.188	18.153	18.118	20	0.41	7.00	57.9	2148.3
08-200	17.79	17.77	17.76	17.73	17.71	18.188	18.153	18.118	20	0.40	7.00	56.0	2204.3
08-200	17.84	17.82	17.82	17.75	17.75	18.188	18.153	18.118	20	0.36	7.00	49.9	2254.2
08-200	17.91	17.89	17.86	17.84	17.77	18.188	18.153	18.118	20	0.29	7.00	40.6	2294.7
08-200	17.88	17.86	17.86	17.86	17.85	18.188	18.153	18.118	20	0.29	7.00	41.0	2335.8
08-200	17.96	17.94	17.95	17.92	17.9	18.188	18.153	18.118	20	0.22	7.00	30.3	2364.0
08-200	18.02	18	17.99	17.97	17.97	18.188	18.153	18.118	20	0.17	7.00	23.3	2389.3
08-200	17.92	17.9	17.9	17.86	17.88	18.188	18.153	18.118	20	0.27	7.00	37.3	2426.6
08-200	17.9	17.88	17.86	17.84	17.8	18.188	18.153	18.118	20	0.29	7.00	41.0	2467.6
08-200	17.9	17.88	17.84	17.84	17.84	18.188	18.153	18.118	20	0.30	7.00	42.0	2509.6
08-200	18	17.98	17.93	17.81	17.85	18.188	18.153	18.118	20	0.22	7.00	31.2	2540.8
08-200	17.98	17.96	17.93	17.9	17.89	18.188	18.153	18.118	20	0.22	7.00	31.2	2572.0
08-200	18.03	18.01	17.93	17.89	17.89	18.188	18.153	18.118	20	0.21	7.00	29.4	2601.4
08-200	17.92	17.9	17.94	17.92	17.96	18.188	18.153	18.118	20	0.23	7.00	32.6	2634.0
08-200	17.95	17.93	17.84	17.84	17.88	18.188	18.153	18.118	20	0.28	7.00	39.6	2673.6
08-200	17.94	17.92	17.92	17.86	17.82	18.188	18.153	18.118	20	0.25	7.00	35.4	2709.0
08-200	17.91	17.89	17.89	17.78	17.79	18.188	18.153	18.118	20	0.30	7.00	42.0	2751.0
08-200	17.82	17.8	17.75	17.76	17.8	18.188	18.153	18.118	20	0.38	7.00	53.6	2804.6
08-200	17.9	17.88	17.79	17.82	17.82	18.188	18.153	18.118	20	0.32	7.00	45.2	2849.8
08-200	17.85	17.83	17.8	17.76	17.91	18.19	18.155	18.12	20	0.36	7.00	50.2	2900.0
08-200	17.92	17.9	17.83	17.8	17.83	18.212	18.177	18.142	20	0.33	7.00	46.7	2946.7
08-200	17.92	17.9	17.9	17.83	17.86	18.257	18.222	18.187	20	0.33	7.00	46.0	2992.7
08-200	18.1	18.08	18.08	18.08	18.12	18.316	18.281	18.246	20	0.20	7.00	28.1	3020.9
08-200	18.1	18.15	18.13	18.09	18.06	18.383	18.348	18.293	20	0.20	7.00	28.7	3049.5
08-200	18.03	18	17.97	17.96	17.99	18.37	18.335	18.3	20	0.36	7.00	50.2	3099.7
08-200	18.01	17.99	17.93	17.9	17.94	18.339	18.304	18.269	20	0.36	7.00	51.0	3150.7
08-200	18.02	17.98	18.02	18.01	17.98	18.299	18.264	18.229	20	0.36	7.00	51.0	3196.7
08-200	17.92	17.9	17.83	17.78	17.78	18.258	18.223	18.188	20	0.39	7.00	54.1	3240.8
08-200	17.83	17.81	17.77	17.73	17.75	18.218	18.183	18.148	20	0.41	7.00	57.8	3289.6
08-200	17.83	17.81	17.83	17.82	17.82	18.177	18.142	18.107	20	0.32	7.00	45.1	3341.7
08-200	17.95	17.92	17.92	17.89	17.94	18.177	18.142	18.107	20	0.25	7.00	32.5	3376.1
08-200	17.83	17.79	17.84	17.81	17.84	18.177	18.142	18.107	20	0.32	7.00	45.1	3421.2
08-200	17.84	17.84	17.83	17.81	17.86	18.177	18.142	18.107	20	0.30	7.00	41.3	3462.6
08-200	17.92	17.88	17.84	17.84	17.84	18.177	18.142	18.107	20	0.28	7.00	39.5	3502.1
09-000	17.85	17.84	17.9	17.92	17.94	18.177	18.142	18.107	20	0.26	7.00	35.7	3537.8

الإجمالي

3537.8
