

بخصوص :- المستخلص رقم (٢) جارى عن
عملية : اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / بارس/درب
الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (٢) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع. ح بقيمة
المستخلص وبيانه كالاتى :-

جملة الأعمال ١٠٥١٥٠٠٠,٠٠

سابق صرفة ٥٥٧٠٠٠٠,٠٠

٤٩٤٥٠٠٠,٠٠

الاستقطاعات

قرش	جنية	
٠٠	٢٤٧٢٥٠	٥٪ لحسن سير العمل
٨٠	١١٩٠٧٨	عادي و اضافي
٤٠	—	توقيع وموارد
٥٠	٢٢٢٥٢	نسبة ٠,٤٥ ٪ قيمة العمالة غير المنتظمة
٥٠	٢٢٢٥٢	نسبة ٠,٤٥ ٪ قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

جملة الاستقطاعات ٤١٠٨٣٤,٢٠ ٤١٠٨٣٤,٢٠

صافى المبلغ ٤٥٣٤١٦٥,٨٠

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

علام عبدالعال حسين (



٢٠١٦

اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين
المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادى الجديد)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٠٣).

مستخلص رقم ٢ جارى

البند	بيان الأعمال	كمية الحصر
١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ م من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفه باستخدام المكانس الميكانيكية والفئة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٠٧٥٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهاجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالمياه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠٠٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم	
	يتم زيادة مبلغ ٦ جنيه فى حالة استخدام البلدوزر فى التحجير وذلك للارض المتماسكة طبقا لتحليل التربة	

مهندس الهيئة

مدير المشروع
١٤٠٤



مهندس الشركة



أعمال إزالة الكشبان الرملية بطريق الخارجة / بارس / درب الأربعين المسافة من كم (١٦٠) إلى كم (١٦٦) (حد المنطقة (الوادي الجديد))

بيان كميات بند رقم (1) إزالة الكشبان الرملية المستخلص رقم (2) جارى لشركة محمد على احمد محمود

م	البند	الكمية	ملاحظات
			الى
1	إزالة الكشبان الرملية	52995.05	تبة رقم 7-8-9-10
2	إزالة الكشبان الرملية	4717.45	تبة رقم 1
3	إزالة الكشبان الرملية	7517.33	تبة رقم 3
4	إزالة الكشبان الرملية	13085.11	تبة رقم 4
5	إزالة الكشبان الرملية	14236.59	تبة رقم 5
6	إزالة الكشبان الرملية	8001.3	تبة رقم 6
7	إزالة الكشبان الرملية	11073.52	تبة رقم 11
الإجمالي		111626.35	

مهندس الهيئة

التوقيع /



٢٠١٦/١٠/٢٣

التوقيع /

مهندس الشركة





اعمال ازالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / بارسو/ درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة الوادي الجديد)

بيان كميات بند رقم (2) توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية المستخلص رقم (2) جاري لشركة محمد على احمد محمود


ملاحظات	الكمية	القطاع		البند	م
		الى	من		
	315000	تربة رقم 3-5-6-9		توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية	1
	315000			الإجمالي	

مهندس الهيئة

التوقيع /



١٣٩٨/٥/١٠




اعمال إزالة الكشبان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 1)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	5.220	0.000	0.000
0+025.00	43.790	612.530	612.530
0+050.00	59.420	1305.050	1917.580
0+075.00	74.840	1678.210	3595.790
0+100.00	14.080	1111.460	4707.240
0+101.19	3.050	10.200	4717.450

مهندس الهيئة
C.M.



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/ درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 3)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	5.130	0.000	0.000
0+025.00	36.480	520.120	520.120
0+050.00	62.790	1240.780	1760.900
0+075.00	118.500	2266.140	4027.040
0+100.00	67.820	2329.030	6356.080
0+125.00	14.380	1003.090	7359.160
0+140.40	6.160	158.170	7517.330

مهندس الهيئة

Signature



مهندس الشركة




اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبة رقم 4)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	4.500	0.000	0.000
0+025.00	45.150	612.200	612.200
0+050.00	48.710	1191.520	1803.720
0+075.00	59.190	1335.990	3139.720
0+100.00	70.610	1622.500	4762.210
0+125.00	68.360	1714.270	6476.490
0+150.00	65.440	1712.500	8188.990
0+175.00	96.630	1993.990	10182.980
0+200.00	71.570	2102.470	12285.440
0+222.35	0.000	799.670	13085.110

مهندس الهيئة

Signature



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / بارس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تسبة رقم 5)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.000	0.000	0.000
0+025.00	23.040	288.020	288.020
0+050.00	50.060	883.100	1171.120
0+075.00	43.510	1207.100	2378.220
0+100.00	69.820	1446.030	3824.250
0+125.00	70.670	1737.920	5562.180
0+150.00	79.140	1899.420	7461.600
0+175.00	69.810	1861.870	9323.470
0+200.00	81.090	1953.980	11277.440
0+225.00	85.920	2087.700	13365.140
0+245.23	0.240	871.460	14236.590



مهندس الهيئة
Cint

مهندس الشركة



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 6)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	6.760	0.000	0.000
0+025.00	47.790	681.930	681.930
0+050.00	95.320	1903.020	2584.950
0+075.00	22.570	1455.630	4040.580
0+100.00	16.000	477.640	4518.210
0+125.00	61.150	977.980	5496.190
0+150.00	55.370	1434.350	6930.540
0+175.00	18.310	934.900	7865.440
0+185.09	8.610	135.860	8001.300

مهندس الهيئة
عبدالله



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/ درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 7&8&9&10)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
158+436.00	0.130	0.000	0.000
158+450.00	8.510	62.460	62.460
158+475.00	9.530	234.410	296.870
158+500.00	60.420	864.760	1161.640
158+525.00	96.580	1962.550	3124.180
158+550.00	127.880	2805.740	5929.930
158+575.00	180.870	3957.200	9887.130
158+600.00	217.680	4981.860	14868.980
158+625.00	13.650	2891.660	17760.640
158+650.00	6.030	252.520	18013.170
158+675.00	4.970	131.210	18144.380
158+700.00	11.060	205.870	18350.240
158+725.00	11.740	281.580	18631.820
158+750.00	8.470	257.500	18889.320
158+775.00	3.740	149.870	19039.190
158+800.00	4.270	102.250	19141.440
158+825.00	12.190	202.970	19344.410
158+850.00	7.440	245.370	19589.780
158+875.00	15.710	296.370	19886.160
158+900.00	32.340	600.520	20486.680
158+925.00	19.610	641.620	21128.300
158+950.00	23.200	535.110	21663.410
158+975.00	39.260	780.820	22444.230
159+000.00	48.470	1116.310	23560.540
159+025.00	83.910	1654.720	25215.260
159+050.00	91.540	2320.690	27535.960
159+075.00	74.420	2143.160	29679.110
159+100.00	48.320	1589.740	31268.860
159+125.00	70.520	1485.520	32754.380
159+150.00	60.590	1685.090	34439.470
159+175.00	24.410	1062.480	35501.950
159+200.00	1.020	317.920	35819.870
159+225.00	0.000	12.880	35832.750
159+250.00	0.020	0.240	35832.990

مهندس الهيئة
عبدالله



٢٧٦١٣

مراجعة محمد علي أحمد منصور
المقاولات المدنية بإمضاء وموافقة الطرف
من ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٢
مهندس الشركة




**اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/ درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)**

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 7&8&9&10)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
159+275.00	0.010	0.390	35833.380
159+300.00	0.000	0.170	35833.550
159+325.00	0.010	0.090	35833.640
159+350.00	0.050	0.740	35834.380
159+375.00	0.010	0.780	35835.160
159+400.00	0.040	0.640	35835.800
159+425.00	0.000	0.520	35836.320
159+450.00	0.010	0.110	35836.430
159+475.00	0.000	0.120	35836.550
159+500.00	0.000	0.020	35836.570
159+525.00	12.030	152.500	35989.070
159+550.00	14.320	329.480	36318.560
159+575.00	17.640	404.010	36722.570
159+600.00	66.100	1059.800	37782.370
159+625.00	160.290	2718.970	40501.340
159+650.00	98.820	3285.200	43786.540
159+675.00	23.340	1526.990	45313.520
159+700.00	0.000	291.780	45605.300
159+725.00	0.000	0.000	45605.300
159+750.00	0.000	0.000	45605.300
159+775.00	0.000	0.000	45605.300
159+800.00	0.000	0.000	45605.310
159+825.00	0.000	0.010	45605.320
159+850.00	0.000	0.010	45605.330
159+875.00	0.000	0.030	45605.360
159+900.00	70.940	903.180	46508.540
159+925.00	163.320	2928.270	49436.820
159+950.00	0.000	2041.510	51478.320
159+975.00	52.540	649.400	52127.720
159+999.50	18.260	867.330	52995.050



مهندس الهيئة
م. م. م.



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / بارس/ درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبة رقم 11)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	5.220	0.000	0.000
0+025.00	43.790	612.530	612.530
0+050.00	59.420	1305.050	1917.580
0+075.00	74.840	1678.210	3595.790
0+100.00	14.080	1111.460	4707.250
0+125.00	3.050	10.200	4717.450
0+150.00	36.480	520.120	5237.570
0+175.00	62.790	1240.780	6478.350
0+200.00	118.500	2266.140	8744.490
0+225.00	67.820	2329.030	11073.520

مهندس البيئة
lila





اعمال التطهيل بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)


حصر مسطح التطهيل تبة 2&3&5&6 &7&9

المسطح	العرض	الطول	رقم التبة
125000.000	250.000	500.000	9
5000.000	50.000	100.000	7
70000.000	200.000	350.000	6
37500.000	150.000	250.000	5
49500.000	180.000	275.000	3
28000.000	140.000	200.000	2

مهندس الهيئة



مهندس الهيئة





در حقیقت تمام اصول و فروع فقهیه بطریق درجما / بایس اورب الارضی مستفاد من کم (۱۶۰) (حد فاسلکة الخواص القدما)




تاريخ	البيان	مبلغ
2024-01-01	الرصيد الافتتاحي	115500
2024-01-02	مبيعات نقدية	35000
2024-01-03	مبيعات ائتمانية	
2024-01-04	مشتريات نقدية	
2024-01-05	مشتريات ائتمانية	
2024-01-06	مدفوعات ديون	
2024-01-07	مدفوعات ديون	
2024-01-08	مدفوعات ديون	
2024-01-09	مدفوعات ديون	
2024-01-10	مدفوعات ديون	
2024-01-11	مدفوعات ديون	
2024-01-12	مدفوعات ديون	
2024-01-13	مدفوعات ديون	
2024-01-14	مدفوعات ديون	
2024-01-15	مدفوعات ديون	
2024-01-16	مدفوعات ديون	
2024-01-17	مدفوعات ديون	
2024-01-18	مدفوعات ديون	
2024-01-19	مدفوعات ديون	
2024-01-20	مدفوعات ديون	
2024-01-21	مدفوعات ديون	
2024-01-22	مدفوعات ديون	
2024-01-23	مدفوعات ديون	
2024-01-24	مدفوعات ديون	
2024-01-25	مدفوعات ديون	
2024-01-26	مدفوعات ديون	
2024-01-27	مدفوعات ديون	
2024-01-28	مدفوعات ديون	
2024-01-29	مدفوعات ديون	
2024-01-30	مدفوعات ديون	
2024-01-31	الرصيد الختامي	115500

لکھنؤ



227





الهيئة العامة
للطرق والكباري
القطاع الجديد عشر جنوب سيناء



بيان المعدات

التاريخ : 2025-1-27

اسم المشروع : عن عملية ازالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد))

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة محمد علي احمد محمود
رقم (2025/2024/603)
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
2	لودر
6	عربية قلاب
1	تاتك مياه
2	سيارات خدمة
2	هراس

مهندس الهيئة
Cm





مشروع :- اعمال إزالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة /
باريس /درب الاربعين من الكم 146+000 الى الكم 160+000 حد منطقة
محافظة الوادي الجديد
تنفيذ : شركة محمد علي أحمد محمود
التقرير الأسبوعي

2/1/2018



البيانات الأساسية

مشروع: - أعمال إزالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس لرب الاربعين من الكم
الى الكم 146+000 منطقة محافظة الوادي الجديد



الهيئة العامة للطرق والكبارى	الجهة المشرفة
شركة محمد على أحمد محمود	الشركة المنفذة
2025/2024/603	رقم العقد
11851000	قيمة العقد
2024 / 12 / 25	تاريخ بدء العمل
%88.72	نسبة التنفيذ
0	المنصرف
مكونات المشروع	

*-أعمال إزالة الكثبان الرملية أعلي الطريق والتي تعيق حركة المرور وتوريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية




مشروع:- اكمال ازالة الكتيان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس ارب الاربعين من الكم 146+000 الى الكم 160+000 حد منطقة محافظة الوادي الجديد



الاعمال

الكمية الاجمالية	نسبة التنفيذ %	الوحدة	البند	م
115500	93%	م3	اعمال ازالة الرمال السائفة	1
350000	85.7%	م2	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكتيان الرملية	2

Civils







مشروع: - افعال إزالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس / الرباط الأربعين من الكم
146+000 إلى الكم 160+000 حد منطقة محافظة الوادي الجديد



صور المشروع إزالة الرمال وتوريد وفرش تربة

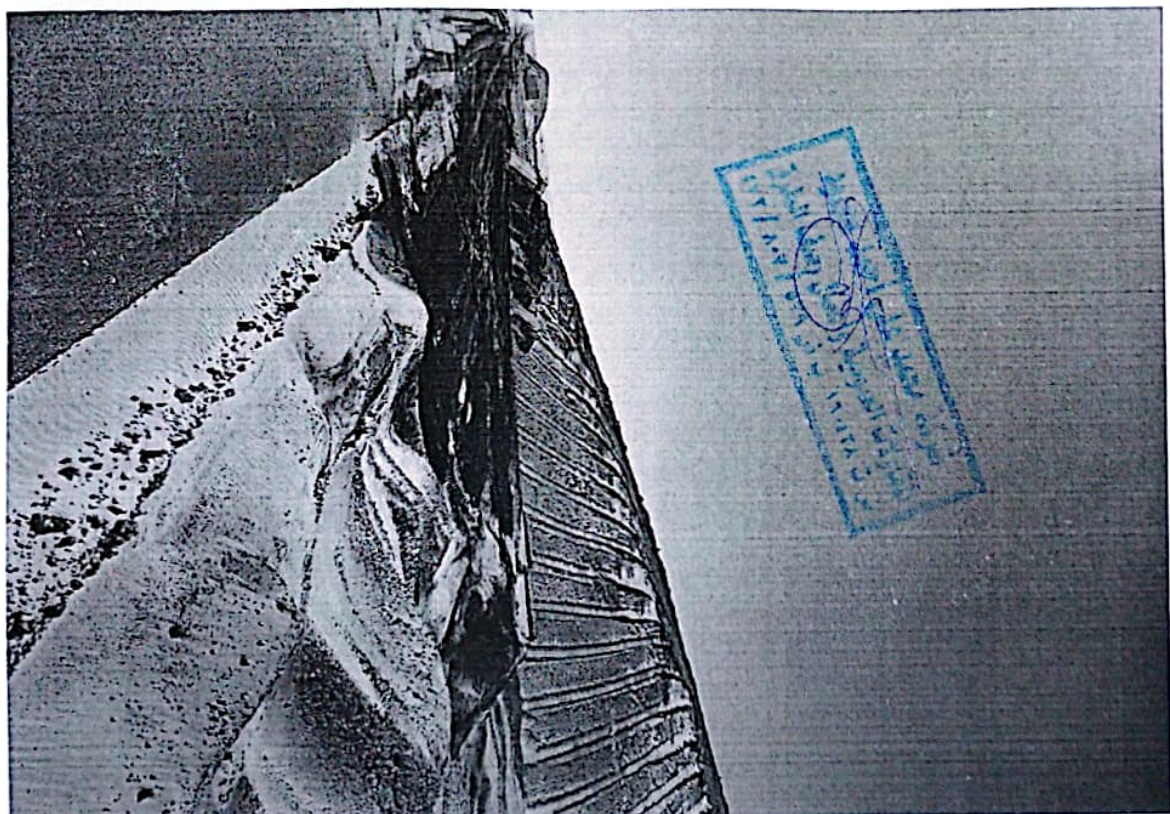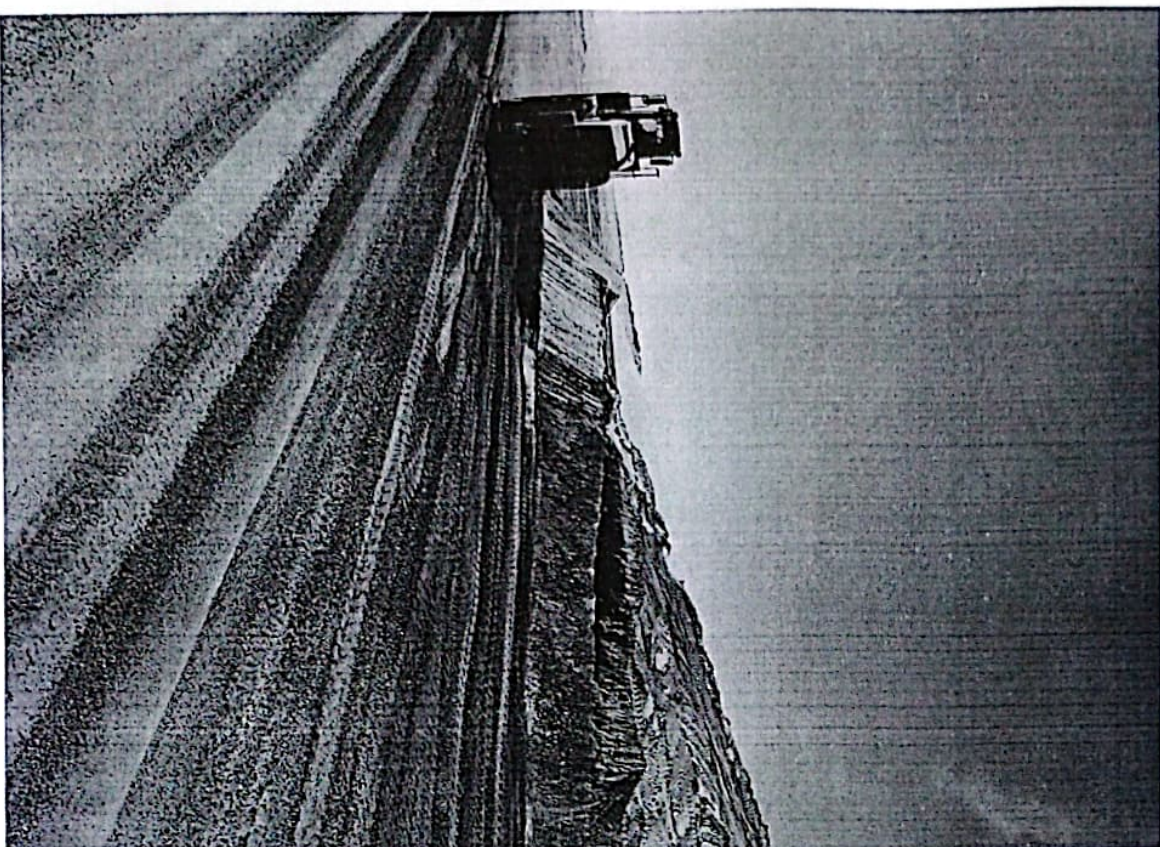


للم



مشروع:- اعمال ازالة الكئبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس /ارب الاربعين من الكم
الى الكم 146+000 الى الكم 160+000 حد منطقة محافظة الوادي الجديد



صور المشروع ازالة الرمال وتوريد وفرش تربة

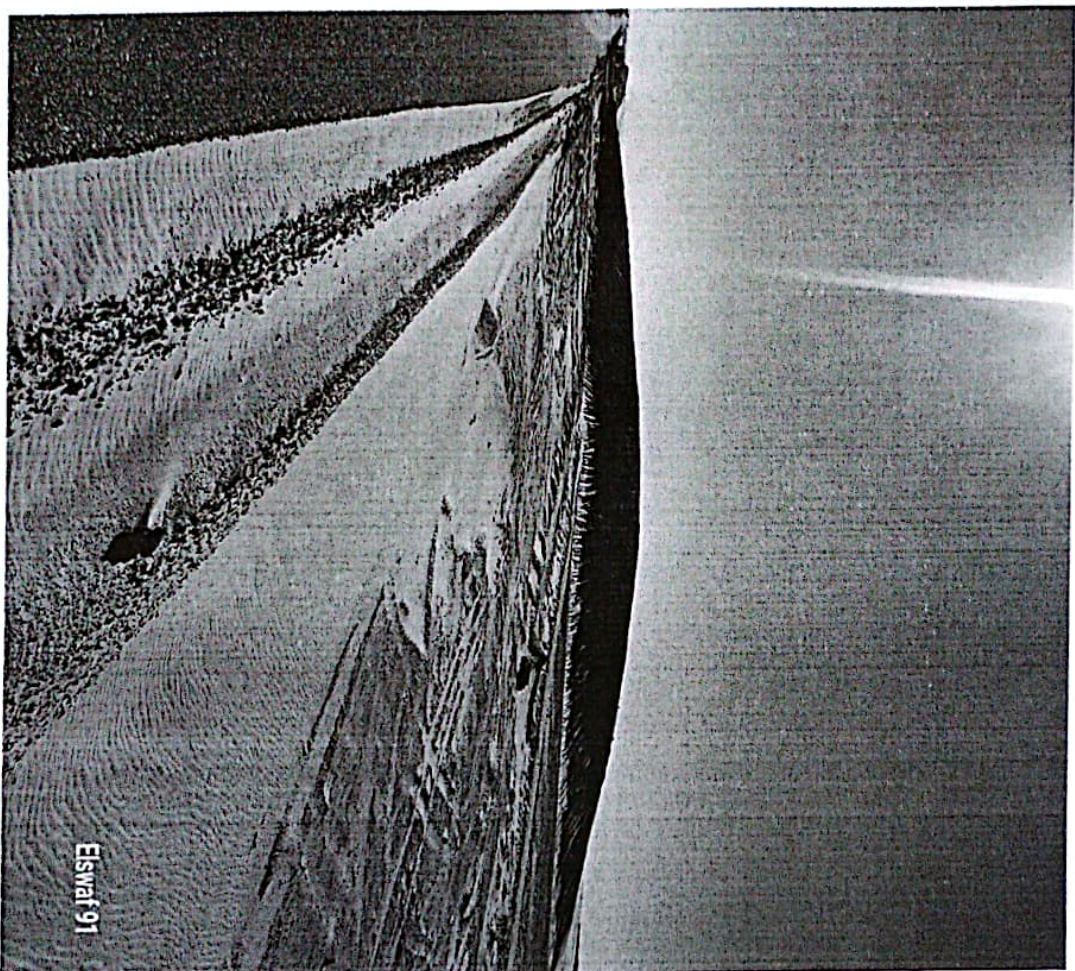

146



مشروع:- اكمال إزالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / بارس / ارب الاربعين من الكم
146+000 الى الكم 160+000 حد منطقة محافظة الوادي الجديد



صور المشروع إزالة الرمال وتوريد وفرش تربة





14/12/2014



مشروع: - اكمال إزالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس لارب الاربعين من الكم
146+000 الى الكم 160+000 حد منطقة محاذية الوادي الجديد



صور المشروع إزالة الرمال وتوريد وفرش تربة

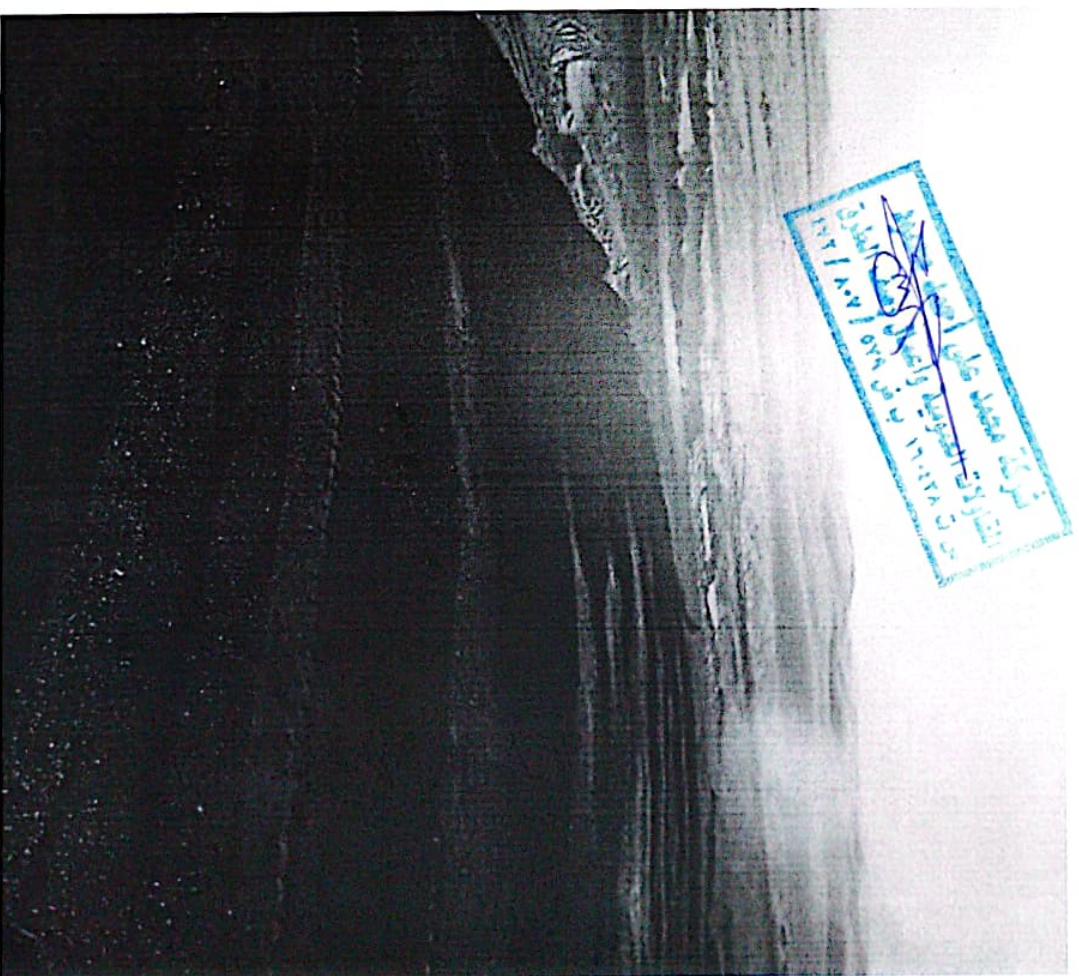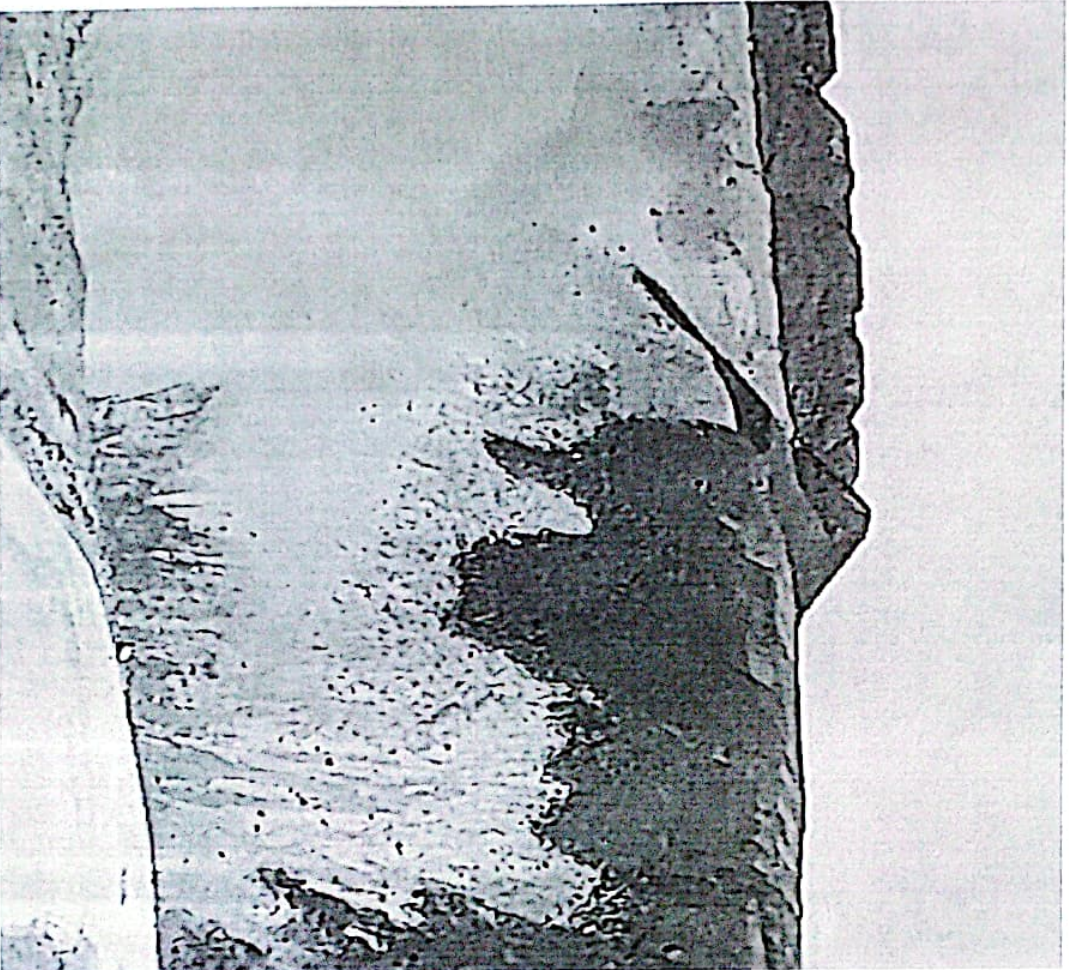

1/2
