

السيد المهندس /نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال رفع كفاءة وصلة
ابوشوشة الصحراوى الغربى بطول ١.٤ كم من الكم ١٨.٠٠ حتى الكم ١٩.٤ ضمن المبادرة
الثاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩١٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٦

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

امضاء

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

إعمال رفع كفاءة وطول البوارجى القريب بطول ١٨٠٠ م
١٤٠٠ م ١٩٠٠ م قنا من المادى الراسية (صلاه كريمة)

عن شهر مايو ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢٩٦	٢٩٦	جملة الاعمال - ١٤٨٠٠ / -
٢٩٦	٢٩٦	تأمين ٥%
٢٩٦	٢٩٦	السابق صرفه ١٠٢٥٠٠ / -
٢٩٦	٢٩٦	دمغات
٢٩٦	٢٩٦	خصم معمل المنطقة ٥٠٥٥ / -
٢٩٦	٢٩٦	المستحق صرفه
٢٩٦	٢٩٦	جملة الاستقطاعات
٢٩٦	٢٩٦	الصافى

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

و موافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أ. ه. ه.

تحريرا ٢٠٢٥/٥/٢٦

عدد (١) استمارة ٥٠ ع. ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

١٧٨ - ١٧٧

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

استمارة الاعتماد المصرف

(أ)

بيانات الفواتير				رقم
رقم	تاريخ	جنية	قرش	الختم ذو التاريخ
٢٩٧٨	٤٤٠	٦		
المجموع				٤٤٠ ٦

مصلحة المصلحة العامة للطرق والنقل
قسم مصلحة
المبلغ المستحق إلى مركز محمود عبد الوهاب
الطلبات طية أو ..
بموجب مصلحة

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا ومصرف القيمة بواسطة
إذن مصرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم مركز محمود عبد الوهاب
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

كشف المراجعة
رئيس القسم

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
نوع الخصم	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	رقم	جنية	قرش	ملي
٢٩٧٨	٤٤٠	٦				
إجمالي الأصل				٤٤٠	٦	
بيانات الاستقطاعات						
عادي						
إضافي						
دمغة توقيع						
قرش جنية						
رسم الدمغة						
صافي القيمة المطلوب صرفها				٤٤٠	٦	

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط في السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة

المبلغ

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط في السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة

المبلغ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم

توقيع الكاتب المنوط في السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة

المبلغ

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

شيك / إذن صرف

رقم

شيك / الحوالات

رقم

شيك / الحوالات

رقم

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

سنة

الختم ذو التاريخ

(٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت


بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتى الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

رقم البند وبيانه: (١) بالمتر المكعب تحميل و نقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م٣
	من	الى	
أعمال الاتربة	٠	٦٢٠٠	٠
الاجمالى			
٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٠
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٠
٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٠
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		٠



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتى الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

رقم البند وبيانه: (٢) بالمتر المكعب رفع المخلفات و نقلها خارج حرم الطريق او المقابل العمومية

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م ٣
	من	الى	
أعمال المخلفات	٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠
الاجمالى			
٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

مهندس الهيئة
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة
محمود علي أحمد عبدالعال أبو غرور
ب. ق. ٧١٤٧
٤٣١-٥١٧-١٠٢٠
التوقيع/


بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتى الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

رقم البند وبيانه: (٣) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م ٣
	من	الى	
أعمال الأساس	٥٩٦٠	٦٢٠٠	١١٠١
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتى الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

رقم البند وبيانه: (٤) بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م ^٢
	من	الى	
أعمال mco	٥٣٣٥	٦٢٠٠	١٠٥٠٠
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

مهندس الهيئة
التوقيع /
مهندس احمد عبد العال

مهندس الشركة المنفذة
س. ت : ٤٦٧٦
ب التوقيع /
٤٣١-٥١٧-٨١

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتى الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

رقم البند وبيانه: (٥) بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م	الاجمالى م٢
	من	الى		
سطحية	٥٣٣٥	٦٢٠٠	٨٦٥	١٠٥٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة

التوقيع/

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

محمود علي أحمد عبدالعال أبو خروف
س. ق. ت. ١٧٤٧٦
ب. التوقيع/ ٨٠١٧-٥١٧-٤٣١

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال رفع كفاءة وصلة ابوشوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتى الكم ١٩,٤
مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩١٢

تنفيذ شركة :- محمود علي أحمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

•توريد أجهزة العمل اللازمة (جهاز استخلاص البيتومين) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق

المعامل المركزية بالهيئة لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٦/٥/٢٠٢٥ م

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عماد حسين

حصر أساس وصلة أبو شوشة					
station	width	av width	area	volume	cum vol
0	12.1				
20	11.4	11.75	235	47	47
40	11	11.2	224	44.8	91.8
60	11.4	11.2	224	44.8	136.6
80	11	11.2	224	44.8	181.4
100	11	11	220	44	225.4
120	11	11	220	44	269.4
135	11	11	165	33	434.4


حصر أساس وصلة أبو شوشة				
station	width	area	volume	cum vol
0	11			
20	11	220	44	44
40	11	220	55	99
60	11	220	48.4	147.4
80	11	220	46.2	193.6
100	11	220	48.4	242
120	11	220	50.6	292.6
140	11	220	37.4	330
160	11	220	55	385
180	11	220	46.2	431.2
200	11	220	48.4	479.6
220	11	220	50.6	530.2
240	11	220	48.4	578.6
260	11	220	44	622.6
280	11	220	44	666.6
اجمالي حصر الأساس			1101	

مهندس الهيئة



/م

مهندس الشركة

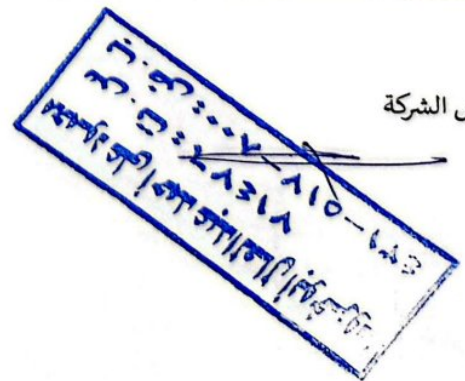

/م

حصر اسفلت وصلة أبو شوشة

station		width	av width	area	cum area
from 2275 to 2410	0	10.5			
	20	10.5	10.5	210	210
	40	10.5	10.5	210	420
	60	10.5	10.5	210	630
	80	10.5	10.5	210	840
	100	10.5	10.5	210	1050
	120	10.5	10.5	210	1260
	135	10.5	10.5	157.5	1417.5

حصر الاسفلت

station		width	area	cum area
5335 to 6200	0	10.5		
	20	10.5	210	210
	40	10.5	210	420
	60	10.5	210	630
	80	10.5	210	840
	100	10.5	210	1050
	120	10.5	210	1260
	140	10.5	210	1470
	160	10.5	210	1680
	180	10.5	210	1890
	200	10.5	210	2100
	220	10.5	210	2310
	240	10.5	210	2520
	260	10.5	210	2730
	280	10.5	210	2940
	300	10.5	210	3150
	320	10.5	210	3360
	340	10.5	210	3570
	360	10.5	210	3780
	380	10.5	210	3990
	400	10.5	210	4200
	420	10.5	210	4410
	440	10.5	210	4620
	460	10.5	210	4830
	480	10.5	210	5040
	500	10.5	210	5250
	520	10.5	210	5460
	540	10.5	210	5670
	560	10.5	210	5880
	580	10.5	210	6090
	600	10.5	210	6300
	620	10.5	210	6510
	640	10.5	210	6720
	660	10.5	210	6930




حصر اسفلت وصلة أبو شوشة

	680	10.5	210	7140
	700	10.5	210	7350
	720	10.5	210	7560
	740	10.5	210	7770
	760	10.5	210	7980
	780	10.5	210	8190
	800	10.5	210	8400
	820	10.5	210	8610
	840	10.5	210	8820
	860	10.5	210	9030
اجمالي حصر الاسفلت	10448			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



تقرير رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / وصلة أبو شوشة الصخراوى الغربى
تنفيذ/ شركة **أبو خروف** لاتشاء الطرق والكبارى

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة **أبو خروف**

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معملى كالاتى:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٢١	اختبار صلاحية عينه اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتى:-

قيمة إجراء التجارب	٢٨٦٠
١٤ % ضريبة القيمة المضافة	٤٠٠.٤
المبلغ الاجمالى	٣٢٦٠.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٢
فنى المعمل،،،

مدير المعمل
مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٧) بتاريخ ٥/١٩/ ٢٠٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
عملية/ رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوى الغربى
تنفيذ/ شركة محاور ابو خروف

احضرت العينة بمعرفة المهندس/ مهدي جمال (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٦٢١	أرقام العينات
	أساس سن تفسير	الطبقة المختبرة
	٥٠٠.٧ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٢	"١.٥
٨٥-٥٥	٨٢.٢	"١
٨٠-٥٠	٧٤.٣	"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٧.٣	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٥٠.٥	رقم ٤
٥٠-٢٠	٤٠.٥	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٥.٦	رقم ٤٠
١٥-٥	١٣.٢	رقم ٢٠٠
—	%٥.٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الاتفاخ
لا تقل عن ٨٠%	%٨٨	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	١٨.٢	حد السيولة
صفر - ٦	٣.٢	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٣٣	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٢	تحديد نسبة الطبعي

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٢٢
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،



رئيس الإدارة المركزية

مهندس

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية /وصلة ابو شوشه الصحراوي الغربى
تنفيذ/ شركة  ابو خروف لانشاء الطرق والكبارى

احضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/مهدى جمال (مهندس الهيئة)

المواصفات حدود	حدود السماح	٦٢٣	٦٢٢	أرقام العينات	
		طبقة سطحية		الطبقة المختبرة	
		٦.٢٠٠ كم	٥.٤٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٥	٨٥.٤٦-٧٥.٤٦	٩١.٠٤	٨٥.٢	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٥.٩٩-٦٥.٩٩	٧٥	٨٠.٦	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٣.١٨-٣٥.١٨	٤٦	٤٧.٨	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٢.٥-٢٦.٥	٣٢.٥	٣٢	رقم ٨	
٢٢-١٠	٢٠.٥-١٤.٥	٢٠.٥	٢٠	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٤.٢٩-٨.٢٩	١٠.٢	١٠.٠٥	رقم ٥٠	
١٢-٤	٩.٦٤-٣.٦٤	٣.٨	٣.٧	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٦٨-٢.٦٨	٢.٨	٢.٧	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٤.٨		%٥.٠١	%٤.٩٨	نسبة الإسفلت	
		%٢.٤	%٢.٥	نسبة الطبيعي	

تحريرا فى: ٢٠٢٥/٥/٢٥

فني المعمل

مدير المعمل


مهندس
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / وصلة ابو شوشه الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة محور ابو خروف لانشاء الطرق والكباري

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محور ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٢٢-٦٢٣	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٤٥	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
١٩٩٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥
فني المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

