



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٠٣) جاري لعملية إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي
النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩

تنفيذ / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

وذلك من بدء العمل

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام....

تحرير في ٢٣/١٠/٢٠٢٣ م

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة
م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة
والقائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر
مهندس /
أحمد عابد أبو الروس

2.1 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

(٥) أدرج في كشف الشيكاك الامارات رقم إمضاء الكاتب المنوط :

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

محضر إستلام موقع

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة - وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠ والمتقاطع مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم).

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات. ٥/٢٢

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ وبناءً على عقد العملية رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

١. السيد المهندس / أحمد أبو دقيقة ... مدير المشروع بالمنطقة الثالثة عشر
٢. السيد المهندس / أحمد الشاعر ... مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
٣. السيد المهندس / هاني السباعي إستشاري الهيئة - مكتب النيل

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. السيد المهندس / شريف القبطان ... مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ولا مانع من إستلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

هاني السباعي

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

شريف القبطان

الإدارة المركزية للمنطقة
بالتحيرة وكفر الشيخ

لواء أ.ح / أحمد باسم حسني الكرداني



السيد الأستاذ / مدير مكتب تأمينات البحيرة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص مشروع/ إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩

تنفيذ / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

نُحيط سيادتكم بأن المشروع عالية يقع في نطاق محافظة البحيرة.

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٣/١٠/٢٠٢٣ م

مدير المشروع

م / أحمد أبو دققة

م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة

والقائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر

مهندس /

أحمد عابد أبو الروس

مشروع كباري القطار السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثمن (ج.م.)	إجمالي القيمة (ج.م.)
أعمال الكباري					
١	بالمتر الطولي أعمال الرافع المساحي للمرافق والمعتزضات (القناح وأربعة متر طولي)	م.ط	٢,٤٠٠	١١	٢٦,٤٠٠,٠٠٠
٢	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري (ثلاثمائة وثلاثون متر طولي)	م.ط	٣٢٠	٤٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية ونهو العمل نهائياً وتبليط المهندس والمبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس (عشرة متر مكعب)	م.م	١٠	٨٠	٨٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائياً كاملاً بإمان ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية ونهو العمل والمبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك (عشرة متر مكعب)	م.م	١٠	١٧٥	١,٧٥٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس بأى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية ونهو العمل والمبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة نقل بها ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان (الف متر مكعب)	م.م	١,٠٠٠	٦٥	٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٦	أعمال نقل ملكية الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري) (واحد بالعدد)	بالعدد	١	٢٤٦,٠٠٠	٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م.م على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب الصومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهائياً كاملاً والمبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف شاملاً إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق (الف ومئة وستة وخمسون متر طولي)	م.ط	١,١٥٦	٤,٥٠٠	٥,٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠
٨	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والمبند يشمل نهو العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) والمبند لا يشمل سعر الخوازيق (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمق بدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساليب بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (خمسون متر مكعب)	م.م	٥٠	٩٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساليب بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الزرع إذا لزم الأمر والمبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (الفان وخمسة مئة متر مكعب)	م.م	٢,٥٠٠	٩٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد ورمل رمل نظيفة أو تربة زائفة موزعة من خارج الموقع حول الأسس وحول جسم الكوبري وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (الف وثلاثمائة متر مكعب)	م.م	١,٣٠٠	١٤٥	١٨٨,٥٠٠,٠٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد ورمل طبقة إحلال من سن + رمل بنسية ١:٢ موزعة من خارج الموقع حول الأسس وحول جسم الكوبري وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (عشرة متر مكعب)	م.م	١٠	٣٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م.م وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م.م (مئة متر مكعب)	م.م	١٠٠	١,٧٥٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأسس والبلاطات الإنشائية ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م.م وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م.م والتشطيب الجيد بالبلوكوتر لسطح الخرسانة (مئة متر مكعب)	م.م	١٠٠	١,٨٢٠	١٨٢,٠٠٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م.م وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م.م والسعر لا يشمل حديد التسليح (الف وثلاثمائة متر مكعب)	م.م	١,٣٠٠	٢,٤٢٠	٣,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠
	علاوة زيادة الأبعاد إلى ٣٥٠ كجم/م.م و ٢ م.م و ٤٠٠ كجم/م.م (عشرة متر مكعب)	م.م	١٠	١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
	علاوة زيادة الأبعاد إلى ٤٠٠ كجم/م.م و ٢ م.م و ٤٥٠ كجم/م.م (أربعة وخمسون متر مكعب)	م.م	٤٥٠	٢٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠

مشروع كبارى القطار السريع

مقاييس أعمال كوبرى بنى سلامة وادي النظرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج. م.)	اجمالي القيمة (ج. م.)
٢٠١٥	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم /سم ^٢ ومحتوي ٥٠٠ كجم/م ^٣ (سبحانة وسبعون متر مكعب)	م ^٣	٧٧٠	٢٠٠	٢٣١,٠٠٠,٠٠٠
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢ كجم سم ^٢ علي أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او مسا يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (مقتان وستون متر مكعب) في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ للمتر	م ^٣	٢١٠	٢,٠٧٩	٨٠٠,٥٤٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزم الجزء العلوي للكوبرى box Section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /سم ^٢ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ علي أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او مسا يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر (اربعة آلاف ومائتان متر مكعب) في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ للمتر	م ^٣	٤,٠٨٠	٢,٢٣٠	١٣,٥٨٦,٤٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فرق اعمدة الكوبرى (الهاسات) مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /سم ^٢ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ علي أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او مسا يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر (مئتان وخمسة وسبعون متر مكعب) في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ للمتر	م ^٣	٢٧٥	٢,٢٢٠	٨٨٥,٥٠٠,٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حفظ سقفة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح (عشرة متر مكعب)	م ^٣	١٠	٢,٩٤٦	٢٩,٤٦٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) ووجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (١٠/١٦) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٦٨٥	٦,٨٥٠,٠٠٠
٢١	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة نيوجيرسي وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (١٠/١٦) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (الف و ستمائة متر طولي)	م.ط	١,٦٠٠	٥٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشحن وحقل كميات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكميرات العرضية لزوم الهيكل الطوي للكوبرى طبقاً لمواصفات المشروع الفئة تشمل توريد الكميات - الأكسسوارات - الأجرية - الإنكوزز - الويندجز اللازمة طبقاً للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنهوض العمل كمثل طبقاً للرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مئة وخمسون طن)	طن	١٥٠	٦٩,٠٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٣	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسمات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهائياً كمثل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢,٦٠٠	٢٧,٥٠٠	٧١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	أطوال أقل من ١٢ متر (الطن وسبعة طن)	طن	٢	٢٨,٥٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠
	أطوال أكثر من ١٢ متر (اثنان طن)	طن	٢	٢٨,٥٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠
٢٤	بالحدود توريد وتركيب ركعز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقل وأعداد الأسطح أسفل الركعز ، تكون الركعز من النوع المكونة من رقائق البوليبيرومات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الأنواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقايمة وتكون الركعز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركعز مطابقة للمواصفات الأوروبية EN ١٢٣٧٠-٢ وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركعز وراعى بوجه خاص أن يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقايمة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المكونة لها وبمقدار الانفصال تحت الاحمال وعدم تآثر خصائصها بمرور الزمن استحداثها المبكرة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملاتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جرات أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركعز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة.				

مشروع كباري القطار السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (م.ع)	إجمالي القيمة (م.ع)
١-٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركعز حمولة ٥٥٠ طن بجوابيط (شاقية بالعدد)	عدد	٨	٨٦,٠٠٠	٦٨٨,٠٠٠,٠٠٠
٢-٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركعز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بجوابيط (سنة عشر بالعدد)	عدد	١٦	١٦٨,٠٠٠	٢,٦٨٨,٠٠٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسة متر مسطح)	م ^٢	٥٠٠	٥٥	٢٧,٥٠٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس إكثريك معقاة التآكلية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشرائح المتخصصة وعمل كل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخواص قبل التوريد (شاقية ألف وخمسة متر مسطح)	م ^٢	٨,٥٠٠	١٠٥	٨٩٢,٥٠٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على أن يسمح الفاصل بحركة للفتة طبقاً للحركة الطبيعية بالعدد (١٠ سم صق ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجميع السواج الخواص المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفتة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للمقلب العمومية وكل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفصيل ذات تمديد مسجوح + ٢,٥ سم (مئة متر طولي)	مط	١٠٠	٤,٥٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) ليوبيرين مسلح + ٥ سم (عشرة متر طولي)	مط	١٠	٦,٥٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) ليوبيرين مسلح + ١٠ سم (عشرة متر طولي)	مط	١٠	١٨,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد تجرية تحميل استقصي للكوبري قبل افتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً ونظراً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	بالعدد	٢	١١٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٣١	توريد وتركيب تنفيذ عرقلة لجميع صرف مطر على الكوبري بالأبعاد التالية ٦٠ × ٦٠ × ١٥ سم والسعر يشمل عزل العرقلة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر (المصبغات الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاطة بصعود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف. (اثنان بالعدد)	بالعدد	٢	٤,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
٣٢	بالمتر المستطاع أعمال تطهير الموقع من الأنقاض والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفتة تشمل كل ما يلزم للنهوض العمل (خمس وأربعون ألف متر مسطح)	م ^٢	٤٥,٠٠٠	٦	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب حاجز من الموائير طول ٢ متر وقطر ٧٦ مم وسبك ٣ مم والشبك المجلن قطر ٣ مم بارتفاع ١,٥ متر بالإضافة لسلك شاك بارتفاع ٠,٥ متر (FENCE TYPICAL - A) (DETAILS) مثبته بالقطاع الخرساني بئلات بمبني بالأبعاد الآتية ١٠ × ٦ × ١٠ PL, ٢٢ × ٢٢ × ٢٢٠ PL وممسير قطر ١٦ مم والبند بجميع مشتات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (مئة وعشرون متر طولي)	مط	١٢٠	٣,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالعدد الفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمرکز الشدة المعنوية على خطوط شركة سويك أثناء تنفيذ وصب القطاع الصندوقي بالموقع والفتة تشمل كل ما يلزم للنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٣٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
				إجمالي أعمال الكباري	١١٤,٥٥٨,٧٠٠,٠٠٠
أعمال الطرق					
٣٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتصوية السطح بالآلات التصوية والرش بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمهيد الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية لكل متر زيادة (شاقية ألف متر مكعب)	م ^٣	٨,٠٠٠	١٨,٥	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠

مشروع كبارى القطار السريع

مقايسة أعمال كوبرى بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأصناف	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	اجمالي القيمة (م.ج)
٣٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صلابة لتردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزججة أو المرور على مناطق للوصول للمواقع وذلك طبقاً لإفادة طقم الإشراف والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين وطبقاً لمصفات النقل. مسافة النقل ٤٠ كم. يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المستندة المشرفة عن المحاجر. (ثلاثون ألف متر مكعب)	م³	٣٠,٠٠٠	٨٦	٢,٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتخرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والألأزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المطلوبة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. مسافة النقل ٢٠ كم. - احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. (الف ومقتان متر مكعب)	م³	١٠,٢٠٠	٢٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٨	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة علفية سمك ١٥ سم لحملية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م³ من دولوميت متخرج + ٣٠,٤ م³ رمل حرس + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عالى على أن يكون السن نظيف ومضبول والزلن خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم / سم³ ويحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تخدم بالقوى المضغوطة سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (مئة متر مسطح)	م²	١٠٠	١٩٧	١٩,٧٠٠,٠٠٠
٣٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC٢٠ بمعدل ١,٢ كجم/م² فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (سنة عشر ألف وخمسمائة متر مسطح)	م²	١٦,٥٠٠	٢٧,٥	٤٥٣,٧٥٠,٠٠٠
٤٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من الببتومين السائل متوسط التطاير RC٢٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م² فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (سنة عشر ألف وخمسمائة متر مسطح)	م²	١٦,٥٠٠	٩,٢٠	١٥١,٨٠٠,٠٠٠
٤١	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك واستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او مايلاتها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (سنة عشر ألف وخمسمائة متر مسطح)	م²	١٦,٥٠٠	١٥٤	٢,٥٤١,٠٠٠,٠٠٠
٤٢	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك واستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او مايلاتها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (عشرة متر مسطح)	م²	١٠	١٤٣	١,٤٣٠,٠٠٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك واستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او مايلاتها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (سنة عشر ألف وخمسمائة متر مسطح)	م²	١٦,٥٠٠	١٣٧	٢,٢٦٠,٥٠٠,٠٠٠

مشروع كباري القطر السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج. م.)	اجمالي القيمة (ج. م.)
٤٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم مصنوعة تتكون من ٣ م ٠.٨ من ملموس لا يزيد أكبر بعد للحيبيات عن ١.٥ سم + ٣ م ٠.٤ + ٣ م ٠.٤ سم أسمنت ويتم تركيب البرودة على قرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرودة والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي)	م.ط	٥٠٠	١٣٤	٢٧,٠٠٠,٠٠٠
٤٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بأبعاد ٥٠×٣٠×١٥/١٥ سم مصنوعة تتكون من ٣ م ٠.٨ من ملموس لا يزيد أكبر بعد للحيبيات عن ١.٥ سم + ٣ م ٠.٤ + ٣ م ٠.٤ سم أسمنت ويتم تركيب البرودة على قرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرودة والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي)	م.ط	٥٠٠	١٢٨	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
٤٦	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م ٠.٨ من ملموس لا يزيد أكبر بعد للحيبيات عن ١.٥ سم + ٣ م ٠.٤ + ٣ م ٠.٤ سم أسمنت ويتم صب البرودة على قرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالموم المضغوطة سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي)	م.ط	٥٠٠	١٢٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٧	بالمتر الطولي توريد وصب قامة من الخرسانة العادية أسفل البرودات بأبعاد ١٠×٣٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وستة متر طولي)	م.ط	١,٦٠٠	٤٤	٧٠,٤٠٠,٠٠٠
٤٨	بالمتر الطولي دهان برودة بأبعاد ١٠×٣٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وستة متر طولي)	م.ط	١,٦٠٠	١٧,٢٥	٢٧,٦٠٠,٠٠٠
٤٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك الخرساني طبقاً لتعليمات المعتمد بإجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتشطيب ونحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة.	م.م	١٠	١٧٠	١,٧٠٠,٠٠٠
١-٤٩	مقاس ١٠٠×٢٠×٦٠ سم (عشرة متر مسطح)	م.م	١,٠٠٠	١٨٥	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٢-٤٩	مقاس ١٠٠×٢٠×٨٠ سم (الف متر مسطح)	م.م	١٠	٢٢٥	٢,٢٥٠,٠٠٠
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك بركوري (عش تحمل هارد ستون) مقاس ٤٠×٦٠ سم ونحو الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات (عشرة متر مسطح)	م.م	١٠		
٥١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لذلك أسفل التلبيطات والارضيات الخرسانية وتشكيل لذلك أسفل وحدات الأنترلوك وخرسانة سمك ١٠ سم من ٣ م ٠.٨ من ملموس متدرج وتشكيل ٣ م ٠.٤ رمل حرش و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي على أن يكون السطح نظيف ومقول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر مسطح)	م.م	١٠	١٤٢	١,٤٢٠,٠٠٠
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من الصبغ الصناعي جيوتكستيل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	١٥٠	٣١	٤,٦٥٠,٠٠٠
١-٥٢	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ ج/م ^٢ (مئة وخمسون متر مسطح)	م.م	١٥٠	٤٣	٢٧٥,٢٠٠,٠٠٠
٢-٥٢	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ ج/م ^٢ (سنة آلاف وأربعمائة متر مسطح)	م.م	١٥٠	٦٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
٣-٥٢	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ ج/م ^٢ (مئة وخمسون متر مسطح)	م.م			
٥٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من الصبغ الصناعي جيوتكستيل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٢٠,٠٠٠	٤٤	٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠
١-٥٣	ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الإجهاد Biaxial (عشرون ألف متر مسطح)	م.م	٥٠٠	٤٧	٢٣,٥٠٠,٠٠٠
٢-٥٣	ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الإجهاد Biaxial (خمسة متر مسطح)	م.م			

مشروع كباري القطر السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة (ج.م)	اجملي القيمة (ج.م)
٥٤	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) مطبق الحلكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند التهيبة ١٥ سم ومسطح الحلكس مستوي يتحمل حمل رأسي (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أفقي (٦ طن) للخابور لا يقل عن (١٠٠) كجم مزود بشريحة عسمة بلورية ٢١ عسمة على شكل مستطيل ٧٥×١٥ سم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E8٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت الحلكس تتحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (خمسون بالعدد)	بالعدد	٥٠	٢٩	١,٩٥٠,٠٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) مطبق الحلكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند التهيبة ١٥ سم ومسطح الحلكس مستوي يتحمل حمل رأسي (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أفقي (٦ طن) للخابور لا يقل عن (١٠٠) كجم مزود بشريحتين عسمة بلورية ٢١ عسمة على شكل مستطيل ٧٥×١٥ سم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E8٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت الحلكس تتحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (عشرون بالعدد)	بالعدد	٢٠	٥٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٥٦	بالمتر الممسح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون على أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M ٢٤٩ والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الريزن ١٠ % من التفتاير ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (ألف متر مسطح)	م٢	١,٠٠٠	١١٢	١١٢,٠٠٠,٠٠٠
٥٧	بالمتر الممسح أعمال تخطيط بلتوية السخنة بنظام البثق Extruder بسمك يقل عن ٢,٥ وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة متر مسطح)	م٢	٥٠٠	٢٢٨	١١٤,٠٠٠,٠٠٠
٥٨	بالمتر الممسح أعمال تخطيط سطحي للطريق على السخن سمك لا يقل عن ١,٥ سم على أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات المصرية البريطانية والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الريزن ١٠ % من التفتاير ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة متر مسطح)	م٢	٥٠٠	١٤٥	٧٢,٥٠٠,٠٠٠
٥٩	بالمتر الممسح توريد وتركيب حوائط مسندة لنظام (Reinforced Earth) (Reinforced panels) المقامة من الإشتباري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الرمد لمسافة ٣٠ سم خلف البوكلات بلمن مقاس ٢-١ سم (فلتز) كما يشمل البند تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية لاجهاد ٢٠٠ كجم / سم / بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسيج الصناعي طبقاً لمواصفات المعتمدة من الإشتباري وتعليمات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللمنة شاملة بالمتر الممسح وذلك للإرتفاعات المختلفة التالية :	م٢	١٠	١,١٩٤	١١,٩٤٠,٠٠٠
١-٥٩	حقل مسند بارتفاع حتى ٦ متر . (عشرة متر مسطح)		١٠	١,١٩٤	١١,٩٤٠,٠٠٠
٢-٥٩	حقل مسند بارتفاع ٦ الى ٩ متر . (ثلاثة الاف و ستون متر مسطح)		٣,٠٦٠	١,٣٩٠	٤,٢٥٣,٤٠٠,٠٠٠
اجملي أعمال الطرق					١٤,٦٣٤,٦٩٠,٠٠٠
أعمال الكهرباء والاشارة					
٦٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود النار بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على السخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم وزاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجاويط والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سرائيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود و روزيطة توصيل طبقاً لأصول الصناعة (ثلاثون بالعدد)	بالعدد	٣٠	٢٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود النار بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على السخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم وزاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجاويط والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سرائيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود و روزيطة توصيل طبقاً لأصول الصناعة (خمسة عشر بالعدد)	بالعدد	١٥	٢٧,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (١٥×١٨٥×٣) مم ٢ الموميوم مسلح واللمنة تشمل النقل ورفع جميع الكابلات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٦٥٠	٦,٥٠٠,٠٠٠
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تراز ١٠×٢٠ سم من الصاج المجلفن واللمنة تشمل النقل ورفع جميع الكابلات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	م.ط	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠

مشروع كباري القطار السريع

مقايضة أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (ج.م.)	إجمالي القيمة (ج.م.)
٦٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (LP - IN) واللوحة ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحة مزودة بخلاية ضوئية مدهونة اليكتروستاتيكا طبقاً للمواصفات والرسومات والقيمة تشمل جميع المعدات اللازمة وبلغ جميع الكراتات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	بالعدد	١	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠
٦٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكاشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت امبير والبند محمل عليه كليات الجهد المتوسط وغير محمل عليه القاعدة الخرسانية والقيمة تشمل جميع المعدات اللازمة في النقل والتركيب وبلغ جميع الكراتات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٦	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه اسود قطر ٢٠٠ مم سمك ١١,٩ مم SDR17 طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف لزوم تحذية كليات كهرباء أسفل مسار القطار السريع (اثنان وسبعون متر طولي)	م.ط	٧٢	١,٦٠٠	١١٥,٢٠٠,٠٠٠
٦٧	بالعدد توريد وتركيب كشف انقار قدرة ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ مم مقف PVC داخل مواسير مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٢٩ مم لتنفيذ كشافات الإنارة ومحمل على البند والمواسير وجميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة (خمسة عشر بالعدد)	بالعدد	١٥	٨,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥*٤ مم ٢ الموليوم مسلح داخل اسورة PVC وقطر ٣ بوصة والقيمة تشمل النقل وبلغ جميع الكراتات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	م.ط	١٠٠	٣٣٥	٣٣,٥٠٠,٠٠٠
	إجمالي أعمال الكهرباء				٣,١٢٠,٢٠٠,٠٠٠
أعمال صرف مياه الأمطار					
٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبرى والبند شامل توريد وتركيب جميع الأكسسوارات والقطع الخاصة لزوم التركيب من اكواع وجلب وقفلان وخلافه طبقاً للعينات واللوحة المعتمدة والبند شامل المساقلات اللازمة للعمل والمعدات وجميع الاختبارات اللازمة لتسليم الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٣٥٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
٧٠	بالعدد تنفيذ غرفة تجميع وصرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP للأبعاد طبقاً للرسومات الهندسية مع عمل جريلات والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسريب المياه وتوريد غطاء من GRP ووصلة مواسير PVC الي عمود الصرف (اثنان بالعدد)	بالعدد	٢	٤,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
	إجمالي أعمال صرف مياه الأمطار				١٢,٥٠٠,٠٠٠
	إجمالي قيمة المقايضة				١٣٢,٣٤٣,٠٩٠,٠٠٠
مائة و اثنان وثلاثون مليون و ثلاثمائة و ثلاثون الف و تسعون جنيها					
<p>١- في حلة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتعمية وإدارة الطرق يضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي:</p> <p>أ - أعمال توريد الأتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه/م^٢ هنسي</p> <p>ب - أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه/م^٢ هنسي</p> <p>ج - أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه/م^٢</p> <p>٢- اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضات الشركة عليها.</p> <p>٣- طبقاً للفتون يتم يتم صرف فروق الاسعار سواء بزيادة أو النقصان للبنود المنوه عنها بالتعلق مثل الحديد بجميع أنواعه والأسمنت والبيتومين والسولار.</p> <p>٤- الاسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الأسمنت ١٣٥٠ جنيه للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والصب.</p> <p>٥- الاسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد القطاعات ٢٨٠٠٠ جنيه للطن على أرض المصنع غير شامل التركيب والتشغيل والنقل.</p> <p>٦- الاسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد التسليح ١٨٠٠٠ جنيه للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب.</p>					

إستشاري الهيئة
المهندس/هاني السباعي

مدير مشروع الشركة
المهندس/ شريف عبد السلام القبطي





N.E.C.B



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون
المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

دفتر حصر مستخلص جاري رقم (3)

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

بيان 3 مشروع كوبري السيارات تقاطع القطر السريع عند الكيلو 220+380 مع طريق بني سلامة

رقم البند	البند	الوحدة	السعر	كمية العقد	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	الإجمالي
1	بالمتر الطولي أعمال الرقع المسامي للمرافق والمعرضات	م.ط	11	2400	2040.000	0.000	2040.000	97%	21766.80
2	بالمتر الطولي تنفيذ أعمال الجسات بالير	م.ط	400	330	330.000	0.000	330.000	97%	128040.00
5	بالمتر المكعب تكسير وإزالة إسفلت وطبقات أسفل	م ³	65	1000	69.107	0.000	69.107	97%	4357.20
6	أعمال نقل مكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	عدد	246,000	1	1.000	0.000	1.000	97%	238620.00
7	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم وحمل التشغيل 450 طن	م.ط	4500	1188	1188.000	0.000	1188.000	97%	5185620.00
8	بالحدود تنفيذ اختبار على خراوق عامل قطر 120 سم	عدد	190000	1	1.000	0.000	1.000	97%	184300.00
9	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمسلة يدوية في ارض الموقع العام	م ³	90	265.6	265.600	0.000	265.600	97%	23186.88
10	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م ³	90	2500	1521.099	0.000	1521.099	97%	132791.94
11	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م ³	145	1300	374.108	0.000	374.108	97%	52618.29
13	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات واللباطات الانتقالية	م ³	1750	100	54.768	0.000	54.768	97%	92968.68
15	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات واللباطات الانتقالية	م ³	2420	1300	1211.520	0.000	1211.520	97%	2843922.05
15-1	علاوة زيادة الاجهاد الي 350 كجم /سم ² و محتوى 400 كجم/م ³	م ³	100	444	443.520	0.000	443.520	97%	43021.44
15-2	علاوة زيادة الاجهاد الي 400 كجم /سم ² و محتوى 450 كجم/م ³	م ³	200	768	768.000	0.000	768.000	97%	148992.00
16-1	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	م ³	3079	261.37	76.778	0.000	76.778	97%	229307.48
16-2	أعمدة أعلى من 6 متر	م ³	3179	569219.60	184.594	0.000	184.594	97%	569219.60
17-1	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزم الجزء الطوي للكوبرى box Section شامل اللبابة السفلية والوحدات واللبابة العلوية وكبستها	3330	4080	601212.35	212.405	0.000	212.405	85%	601212.35
17-2	ارتفاع أعلى من 6 متر	م ³	3430	4187293.58	1436.218	0.000	1436.218	85%	4187293.58
18-1	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكميرات العرضية فوق الأعمدة (الهامات)	3220	330.67	589010.77	188.580	0.000	188.580	97%	589010.77
18-2	ارتفاع أعلى من 6 متر	م ³	3320	457573.75	142.086	0.000	142.086	97%	457573.75
22	بالطن توريد و تركيب وشد وحقق كابلات عالية الإجهاد	طن	69000	150	70.056	0.000	70.056	70%	3383704.80
23	بالطن توريد و تركيب ورس التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	27500	2600	945.383	168.999	1114.382	97%	29726139.85
24	بالحدود توريد و تركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والإشترطات الموضحة بالجدول والرسومات								
24-2	بالحدود توريد و تركيب ركائز حمولة أعلى 550 طن بجوابط	عدد	168000	16	8.000	0.000	8.000	87%	1169280.00
25	بالمتر للمربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على الياق	م ²	55	1229.72	1229.716	0.000	1229.716	97%	65605.35
32	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	م ²	6	45000	16000.000	0.000	16000.000	97%	93120.00
34	بالحدود للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لحمل تمرکز الشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد	عدد	300000	2	2.000	0.000	2.000	97%	582000.00
66	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه أسود قطر 200 مم * سمك 11.9 مم	م.ط	1600	72	72.000	0.000	72.000	97%	111744.00



مكتب النيل للاستشارات
استشاري الهيئة



المكتب الفني

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

بيان اجماليات لنيل رقم 1-15

البيانات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	البيانات	رقم البند في المقايضة
	443.52	443.52	0.00	443.52	م3	علاوة زيادة الاجهاد الي 350 كجم /سم2 و محتوى 400 كجم/م3	Item No.: 15-1
	443.52	اجمالي ما تم تنفيذه					
	0.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	443.52	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	443.52	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد أبو دققة
م / أحمد أبو دققة

مكتب النيل الاستشاري الهندسي
Nile Engineering Consulting Bureau
م / هاني السباعي
م / هاني السباعي

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / شريف القبطان
CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

كوبري بني سلامة

[illegible]

مدير مشروع الهيئة

إستشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

بيان اجماليات للبيد رقم 2-15

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايمة	الوحدة	البيد	رقم البيد في المقايمة
	768.00	768.00	0.00	768.00	م3	علاوة زيادة الاجهاد الي 400 كجم /سم2 و محتوي 450 كجم/م3	Item No.: 15-2
	768.00					اجمالي ما تم تنفيذه	
	0.00					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	768.00					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	768.00					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري



م / أحمد أبو دقفة



مكتب النيل الاستشاري الهندسي
Nile Engineering Consulting Bureau
م / شريف القبطان

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات





SINCE 1969

[illegible]

1

Logo of Nile Engineering Consultants, featuring a green star with Arabic text and a signature.

مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النظرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

بيان اجماليات للبند رقم 23

رقم البند في المقاييس	البند	الوحدة	كمية المقاييس	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي	الملاحظات
Item No.: 23	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسور يشمل التقطيع طبقاً للرسومات ولا يشمل عمل الوصلات و السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسور يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	طن	2600.00	945.383	168.999	1114.38	
	اجمالي ما تم تنفيذه					1114.38	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					945.383	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					168.999	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					1114.38	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد أبو دقينة

مكتب النيل الاستشاري الهندسي
Nile Engineering Consulting Bureau
م / هاني السباعي

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / شريف القبطان
Concrete Engineering & Contracting

العدد

الوحدة

التوصيف

2

الخوازيق

القواعد

الأعمدة

الهوامت

اجمالی الصفحة

فقط/ ستمائة وسبعة عشر و (١٠٦٦) طن فقط لا غير

مدير مشروع الهيئة

إستشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

انوار الحق

رجب الفيل الهندس الإسلام
صاوي

مدير مشروع الشركة

۴

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون
المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

حصر مستخلص جاري رقم (3)

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



كوبري بني سلامة

ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	البند	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	م
1-15 - علاوة زيادة الاجهاد الي 350 كجم /سم² و محتوي 400 كجم/م³							
221.760	2.2	7	7.2	2	م³	محور 2	1
221.760	2.2	7	7.2	2	م³	محور 3	2
443.520	اجمالى الصفحة						



مدير المشروع




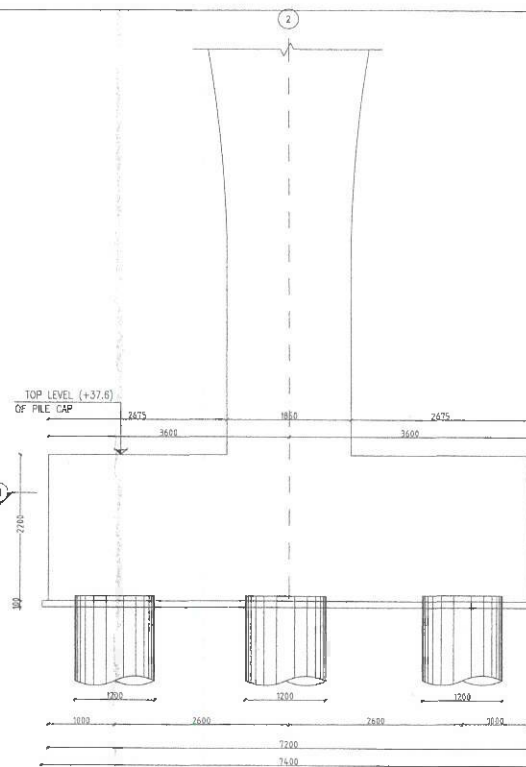










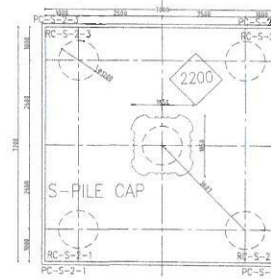






clarify as per attached sketch drawings.

Modify as per Approved Form work details

* Refer to attached
note for General
Comments



CONCRETE DIMENSIONS FOR FOOTING AT AXIS (2)

Preheat Plan	Reel Number	Total Length [mm]	Yield Stress	Symbol [mm]	ABCDE [mm]	Heat Treat [kg]	Mass [kg]	Weight [kg]	Volume [cm ³]	Weight [kg]
FA2-1	92	32	4.00		A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00	6.594	4	4.066	0.08	0.08
FA2-2	92	32	4.00		A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00	6.594	32	2.904	21	2.904
FA2-3	144	18	4.00		A = 1.80 a = 1.00 A = 1.80 a = 1.00 A = 1.80 a = 1.00	1.936	21	3.078	67	3.078
FA2-4	144	32	4.00		A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00	6.594	67	9.636	21	9.636
FA2-5	140	18	4.00		A = 1.80 a = 1.00 A = 1.80 a = 1.00 A = 1.80 a = 1.00	1.936	21	3.048	67	3.048
FA2-6	140	32	4.00		A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00	6.594	38	6.303	67	6.303
FA2-7	140	32	4.00		A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00 A = 3.20 a = 1.00	6.594	38	9.557	67	9.557
FA2-8	16	16	4.00		A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00	1.303	19	3.303	303	3.303
FA2-9	16	16	4.00		A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00	1.303	10	16.4	16.4	16.4
FA2-10	16	16	4.00		A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00	1.303	19	3.303	303	3.303
FA2-11	192	12	4.00		A = 1.20 a = 1.00 A = 1.20 a = 1.00 A = 1.20 a = 1.00	0.563	3	5.61	56.3	5.61
FA2-12	192	12	4.00		A = 1.20 a = 1.00 A = 1.20 a = 1.00 A = 1.20 a = 1.00	0.563	3	2.90	2.90	2.90
FA2-13	32	16	4.00		A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00	1.303	11	3.41	3.41	3.41
FA2-14	128	12	4.00		A = 1.20 a = 1.00 A = 1.20 a = 1.00 A = 1.20 a = 1.00	0.563	27	2.27	2.27	2.27
FA2-15	16	16	4.00		A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00	1.303	6	1.89	1.89	1.89
FA2-16	20	16	4.00		A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00 A = 1.60 a = 1.00	1.303	6	1.26	1.26	1.26

PC-N-2	POSITION X	POSITION Y
PC-N-2-5	561050.227	849251.071
PC-N-2-6	561053.854	849257.291
PC-N-2-7	561043.835	849254.799
PC-N-2-8	561047.461	849261.019

RC-N-2	POSITION X	POSITION Y
RC-N-2-5	561050.191	849251.208
RC-N-2-6	561053.717	849257.255
RC-N-2-7	561043.971	849254.835
RC-N-2-8	561047.497	849260.882

PC-S-2	POSITION X	POSITION Y
PC-S-2-1	561058.520	849246.235
PC-S-2-2	561062.146	849252.454
PC-S-2-3	561052.127	849249.962
PC-S-2-4	561055.754	849256.182

RC-S-2	POSITION X	POSITION Y
RC-S-2-1	561058.484	849246.371
RC-S-2-2	561062.010	849252.418
RC-S-2-3	561052.264	849249.998
RC-S-2-4	561055.790	849256.045

GENERAL NOTES:

- 1- ALL PROPOSED AND EXISTING MUST BE CHARGED SEPARATE
CONNECTIONS**
- 2- PUMP STATION AND RECOVER LIFTING CAPACITY
ARE TO BE ACCORDING TO THE WELL REPORT**
- 3- TYPICAL REQUIREMENTS SHOULD BE SPECIFIED
LEAVING COLLECTOR ON TRUCK SPACES**
- 4- THE INFORMATION MUST FOLLOW ALL RULES &
REGULATIONS IN THE NATIONAL CODE OF PRACTICE FOR
M.C. CONSTRUCTION INC. (2008), LATEST EDITION**
- 5- THE LEAVING LOAD OR THE BRIDGE IS ACCORDING TO
THE JCRS OF LOADS AND JOINTS, LATEST EDITION**
- 6- SEE GENERAL NOTES APPENDIX TO THIS SET**
(2014-09-23-2021-10-23-2022-01-27-2023-01-27)

7- Unless noted otherwise in the drawings, the following classes of concrete shall be used throughout:

Location	Calculated Q _{max} (Calculated Q _{max})
PERC	100 kg/ha/yr (100 kg/ha/yr)
PERC CAPS	100 kg/ha/yr (100 kg/ha/yr)

British Yield used for maximum annual use is 100 kg/ha/yr as per
 Approved PERC Grade 52 (400 kg/ha/yr) with yield strength not less than
 100 kg/ha and carbon content not greater than 0.2 percent.

8- Potassium Chloride (KCl) (100 kg/ha/yr) (100 kg/ha/yr)

SYMBOLS:
1-N-PILE: NORTHERN PILE
2-S-PILE: SOUTHERN PILE

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1950

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

✓ 100% ✓

2/22/27

7080

1990

10/10/1918

Dr. Marwari

11. The El-Khattab St.

1. *Environ. Toxicol. Chem.* 1995, 14, 1137-1144.

THE DRAWING WITH CONTENTS ARE PROPRIETARY OF ASCE &
AND SHALL NOT BE COPIED OR USED FOR ANY PURPOSE WITHOUT

REVISIONS:

REV	DESCRIPTION	DATE
01	ISSUED FOR BIDDING	07/20/00
02	REVISED TO ADD 1" DIA. VERTICAL REINFORCING BARS AT 48" ON CENTER	07/20/00

2000

المينق و الزباب و النمل العج

OWNER CONSULTANT
FOR STRUCTURAL DESIGN

File Engineering Consulting Service
Prof. Dr. Ing. / P.22-Radi
Tübingen / 70564 Stuttgart
Dr. Ing. / 70564 Stuttgart

2000 年 12 月 1 日
 2000 年 12 月 1 日

CONTRACTOR CONSULTANT
DR. MAITWAN TAREK (PHD)
 181 Canal Bay, Doha, P.O. Box 11111, Qatar

PROJECT:
شروع القطار المرموم (المطبخ - العاصمة - الدمام)

DRAWING TITLE: Project Daily Status

CONCRETE REINFORCED WITH STEEL (2)



















NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4	NO. 5	NO. 6	NO. 7	NO. 8	NO. 9	NO. 10	NO. 11	NO. 12	NO. 13	NO. 14	NO. 15	NO. 16	NO. 17	NO. 18	NO. 19	NO. 20	NO. 21	NO. 22	NO. 23	NO. 24	NO. 25	NO. 26	NO. 27	NO. 28	NO. 29	NO. 30	NO. 31	NO. 32	NO. 33	NO. 34	NO. 35	NO. 36	NO. 37	NO. 38	NO. 39	NO. 40	NO. 41	NO. 42	NO. 43	NO. 44	NO. 45	NO. 46	NO. 47	NO. 48	NO. 49	NO. 50	NO. 51	NO. 52	NO. 53	NO. 54	NO. 55	NO. 56	NO. 57	NO. 58	NO. 59	NO. 60	NO. 61	NO. 62	NO. 63	NO. 64	NO. 65	NO. 66	NO. 67	NO. 68	NO. 69	NO. 70	NO. 71	NO. 72	NO. 73	NO. 74	NO. 75	NO. 76	NO. 77	NO. 78	NO. 79	NO. 80	NO. 81	NO. 82	NO. 83	NO. 84	NO. 85	NO. 86	NO. 87	NO. 88	NO. 89	NO. 90	NO. 91	NO. 92	NO. 93	NO. 94	NO. 95	NO. 96	NO. 97	NO. 98	NO. 99	NO. 100
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

DATE	10-10-2020	TIME	10:30 AM	SCALE	1:1
DRAWING NO.					

حصر الكميات (حديد التسليح)

كوبرى بنى سلامة

حصر عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حتى محور 6 - الاتجاه البحرى

رقم	بيان الأعمال	قطر السليخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السليخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالى الطول (متر)	إجمالى الوزن (طن)	شكل السليخ
8	حديد رئيسي علوي SEC 1	25	3,856	12,000	160	1920,000	7,404	
14	حديد رئيسي سفلي SEC 1	25	3,856	6,000	160	960,000	3,702	
7 - 15	حديد الكابولي SEC 1	12	0,888	4,000	320	1280,000	1,137	
12 - 13	حديد الهونش SEC 1	12	0,888	1,000	320	320,000	0,284	
1	حديد رئيسي علوي SEC 2A	22	2,986	12,000	281	3372,000	10,069	
2	حديد رئيسي سفلي SEC 2A	18	1,999	6,000	281	1686,000	3,370	
4 - 5	حديد الكابولي SEC 2A	12	0,888	4,000	562	2248,000	1,996	
10	حديد الهونش SEC 2A	12	0,888	1,000	562	562,000	0,499	
9	حديد رئيسي علوي SEC 3	22	2,986	12,000	476	5712,000	17,056	
18	حديد رئيسي سفلي SEC 3	18	1,999	6,000	476	2856,000	5,709	
11 - 19	حديد الكابولي SEC 3	12	0,888	4,000	952	3808,000	3,382	
16 - 20	حديد الهونش SEC 3	12	0,888	1,000	952	952,000	0,845	
*1	حديد رئيسي علوي SEC 2B	22	2,986	12,000	368	4416,000	13,186	
*2	حديد رئيسي سفلي SEC 2B	18	1,999	6,000	368	2208,000	4,414	
5 - 29	حديد الكابولي SEC 2B	12	0,888	4,000	736	2944,000	2,614	
16 - 20	حديد الهونش SEC 2B	12	0,888	1,000	736	736,000	0,654	
**1	حديد رئيسي علوي SEC 2C	22	2,986	12,000	301	3612,000	10,785	
**2	حديد رئيسي سفلي SEC 2C	18	1,999	6,000	301	1806,000	3,610	
إجمالى الصفحة								90,716

Nile Engineering Consulting Bureau
مكتب الاستشارات الهندسية
بمبنى
الهندسة
الاستشارية
بمبنى
الهندسة
الاستشارية

مدير المشروع



المكتب الفني
CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

کوبري بنی سلامة

(استشاري الهندسة)

مهندس / محمد عبد الله

مدير عام

مكتب الاستشارات الهندسية

مدير المشروع



















كوبري بنی سلامة

١٢ ٧ ملو سفلي ٥

١٢ ٨ ملو سفلي ٦

المكتب الفني
CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

کوبری بنی سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
حصر عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حتى محور 6 - الإنجاعة البحرية								
		إجمالي ماسبق						١٥٤,٤١٩
1	ملو سفلي 9	١٢	٠,٨٨٨	٦,٠٠٠	١٢	٧٢,٠٠	٠,٠٦٤	
6	ملو سفلي 10	١٢	٠,٨٨٨	٩,٠٠٠	٦	٥٤,٠٠	٠,٠٤٨	
1	ملو سفلي 11	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٥٤	٦٤٨,٠٠	٠,٥٧٥	
1	ملو سفلي 12	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٥٢	٦٢٤,٠٠	٠,٥٥٤	
6	ملو سفلي 13	١٢	٠,٨٨٨	٩,٠٠٠	٦	٥٤,٠٠	٠,٠٤٨	
42	ملو سفلي 14	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٠٠	٢	١٠,٠٠	٠,٠٠٩	
54	ملو سفلي 15	١٢	٠,٨٨٨	٦,٠٠٠	٢	١٢,٠٠	٠,٠١١	
57	ملو سفلي 16	١٢	٠,٨٨٨	٢,٥٠٠	٢٠	٥٠,٠٠	٠,٠٤٤	
37	ملو سفلي 17	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٢٦	١٠٤,٠٠	٠,٠٩٢	
55	ملو سفلي 18	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٠٠	٢٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٨٩	
1	ملو علوي 1	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٦٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٦,٣٩٤	
2	ملو علوي 2	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٤٢٠	٥٠٤٠,٠٠	٤,٤٧٦	
3	ملو علوي 3	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٣٢	١٥٨٤,٠٠	١,٤٠٧	
4	ملو علوي 4	١٢	٠,٨٨٨	١١,٦٥٠	١٢	١٣٩,٨٠	٠,١٢٤	
13	ملو علوي 5	١٢	٠,٨٨٨	١١,٠٠٠	١٢	١٣٢,٠٠	٠,١١٧	
12	ملو علوي 6	١٢	٠,٨٨٨	٩,٠٠٠	١٢	١٠٨,٠٠	٠,٠٩٦	
35	ملو علوي 7	١٢	٠,٨٨٨	٨,٠٠٠	١٢	٩٦,٠٠	٠,٠٨٥	
إجمالي الصفحة							١٦٨,٦٥١	

مدير المشروع



كوبري بني سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
<u>حصر عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حتى محور 6 - الإنجاعة البحري</u>								
	إجمالي ماسبق						١٦٨,٦٥١	
35*	ملو علوي 8	١٢	٠,٨٨٨	٦,٠٠٠	١٢	٧٢,٠٠٠	٠,٠٦٤	
31	ملو علوي 9	١٢	٠,٨٨٨	٧,٠٠٠	٢٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٣٦	
24	ملو علوي 10	١٢	٠,٨٨٨	٦,٠٠٠	٢٠	١٢٠,٠٠٠	٠,١٠٧	
23	ملو علوي 11	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٤٠	١٦٠,٠٠٠	٠,١٤٢	
	إجمالي الصفحة						١٦٨,٩٩٩	
	إجمالي حصر عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حتى محور 6 - الإنجاعة البحري						١٦٨,٩٩٩	

مدير المشروع

المكتب القتي
