



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة -العلمين -مطروح)

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية

الموقف التنفيذي نصف شهري

مستخلص جاري ٨ عقد ٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
موقف تنفيذي نصف شهري	25/06/2023

إجمالي كمية الردم	697,000.00
كمية الردم المنفذ	658,000.00
نسبة تنفيذ الردم	94.40%

إجمالي كمية القطع	110,000.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	161.06%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/١٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
موقف تنفيذي نصف شهري	17/07/2023

إجمالي كمية الردم	697,000.00
كمية الردم المنفذ	663,000.00
نسبة تنفيذ الردم	95.12%

إجمالي كمية القطع	110,000.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	161.06%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
31/07/2023	موقف تنفيذي نصف شهري

697,000.00	إجمالي كمية الردم
667,000.00	كمية الردم المنفذ
95.70%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع / 

الاسم / احمد سامي
التوقيع / 
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية



من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
موقف تنفيذي نصف شهري	13/08/2023

إجمالي كمية الردم	697,000.00
كمية الردم المنفذ	677,000.00
نسبة تنفيذ الردم	97.13%

إجمالي كمية القطع	110,000.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	161.06%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية



من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي نصف شهري
05/09/2023

697,000.00	إجمالي كمية الردم
686,000.00	كمية الردم المنفذ
98.42%	نسبة تنفيذ الردم


110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية




28+600.00

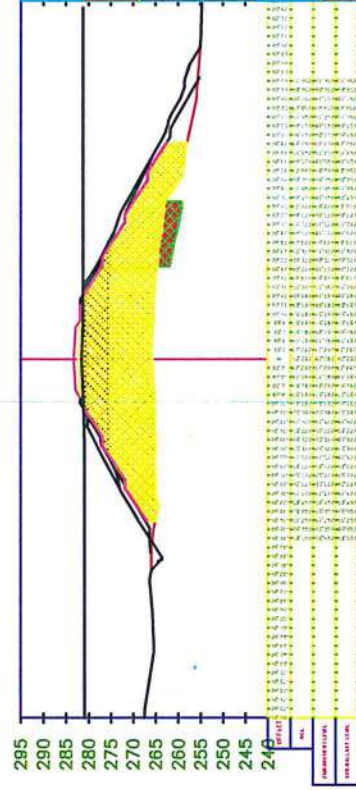

كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	963.77	26560.31	107948.84
SLOPE PROTECTION	8.90	234.35	961.82
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	49.77	622.07	622.07
fill steps	49.77	622.07	622.07

28+625.00

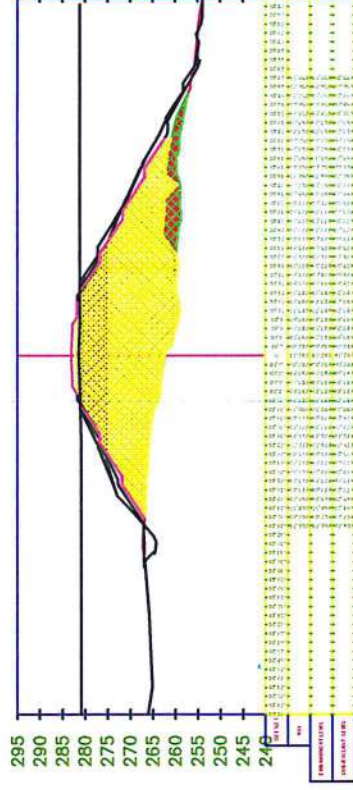

كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1073.67	25467.93	133416.78
SLOPE PROTECTION	8.88	222.35	1184.18
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	78.51	1603.44	2225.51
fill steps	78.51	1603.44	2225.51

28+650.00




كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	953.62	25341.04	158757.81
SLOPE PROTECTION	8.94	222.84	1407.02
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	85.41	2048.98	4274.49
fill steps	85.41	2048.98	4274.49

28+675.00




كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	923.09	23458.82	182216.63
SLOPE PROTECTION	9.29	227.90	1634.91
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	1067.60	5342.09
fill steps	0.00	1067.60	5342.09

28+700.00

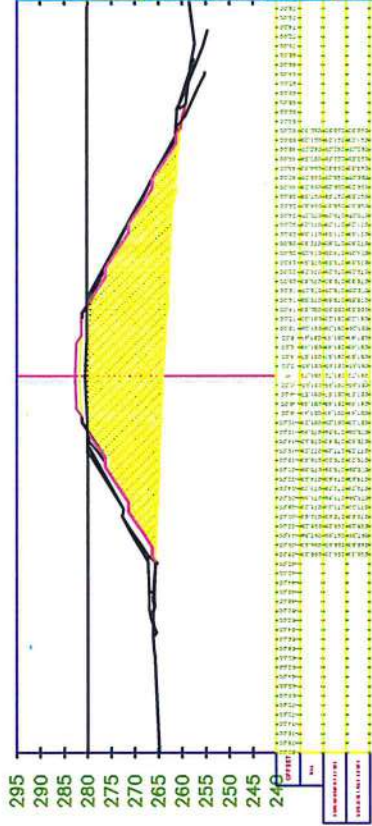


كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	950.42	23418.83	205635.46
SLOPE PROTECTION	9.73	237.77	1872.69
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

28+725.00

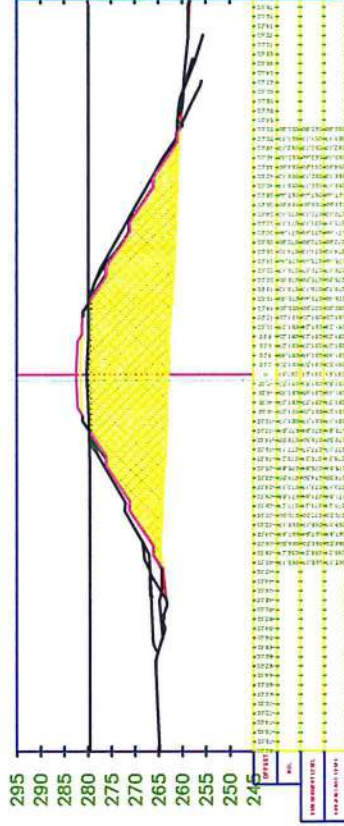


كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1016.84	24590.71	230226.17
SLOPE PROTECTION	9.95	246.00	2118.69
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

28+750.00

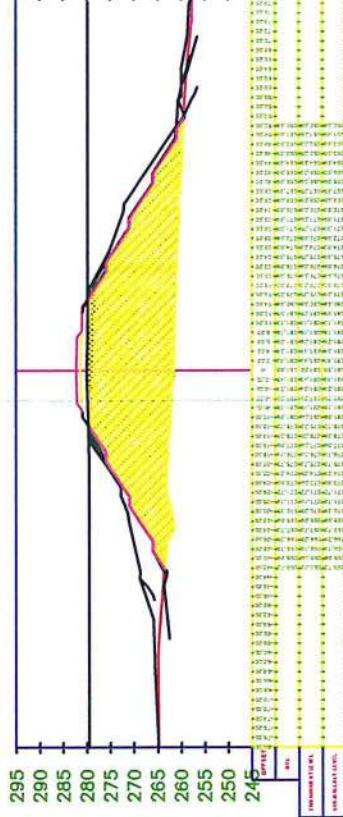

كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1111.99	26610.38	256836.55
SLOPE PROTECTION	10.35	253.69	2372.38
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

28+775.00

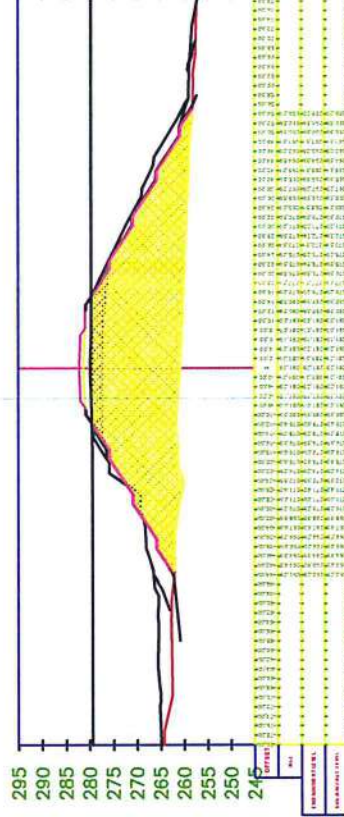


كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1199.63	28895.20	285731.75
SLOPE PROTECTION	10.68	262.88	2635.26
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

28+800.00



كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1284.65	31053.41	316785.16
SLOPE PROTECTION	10.82	268.77	2904.02
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

28+825.00

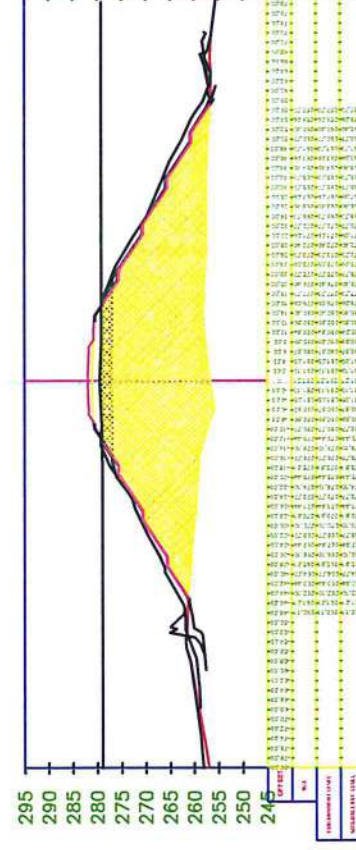


كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1401.49	33576.74	350361.90
SLOPE PROTECTION	11.16	274.69	3178.71
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

28+850.00




كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1531.55	36663.04	387024.94
SLOPE PROTECTION	11.86	287.63	3466.34
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

28+875.00

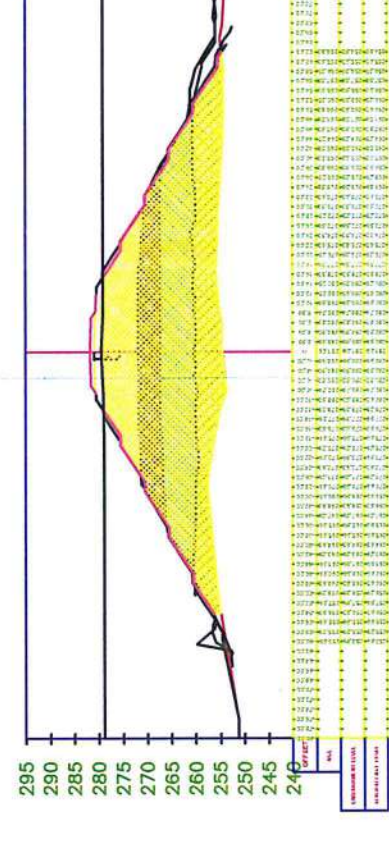


كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1720.69	40653.03	427677.97
SLOPE PROTECTION	13.30	314.43	3780.76
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

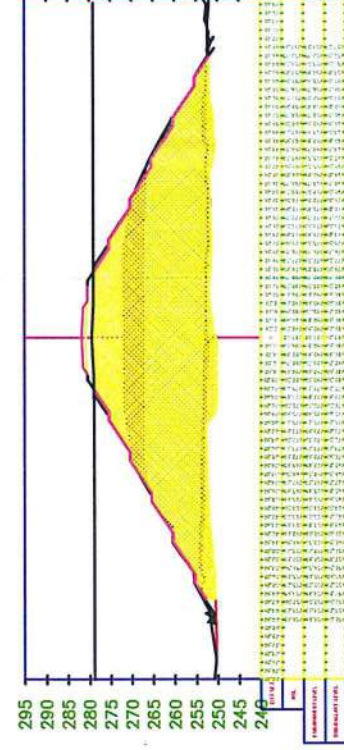


كميات ختامية		
Material Name	Area	Cumulative Volume
اجمالي كميات الرمم	2199.31	476678.01
SLOPE PROTECTION	14.96	4133.97
كميات ختامية		
Material Name	Area	Cumulative Volume
cut steps	0.00	5342.09
fill steps	0.00	5342.09




كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي الكميات الردم	2360.57	56998.47	533676.48
SLOPE PROTECTION	15.62	382.27	4516.24
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

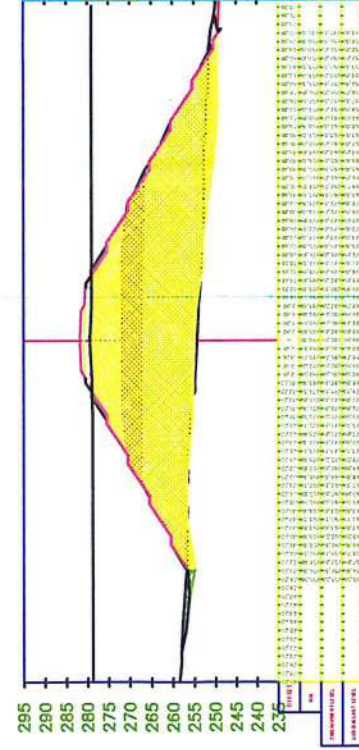

كميات ختامية		
Material Name	Area	Cumulative Volume
اجملى الكميات الرمم	1917.10	587147.33
SLOPE PROTECTION	14.68	4894.99
كميات ختامية		
Material Name	Area	Cumulative Volume
cut steps	0.00	5342.09
fill steps	0.00	5342.09

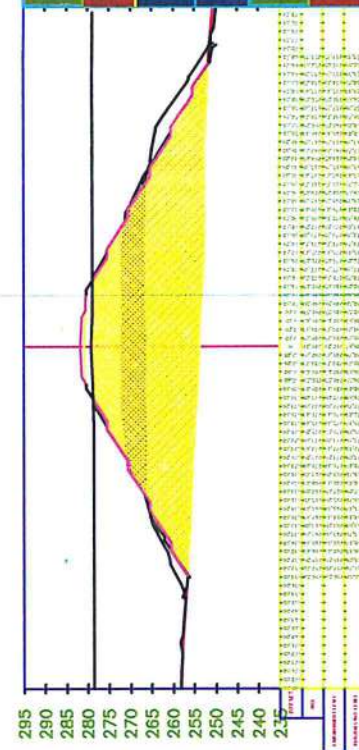


كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1873.31	47380.21	634527.54
SLOPE PROTECTION	13.81	356.09	5251.08
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09

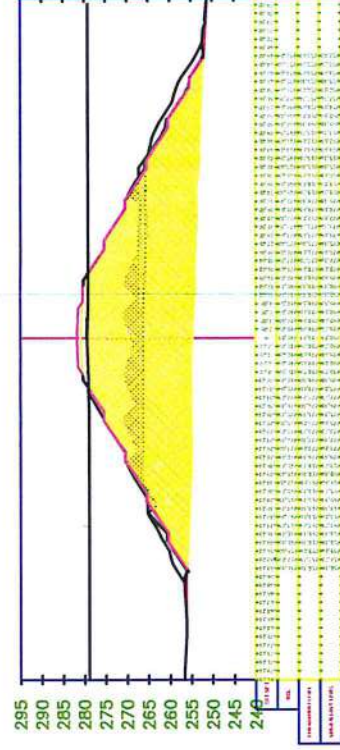


كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي كميات الردم	1829.17	45949.52	680477.06
SLOPE PROTECTION	13.80	342.70	5593.78
كميات ختامية			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
cut steps	0.00	0.00	5342.09
fill steps	0.00	0.00	5342.09


29+630.10

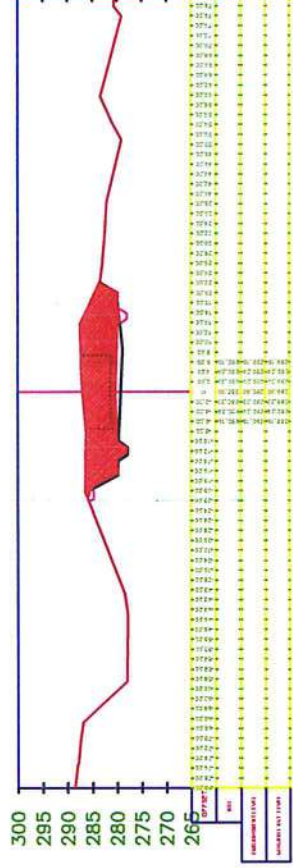

29+652.35

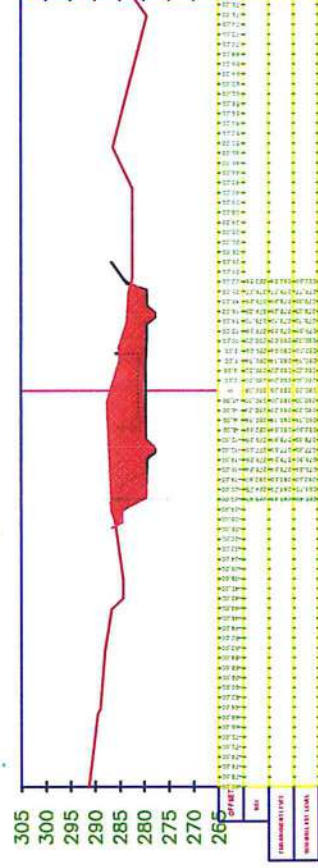


29+675.00

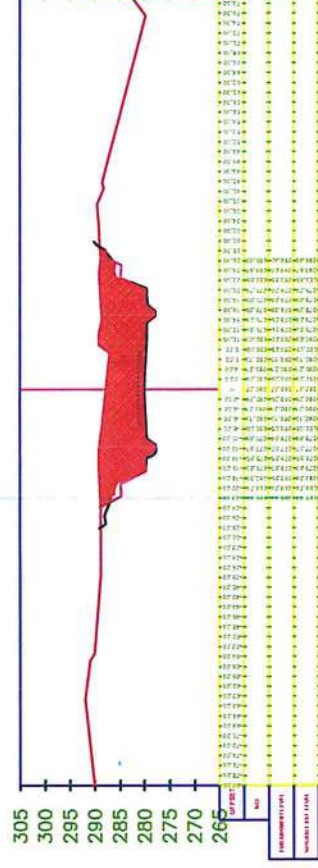

التمديد


29+700.00

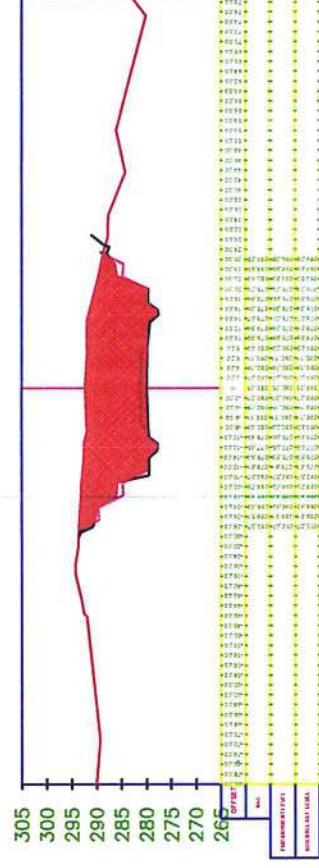

الشاهدي للمقاولات المعمارية
و المنشآت الهندسية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
م. ش. ٨٩٩٩١
م. ش. ٤٥٣ - ١٩٠
٥/١٣/٢٠١٦


مستدوع القنصل السعوي
م. ش. ٨٩٩٩١
م. ش. ٤٥٣ - ١٩٠

29+725.00

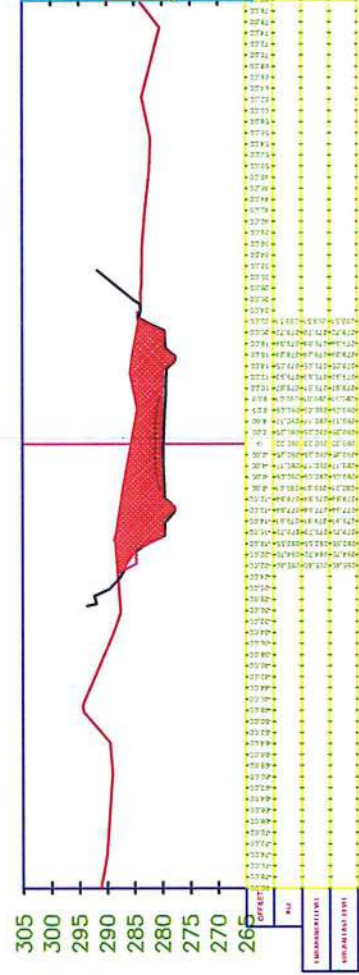


Material(s) at Station 29+725.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	256.96	10045.52	34767.66

29+750.00

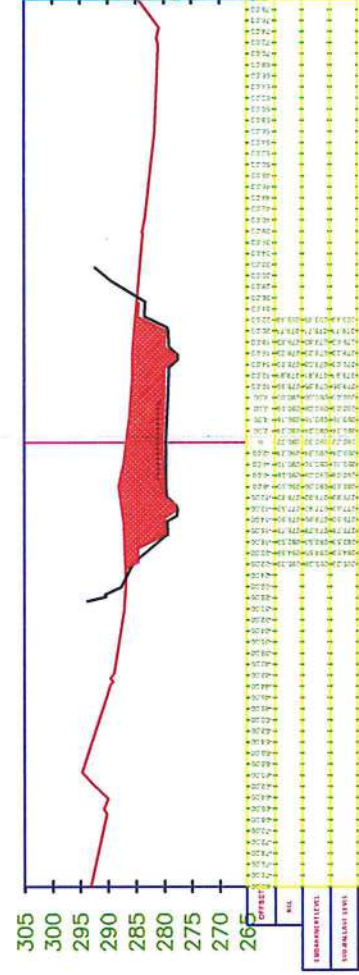


Material(s) at Station 29+750.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	278.37	6691.61	41459.27

29+775.00

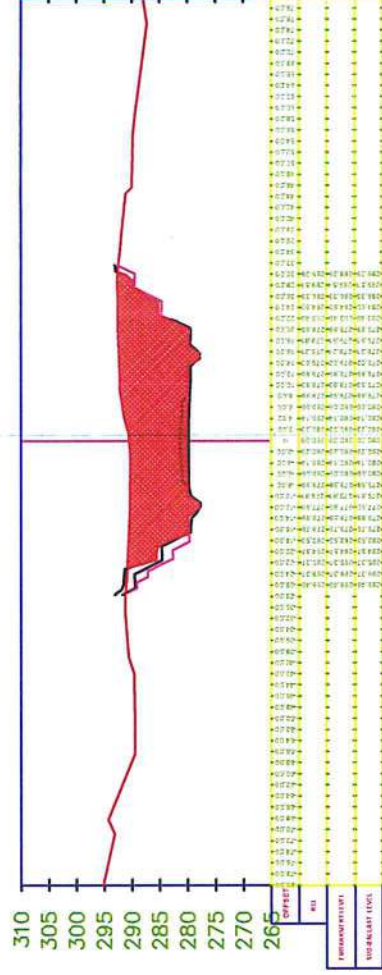

Material(s) at Station 29+775.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	518.30	9958.32	51417.59

29+800.00

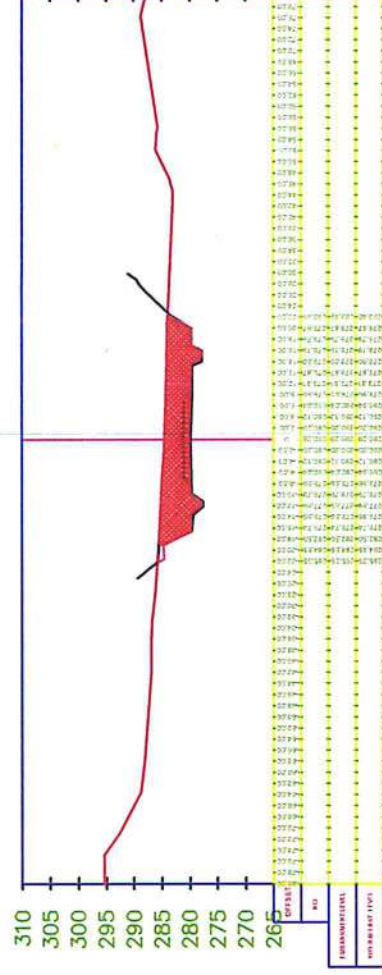


Material(s) at Station 29+800.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	188.64	8836.73	60254.32



مشروع القنصلية
بمنطقة استثمار القاهرة
من ٢٩٧ ص ٢٩٨ م ١٩٠


29+825.00

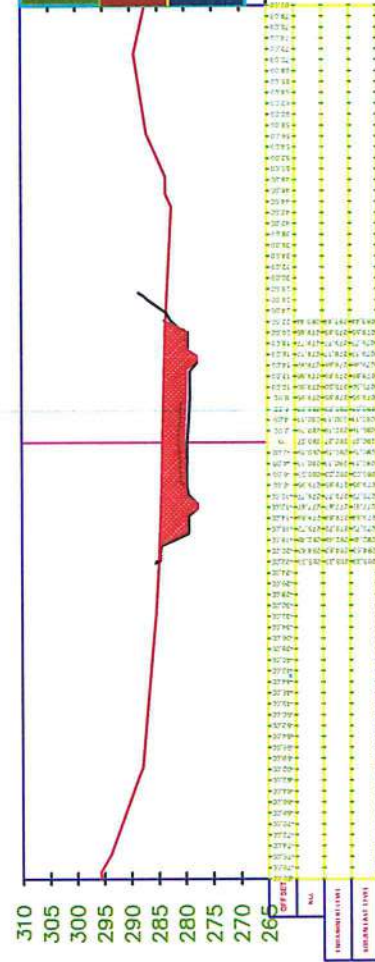

Material(s) at Station 29+825.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	172.02	4508.22	64762.53

265


29+850.00

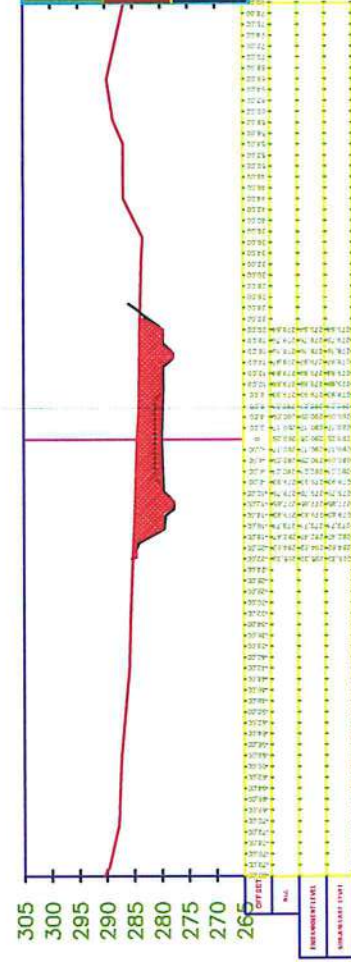

Material(s) at Station 29+850.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	182.19	4427.58	69190.12

265


29+875.00

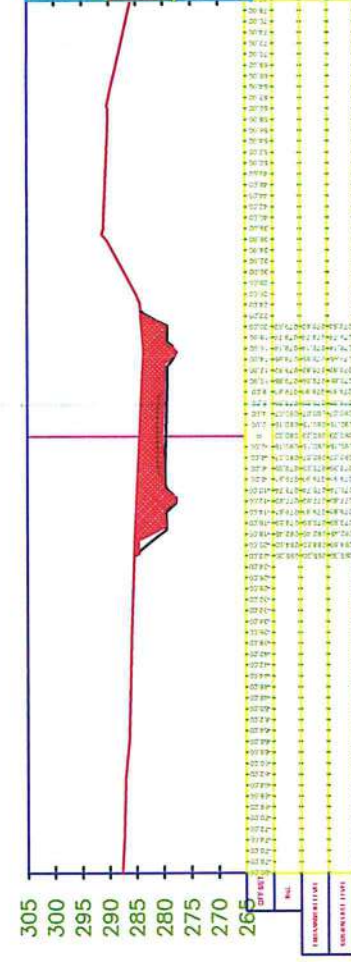

Material(s) at Station 29+875.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	185.00	4589.92	73780.04

265

29+900.00

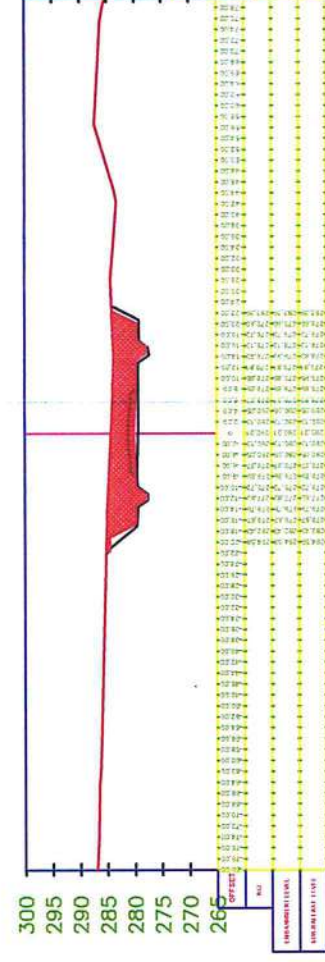


Material(s) at Station 29+900.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	187.38	4654.82	78434.86

265


الشهناوي للمقاولات العمومية
و المقاولات السبائية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ص: ٥٥٩/١٤٤/١١١
مكتب فني: ٥٥٩/١٤٤/١١١
EL SHENINAWY
CONSTRUCTION
٥/٠٠١٤١٦٥/٢٥/١٣

م.ت: ٥٥٩/١٤٤/١١١
ب.ص: ٥٥٩/١٤٤/١١١
مكتب فني: ٥٥٩/١٤٤/١١١
م.ت: ٥٥٩/١٤٤/١١١
ب.ص: ٥٥٩/١٤٤/١١١
مكتب فني: ٥٥٩/١٤٤/١١١


29+925.00

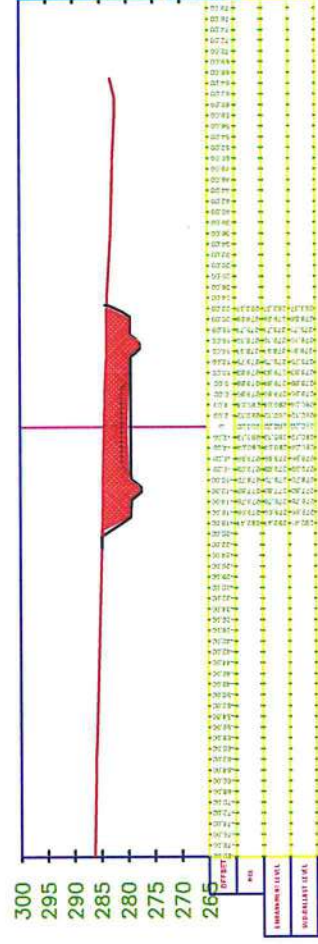


29+950.00

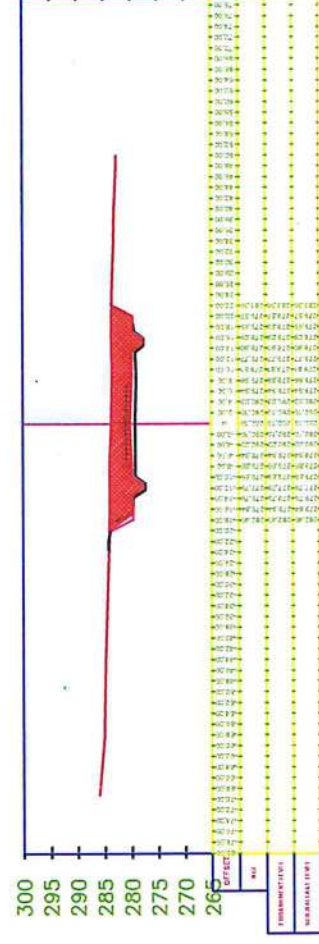

29+975.00

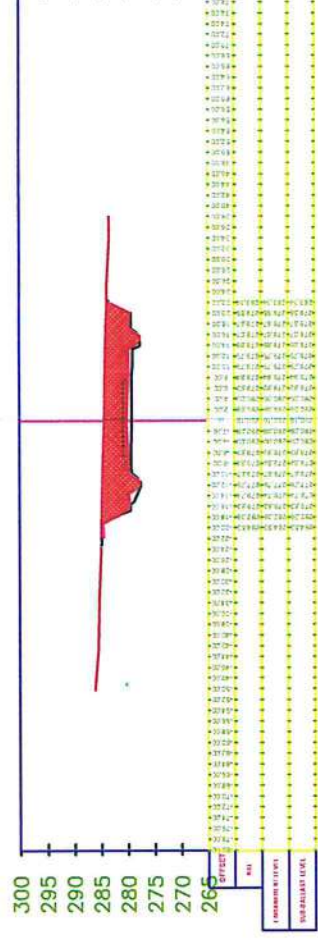

30+000.00

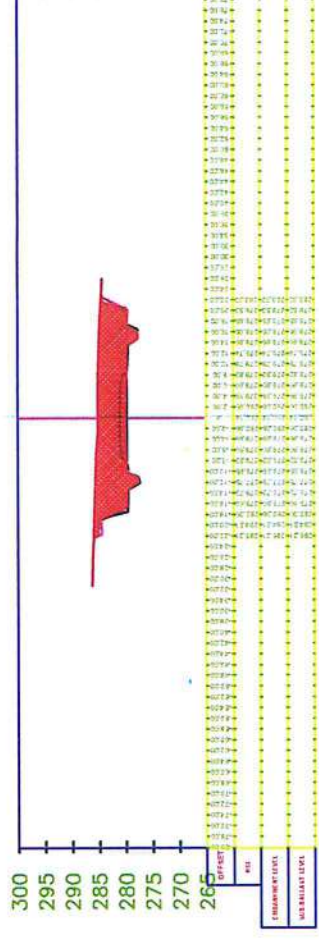

محضر معاينة



التاريخ: ٢٠ / ١٠ / 2021

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لمدينة الطرق والكبارى)

برصد احداثيات المحجر الخاص بشركة / استشارى
بحضور كلاً من :-

- 1- م / استشارى
- 2- م / استشارى
- 3- م / استشارى
- 4- م / استشارى

وكانت احداثياته :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
1	703115.840	779007.832	11 Km

ملاحظات :-

مهندس الهيئة

استشارى المشروع


استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة

.....

.....

.....





محضر معاينة عينات ردم



التاريخ : 2022 / 10 / 31

اسم المشروع : مشروع القطار السريع [العين السخنة - العلمين]

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق و الكباري
برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / الشناوي للمقاولات العموميه

بحضور كلا من :-

1- م / محمد عبد الله
2- م / علي محمد
3- م / محمود محمد
4- م / محمد عبد الله

و كانت إحداثياته كالتالي :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
٢	706609,265	778990,2	14, -
	706919,295	777876,029	
	707176,977	777730,502	

تم زيادة مسافة النقل وذلك لخلق طرقة المخرج من قبل
شركة الرواد لمعامل كوبري طرقة المخرج 29+5 وذلك
من تاريخ 2022/10/17


ملاحظات :-
يوجد فرق مسافة 2 كم

مهندس الهيئة
رغمه علي
استشاري الهيئة


استشاري المشروع

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة



شركة
المقاولات العمومية
بالتعاون مع
المكتب الفني



محضر معاينة عينات ردم



التاريخ : 18 / 6 / 2022

اسم المشروع : مشروع القطار السريع [العين السخنة - العاصمة]

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) إستشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق و الكباري برصد إحدائيات الحجر الخاص بشركة / الشبكات العامة لقطاع الطرق و الكباري

بحضور كلاً من :-

- 1- م/ علي محمد علي عبد الحميد استشاري
- 2- م/ محمد علي عبد الحميد ممثل الشركة
- 3- م/ محمد محمد السيد استشاري المساحة
- 4- م/

و كانت إحدائياته كالتالي :-

رقم الحجر	الشرق	الشمال	مسافة الحجر من قطاع الردم
2	706609.265	778440.2	29.9
	706419.295	777878.024	
	707176.472	777730.502	

778476.875 707113.601

ملاحظات :-

يوجد مدحه بمساحة 2 كم

مهندس الهيئة

استشاري المشروع

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

8/6/2022

شركة الشبكات العامة لقطاع الطرق و الكباري



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٣-٨-١٥

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
بأعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : الشناوى للمقاولات العمومية

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	28+500	30+000	اعمال حفر شامل اعمال حفر البرابخ	105644,77 105136.60	كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات
2			اعمال ردم	675473	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
3			اعمال إحلال سن ١+سن ٢+رمل للبرابخ ارقام ٢٨+٩٢٠ ٢٩+١٠٠&	2218.89	

ملاحظات :-


كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه

مهندس الهيئة
i/محمد صلاح

استشارى الهيئة
المهندس

استشارى المساحة
عاجل حش

مهندس الشركة المنفذة

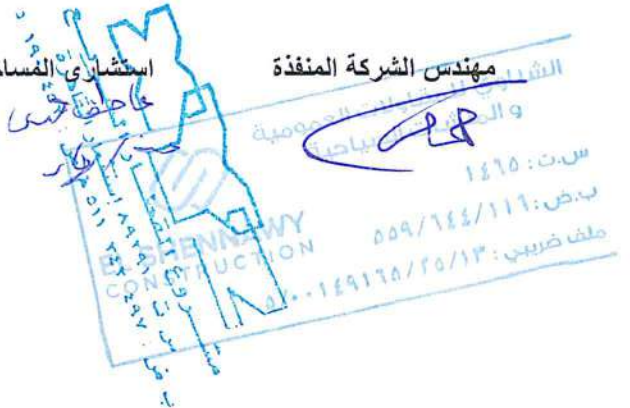

من المحطة ٢٨٥٠٠ الى المحطة ٣٠٠٠٠

مهندس الشركة

استشاري الهيئة
المحرم

ب.س. الشركة

ش.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ١١٦/١١٦٤/١٣٩٩
ملف ضريبي: ١٣/٢٥/١١٦٤/١٣٩٩

بيان اعمال مستخلص جاري (٨)

القطاع	رقم البند	بيان الاعمال	الكمية ١٠٠ % (م٣)	الكمية ٩٥ % (م٣)
من المحطة ٢٨+٥٠٠ الى المحطة ٣٠+٠٠٠	1	اعمال الحفر		
	1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		0.00
	1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ ومحمل على البند الاتى تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ م-1 ارنكه الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 2- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا-3 يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	509.17	483.71
	1-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم حتى منسوب (٢٠٠٠) و بعد ذلك سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم).		0
	1-3	مسافة النقل من ٢ كم الى ٥ كم (3 كم)		0
	2-1-3	مسافة النقل من ٥ كم الى ١٠ كم (9,9 كم) + مسافة مدق ٢ كم		0
	3-1-3	مسافة النقل من ١٠ كم الى ١٥ كم (14 كم) + مسافة مدق ٢ كم	50,516.84	45,465
	5-3	المتر المكعب توريد وردم طبقة إحلال من (سن+رمل) بنسبة ١:٢ مودة من خارج الموقع على ان يتم اضافته تدريجيا وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الدمك الديناميكي للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨ % وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		0
	5-4	المتر المكعب توريد وردم طبقة إحلال من (سن+رمل) بنسبة ١:٢ مودة من خارج الموقع بالإضافة الى اسمنت بورتلاندى عادي بنسبة ٣% على ان يتم اضافته تدريجيا وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الدمك الديناميكي للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨ % وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		0

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

مهندس الشركة

 الشاوي للمقاولات العامة
 والمشتات السياحية
 س.ت: ١٤٦٥
 ف.ص: ١١٦١/١٤٦٥
 ف.ص: ١٣/٢٥/١٤٦٥
 EL SHENNAWY
 CONSTRUCTION

607,926	675,473.37
---------	------------



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة -العلمين -مطروح)

شركة الشناوى للمقاولات العموميه والمنشآت السياحية

الموقف التنفيذي الأسبوعي

مستخلص جاري ٨ عقد ٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
18/06/2023

إجمالي كمية الردم	697,000.00
كمية الردم المنفذ	655,000.00
نسبة تنفيذ الردم	93.97%

إجمالي كمية القطع	110,000.00
كمية القطع المنفذ	109,000.00
نسبة تنفيذ القطع	99.09%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية



من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
25/06/2023

697,000.00	إجمالي كمية الردم
658,000.00	كمية الردم المنفذ
94.40%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
10/07/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

697,000.00	إجمالي كمية الردم
661,000.00	كمية الردم المنفذ
94.84%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم/ احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية



من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
موقف تنفيذي اسبوعي	17/07/2023

إجمالي كمية الردم	697,000.00
كمية الردم المنفذ	663,000.00
نسبة تنفيذ الردم	95.12%

إجمالي كمية القطع	110,000.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	161.06%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
24/07/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

697,000.00	إجمالي كمية الردم
665,000.00	كمية الردم المنفذ
95.41%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
الشناوي للتوقيع /
و الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
31/07/2023

إجمالي كمية الردم	697,000.00
كمية الردم المنفذ	667,000.00
نسبة تنفيذ الردم	95.70%

إجمالي كمية القطع	110,000.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	161.06%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
06/08/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

697,000.00	إجمالي كمية الردم
672,000.00	كمية الردم المنفذ
96.41%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
13/08/2023

697,000.00	إجمالي كمية الردم
677,000.00	كمية الردم المنفذ
97.13%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣

EL SHENAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
20/08/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

27

697,000.00	إجمالي كمية الردم
680,000.00	كمية الردم المنفذ
97.56%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ص: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
27/08/2023

697,000.00	إجمالي كمية الردم
682,000.00	كمية الردم المنفذ
97.85%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /

الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣

EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
05/09/2023

697,000.00	إجمالي كمية الردم
686,000.00	كمية الردم المنفذ
98.42%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ص: ٥٥٩ / ١٤٦٥ / ١١٦
ملف ضريبي: ٥ / ٠٠١٤٩١٦٥ / ٢٥ / ١٣
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة -العلمين -مطروح)

شركة الشناوى للمقاولات العموميه والمنشآت السياحية

الموقف التنفيذي شهري

مستخلص جاري ٨ عقد ٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
موقف تنفيذي شهري	25/06/2023

إجمالي كمية الردم	697,000.00
كمية الردم المنفذ	658,000.00
نسبة تنفيذ الردم	94.40%

إجمالي كمية القطع	110,000.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	161.06%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية

الشناوي للمقاولات العمومية
و المنشآت السياحية

س.ت: ١٤٦٥
ب.ض: ٥٥٩/١٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣

EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
31/07/2023	موقف تنفيذي شهري

697,000.00	إجمالي كمية الردم
667,000.00	كمية الردم المنفذ
95.70%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية



من الكم ٢٨+٥٠٠ حتي الكم ٣٠+٠٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
05/09/2023	موقف تنفيذي شهري

697,000.00	إجمالي كمية الردم
686,000.00	كمية الردم المنفذ
98.42%	نسبة تنفيذ الردم

110,000.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
161.06%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /
الحسن

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية

الشناوي للمقاولات العمومية
و المنشآت السياحية
س.ت: ١٤٦٥
ب.ص: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
