

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري استكمال اعمال الجسر الترابي مشروع
القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة -
مطروح) قطاع المركزية في المسافة من ١٩٣,٣٥٠ كم الى ١٩٥,٠٠٠ كم بطول ١.٦٥٠ كم
بالممر المباشر

تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٥/٣/١٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر اعمال
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
محضر استلام موقع
خطاب محملات
برنامج زمني
وثائق التأمين

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المصلحة الاولى المركزية
قسم المحارقات العامة
رقم الصادر / ١٥٢٢
عدد المرفقات / ١
التاريخ ٢٠٢٥ / ٢ / ١٩
التوقيع /

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ (بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣

استكمال اعمال الجسر الترابى مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة -

العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع المركزية فى المسافة من ١٩٣,٣٥٠ كم

الى ١٩٥,٠٠٠ كم بطول ١.٦٥٠ كم بالمر المباشر

تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توريد عدد (١) سيارة ملاكى لاتقل

عن ١٦٠٠ سى لانتقالات جهاز الاشراف عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة

الميكانيكة ولا يشمل على اى محملات اخري .

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى ٢٠٢٥/٣/١٧

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

الافور

بموجب } الطلبات طيه ، أو : م ح ا ر ر ا

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وحرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على : _____

ك شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم } ع

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم :

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات		نوع الخصم			بيانات		
٢	قرش	جنيه	قسم	فرع	نقل	بند	٥٠٠ (١) اعتماد استكمال الحيز الإداري لمركز الطوارئ المدى بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠
	إجمالي الأصل						٥٠٦٢٥٢٢
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
							عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش _____ _____ _____ رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الایرادات

الختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ٤ » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في ————— سنة ٢٠١

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(2)

المختتم ذو التاريخ

(۳) محب

شیک
اِذن صرف

رقم : _____ إمضاء الكاتب الموثق :

الشكايات

(٤) قيد في سجل

ت. رقم : _____ امضاء الكاتب الموط : _____

الشيكات

(۵) ادرج فی کشف

أعضاء الكتل والنقطة :

شيك

(۶) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير

٢.١ سنة _____

عن عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع المركزية في المسافة من الكيلو ١٩٣+٣٥٠ الي الكيلو ١٩٥+٠٠٠ بطول ١,٦٥٠ كم										الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الاولى المركزية شركه الاخوة العرب لتقسيم الاراضى و المقاولات	
مستخلص رقم (١) مقايضة معدلة رقم (٢)											
تنفيذ شركه الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات										٢٠٢٤ / ١١ / ٣ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٢١	
من بدء العمل										حتى تاريخ	
١٧/٠٢/٢٠٢٥										مستخلص جارى ١	
بيان الأعمال										ملاحظات	
الوحدة	الفنه	الكميه حسب المقايضة المعدلة (٢)	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالي مقدار الاعمال الحالية	جاري ام نهائي	جمله قيمه الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		
الملاططات الخرسانية / الرصف الخرسانى											
٢م	٤٣٢,٠٠	٢٦٣٤٣,٤٧	٠,٠٠	١٢٠,٦٩,٨٤	١٢٠,٦٩,٨٤	جاري	٥٢١٤١٧٠,٨٨	٠,٠٠	٥٢١٤١٧٠,٨٨	التقارير متواجده مبني شهري اسبوعي المهندسون متواجدون المعدات متواجده المعمل موجود وثيقة التأمين موجودة	
٣م	٢٦٦٥,٢٠	١٨,٩٠	٠,٠٠	١٨,٩٠	١٨,٩٠	جاري	٥٠٣٧٢,٢٨	٠,٠٠	٥٠٣٧٢,٢٨	البرنامج الزمني متواجد اعمال تأمين وسلامه المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده	
الإجمالي										5264543.16	
فقط خمسة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون جنيه وستة عشر قرش											

بمكتب
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع

محاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ مصطفى محمد عبد الجواد
التوقيع

مدير عام المشاريع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع

مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ ايمن محمد السيد
التوقيع

الاستشاري العام
(سيسترا)
م/ عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع الاستشاري
مكتب إنترانس
م/ تامر شرف الدين
التوقيع

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م/ احمد هشام
التوقيع

مدير المشروع
الشركة المنفذة
م/ عادل احمد
التوقيع

إخوة العرب
شركة الأراضي والمقاولات
483-466-677
مكتب 5314

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الاولى المركزيه شركه الاخوة العرب لتقسيم الاراضى و المقاولات		عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع المركزية في المسافه من الكيلو ١٩٣+٣٥٠ الي الكيلو ١٩٥+٠٠٠ بطول ١,٦٥٠ كم										
		مستخلص رقم (١) مقايسة معدلة رقم (٢)										
العقد رقم	٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٢١ بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٣	تنفيذ شركه الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات		من بدء العمل		حتى تاريخ	17/02/2025	مستخلص جارى ١				
بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكميه حسب المقايسه المعدلة (٢)	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالي مقدار الاعمال الحالية	جاري ام نهائي	جمله قيمه الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
								جنيه	جنيه	جنيه		
البلاطات الخرسانة / الرصف الحرساني												
١-٦	٢م		٤٣٢,٠٠	٢٦٣٤٣,٤٧	٠,٠٠	١٢٠,٦٩,٨٤	١٢٠,٦٩,٨٤	جاري	٥٢١٤١٧٠,٨٨	٠,٠٠	٥٢١٤١٧٠,٨٨	التقارير متواجده مبدي شهري امبوعي المهندسون متواجدون المعدات متواجده المعمل موجود وثيقة التأمين موجودة
٢-٦	٣م		٢٦٦٥,٢٠	١٨,٩٠	٠,٠٠	١٨,٩٠	١٨,٩٠	جاري	٥٠٣٧٢,٢٨	٠,٠٠	٥٠٣٧٢,٢٨	البرنامج الزمني متواجد اعمال تأمين وسلامه المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده
الاجمالي		فقط خمسة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون جنيه وستة عشر قرش										
5264543.16												

بمعد
رئيس الاداره المركزيه
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع

محاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ. مصطفى محمد عبد الجواد
التوقيع

مدير عام المشاريع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / جهاد محمد سعد
التوقيع

مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / ايمن محمد السيد
التوقيع

الاستشارى العام
(مسترا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع الاستشاري
مكتب إنترانس
م / تامر شرف الدين
التوقيع

استشارى المساحه
مكتب XYZ
م / احمد هشام
التوقيع

مدير المشروع
الشركه المنفذه
م / عادل احمد
التوقيع

شركه الاخوة العرب
للتقسيم الاراضى والمقاولات
٤٣٣-٤٤٤-٤٥٥
٤٥٦-٤٦٧-٤٧٨

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الاولى المركزية شركه الاخوة العرب لتقسيم الاراضى و المقاولات												عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع المركزية في المسافه من الكيلو ١٩٣+٣٥٠ الي الكيلو ١٩٥+٠٠٠ بطول ١,٦٥٠ كم																				
العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٢١ بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٣												مستخلص رقم (١) مقايسة معدلة رقم (٢)																				
تنفيذ شركه الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات												من بدء العمل		حتى تاريخ		17/02/2025		مستخلص جارى ١														
بيان الأعمال												الوحدة	الفنه	الكميه حسب المقايسة المعدلة (٢)	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالى مقدار الاعمال الحالية	جاري ام نهائي	جمله قيمه الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات										
١-٦												بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ^٣ سن دولوميت متدرج + ٣ م ^٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فخير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										٢م	٤٣٢,٠٠	٢٦٣٤٣,٤٧	٠,٠٠	١٢٠٦٩,٨٤	١٢٠٦٩,٨٤	جاري	٥٢١٤١٧٠,٨٨	٠,٠٠	٥٢١٤١٧٠,٨٨	التقارير متواجده ميدني شهري اسبوعي المهندسون متواجدون المعدات متواجده المعمل موجود وثيقة التأمين موجودة
٢-٦												بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرساته عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعويه للاكتاف والميول الجانيه تتكون من ٣ م ^٣ سن دولوميت متدرج+ ٣ م ^٣ رمل حرش+ ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فخير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.										٣م	٢٦٦٥,٢٠	١٨,٩٠	٠,٠٠	١٨,٩٠	١٨,٩٠	جاري	٥٠٣٧٢,٢٨	٠,٠٠	٥٠٣٧٢,٢٨	البرنامج الزمني متواجد اعمال تأمين وسلامه المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده
الإجمالي												فقط خمسة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون جنيه وستة عشر قرش										5264543.16										

بمعد
رئيس الاداره المركزيه
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع

محاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ. / مصطفى محمد عبد الجواد
التوقيع

مدير عام المشاريع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / جهاد محمد سعد
التوقيع

مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / ايمن محمد السيد
التوقيع

الاستشاري العام
(مسترا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع الاستشاري
مكتب إنترانس
م / تامر شرف الدين
التوقيع

استشاري المساحه
مكتب XYZ
م / احمد هشام
التوقيع

مدير المشروع
الشركه المنفذه
م / عادل احمد
التوقيع



محضر إستلام الموقع

مشروع إستكمال اعمال الجسر الترابى مشرع القطار الكهربائى السريع الخط الاول

(العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية فى المسافة من الكم ٣٥٠+١٩٣ حتى كم

١٩٥+٠٠٠ بطول ١.٦٥٠ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة الإخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٤ إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-
١- م / جهاد محمد سعد
٢- م / أيمن محمد السيد
٣- م / تامر شرف الدين
٤- م / زياد أحمد هارون
٥- م / أحمد هشام
٦- م / إيهاب عادل احمد
بناء على العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٥/٤٢١) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٣ تمت المعاينة للمسافة عالية
وتبين أن الموقع خالى من العوائق ظاهريا وعالية يكون تاريخ إستلام الموقع هو تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ .
وأقفل المحضر على ذلك :-
- الحضور :-



٦- م / إيهاب عادل احمد
٥- م / أحمد هشام
٤- م / زياد أحمد هارون
٣- م / تامر شرف الدين
٢- م / أيمن محمد السيد
١- م / جهاد محمد سعد

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

العنوان :- المنطقة الاولى المركزية (نزلة الخصوص - أسفل الطريق الدائرى) ت/ ٢٨٨٨٤٨٦٨ - ف/ ٢٨٨٨٤٨٦٨



شركة
الأخوة العرب لتقسيم
الأراضي والمقاولات

EnTrans
CONSULTING

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBLU)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الأولى المركزية

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية					
المسافة من كم (190+000) حتى كم (195+000) بطول (5) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد 830 لسنة 2021-2022 وتم عمل ختامي لعقد					
المسافة من الكم 193+350 الى الكم 195+000 عقد رقم 421 لسنة 2024-2025 بتاريخ 3-11-2024 تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات					
حصر أعمال مستخلص جارى رقم 1 لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات بتاريخ 17 فبراير 2025					
ملخص حصركميات حمايات الميول					
الإتجاه	مسطح ميول	قدمات (م3)	ملاحظات		
الإتجاه الأيمن	29195.74	440.55			
الإتجاه الأيسر	38723.88	375.45			
الإجمالى المنفذ لكامل القطاع	67919.62	816.00			
تقسيم الكميات على الشركات المنفذة للقطاع					
إسم الشركة	مسطح ميول م2			ملاحظات	
	الجانب الأيمن	الجانب الأيسر	الإجمالى		
شركة الذهبى للمقاولات	8094.05	24994.87	33088.92	عقد 830 لسنة 2021-2022	
شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات	20860.48	1900.38	22760.86	عقد 422 لسنة 2024-2025	
شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات	241.21	11828.63	12069.84	عقد 421 لسنة 2024-2025	
الإجمالى			67919.62		
إسم الشركة	قدمة سفلية للميول م3				
	الجانب الأيمن	الجانب الأيسر	الإجمالى		
شركة الذهبى للمقاولات	232.05	367.05	599.10		
شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات	198.00	0.00	198.00	عقد 422 لسنة 2024-2025	
شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات	10.50	8.40	18.90	عقد 421 لسنة 2024-2025	
الإجمالى			816.00		

مدير المشروع من الهيئة

م/ ايمن محمد السيد

مكتب استشارات كونسالتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ





مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قذمة سفلية				مسطح المائل 3D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م ^٣	
494	20	6	2023	الذهبي عقد رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	190+000	190+020	509	190+000	190+020	20	0.5	0.3	20	3.00	1698.52
495	21	6	2023		190+020	190+040		190+020	190+040	20	0.5	0.3	20	3.00	
497	9	7	2023		190+040	190+080		190+040	190+080	40	0.5	0.3	40	6.00	
500	11	7	2023		190+080	190+120		190+080	190+120	40	0.5	0.3	40	6.00	
502	12	7	2023		190+120	190+140		190+120	190+140	20	0.5	0.3	20	3.00	
504	13	7	2023		190+140	190+160		190+140	190+160	20	0.5	0.3	20	3.00	
506	15	7	2023		190+160	190+197		190+160	190+197	37	0.5	0.3	37	5.55	
29	20	10	2024	الاخوة العرب عقد رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٥-٢٠٢٤	191+500	191+540	39	191+500	191+540	40	0	0	0	0.00	1251.96
25	5	10	2024		191+540	191+580		191+540	191+580	40	0	0	0	0.00	
21	28	8	2024		191+580	191+620		191+580	191+620	40	0	0	0	0.00	
33	28	10	2024		191+620	191+660	52	191+620	191+660	40	0	0	0	0.00	508.18
48	13	11	2024		191+660	191+680		191+660	191+680	20	0	0	0	0.00	

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد

مكتب انترانس كونسولنج

مكتب XYZ

الشركة المنفذة
شركة / الاخوة العرب

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية
المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكوست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوست		رقم الريكوست As built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قدمة سفلية				مسطح المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
540	13	8	2023	الذهبي عقد رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	191+680	191+740	551	191+680	191+740	60	0.5	0.3	60	9.00	471.9
543A	15	8	2023		191+740	191+800		191+740	191+800	60	0.5	0.3	60	9.00	
544	16	8	2023		191+800	191+840		191+800	191+840	40	0.5	0.3	40	6.00	
545	17	8	2023		191+840	191+880	583	191+840	191+880	40	0.5	0.3	40	6.00	1543.1
546	19	8	2023		191+880	191+920		191+880	191+920	40	0.5	0.3	40	6.00	
550A	21	8	2023		191+920	191+960		191+920	191+960	40	0.5	0.3	40	6.00	
553	22	8	2023		191+960	191+980		191+960	191+980	20	0.5	0.3	20	3.00	
557A	23	8	2023		191+980	192+000		191+980	192+000	20	0.5	0.3	20	3.00	
560A	26	8	2023		192+000	192+040		192+000	192+040	30	0.5	0.3	30	4.50	
1	6	7	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥	192+030	192+140	7	192+030	192+140	110	0.5	0.3	110	16.50	2982.53
2	8	7	2024		192+140	192+200		192+140	192+200	60	0.5	0.3	60	9.00	
3	10	7	2024		192+200	192+260		192+200	192+260	60	0.5	0.3	60	9.00	
4	14	7	2024		192+260	192+320	9	192+260	192+320	60	0.5	0.3	60	9.00	1474.87
5	15	7	2024		192+320	192+360		192+320	192+360	40	0.5	0.3	40	6.00	

مدير المشروع الهيئة
م / ايمن محمد السيد

الاستشاري المشرف
مكتب انترانس كونسولتينج

الاستشاري المساحة
مكتب XYZ

الشركة المتقانة
شركة الأخوة العرب

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الأديبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ١١-٣-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جاري رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكويست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكويست		رقم الريكويست As built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قائمة سفلية			مسطح المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣
6	17	7	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢٢-٢٠٢٤	192+360	192+400	14	192+360	192+400	40	0.5	0.3	40	6.00
8	21	7	2024		192+400	192+440		192+400	192+440	40	0.5	0.3	40	6.00
10	23	7	2024		192+440	192+480		192+440	192+480	40	0.5	0.3	40	6.00
11	25	7	2024		192+480	192+520		192+480	192+520	40	0.5	0.3	40	6.00
12	29	7	2024		192+520	192+560		192+520	192+560	40	0.5	0.3	40	6.00
13	31	7	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢٢-٢٠٢٤	192+560	192+600	28	192+560	192+600	40	0.5	0.3	40	6.00
15	4	8	2024		192+600	192+640		192+600	192+640	40	0.5	0.3	40	6.00
16	9	9	2024		192+640	192+680		192+640	192+680	40	0.5	0.3	40	6.00
20	25	9	2024		192+680	192+740		192+680	192+740	60	0.5	0.3	60	9.00
22A	1	10	2024		192+740	192+780		192+740	192+780	40	0.5	0.3	40	6.00
23	1	10	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢٢-٢٠٢٤	192+780	192+820	40	192+780	192+820	40	0.5	0.3	40	6.00
26	8	10	2024		192+820	192+880		192+820	192+880	60	0.5	0.3	60	9.00
30	20	10	2024		192+880	192+900		192+880	192+900	20	0.5	0.3	20	3.00
31	22	10	2024		192+900	192+940		192+900	192+940	40	0.5	0.3	40	6.00
32	26	10	2024		192+940	193+020		192+940	193+020	80	0.5	0.3	80	12.00

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد

الإستشاري المعماري
مكتب انترانس كونسولتج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
شركة الأخوة العرب

مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد


المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكويست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكويست		رقم الريكويست As built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قذمة سفلية				مسطح المائل 3D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م ^٣	
34	29	10	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢٢ ٢٠٢٤-٢٠٢٥	193+060	193+020	50	193+060	193+020	40	0.5	0.3	40	6.00	3830.41
35	30	10	2024		193+100	193+060		193+100	193+060	40	0.5	0.3	40	6.00	
36	2	11	2024		193+140	193+100		193+140	193+100	40	0.5	0.3	40	6.00	
38	3	11	2024		193+180	193+140		193+180	193+140	40	0.5	0.3	40	6.00	
41	5	11	2024		193+220	193+180		193+220	193+180	40	0.5	0.3	40	6.00	
43	9	11	2024		193+300	193+220		193+300	193+220	80	0.5	0.3	80	12.00	
44	10	11	2024		193+340	193+300		193+340	193+300	40	0.5	0.3	40	6.00	
45	11	11	2024		193+380	193+340		193+380	193+340	10	0.5	0.3	10	1.50	
46	12	11	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢١ ٢٠٢٤-٢٠٢٥	193+420	193+380	51	193+420	193+380	70	0.5	0.3	70	10.5	242.17
526	31	7	2023	الذهبى عقد رقم ٨٣٠ ٢٠٢١-٢٠٢٢	194+020	194+000	554	194+020	194+000	20	0.5	0.3	20	3.00	498.01
522	25	7	2023		194+060	194+020		194+060	194+020	40	0.5	0.3	40	6.00	
517A	24	7	2023		194+100	194+060		194+100	194+060	40	0.5	0.3	40	6.00	
514	19	7	2023		194+160	194+100		194+160	194+100	60	0.5	0.3	60	9.00	

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد

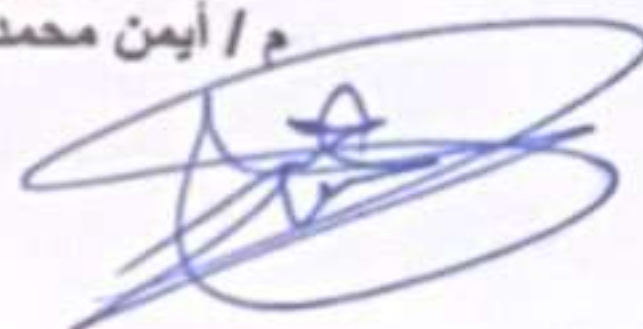

الاستشاري المساحة
مكتب انتر انمل كونسولنج
مشاريع الطرق والبنية التحتية

استشاري المساحة
مكتب XYZ
مشاريع الطرق والبنية التحتية

الشركة المتفذة
شركة / الاخوة العرب
466-67

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠.٠٠٠) حتي كم (١٩٥.٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥٠+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جاري رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المفاوض	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قدمة سفلية				مسطح المائل 3D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
443A	16	4	2023	الذهبي عقد رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	194+160	194+240	447	194+160	194+240	80	0.3	80	12.00	3,882.52	
440	11	4	2023		194+240	194+340		100	0.3	100	15.00				
437	4	9	2023		194+340	194+400		60	0.3	60	9.00				
436	4	8	2023		194+400	194+500		100	0.3	100	15.00				
434	4	5	2023		194+500	194+540		40	0.3	40	6.00				
433A	4	5	2023		194+540	194+660		120	0.3	120	18.00				
431	4	3	2023		194+660	194+700		40	0.3	40	6.00				
430	4	2	2023		194+700	194+760		60	0.3	60	9.00				
425B	30	3	2023		194+760	194+860		100	0.3	100	15.00				
420	26	3	2023		194+860	195+000		140	0.3	140	21.00				
الإجمالي المنفذ حتى تاريخ المستخلص في الجانب الأيمن															
29195.74 440.55															
الاجمالي المنفذ في كلا الجانبين من فبراير ٢٠٢٥ حتى تاريخه															
67,919.62 816															
الاجمالي الكمية المنفذه في كلا الجانبين من يناير ٢٠٢٣ حتى تاريخه بنسبة ١٠٠%															
67,919.62 816															

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد

الإستشاري المتميز
مكتب انترانس كونسولتج

استخبارات و اطلاعات
مکتب XYZ

الشركة المنفذة
ة / الاخوة العرب

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات


حصر أعمال مستخلص جارى رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتى تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قدمة سفلية				مسطح المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
473A	23	5	2023	الذهبي عقد رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	190+000	190+040	498	190+000	190+040	40	0.5	0.3	40	6.00	1797.09
485	11	6	2023		190+040	190+080		190+040	190+080	40	0.5	0.3	40	6.00	
487	14	6	2023		190+080	190+120		190+080	190+120	40	0.5	0.3	40	6.00	
488	17	6	2023		190+120	190+160		190+120	190+160	40	0.5	0.3	40	6.00	
490	18	6	2023		190+160	190+180		190+160	190+180	20	0.5	0.3	20	3.00	
492	19	6	2023		190+180	190+200		190+180	190+200	20	0.5	0.3	20	3.00	
441	11	4	2023	الذخيرة عقد رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥	190+240	190+280	448	190+240	190+280	40	0	0	0	0.00	734.59
449	15	4	2023		190+280	190+300		190+280	190+300	20	0	0	0	0.00	
19	21	9	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥	191+500	191+560	27	191+500	191+560	60	0	0	0	0.00	1236.83
24	5	10	2024		191+560	191+580		191+560	191+580	20	0	0	0	0.00	
18	15	9	2024		191+580	191+600		191+580	191+600	20	0	0	0	0.00	
17	11	9	2024		191+600	191+620		191+600	191+620	20	0	0	0	0.00	

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد




EnTrans
CONSULTING
الاستشاري للمشرف
مكتب الترانس كونسولتنج
مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ
مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
مكتب الاستشاري القاهرة
١٩٠٤٥٣

الشركة المنفذة

شركة / الأخوة العرب



مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جاري رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قدمة سفلية				مسطح المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
37	2	11	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٥-٢٠٢٤	191+620	191+660	53	191+620	191+660	40	0	0	0	0.00	663.55
42	9	11	2024		191+660	191+680		191+660	191+680	20	0	0	0	0.00	
49	13	11	2024		191+680	191+700		191+680	191+700	20	0	0	0	0.00	
507	16	7	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	191+703	191+740	510	191+703	191+740	37	0.5	0.3	37	5.55	88.9
508	17	7	2023		191+740	191+760	552	191+740	191+760	20	0.5	0.3	20	3.00	2069.24
513	18	7	2023		191+760	191+840		191+760	191+840	80	0.5	0.3	80	12.00	
515	22	7	2023		191+840	191+880		191+840	191+880	40	0.5	0.3	40	6.00	
518	23	7	2023		191+880	191+920		191+880	191+920	40	0.5	0.3	40	6.00	
519	24	7	2023		191+920	191+960		191+920	191+960	40	0.5	0.3	40	6.00	
521B	29	7	2023		191+960	192+000		191+960	192+000	40	0.5	0.3	40	6.00	
523A	29	7	2023		192+000	192+020		192+000	192+020	20	0.5	0.3	20	3.00	
527	31	7	2023		192+020	192+060		192+020	192+060	40	0.5	0.3	40	6.00	
529	1	8	2023		192+060	192+080	556	192+060	192+080	20	0.5	0.3	20	3.00	385.96
533	2	8	2023		192+080	192+100		192+080	192+100	20	0.5	0.3	20	3.00	

مدير المشروع الهيئة
م / ايمن محمد السيد



الاستشاري المشرف
مكتب انترانس كونسولتينج
مشروع قطار السريع - الخط الاول

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مشروع قطار السريع - الخط الاول
مكتب XYZ
2024/02/02

الشركة المنفذة
شركة / الاخوة العرب

الأخوة العرب
لتقسيم الأراضي والمقاولات
هاتف: 433-466-67
موبايل: 5514

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قائمة سفلية				مسطح المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
561A	28	8	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	192+100	192+140	584	192+100	192+140	40	0.5	0.3	40	6.00	2809.78
565A	29	8	2023		192+140	192+160		192+140	192+160	20	0.5	0.3	20	3.00	
568	29	8	2023		192+160	192+180		192+160	192+180	20	0.5	0.3	20	3.00	
567	30	8	2023		192+180	192+200		192+180	192+200	20	0.5	0.3	20	3.00	
571	31	8	2023		192+200	192+220		192+200	192+220	20	0.5	0.3	20	3.00	
573A	3	9	2023		192+220	192+240		192+220	192+240	20	0.5	0.3	20	3.00	
575	3	9	2023		192+240	192+260		192+240	192+260	20	0.5	0.3	20	3.00	
576	4	9	2023		192+260	192+300		192+260	192+300	40	0.5	0.3	40	6.00	
580	5	9	2023		192+300	192+320		192+300	192+320	10	0.5	0.3	10	1.50	
590	17	9	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	192+320	192+360	600	192+310	192+360	50	0.5	0.3	50	7.50	2301.89
591A	18	9	2023		192+360	192+400		192+360	192+400	40	0.5	0.3	40	6.00	
592	20	9	2023		192+400	192+420		192+400	192+420	20	0.5	0.3	20	3.00	
593	23	9	2023		192+420	192+460		192+420	192+460	50	0.5	0.3	50	7.50	

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد



الاستشاري المشرف
مكتب إنترانس كونسولنج
مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الأول

مستشاري المساحة
مكتب XYZ
مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الأول

الشركة المنفذة
شركة / الأخوة العرب
تقسيم الأراضي والمقاولات
هاتف: 433-466-677
موبايل: 5514

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قدمة سفلية				مسطح المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
595	25	9	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	192+460	192+500	606	192+470	192+500	30	0.5	0.3	30	4.50	2238.69
596A	27	9	2023		192+500	192+520		192+500	192+520	20	0.5	0.3	20	3.00	
598	27	9	2023		192+520	192+540		192+520	192+540	20	0.5	0.3	20	3.00	
599	30	9	2023		192+540	192+580		192+540	192+580	40	0.5	0.3	40	6.00	
602	1	10	2023		192+580	192+620		192+580	192+620	40	0.5	0.3	40	6.00	
604	2	10	2023		192+620	192+660	610	192+620	192+660	40	0.5	0.3	40	6.00	2316.71
605A	7	10	2023		192+660	192+700		192+660	192+700	40	0.5	0.3	40	6.00	
607A	9	10	2023		192+700	192+740		192+700	192+740	40	0.5	0.3	40	6.00	
609	10	10	2023		192+740	192+760		192+740	192+760	20	0.5	0.3	20	3.00	
618	2	12	2023		192+760	192+800	628	192+760	192+800	40	0.5	0.3	40	6.00	2531.01
619	4	12	2023		192+800	192+820		192+800	192+820	20	0.5	0.3	20	3.00	
620	5	12	2023		192+820	192+840		192+820	192+840	20	0.5	0.3	20	3.00	
621	6	12	2023		192+840	192+860		192+840	192+860	20	0.5	0.3	20	3.00	
622	7	12	2023		192+860	192+880		192+860	192+880	20	0.5	0.3	20	3.00	
623A	10	12	2023		192+880	192+900		192+880	192+900	20	0.5	0.3	20	3.00	

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسولتج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / الاخوة العرب

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جاري رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قدمة سفلية				مسطح المائل 3D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
624	11	12	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	192+900	192+920	636	192+900	192+920	20	0.5	0.3	20	3.00	2918.54
625	12	12	2023		192+920	192+940		192+920	192+940	20	0.5	0.3	20	3.00	
626	13	12	2023		192+940	192+960		192+940	192+960	20	0.5	0.3	20	3.00	
628	17	12	2023		192+960	192+980		192+960	192+980	20	0.5	0.3	20	3.00	
629	18	12	2023		192+980	193+000		192+980	193+000	20	0.5	0.3	20	3.00	
630	19	12	2023		193+000	193+020		193+000	193+020	20	0.5	0.3	20	3.00	
631	20	12	2023		193+020	193+040		193+020	193+040	20	0.5	0.3	20	3.00	
632	23	12	2023		193+040	193+060		193+040	193+060	20	0.5	0.3	20	3.00	
633	24	12	2023		193+060	193+080		193+060	193+080	20	0.5	0.3	20	3.00	
634	25	12	2023		193+080	193+120	645	193+080	193+120	40	0.5	0.3	40	6.00	1896.28
635	26	12	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	193+120	193+140		193+120	193+140	20	0.5	0.3	20	3.00	
637	27	12	2023		193+140	193+160		193+140	193+160	20	0.5	0.3	20	3.00	
638	30	12	2023		193+160	193+180		193+160	193+180	20	0.5	0.3	20	3.00	
639	31	12	2023		193+180	193+200		193+180	193+200	20	0.5	0.3	20	3.00	
640	1	1	2024		193+200	193+220		193+200	193+220	20	0.5	0.3	20	3.00	
641	2	1	2024		193+220	193+240		193+220	193+240	20	0.5	0.3	20	3.00	

مدير المشروع الهيئة
م / ايمن محمد السيد

الاستشاري المشرف
مكتب انترانس كونسولتج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
شركة / الاخوة العرب

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قدمة سفلية				مسطح المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
642	3	1	2024	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	193+240	193+280	649	193+240	193+280	40	0.5	0.3	40	6.00	930.16
646	7	1	2024		193+280	193+340		193+280	193+340	60	0.5	0.3	60	9.00	
647	8	1	2024		193+340	193+360		193+340	193+360	20	0.5	0.3	20	3.00	
648	9	1	2024		193+360	193+390		193+360	193+390	30	0.5	0.3	30	4.50	
47A	13	11	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥	193+390	193+400	76	193+390	193+400	10	0.5	0.3	10	1.5	29.27
64	14	12	2024		193+440	193+480	77	193+440	193+480	40	0	0	0	0	3200.19
66	17	12	2024		193+480	193+520		193+480	193+520	40	0	0	0	0	
67	1	1	2025		193+520	193+560		193+520	193+560	30	0	0	0	0	
68	5	1	2025		193+560	193+600		193+560	193+600	40	0	0	0	0	
69	6	1	2025		193+600	193+640		193+600	193+640	40	0	0	0	0	
80	4	2	2025		193+540	193+640	86	193+540	193+640	100	0	0	0	0	670.06
83	9	2	2025		193+640	193+680	جزء علوي	193+640	193+680	50	0	0	0	0	
70	8	1	2025		193+640	193+680	81	193+640	193+680	40	0	0	0	0	1695.15
71	12	1	2025		193+680	193+720		193+680	193+720	40	0	0	0	0	
72	14	1	2025		193+720	193+760		193+720	193+760	20	0	0	0	0	

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد

الاستشاري المشرق
مكتب انترانس كونسولنج

استشاري المصاحبة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
شركة / الاخوة العرب

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جاري رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوست		رقم الريكوست As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قمة سفلية				مساحة المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
73	15	1	2025	الاخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٥-٢٠٢٤	193+760	193+800	85	193+740	193+800	60	0	0	0	0	2458.76
78	19	1	2025		193+800	193+840		193+800	193+840	40	0	0	0	0	
82	9	2	2025		193+840	193+880		193+840	193+880	40	0	0	0	0	
65	14	12	2025		193+880	193+920		193+880	193+920	40	0	0	0	0	
63	11	12	2024	٤٢١	193+920	193+960	79	193+920	193+960	40	0	0	0	0	465.05
62	11	12	2024		194+000	194+040	74	194+000	194+040	40	0.5	0.3	40	6	66.1
524	30	7	2023	الذهبي عقد رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	194+040	194+080	555	194+040	194+080	40	0.5	0.3	40	6.00	528.63
530	1	8	2023		194+080	194+140		194+080	194+140	60	0.5	0.3	60	9.00	
532	2	8	2023		194+140	194+180		194+140	194+180	40	0.5	0.3	40	6.00	
535	2	8	2023		194+180	194+220		194+180	194+220	40	0.5	0.3	40	6.00	
547A	20	8	2023	٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	194+220	194+300	601	194+220	194+300	80	0.5	0.3	80	12.00	948.19
588A	16	9	2023		194+300	194+340		194+300	194+340	40	0.5	0.3	40	6.00	
589	17	9	2023		194+340	194+400		194+340	194+400	60	0.5	0.3	60	9.00	
594A	24	9	2023		194+400	194+500		194+400	194+500	100	0.5	0.3	100	15.00	
597	26	9	2023	٢٠٢٢-٢٠٢٣	194+500	194+540	608	194+500	194+540	40	0.5	0.3	40	6.00	499.22
603	1	10	2023		194+540	194+600		194+540	194+600	60	0.5	0.3	60	9.00	

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد

الاستشاري المشرف
مكتب انترانس كونسولتج


المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
شركة / الاخوة العرب

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية															
المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد															
المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات															
حصر أعمال مستخلص جارى رقم ١ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من بداية العمل حتي تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥															
مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side															
رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قدمة سفلية				مسطح المائل ٣D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
54	27	11	2024	الاخوة العرب عقد رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥	194+600	194+660	75	194+600	194+660	60	0.5	0.3	6	0.90	3369.57
55	30	11	2024		194+660	194+700		194+660	194+700	40	0	0	0	0	
56	1	12	2024		194+700	194+760		194+700	194+760	60	0	0	0	0	
57	3	12	2024		194+760	194+800		194+760	194+800	40	0	0	0	0	
58	4	12	2024		194+800	194+820		194+800	194+820	20	0	0	0	0	
59	7	12	2024		194+820	194+920		194+820	194+920	100	0	0	0	0	
60	8	12	2024		194+920	194+960		194+920	194+960	40	0	0	0	0	
61	9	12	2024		194+960	195+000		194+960	195+000	40	0	0	0	0	
الإجمالى المنفذ في الجانب الايسر															
38,723.88 375.45															

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد





الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



المنطقة الأولى المركزية

عن عملية استكمال اعمال الجسر الترابي مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية.
المسافة من كم ١٩٣+٣٥٠ حتي كم ١٩٥+٠٠٠ بطول (١,٦٥٠) كم عقد ٢١
(بالأمر المباشر) تنفيذ شركة الاخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

بيان الافراد

م	الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
١	عادل احمد الاشعل	مدير عام مشروعات	٤٤	
٢	إيهاب عادل أحمد	مدير مشروع	١٣	
٣	احمد عبد الجليل	مكتب فنى	٤	
٤	احمد سعد عكه	مهندس تنفيذ	٦	
٥	عبد الله سمير سامح	مساح	٨	
٦	محمد عبد الفتاح	مساح	٥	
٧	محمد البشير محمد عثمان	مهندس المعمل	٦	
٨	منصور محمد منصور	مشرف موقع	١٥	
٩	حسام عبد الحكيم	فنى معمل	٣	
١٠	إيهاب عبد الحليم فريد	فنى معمل	٣	
١١	عمر عبد المنعم عبد العال	مساعد مساح	٣	
١٢	السيد محمد القط	مشرف طرق	٥	
١٣	احمد قاسم العمري	مشرف طرق	٢	

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس

التوقيع

الشركة المنفذه

شركة الاخوة العرب

التوقيع





الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



المنطقة الأولى المركزية

عن عملية استكمال اعمال الجسر الترابي مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية.
المسافة من كم ١٩٣+٣٥٠ حتى كم ١٩٥+٠٠٠ بطول (١,٦٥٠) كم عقد ٤٢١
(بالأمر المباشر) تنفيذ شركة الاخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

بيان المعدات

المعدة	العدد	ملاحظات
لودر	١	
جريدر	٠	
هراس	٠	
تنك مياه	١	
بلدوزر	٠	
سيارات نقل	١	
خلاطة خرسانة مركزية	١	
سيارات خدمة	٢	

الاستشاري المشرف

مكتب إنترانس

التوقيع

الشركة المنفذه

شركة الاخوة العرب

التوقيع

