

محضر إستلام موقع  
مشروع تنفيذ اعمال الجسر الترابي لازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى  
توشكي من كم 75+000 حتي كم 80+000 بطول 5 كم .  
عقد رقم (2024/2023/259) بتاريخ 2023/08/23  
تنفيذ : مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة

إنه في يوم الاثنين الموافق 11 / 09 / 2023 قامت اللجنة المشكلة من :-

- |                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / وليد صالح علي        | مهندس / المنطقة العاشرة بأسوان         |
| 2. السيد المهندس / محمود أحمد عثمان     | مدير المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان  |
| 3. السيد المهندس / محمد عمر انيس        | مهندس المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان |
| 4. السيد المهندس / هشام عيد صالح        | المكتب الاستشاري ( رؤيه المستقبل )     |
| 5. السيد الاستاذ / شفيق عطية محيي الدين | الشركة المنفذة                         |

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه , و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق  
ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة .

و عليه يكون يوم الاثنين الموافق 11 / 09 / 2023 هو تاريخ إستلام الموقع و بدء العمل .

التوقيعات

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



يعتمد  
التوقيع ( )  
مهندس / عيد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزية

اعمال الجسر الترابي لازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى

توشكى في المسافة من 75+000 حتى الكم 80+000 بطول 5 كم

اشراف (المنطقة العاشرة - اسوان) بالامر المباشر

تنفيذ : مؤسسة الريماس للمقاولات وتوريد مواد بناء

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
( GARBLT )

المنطقة العاشرة - جنوب الواحى - اسوان



السيد ال عميد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية  
تحية طيبة و بعد ,,

بالإحالة الى:-

اعمال الجسر الترابي لازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى في المسافة من  
75+000 حتى الكم 80+000 بطول 5 كم اشراف (المنطقة العاشرة - اسوان)  
بالامر المباشر

تنفيذ : مؤسسة الريماس للمقاولات وتوريد مواد بناء - عقد رقم (2024/2023/259)  
نحيط علم سيادتكم بأن العملية عاليه محمل عليه الأتي :-

| البيان            | العدد |
|-------------------|-------|
| كرتونة اوراق - A4 | 10    |

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

محمد عثمان

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عدي يحيى كرومر



تنفيذ اعمال الجسر الترابى لازدواج الطريق الصعيد الصحرواى الغربى فى  
المسافة من اسوان حتى توشكى من كم 75+000 حتى كم  
80+000- بطول 5 كم اشراف ( المنطقة العاشرة -اسوان)  
"بالامر المباشر"

تنفيذ: " مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة وتوريد مواد البناء "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: ( 259 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 2023/8/23

تنفيذ : " مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة وتوريد مواد البناء "

نحيطكم علما بأن المحملات بالعقد عاليه تم تسليمها الى المنطقة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

مرفقات : عدد ( 1 ) اذن اضافة

محرر اتي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
عيد يحيى كرومر

(نموذج ١، مخازن حكومية)

شركة البرما  
جوانه  
بتاريخ

وارد من :

\* سند الإضافة :

## إذن إضافة

مجموعه رقم ۱۲۸

6-010-V9

اسم الجهة: المحكمة  
مخزن: ٩١٨ ٢٠٩٢  
التاريخ: ١١/٩/٢٠١٨

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٦٣ س ٢٠١٥ - ١٢٠,٠٠٠

[illegible]

### كاتب الشطب :

الإجمالي

فقط مبلغ: (.....)

Решение

أمين المخزن / -

استلمت الأصناف المسبقة بأعلاه وتم إضافتها في دفتر عهدة المخزن ،،،،



تنفيذ اعمال الجسر الترابي لازدواج الطريق الصعيد الصحراوي الغربى فى المسافة من  
اسوان حتى توشكى من كم 75+000 حتى كم 80+000 بطول 5 كم  
اشراف ( المنطقة العاشرة - اسوان ) " بالامر المباشر "  
تنفيذ : " مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة وتوريد مواد البناء "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم ( 1 ) جارى والخاص بالمشروع عالياه .

عقد رقم .: ( 259 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 2023/8/23

تنفيذ : " مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة وتوريد مواد البناء "

نحيطكم علما بأن العقد عالياه ليس عليه عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

مكرم عرابي

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عيد يحيى كرومر

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

### تحية طيبة وبعد

بخصوص البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكبارى , طبقا للتعاقد بالحصول على الاتربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبى الطريق .

وبخصوص عملية :.

تنفيذ عمال الجسر الترابى لازدواج الطريق الصحرواى الغربى فى المسافة من اسوان حتى توشكى فى المسافة من ( 75+000 حتى الكم 80+000 ) بطول 5 كم اشراف ( المنطقة العاشرة - اسوان ) " بالامر المباشر "

تنفيذ :. "مؤسسة الريماس للمقاولات وتوريد مواد البناء"

عقد رقم :. ( 259 / 2024/2023 ) بتاريخ 2023/8/23

وبالاحالة الى المستخلص الجارى ( 1 ) اعداده للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بان الكميات الجارية بينها كالاتى:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| اجمالى اتربة باستخدام ناتج الحفر | 3م 60000 |
| اجمالى الحفر فى التربة المتامسكة | 3م 15000 |
| اعمال الاتربة من الخارج          | 3م 45000 |

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالىة حتى يمكن استكمال اجراءات المستخلص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,,,,,,,,,,,

تحريرا فى :. / / 2023

رئيس الادارة المركزية



عيد يحيى كرومر



مهندس /

( ٢٠٢٣/٨/٢٣ )



تنفيذ اعمال الجسر الترابي لازدواج الطريق الصعيد الصحراوي الغربى فى المسافة من  
اسوان حتى توشكى من كم 75+000 حتى كم 80+000 بطول 5 كم  
اشراف ( المنطقة العاشرة - اسوان ) " بالامر المباشر "  
تنفيذ : " مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة وتوريد مواد البناء "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم ( 1 ) جارى والخاص بالمشروع عالياه .

عقد رقم .: ( 259 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 2023/8/23

تنفيذ : " مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة وتوريد مواد البناء "

نحيطكم علما بأن العقد عالياه ليس عليه سيارة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

كروم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كروم



مهندس /

**ASAS**

Engineering Design and Consultancy  
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman  
Consult. of Geotech. Engineering  
Faculty of Eng. – Aswan University



أساس  
ASAS

للتصميمات والاستشارات الهندسية  
د.م. أشرف عبدالمهدي سليمان  
مستشاري  
٢٠٢٢  
٢٠٢٢

أساس

للتصميمات والاستشارات الهندسية  
أ.د.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان  
استشاري الهندسة الجيوتقنية  
كلية الهندسة – جامعة أسوان

## تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع الحفر

## مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى  
توشكى.

من كم (75+250) إلى كم (75+500)

## الجهة المنفذة للمشروع

شركة الريماس للمقاولات

## الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢

مهندس استشاري  
د. / أشرف عبدالمهدي سليمان  
استشاري الهندسة الجيوتقنية  
استشاري  
٢٠٢٢  
٢٠٢٢  
ASAS.GEOTECH@gmail.com  
بريد إلكتروني: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣ / ت/فاكس



العنوان : أسوان – شارع المدينة الصناعية القديمة – أمام مصلحة الضرائب  
موبايل : ٠١٠٤٢٠١٨٨٨ & ٠١١٣٩٦٤٦٧٥

**ASAS**

Engineering Design and Consultancy  
 Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman  
 Consult. of Geotech. Engineering  
 Faculty of Eng. – Aswan University

**أساس**


للتصميمات والاستشارات الهندسية  
 أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان  
 استشاري الهندسة الجيوتقنية  
 كلية الهندسة – جامعة أسوان

## المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

## المرفقات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري – المنطقة العاشرة – جنوب الوادي – أسوان



بريد الإلكتروني: [ASAS.GEOTCH@gmail.com](mailto:ASAS.GEOTCH@gmail.com)

ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان – شارع المدينة الصناعية القديمة – أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠٤٢٠١٨٨٨

## أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة الريماس للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (75+250) إلى كم (75+500) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

## ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري – المنطقة العاشرة – جنوب الوادي – أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طميية من نوع A4.

## ثالثاً : الخلاصة والتوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة نوصي بالآتي :-

مهندس استشاري  
د / أشرف عبدالمهدي سليمان  
استشاري الهندسة الجيوتقنية  
استشاري : ١ / ٦٧٥٥  
سجل ٥١ / ١٩٨٧  
ASAS.GEOTCH@gmail.com  
بريد الكتروني

**أساس**  
**ASAS**  
للتصميمات والاستشارات الهندسية  
د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان  
سجل ١٩٨٧ / ١٩٩٤ / ٢٠١٧

ت/فاكس : ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان – شارع المدينة الصناعية القديمة – أمام مصلحة الضرائب  
موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨ & ٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

**ASAS**

Engineering Design and Consultancy  
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman  
Consult. of Geotech. Engineering  
Faculty of Eng. – Aswan University



د.م. أشرف عبدالمهدي سليمان  
استشاري  
١٦٧٢٥٥  
٢٢/٢٢٩٧٧  
٥١/٢٨٧

أساس  
ASAS

أساس  
للتصميمات والاستشارات الهندسية  
أ.د.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان  
استشاري الهندسة الجيوتقنية  
كلية الهندسة - جامعة أسوان

- ١- حيث أن التربة طميية من نوع A4 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري  
د.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان  
استشاري الهندسة الجيوتقنية  
أ.د.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان



شركة الريماس  
للمقاولات

تقرير رقم 963 بتاريخ 11/4/2022  
عملية : ازدواج طرريق اسوان / توشكى من كم  
680+36 الى كم 39+480



السيد المهندس / مدير شركة الريماس للمقاولات

تحية طيبة-----وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-  
قيمة الاختبارات المعملية 2917 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

تحريرا فى 17/4/2022

استقبلت لرسول  
شخص

شركة  
الريمالس  
للمقاولات

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والسكك الحديدية  
(GAJBLT)  
إدارة البنية التحتية للطرق  
معمل المنطقة

| رقم العينة | الكمية | الوصف                                                                                                                                                                                            | النتيجة | ملاحظات                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 0          | 530    | 60<br>تجهيز العينة<br>تحديد نسبة الماء من مهزة 200<br>اختبار حد السيولة<br>اختبار حد اللدونة                                                                                                     | 0       |                         |
| 0          | 600    | 60<br>تجهيز العينة<br>اختبار الدمك بالموقع                                                                                                                                                       | 0       | دمك أماس بالموقع        |
| 1005       | 1005   | 60<br>تجهيز العينة<br>تدرج المواد الصلبة المحبوزة على مهزة رقم 8<br>تحديد نسبة الماء من مهزة 200<br>اختبار قنائل بجهز لوس الجلولس<br>اختبار حد السيولة<br>اختبار نسبة الطين<br>اختبار حد اللدونة | 1       | سلامة أسس               |
| 560        | 560    | 60<br>تجهيز العينة<br>C.B.R                                                                                                                                                                      | 1       | C.B.R                   |
| 510        | 510    | 60<br>تجهيز العينة<br>اختبار الذك المعدل                                                                                                                                                         | 1       | بروكتور اماس            |
| 0          | 325    | 80<br>تجهيز العينة<br>تحديد الوزن النوعي للخلطات المدمكة بالفيط<br>مسر قوالب مارشال دمك بالموقع للقلب                                                                                            | 0       | رابطه +<br>منطعية       |
| 0          | 560    | 80<br>تجهيز العينة<br>تحديد نسبة البتومين وتدرج المواد الصلبة<br>اختبار نسبة الطين                                                                                                               | 0       | رابطه                   |
| 0          | 560    | 80<br>تجهيز العينة<br>تحديد نسبة البتومين وتدرج المواد الصلبة<br>اختبار نسبة الطين                                                                                                               | 0       | منطعية                  |
| 0          | 320    | 60<br>تجهيز العينة<br>تحديد نسبة الأمصاص<br>تحديد نسبة التفتت                                                                                                                                    | 0       | دبش تكاسي               |
| 0          | 1000   | 1000                                                                                                                                                                                             | 0       | خروج في العمل ليوم واحد |
| 150        | 150    | 150                                                                                                                                                                                              | 1       | إعداد تقرير شامل        |
| 2225.00    |        |                                                                                                                                                                                                  |         | الجم                    |
| 333.75     |        | 0.15                                                                                                                                                                                             |         | 15% مصاريف إدارية       |
| 2558.75    |        |                                                                                                                                                                                                  |         | الجم                    |
| 358.23     |        | 0.14                                                                                                                                                                                             |         | 14% الضريبة المتضائلة   |
| 2917.00    |        |                                                                                                                                                                                                  |         | الإجم                   |

غير الفان وتسعمائة وسبعة عشر جنيه

17/4/2022 في

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / محمد يحيى كرومر

مدير المعمل

مهندس / جيهان قنص

مهندس المعمل

مهندس / انطوني جمال عبد الملاك

مهندس المعمل

الاستاذ / احمد الامير محمد



الهيئة العامة للغذاء والدواء  
SAGRA

75400 الى 80400

شركة الريعتس  
للمقاولات

مصلحة : المزارع طريق اسوان - اوشك  
المساحة من 38+680 الى 39+480  
التي اعطت العينات استشرى المشروع لمهندس احمد جمال  
العينات مسوية عن اعطرها

تصنيف طبقات التربة الارض الطبيعية

| رقم العينة   | 6191            | 6192            | 6193            | 6194            | 6195            |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| موقع القطاع  | 75+000 - 75+250 | 75+250 - 75+500 | 75+500 - 75+680 | 75+680 - 76+200 | 76+200 - 76+380 |
| موقع العينة  | 75+060          | 75+300          | 75+560          | 76+340          | 76+380          |
| التاريخ      | 31-03-22        |                 |                 |                 |                 |
| المهزات      |                 |                 |                 |                 |                 |
| رقم 10       | 33.4            | 466.6           | 93.32           | 96.4            | 403.6           |
| رقم 40       | 120.7           | 379.3           | 75.86           | 155.8           | 344.2           |
| رقم 200      | 235.1           | 264.9           | 52.98           | 251.3           | 248.7           |
| وزن العينة   | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| حد السيولة   | 32.6            | 25.3            | 36.4            | 0               | 0               |
| مجال اللدونة | 8.4             | 6.7             | 3.6             | 0               | 0               |
| نوع التربة   | A-4             | A-4             | A-3             | A-3             | A-3             |

مهندس استشاري  
د/ اشرف عبد الميكي سليمان  
استشاري الهندسة الجيوتقنية  
٥١ / ٦٨٧  
١ / ٦٧٥٥  
استشاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
SAGRA  
الهيئة العامة للغذاء والدواء  
SAGRA

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

تاريخ 11/4/2022

مدير المشروع  
مدير الموقع  
مدير المختبر

معمل المنطقة

| المواصفات |  | العينات مسئولية من احضرها |  | رقم العينة | الموقع كم                    | التاريخ    | المهزات                   |
|-----------|--|---------------------------|--|------------|------------------------------|------------|---------------------------|
|           |  |                           |  | 6197       | تشوينات محجر اترية كم 32+000 | 2022-04-11 | النسبة المئوية للمار      |
|           |  |                           |  |            |                              |            | "2                        |
|           |  |                           |  |            |                              |            | "1.5                      |
|           |  |                           |  |            |                              |            | "1                        |
|           |  |                           |  |            |                              |            | "3 / 4                    |
|           |  |                           |  |            |                              |            | "1 / 2                    |
|           |  |                           |  |            |                              |            | "3 / 8                    |
|           |  |                           |  |            |                              |            | رقم 4                     |
|           |  |                           |  |            |                              |            | رقم 10                    |
|           |  |                           |  |            |                              |            | رقم 40                    |
|           |  |                           |  |            |                              |            | رقم 200                   |
|           |  |                           |  |            |                              |            | حد السيولة                |
|           |  |                           |  |            |                              |            | مجال اللدونة              |
|           |  |                           |  |            |                              |            |                           |
|           |  |                           |  |            |                              |            | نوع التربة                |
|           |  |                           |  |            |                              |            | أقصى كثافة جافة ( 3/4 - ) |
|           |  |                           |  |            |                              |            | تصحيح الرطوبة             |
|           |  |                           |  |            |                              |            | CBR                       |

تحریرا فی 17/4/2022

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس / عبد يحيى كرومر

مهندس /  
مدير العمل  
جيهان فتحي

مهندس المعمل  
مهندس / السيد / محمد / علي  
انتظوني جمال عبد الملك

القائم بالاختبار  
فنى المصحح  
صفوت محمد علي

تقرير رقم 963 بتاريخ 11/4/2022  
عملية : ازدواج طريق اسوان/ توشكى  
العملية من كم 36+680 الى كم 39+480



شركة الريماس للمقاولات

تصنيف طبقة اترية

| المواصفات |  | معمل المنطقة            |  |  |                              |
|-----------|--|-------------------------|--|--|------------------------------|
|           |  | رقم العينة              |  |  | 6197                         |
|           |  | الموقع كم               |  |  | تشوينات محجر اترية كم 32+000 |
|           |  | التاريخ                 |  |  | 2022-04-11                   |
|           |  | المهزات                 |  |  | المحجوز المار المار %        |
|           |  | "2"                     |  |  | 2536 32730 93                |
|           |  | "1.5"                   |  |  | 1420 31310 88.78             |
|           |  | "1"                     |  |  | 2960 28350 80.39             |
|           |  | "3 / 4"                 |  |  | 2040 26310 74.60             |
|           |  | "1 / 2"                 |  |  | 2380 23930 67.86             |
|           |  | "3 / 8"                 |  |  | 1640 22290 63.21             |
|           |  | رقم 4                   |  |  | 4110 18180 51.55             |
|           |  | الباقى                  |  |  | 18180                        |
|           |  | الوزن الكلى             |  |  | 35266 م . الكلى              |
|           |  | رقم 10                  |  |  | 115.3 384.7 76.9 39.66       |
|           |  | رقم 40                  |  |  | 307.8 192.2 38.4 19.82       |
|           |  | رقم 200                 |  |  | 452.7 47.3 9.5 4.88          |
|           |  |                         |  |  | 500                          |
|           |  | حد السيولة              |  |  | 0                            |
|           |  | مجال اللدونة            |  |  | 0                            |
|           |  | نوع التربة              |  |  | A - 1 - a                    |
|           |  | أقصى كثافة جافة ( 3/4 ) |  |  | 2.238                        |
|           |  | نسبة مياه ملائمة (3/4)  |  |  | 5.61                         |
|           |  | نسبة ( 3/4+ )           |  |  | 25.40                        |
|           |  | البروكتور المصحح        |  |  | 2.330                        |
|           |  | تصحيح الرطوبة           |  |  | 4.31                         |
|           |  | CBR                     |  |  | 69.02                        |

تحريرا فى 17/4/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

مدير المعمل

مهندس /

مهندس المعمل

مهندس /

القائم بالاختبار

فنى المختبر /

صفوت محمد علم

# عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم 36+680 الى كم 39+480

Report No 963 date 11 / 4 / 2022

Spacimen NO. 6197

شركة الريماس للمقاولات

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة (3/4)

طبقة اترية A - 1 - a

كم 32+000

|                  |       |
|------------------|-------|
| D. d. of (- 3/4) | 2.238 |
| W. c. of (- 3/4) | 5.61  |
| W. c. of (+ 3/4) | 0.5   |
| S. g. Of (+ 3/4) | 2.650 |

|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % Retaned 3/4   | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    |
| Corrected D. d. | 2.310 | 2.314 | 2.317 | 2.321 | 2.325 | 2.329 | 2.332 | 2.336 | 2.340 | 2.344 | 2.348 | 2.351 | 2.355 | 2.359 | 2.363 | 2.367 | 2.371 |
| Corrected W. c. | 4.59  | 4.54  | 4.49  | 4.43  | 4.38  | 4.33  | 4.28  | 4.23  | 4.18  | 4.13  | 4.08  | 4.03  | 3.97  | 3.92  | 3.87  | 3.82  | 3.77  |

|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % (+ 3/4)       | 37    | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    |
| Corrected D. d. | 2.375 | 2.379 | 2.383 | 2.387 | 2.390 | 2.394 | 2.398 | 2.402 | 2.406 | 2.410 | 2.415 | 2.419 | 2.423 | 2.427 |
| Corrected W. c. | 3.72  | 3.67  | 3.62  | 3.57  | 3.51  | 3.46  | 3.41  | 3.36  | 3.31  | 3.26  | 3.21  | 3.16  | 3.11  | 3.05  |

تحريرا في 17/4/2022

رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل  
مهندس /  
جيهان فتحي

مهندس المعمل  
مهندس /  
انطوني جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار  
فنى /  
صفوت محمد على

# عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم 36+680 الى كم 39+480

## شركة الريماس للمقاولات

| MODIFIED PROCTOR TEST | AASHTO T 180 | AASHTO T 224 |
|-----------------------|--------------|--------------|
|-----------------------|--------------|--------------|

Activity :- طبقة اترية A - 1 - a

Report No 963 date 11 / 4 / 2022


Specimen NO. 6197

Testing date: 11-4-2022

Location

كم 32+000

| Trail No-                             | 1     | 2     | 3     | 4     |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Weight of mould                       | 3380  | 3380  | 3380  | 3380  |
| Volume of mould                       | 2115  | 2115  | 2115  | 2115  |
| Weight of mould + compacted soil      | 7951  | 8235  | 8515  | 8157  |
| Weight of compacted soil              | 4571  | 4855  | 5135  | 4777  |
| weight of wet soil + Container weight | 429.7 | 257.2 | 403.4 | 367.1 |
| weight of dry soil + Container weight | 422.6 | 247.3 | 386.6 | 347.2 |
| Container No.                         | 1.0   | 2.0   | 3.0   | 4.0   |
| Container weight                      | 150.9 | 40.9  | 157.8 | 102.7 |
| weight of dry soil                    | 271.7 | 206.4 | 228.8 | 244.5 |
| Weight of water                       | 7.10  | 9.90  | 16.80 | 19.90 |
| Moisture content                      | 2.61  | 4.80  | 7.34  | 8.14  |
| Bulk density of wet soil              | 2.161 | 2.296 | 2.428 | 2.259 |
| Dry density                           | 2.106 | 2.190 | 2.262 | 2.089 |

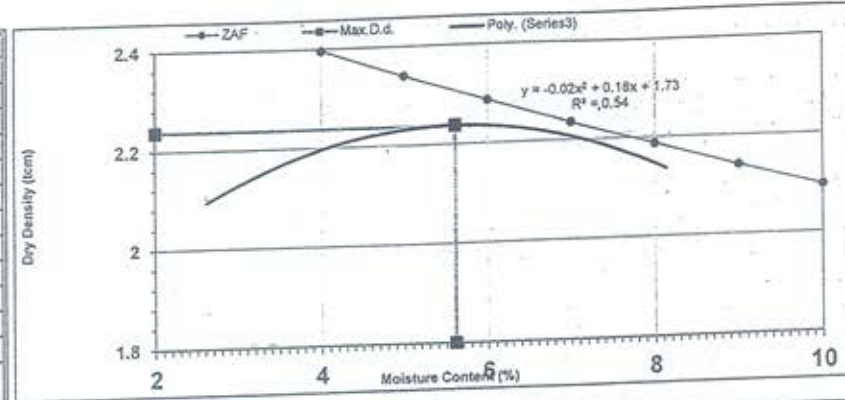

% Retained 3 / 4 25.40

MAX. DRY DENSITY - 3 / 4 2.238

O. W.C.% - 3 / 4 5.61

Corrected DRY DENSITY 2.330 Corrected W. C. 4.31

تحريرا فى 17/4/2022

رئيس الادارة المركزية  
مهندس / عيد يحيى كرومر

مدير المعمل  
مهندس / جيهان فتحى

مهندس المعمل  
مهندس / انطونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار  
فنى / صفوت محمد على



تقرير الكميات شركة (الريماس)

من قطاع 39+180 الي قطاع 39+780

اجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ



| الكمية الإجمالية | البند                               | رقم البند           |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 0                | حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية |                     |
| 59852.56         | ردم باتربة مطابقة للمواصفات         |                     |
|                  |                                     |                     |
|                  |                                     |                     |
| Station          | Cut Volume (Cu.M.)                  | Fill Volume (Cu.M.) |
| 39+240.00        | 0                                   | 555.93              |
| 39+260.00        | 0                                   | 1165.79             |
| 39+280.00        | 0                                   | 1331.54             |
| 39+300.00        | 0                                   | 1478.16             |
| 39+320.00        | 0                                   | 1546.23             |
| 39+340.00        | 0                                   | 1633.83             |
| 39+360.00        | 0                                   | 1810.99             |
| 39+380.00        | 0                                   | 1777.67             |
| 39+400.00        | 0                                   | 1708.96             |
| 39+420.00        | 0                                   | 1922.8              |
| 39+440.00        | 0                                   | 2058.32             |
| 39+460.00        | 0                                   | 2187.35             |
| 39+480.00        | 0                                   | 2422.54             |
| 39+500.00        | 0                                   | 2410.9              |
| 39+520.00        | 0                                   | 2330.18             |
| 39+540.00        | 0                                   | 2503.36             |
| 39+560.00        | 0                                   | 2820.01             |
| 39+580.00        | 0                                   | 2948.01             |
| 39+600.00        | 0                                   | 2659.88             |
| 39+620.00        | 0                                   | 2426.43             |
| 39+640.00        | 0                                   | 2412.91             |
| 39+660.00        | 0                                   | 2472.98             |
| 39+680.00        | 0                                   | 2587.69             |
| 39+700.00        | 0                                   | 2772.4              |
| 39+720.00        | 0                                   | 3066.21             |
| 39+740.00        | 0                                   | 3305.56             |
| 39+760.00        | 0                                   | 2614.89             |
| 39+780.00        | 0                                   | 921.04              |
| total            | 0                                   | 59852.56            |

مهندس إلهي  
كريم

مهندس الشركة  
شفيق

| Station   | Cut Volume (Cu.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 38+680.00 | 43.24              | 10.24               |
| 38+700.00 | 43.24              | 10.24               |
| 38+720.00 | 0.06               | 10.24               |
| 38+740.00 | 0.9                | 10.24               |
| 38+760.00 | 0.84               | 10.24               |
| 38+780.00 | 0                  | 10.24               |
| 38+800.00 | 0                  | 211.21              |
| 38+820.00 | 0                  | 224.7               |
| 38+840.00 | 0                  | 258.07              |
| 38+860.00 | 0                  | 266.31              |
| 38+880.00 | 0                  | 324.04              |
| 38+900.00 | 0                  | 391.03              |
| 38+920.00 | 0                  | 402.75              |

مهندس احمد  
محرر

مهندس احمد  
محرر

|           |       |          |
|-----------|-------|----------|
| 38+940.00 | 0     | 407.14   |
| 38+960.00 | 0     | 434.24   |
| 38+980.00 | 0     | 476.84   |
| 39+000.00 | 0     | 524.69   |
| 39+020.00 | 0     | 568.21   |
| 39+040.00 | 0     | 556.89   |
| 39+060.00 | 0     | 555.71   |
| 39+080.00 | 0     | 562.98   |
| 39+100.00 | 0     | 637.6    |
| 39+120.00 | 0     | 773.18   |
| 39+140.00 | 0     | 857.94   |
| 39+160.00 | 0     | 817.66   |
| 39+180.00 | 0     | 741.72   |
| total     | 88.28 | 10054.35 |

مهندس احمد  
مستشار

مهندس احمد  
مستشار

تتبع أعمال الجسر الترابي لأزدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى في المسافة من  
75+000 حتى الكم 80+000 بطول 5 كم اشراف ( المنطقة العاشرة - اسوان )

"بالامر المباشر"

تتبع ، مؤسسة الريمانس للمقاولات وتوريد مواد بناء

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (2)

المتز المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اترية

| بيان الأعمال                               | المفردات | إجمالي الكمية | ملاحظات                                                     |
|--------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| المتز المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اترية | 3م       | 60000         | علما بان كيات الاخرية تقع من الكم<br>38+680 حتى الكم 39+780 |
| أجمالي الكمية المنفذة                      |          | 60000         |                                                             |
| الكمية السابق صرفها                        |          | 0             |                                                             |
| أجمالي الكمية المنفذة حاليا                |          | 60000         |                                                             |

مهندس الهيئة

محرر

عن الشركة

مدير

تنفيذ اعمال الجسر الترابي لارزدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى في المسافة من

75+000 حتى الكم 80+000 بطول 5 كم اشرافه (المبطقة العاشرة - اسوان )

"الامر المباشر"

تنفيذ : مؤسسة الرياس للمجاولات وتوريد مواد بناء

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (1)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ( البلبوزر) في التربة المتاسكة

| بيان الأعمال                                                          | المفردات | إجمالي الكمية | ملاحظات |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ( البلبوزر) في التربة المتاسكة | 3م       | 15000         |         |
| أجمالي الكمية المنفذة                                                 |          | 15000         |         |
| الكمية السابق صرفها                                                   |          | 0             |         |
| أجمالي الكمية المنفذة حاليا                                           |          | 15000         |         |

مهندس الهيئة

عن الشركة



شركة الريماس  
للمقاولات

تقرير رقم ٨٥٢ بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٢  
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى  
العملية من كم ٣٦+٦٨٠ الى كم ٣٩+٤٨٠

السيد المهندس / مدير شركة الريماس للمقاولات

تحية طيبة-----وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-  
قيمة الاختبارات المعملية ٢٢٩٥ جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٨/٢/٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عبد يحيى كرومر

تمت (الرجاء)  
شيفت عليه

شركة  
الريماس  
للمقاولات

تقرير رقم ٨٥٢ بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٢

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى من كم  
٣٦+٦٨٠ الى كم ٣٩+٤٨٠



| م  | عدد العينات | الطبقة        | التجارب                                    | الفئة | القيمة | الإجمالي |
|----|-------------|---------------|--------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 1  | 1           | تجهيز العينة  | تحديد نسبة الماء من مهزة ٢٠٠               | 60    | 530    | 530      |
|    |             |               | اختبار حد السيولة                          | 160   |        |          |
|    |             |               | اختبار حد اللدونة                          | 180   |        |          |
|    |             |               | اختبار حد اللدونة                          | 130   |        |          |
| 2  | 0           | تجهيز العينة  | اختبار حد اللدونة                          | 60    | 600    | 0        |
|    |             |               | اختبار حد اللدونة                          | 540   |        |          |
| 3  | 0           | تجهيز العينة  | تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم ٨ | 60    | 1005   | 0        |
|    |             |               | تحديد نسبة الماء من مهزة ٢٠٠               | 165   |        |          |
|    |             |               | اختبار التآكل بجهاز لوس الجلوس             | 160   |        |          |
|    |             |               | اختبار حد السيولة                          | 230   |        |          |
|    |             |               | اختبار نسبة الطين                          | 180   |        |          |
|    |             |               | اختبار حد اللدونة                          | 80    |        |          |
|    |             |               | اختبار حد اللدونة                          | 130   |        |          |
| 4  | 1           | C.B.R         | تجهيز العينة                               | 60    | 560    | 560      |
|    |             |               | C.B.R                                      | 500   |        |          |
| 5  | 1           | بروفكتور أساس | تجهيز العينة                               | 60    | 510    | 510      |
|    |             |               | اختبار الدمك المعدل                        | 450   |        |          |
| 6  | 0           | رابطة + سطحية | تجهيز العينة                               | 80    | 325    | 0        |
|    |             |               | تحديد الوزن النوعي للخلطات المدمجة بالهبط  | 85    |        |          |
|    |             |               | كسر قوالب مارشال دمك بالموقع للقلب         | 110   |        |          |
|    |             |               | قياس سمك الأكواد                           | 50    |        |          |
| 7  | 0           | رابطة         | تجهيز العينة                               | 80    | 560    | 0        |
|    |             |               | تحديد نسبة البترومين وتدرج المواد الصلبة   | 400   |        |          |
|    |             |               | اختبار نسبة الطين                          | 80    |        |          |
| 8  | 0           | سطحية         | تجهيز العينة                               | 80    | 560    | 0        |
|    |             |               | تحديد نسبة البترومين وتدرج المواد الصلبة   | 400   |        |          |
|    |             |               | اختبار نسبة الطين                          | 80    |        |          |
| 9  | 0           | لبش تكليس     | تجهيز العينة                               | 60    | 320    | 0        |
|    |             |               | تحديد نسبة الأمصاص                         | 160   |        |          |
|    |             |               | تحديد نسبة التفتت                          | 100   |        |          |
| 10 | 0           |               | خروج فني المعمل ليوم واحد                  | 1000  | 1000   | 0        |
| 11 | 1           |               | إعداد تقرير شامل                           | 150   | 150    | 150      |
|    |             |               | الجملة                                     |       |        | 1750.00  |
|    |             |               | ١٥% مصاريف إدارية                          | 0.15  |        | 262.50   |
|    |             |               | الجملة                                     |       |        | 2012.50  |
|    |             |               | ١٤% الضريبة المضافة                        | 0.14  |        | 281.75   |
|    |             |               | الإجمالي                                   |       |        | 2295.00  |

فقط لا غير الفان ومائتان وخمسة وتسعون جنيه

تحريرا في ٢٨/٢/٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل  
مهندس /  
جيهان شكري

مهندس المعمل  
مهندس /  
انطوني جمال عبد الملاك

مهندس المعمل  
الاستاذ /  
أحمد الأمير محمد

# شركة الريماس للمقاولات

تقرير رقم ٨٥٢ بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٢  
عملية : ازدواج طريق اسوان/ توشكى  
العملية من كم ٣٦+٦٨٠ الى كم ٣٩+٤٨٠  
الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / احمد جمال  
العينات مسئولية من احضرها

بيانات ادارية

الهيئة العامة  
للطرق والكبارى والنقل البرى  
( GARBLT )  
القطاع الهندسى - جنوب السودان - اسوان



| المواصفات | تصنيف طبقة التربة    | معمل المنطقة              |
|-----------|----------------------|---------------------------|
|           | 5489                 | رقم العينة                |
|           | تشوينات محجر ٢٨+١١   | الموقع كم                 |
|           | ١٠/٠٢/٢٠٢٢           | التاريخ                   |
|           | النسبة المئوية للمار | المهزات                   |
|           | 100.00               | "٢                        |
|           | 99.62                | "١,٥                      |
|           | 83.38                | "١                        |
|           | 58.74                | "٣ / ٤                    |
|           | 48.85                | "١ / ٢                    |
|           | 43.79                | "٣ / ٨                    |
|           | 36.61                | رقم ٤                     |
|           | 30.58                | رقم ١٠                    |
|           | 20.23                | رقم ٤٠                    |
|           | 6.41                 | رقم ٢٠٠                   |
|           | 0                    | حد السيولة                |
|           | 0                    | مجال اللدونة              |
|           |                      |                           |
|           | A - 1 - a            | نوع التربة                |
|           | 2.180                | أقصى كثافة جافة ( ٣/٤ - ) |
|           | 3.19                 | تصحیح الرطوبة             |
|           | 43.17                | CBR                       |
| 30 % ≥    |                      |                           |
| 6 % ≥     |                      |                           |
|           |                      |                           |
|           |                      |                           |
|           |                      |                           |
|           |                      |                           |
|           |                      |                           |
| 10 % ≤    |                      |                           |

تحريرا فى ٢٨/٢/٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /  
عبد يحيى كركمر

مدير المعمل

مهندس /  
جيهان فتحى

مهندس المعمل

مهندس /  
انتونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار

فنى /  
صفوت محمد على

شركة الريماس للمقاولات

تقرير رقم ٨٥٢ بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٢  
عملية : ازدواج طريق اسوان/ توشكى  
العملية من كم ٣٦+٦٨٠ الى كم ٣٩+٤٨٠



تصنيف طبقة اترية

| المواصفات |  | معمل المنطقة       |       |                          |              |
|-----------|--|--------------------|-------|--------------------------|--------------|
|           |  | رقم العينة         |       |                          |              |
|           |  | 5489               |       |                          |              |
|           |  | تشوينات محجر ٢٨٠٠٠ |       |                          |              |
|           |  | 10/02/2022         |       |                          |              |
|           |  | المحجوز            | المار | المار%                   | المهيزات     |
|           |  | 0                  | 28820 | 100                      | "٢           |
|           |  | 110                | 28710 | 99.62                    | "١,٥         |
|           |  | 4680               | 24030 | 83.38                    | "١           |
|           |  | 7100               | 16930 | 58.74                    | "٣ / ٤       |
|           |  | 2850               | 14080 | 48.85                    | "١ / ٢       |
|           |  | 1460               | 12620 | 43.79                    | "٣ / ٨       |
|           |  | 2070               | 10550 | 36.61                    | رقم ٤        |
|           |  | 10550              |       |                          | الباقى       |
|           |  | 28820              |       |                          | الوزن الكلى  |
|           |  | 82.3               | 417.7 | 83.5                     | رقم ١٠       |
|           |  | 223.7              | 276.3 | 55.3                     | رقم ٤٠       |
|           |  | 412.4              | 87.6  | 17.5                     | رقم ٢٠٠      |
|           |  | 500                |       |                          |              |
|           |  | 0                  |       |                          | حد السيولة   |
|           |  | 0                  |       |                          | مجال اللدونة |
|           |  | A - 1 - a          |       | نوع التربة               |              |
|           |  | 2.180              |       | أقصى كثافة جافة ( ٣/٤- ) |              |
|           |  | 5.08               |       | نسبة مياه ملائمة (٣/٤-)  |              |
|           |  | 41.26              |       | نسبة ( ٣/٤+ )            |              |
|           |  | 2.352              |       | البروكتور المصحح         |              |
|           |  | 3.19               |       | تصحيح الرطوبة            |              |
|           |  | 43.17              |       | CBR                      |              |

تحريرا فى ٢٨/٢/٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل  
مهندس /  
جيهان فتحى

مهندس المعمل  
مهندس /  
انطونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار  
مهندس /  
صفوت محمد على

# عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم ٣٦+٦٨٠ الى كم ٣٩+٤٨٠

Report No 852 date 7 / 2 / 2022  
Spacimen NO. 5489

شركة الريماس للمقاولات

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة (٣/٤)

طبقة اترية A 1 - a

تشوينات محجر

لم ٢٨٤٠٠٠ حبل

|                    |       |
|--------------------|-------|
| D. d. of ( - 3/4 ) | 2.180 |
| W. c. of ( - 3/4 ) | 5.08  |
| W. c. of ( + 3/4 ) | 0.5   |
| S. g. Of ( + 3/4 ) | 2.650 |

| % Retaned 3/4   | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Corrected D. d. | 2.260 | 2.264 | 2.268 | 2.273 | 2.277 | 2.281 | 2.285 | 2.290 | 2.294 | 2.298 | 2.302 | 2.307 | 2.311 | 2.315 | 2.320 | 2.324 | 2.329 |
| Corrected W. c. | 4.17  | 4.12  | 4.08  | 4.03  | 3.98  | 3.94  | 3.89  | 3.85  | 3.80  | 3.75  | 3.71  | 3.66  | 3.62  | 3.57  | 3.53  | 3.48  | 3.43  |

| % ( + 3/4 )     | 37    | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Corrected D. d. | 2.333 | 2.337 | 2.342 | 2.346 | 2.351 | 2.355 | 2.360 | 2.364 | 2.369 | 2.374 | 2.378 | 2.383 | 2.387 | 2.392 |
| Corrected W. c. | 3.39  | 3.34  | 3.30  | 3.25  | 3.20  | 3.16  | 3.11  | 3.07  | 3.02  | 2.98  | 2.93  | 2.88  | 2.84  | 2.79  |

تحريرا فى ٢٨/٢/٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية  
مهندس / عيد يحيى كرومر

مدير المعمل  
مهندس / جيهان فتحى

مهندس المعمل  
مهندس / انطونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار  
فنى / صفوت محمد على  
صفوت محمد على

# عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم ٣٦+٦٨٠ الى كم ٣٩+٤٨٠

## شركة الريماس للمقاولات

MODIFIED PROCTOR TEST

AASHTO T 180

AASHTO T 224

Activity :- طبقة اترية A 1 - a


Report No 852 date 7 / 2 / 2022

Specimen NO. 5489

Testing date: 7/2/2022

Location تشوينات محجر كم ٢٨/٢

| Trail No-                             | 1     | 2     | 3     | 4     |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Weight of mould                       | 3380  | 3380  | 3380  | 3380  |
| Volume of mould                       | 2115  | 2115  | 2115  | 2115  |
| Weight of mould + compacted soil      | 7589  | 7984  | 8315  | 8024  |
| Weight of compacted soil              | 4209  | 4604  | 4935  | 4644  |
| weight of wet soil + Container weight | 445.2 | 515.5 | 319.2 | 623.8 |
| weight of dry soil + Container weight | 437.3 | 498.6 | 305.2 | 591.7 |
| Container No.                         | 1.0   | 2.0   | 3.0   | 4.0   |
| Container weight                      | 43.8  | 51.7  | 41.0  | 151.0 |
| weight of dry soil                    | 393.5 | 446.9 | 264.2 | 440.7 |
| Weight of water                       | 7.90  | 16.90 | 14.00 | 32.10 |
| Moisture content                      | 2.01  | 3.78  | 5.30  | 7.28  |
| Bulk density of wet soil              | 1.990 | 2.177 | 2.333 | 2.196 |
| Dry density                           | 1.951 | 2.098 | 2.216 | 2.047 |

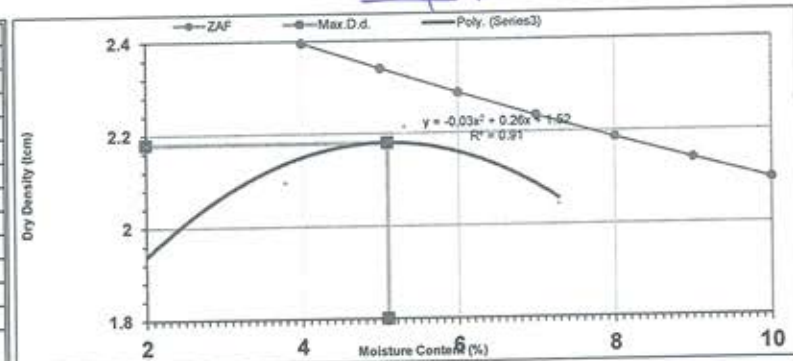

|                  |       |
|------------------|-------|
| % Retained 3 / 4 | 41.26 |
|------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| MAX. DRY DENSITY - 3 / 4 | 2.180 |
|--------------------------|-------|

|                  |      |
|------------------|------|
| O. W.C.% - 3 / 4 | 5.08 |
|------------------|------|

|                       |       |                 |      |
|-----------------------|-------|-----------------|------|
| Corrected DRY DENSITY | 2.352 | Corrected W. C. | 3.19 |
|-----------------------|-------|-----------------|------|

تحريرا فى ٢٨/٢/٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
عيد يحيى كرومر

مدير المعمل  
مهندس /  
جيهان فتحى

مهندس المعمل  
مهندس /  
انطونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار  
فنى / مهندس /  
صفوت محمد على

# عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم ٣٦+٦٨٠ الى كم ٣٩+٤٨٠

Determining the California Bearing Ratio (T193)

شركة الريماس  
للمقاولات

Report No 852 date 7 / 2 / 2022

Specimen NO. 5489

Testing date:

8/2/2022

LOCATION

تشوينات محجر



طبقة اترية A1 - a

Determining the California Bearing Ratio (Trial 1):

|                                       | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 |                           | 0.00 | 0.640  | 1.270  | 1.910  | 2.540  | 3.810  | 5.080  | 7.620   |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Height of mould mm.                   | 117     | 117     | 117     | Penetration mm :          | 0.00 | 0.01   | 0.02   | 0.04   | 0.07   | 0.13   | 0.18   | 0.32    |
| No. of blows                          | 10      | 30      | 65      | Load Dial Reading :       | 0.0  | 161.67 | 183.06 | 225.88 | 290.24 | 419.40 | 527.49 | 832.34  |
| weight of compacted wet soil+mould    | 8266.0  | 8514.0  | 8723.0  | Load Kg. :                |      |        |        |        | 21.34% |        |        |         |
| weight of mould gm.                   | 3848.0  | 3848.0  | 3848.0  | C.B.R. at pen. (2.54) mm: |      |        |        |        | 25.86% |        |        |         |
| weight of compacted wet soil gm.      | 4418.0  | 4666.0  | 4875.0  | C.B.R. at pen. (5.08) mm: |      |        |        |        | 25.86% |        |        |         |
| Volume of mould                       | 2115.0  | 2115.0  | 2115.0  | (C.B.R.)                  |      |        |        |        |        |        |        |         |
| Wet Density gm/cm3                    | 2.089   | 2.206   | 2.305   | (Trial 2)                 |      |        |        |        |        |        |        |         |
| Container No.                         | 1       | 2       | 3       | Penetration mm :          | 0.00 | 0.640  | 1.270  | 1.910  | 2.540  | 3.810  | 5.080  | 7.620   |
| Container weight                      | 43.9    | 51.2    | 43.9    | Load Dial Reading :       | 0.00 | 0.01   | 0.04   | 0.08   | 0.14   | 0.22   | 0.32   | 0.53    |
| weight of wet soil + Container weight | 274.40  | 302.69  | 286.60  | Load Kg. :                | 0.0  | 161.67 | 225.88 | 311.72 | 440.98 | 614.25 | 832.34 | 1295.70 |
| weight of dry soil + Container weight | 265.40  | 292.90  | 277.60  | C.B.R. at pen. (2.54) mm: |      |        |        |        | 32.43% |        |        |         |
| weight of dry soil                    | 221.50  | 241.70  | 233.70  | C.B.R. at pen. (5.08) mm: |      |        |        |        | 40.80% |        |        |         |
| weight of water gm.                   | 9.00    | 9.79    | 9.00    | (C.B.R.)                  |      |        |        |        | 40.80% |        |        |         |
| Water content %                       | 4.06    | 4.05    | 3.85    | swell calculations:       |      |        |        |        |        |        |        |         |
| Dry density g/cm3                     | 2.007   | 2.120   | 2.220   | initial measurement mm. : | 0.00 | 0.00   | 0.00   |        |        |        |        |         |
|                                       |         |         |         | Final measurement mm. :   | 0    | 0      | 0      |        |        |        |        |         |
|                                       |         |         |         | Swell % :                 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |        |        |        |        |         |
|                                       |         |         |         |                           |      |        |        |        |        |        |        |         |

|                           | (Trial 3) | 0.00 | 0.640  | 1.270  | 1.910  | 2.540  | 3.810  | 5.080  | 7.620   |
|---------------------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Penetration mm. :         |           | 0.00 | 0.02   | 0.05   | 0.11   | 0.19   | 0.29   | 0.36   | 0.61    |
| Load Dial Reading :       |           | 0.0  | 183.06 | 247.32 | 376.28 | 549.15 | 766.74 | 920.03 | 1474.14 |
| Load Kg. :                |           |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C.B.R. at pen. (2.54) mm: |           |      |        |        | 40.38% |        |        |        |         |
| C.B.R. at pen. (5.08) mm: |           |      |        |        | 45.10% |        |        |        |         |
| (C.B.R.)                  |           |      |        |        | 45.10% |        |        |        |         |

|                         | initial measurement mm. : | 0.00              | 0.00           | 0.00         | ( No swell ) |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| Final measurement mm. : | 0                         | 0                 | 0              |              |              |
| Swell % :               | 0.00                      | 0.00              | 0.00           |              |              |
| CBR at                  | 98.0%                     | OF Max. density = | 54.60          | %            |              |
| density                 | percent of CBR (%)        | Max. Dens.        | Surcharge (Kg) | Max. Swell % |              |
| 1 ◇                     | 2.01%                     | 85.35%            | 21.34          | 25.86        | 2.352        |
| 2 △                     | 2.12%                     | 90.15%            | 32.43          | 40.80        | 5.00         |
| 3 □                     | 2.22%                     | 94.4%             | 40.38          | 45.10        | 5.00         |



رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل  
مهندس /  
جيهان فتحي

مهندس المعمل  
مهندس /  
انطوني جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار  
فنى /  
صفوت محمد على

تحريرا فى ٢٨/٢/٢٠٢٢



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

### محتوى الشرط

### الشروط العامة

يمكن تغطية الأنواع السياحية من الحوادث الشخصية بموجب ملحق يضاف الى الوثيقة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الملحق الخاص بهذه التغطية والمرفق بهذه الوثيقة :-

[F9]  
[A1] يكون سعر التغطية بواقع 01 % ( واحد في الألف ) عن كل اسبوع أو جزء منه



المنطقة : جنوب الوجه القبلي

الفرع : اسوان

تسجيل : Mohammed Thabet Abdel Salam

تاريخ الطباعة : ٢٠٢٣/٩/١٩

شركة مصر للتأمين

مصر للتأمين

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمخصص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 أ الدقي - الجيزة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الدماء المستحقة على هذا المستند ومرفقاته  
رقم التسجيل الضريبي 200-008-404



**مصر للتأمين**  
**MISR INSURANCE**

الحوادث الشخصية جماعى  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

فقد يد وقدم .

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم والمبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئى حسب البيان التالى :-

حالة العجز الجزئى  
المستديم

نسبة العجز الجزئى

1. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للذراع أو يد 50 % 60 00000000000000

الفقد الكامل لحركة الكتف 20 % 25 00000000000000

الفقد الكامل لحركة المرفق 15 % 20 00000000000000

الفقد الكامل لحركة المعصم 15 % 20 00000000000000

الفقد الكامل للإبهام والسبابة 25 % 30 00000000000000

الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 20 % 25 00000000000000

الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 15 % 20 00000000000000

الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 20 % 25 00000000000000

الفقد الكامل للإبهام فقط 15 % 20 00000000000000

الفقد الكامل للسبابة فقط 10 % 15 00000000000000

الفقد الكامل للوسطى فقط 8 % 10 00000000000000

الفقد الكامل للبصير فقط 7 % 8 00000000000000

الفقد الكامل للخنصر فقط 6 % 7 00000000000000

2. الأطراف السفلى

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة 50 %

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة 40 %

البتر الجزئى للقدم والشامل لجميع الأصابع 30 %

الفقد الكامل لحركة الحرقفة 30 00000000000000000000

الفقد الكامل لحركة الركبة 30 00000000000000000000

الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15 00000000000000000000

الفقد الكامل لحركة إبهام القدم 8 00000000000000000000

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وأعدائاته والمريض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 أ الدقي - الجيزة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الدفوعات المستحقة على هذا المستند ومرفقاته  
رقم التسجيل الضريبي 200-008-404



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

| عدد المؤمن عليهم | الوظيفة     | مبلغ تأمين الفرد | العملة | إجمالي مبلغ التأمين |
|------------------|-------------|------------------|--------|---------------------|
| 1                | مهندس       | 75000.00         | EGP    | 75000.00            |
| عدد المؤمن عليهم | الوظيفة     | مبلغ تأمين الفرد | العملة | إجمالي مبلغ التأمين |
| 1                | مساعد مهندس | 30000.00         | EGP    | 30000.00            |
| عدد المؤمن عليهم | الوظيفة     | مبلغ تأمين الفرد | العملة | إجمالي مبلغ التأمين |
| 1                | سائق        | 15000.00         | EGP    | 15000.00            |
| عدد المؤمن عليهم | الوظيفة     | مبلغ تأمين الفرد | العملة | إجمالي مبلغ التأمين |
| 1                | عامل        | 10000.00         | EGP    | 10000.00            |



شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولتدويلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 أ الدقي - الجيزة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الدفاتر المستحقة على هذا المستند ومرفقاته  
رقم التسجيل الضريبي 200-008-404



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة وتوريد مواد البناء

عنوان المؤمن له : الملكين القبلىة الحسينية-ملك عطيه محى الدين عطيه-اسوان

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 19-09-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 19-03-2024

إجمالي مبلغ التأمين :

| المبلغ    | العملة |
|-----------|--------|
| 130000.00 | EGP    |

حساب الرسوم :

| الوصف                   | المبلغ | العملة |
|-------------------------|--------|--------|
| صافي القسط              | 728.75 | EGP    |
| الدمغة النسبية          | 7.29   | EGP    |
| الضريبة النوعية         | 18.40  | EGP    |
| رسم الإشراف والرقابة    | 4.37   | EGP    |
| رسوم اعتماد             | 0.73   | EGP    |
| صندوق ضمان حملة الوثائق | 1.46   | EGP    |
| مصاريف الإصدار          | 75.00  | EGP    |
| اجمالي القسط            | 836.00 | EGP    |

المبلغ المخصص

النسبة %

المستفيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

كود الهيئة

الوسيط التأمينى

انتاج ادارة

مصر للتأمين

الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسى 44 أ الدقي - الجيزة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الدفوعات المستحقة على هذا المستند ومرفقاته  
رقم التسجيل الضريبي 200-008-404



**مصر للتأمين**  
**MISR INSURANCE**

الحوادث الشخصية جماعي  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

## محتوى الشرط

## الشروط العامة

ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة (7) .

### التغطيات الإضافية

1- العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة (البند الأول -أ)

2- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى . (بحد أقصى 1000 جم)

3- الشعب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركا فيها .

4- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية ( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطه غاصبة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان .

5- الأخطار الطبيعية ( الفيضان والزوابع والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر ) .

6- السفر على الطائرات الخاصة .

7- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة واليهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس وركوب المناطيد والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات أو القيام بإجراء اختبارات السرعة .

8- مصاريف الجنازة (بحد أقصى 2000 جم) .

9- صرف قيمة الأجهزة التعويضية : في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تسدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين و بحد أقصى 5000 جم .

9- صرف قيمة الأجهزة التعويضية : في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تسدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين و بحد أقصى 5000 جنيه .

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة في جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث 0

### تغيير الخطر

" لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تنصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية :-

### الاستثناءات

1- تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم .

2- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها 0

3- السفر على الطائرات الحربية .

4- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إراديا لخطر غير ضرورى ( إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفس بشرية ) 0

5- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

### محتوى الشرط

### الشروط العامة

يمكن تغطية الأفواج السياحية من الحوادث الشخصية بموجب ملحق يضاف الى الوثيقة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الملحق الخاص بهذه التغطية والمرفق بهذه الوثيقة : -

[F&S] يكون سعر التغطية بواقع 01 % ( واحد فى الألف ) عن كل اسبوع أو جزء منه



المنطقة : جنوب الوجه القبلي

الفرع : اسوان

تسجيل : Mohammed Thabet Abdel Salam

تاريخ الطباعة : ٢٠٢٣/٩/١٩

شركة مصر للتأمين

محمد تابت

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 أ الدقي - الجيزة

لقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الدفاتر المستحقة على هذا المستند ومرفقاته  
رقم التسجيل الضريبي 200-008-404



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

فقد يد وقدم " .

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم والمبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنه من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئى حسب البيان التالى :-

حالة العجز الجزئى  
المستديم

نسبة العجز الجزئى

1. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للذراع أو يد 00000000000000 60 % 50 %

الفقد الكامل لحركة الكتف 00000000000000 25 % 20 %

الفقد الكامل لحركة المرفق 00000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل لحركة المعصم 00000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل للإبهام والسبابة 00000000000000 30 % 25 %

الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20 % 15 %

الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للإبهام فقط 00000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل للسبابة فقط 00000000000000 15 % 10 %

الفقد الكامل للوسطى فقط 00000000000000 10 % 8 %

الفقد الكامل للبنصر فقط 00000000000000 8 % 7 %

الفقد الكامل للخنصر فقط 00000000000000 7 % 6 %

2. الأطراف السفلى

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة 50 %

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة 40 %

البتر الجزئى للتقدم والشامل لجميع الأصابع 30 %

الفقد الكامل لحركة الحرقفة 0000000000000000 30 %

الفقد الكامل لحركة الركبة 0000000000000000 30 %

الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 00000000000000 15 %

الفقد الكامل لحركة إبهام القدم 00000000000000 8 %

شركة لإبعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

| عدد المؤمن عليهم | الوظيفة     | مبلغ تأمين الفرد | العملة | إجمالي مبلغ التأمين |
|------------------|-------------|------------------|--------|---------------------|
| 1                | مهندس       | 75000.00         | EGP    | 75000.00            |
| عدد المؤمن عليهم | الوظيفة     | مبلغ تأمين الفرد | العملة | إجمالي مبلغ التأمين |
| 1                | مساعد مهندس | 30000.00         | EGP    | 30000.00            |
| عدد المؤمن عليهم | الوظيفة     | مبلغ تأمين الفرد | العملة | إجمالي مبلغ التأمين |
| 1                | سائق        | 15000.00         | EGP    | 15000.00            |
| عدد المؤمن عليهم | الوظيفة     | مبلغ تأمين الفرد | العملة | إجمالي مبلغ التأمين |
| 1                | عامل        | 10000.00         | EGP    | 10000.00            |



شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 أ. الدقي - الجيزة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الدفعات المستحقة على هذا المستند ومرفقاته  
رقم التسجيل الضريبي 200-008-404



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى  
ACCP002248822A

وثيقة تأمين  
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : مؤسسة الريماس للمقاولات المتكاملة وتوريد مواد البناء  
عنوان المؤمن له : الملكين القبلىة الحسينية-ملك عطيه محى الدين عطيه-اسوان  
مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 19-09-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 19-03-2024

إجمالي مبلغ التأمين :

| المبلغ    | العملة |
|-----------|--------|
| 130000.00 | EGP    |

حساب الرسوم :

| الوصف                   | المبلغ | العملة |
|-------------------------|--------|--------|
| صافي القسط              | 728.75 | EGP    |
| الدمغة النسبية          | 7.29   | EGP    |
| الضريبة النوعية         | 18.40  | EGP    |
| رسم الإشراف والرقابة    | 4.37   | EGP    |
| رسوم اعتماد             | 0.73   | EGP    |
| صندوق ضمان حملة الوثائق | 1.46   | EGP    |
| مصاريف الإصدار          | 75.00  | EGP    |
| اجمالي القسط            | 836.00 | EGP    |

المبلغ المخصص

النسبة %

المستفيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

كود الهيئة

الوسيط التأمينى

انتاج ادارة

مصر للتأمين

الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكلاً لها.

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسى 44 أ الدقي - الجيزة

لقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الدفوعات المستحقة على هذا المستند ومرتقاته  
رقم التسجيل الضريبى 200-008-404

وثيقة تأمين  
رقم

## الشروط العامة

### التغطيات الإضافية

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الدماء المستحقة على هذا المستند ومرفقاته  
رقم التسجيل الضريبي 200-008-404
