

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية اعمال التخطيط لطريق طابا / نوبيع

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٤ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٢٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ بخصوص الاستلام الابتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

- المهندس / محمود حمدي محمد الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
 - المهندس / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
 - المهندس / محمد حسنى ادارة المعامل المركزية - عضوا
 - المهندس / اسامة عادل عز الدين المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) - عضوا
 - المهندس / هشام على العجرودى شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا
- وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها بصريا تبين الاتى :-

٢- تخطيط بالبويات المرورية العاكسة البيضاء على الساخن (اكسترودر) سمك ٢,٥ مم:-

- الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية واتساخ بالخطوط باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ٣٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة ثلاثة الاف جنية لا غير).
- اجمالى الخصم = ٣٠٠٠ جنية (فقط وقدرة ثلاثة الاف جنية لا غير).
- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي للاعمال عالية ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة هو تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ هو بداية فترة الضمان مع خصم المبلغ عالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة.

التوقيعات

٥- 

٤- 

٣- 

٢- 

١- 

شهادة

- تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري
بخصوص عملية : اعمال التخطيط علي طريق طابا / نويبع بالامر المباشر
التي قامت بتنفيذها : شركة مصرية للمستلزمات الطرق
١. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن .
 ٢. تم نهو جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ .
 ٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و أية خصومات أخرى مستحقة .
 ٤. المهندسين و الفنيون متواجدون بسلوك جيد.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٦

رئيس الإدارة المركزية



أحمد الطحان

مهندس /



بخصوص عملية: اعمال التخطيط علي طريق طابا / نوبيع
بالامر المباشر
تنفيذ: شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مذكرة إيضاحية

اسم العملية : اعمال التخطيط علي طريق طابا / نوبيع بالامر المباشر

- اشراف :- المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.
قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٥٠٠٠٠٠ جنيها

مدة تنفيذ العملية : ١ أشهر

تاريخ البدء:- ٢٠٢٤/٠٨/١٥

تاريخ النهو التعاقدى:- ٢٠٢٤/٠٩/١٥

تاريخ النهو الفعلي :- ٢٠٢٤/٠٨/٢١.

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٢٥٦٥٠٠٠ جنيها مصري لانتهاء الاعمال بنسبة
اقل من العقد ٤٨,١٩ % بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.


تحريرا في: / / ٢٠٢٤

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



مهندس /

تحريرا في: ٢٠٢٥/٦/٢٦


عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / بالامر المباشر
مقايسة ختامية



رقم البند	بيان الأعمال	الغنة		الكمية	الجملة	
		قرش	جنيه		قرش	جنيه
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبويه المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لايقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٨٥	٩٠٠٠	٠	٢٥٦٥٠٠٠
الاجمالي		٠			٠	٢٥٦٥٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع


مهندس العملية



م / محمد شحات

م / اسامه عادل عز الدين

م



عملية : أعمال التخطيط علي طريق طابا / نويج بالامر المباشر
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ : شركة مصرية للمستلزمات الطرق


بيان كميات الحصر الختامي

ملاحظات	نسبة الزيادة او النقص	الفرق بين الكمية الختامية و كمية التعاقد	الكمية الختامية	كمية التعاقد	الوحدة	بيان الاعمال	م
ملاحظا للحصر الفعلى على الطبيعة	%٤٨,١٠	٨٣٢٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٧٣٢٥	٢م	بالمتر المسطح اعمال تخطيط باليوبه المرورية البضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ سم يعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المنقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	١

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مهندسين للطرق
م.م.م.م.
ص.ب. ٧٤٠٤٢٠ ق.م. ٧٥٨٥
٢٠٥ - ١٥٥ - ٩٨٧



المنطقة الحادية / عشر جنوب سيناء

عملية اعمال تامين وسلامه مرور علي طريق طابا نوبيع


تنفيذ شركة مصريه لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م٢	٣٦١٣٨
٢	اعمال تهشير بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

مهندس الشركة: ايمن منصور ابراهيم

الاسم /
التوقيع /



القطاع نوبيع - ذهب (عملية تطوير طريق ذهب نوبيع بطول ٢٧ كم)

البيان	المسطح ب	المسطح س	عرض الخط	عدد الخطوط	نوع الخط	نوع التخطيط	طول القطاع	الكم الى	من الكم
اتجاه ذهب نوبيع		233.8	0.146	2	محور	ساخن	2402	74.224	71.822
اتجاه ذهب نوبيع		696.6	0.145	2	مستمر جنب	ساخن	2402	74.224	71.822
قبل الله اكبر اتجاه نوبيع	25.2		7.2	1	مطب	بارد	3.5	75.217	75.217
قبل الله اكبر اتجاه نوبيع			0.2	15	15 شريحة صوتي	صوتي	4834	75.315	75.315
اتجاه نوبيع ذهب		228.8	0.142	1	محور	ساخن	4834	77.473	72.639
اتجاه نوبيع ذهب		1421.2	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	4834	77.473	72.639
اتجاه نوبيع ذهب			10.1	1	مطب	بارد	4.5	72.857	72.857
اتجاه نوبيع ذهب	45.5		0.2	15	15 شريحة صوتي	صوتي	72.977	72.977	72.977
اتجاه نوبيع ذهب			0.143	1	محور	ساخن	1411	83.185	81.774
اتجاه نوبيع ذهب		67.3	0.143	1	مستمر جنب	ساخن	1411	83.185	81.774
اتجاه نوبيع ذهب		406.4	0.144	2	مستمر جنب	ساخن	1411	82.291	82.291
قبل الغار اتجاه نوبيع			0.2	15	15 شريحة صوتي	صوتي	3.5	82.291	82.291
امام الغار اتجاه نوبيع	23.8		6.8	1	مطب	بارد	4.4	84.763	84.763
اتجاه نوبيع ذهب			6.8	1	مطب	بارد	4.4	85.758	84.985
اتجاه نوبيع ذهب			0.141	1	محور	ساخن	773	85.758	84.985
اتجاه نوبيع ذهب		36.3	0.141	1	مستمر جنب	ساخن	773	85.758	84.985
اتجاه نوبيع ذهب		227.3	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	344	85.838	85.838
اتجاه نوبيع ذهب		100.4	0.146	2	مستمر جنب	ساخن	344	85.838	85.838
مدخل ابو جالوم		46.4	0.145	2	مستمر جنب	ساخن	160	85.838	85.838
مخرج ابو جالوم		31.8	0.143	1	50/50	ساخن	445	85.838	85.838
ابو جالوم		31.8	0.143	1	محور	ساخن	2473	86.624	84.151
اتجاه ذهب نوبيع		361.1	0.146	1	محور	ساخن	2473	86.624	84.151
اتجاه ذهب نوبيع		727.1	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	2473	86.624	84.151
اتجاه ذهب نوبيع		727.1	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	486	86.199	86.199
عند ١١٢ الصاعده		70.5	0.145	1	مستمر جنب	ساخن	486	86.624	86.624
نهاية الازواج	13.2		0.145	1	اسهم 6	بارد	2.2	86.624	86.624
	76.0		38		نوزه	بارد	4	86.624	86.624
	213.6	4654.9			الا حماري				

Handwritten signatures and notes on the left side of the page.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

القطاع كمين طابا - طاباهايتس - نويبع حتى بداية الازدواج

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
9.081	9.303	222	ساخن	مستمر جنب	1	0.145	32.2		
9.303	9.483	180	بارد	مستمر	3	0.15		81.0	وادي
9.081	18.854	2875	ساخن	محور	1	0.145	139.0		
9.081	18.854	9773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	2873.3		
9.081	18.854	6898	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	1007.1		
9.081	18.854	558	ساخن	مستمر سنتر اضافي	1	0.143	79.8		
18.854	18.854	2.1	بارد	مطب	1	7.3		15.3	طابا هاييس
18.854	18.854	3.3	بارد	مطب	1	8.6		28.4	طابا هاييس
18.854	18.854	2.8	بارد	مطب	1	7.3		20.4	طابا هاييس
18.854	23.215	632	ساخن	محور	1	0.142	29.9		
18.854	23.215	4361	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1282.1		
18.854	23.215	3730	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	544.6		
23.215	23.458	243	بارد	مستمر	3	0.15		109.4	وادي
23.458	24.130	672	ساخن	محور	1	0.135	30.2		
23.458	24.469	1011	ساخن	مستمر جنب	2	0.138	279.0		
24.130	24.469	339	ساخن	مستمر سنتر	1	0.134	45.4		
24.469	24.689	220	بارد	مستمر	3	0.15		99.0	وادي
24.689	35.676	1136	ساخن	محور	1	0.138	52.3		
24.689	35.676	10987	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	3230.2		
24.689	35.676	9851	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	1428.4		
35.676	35.676	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	35.786	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	57.418	2275	ساخن	محور	1	0.143	108.4		
35.676	57.418	21742	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	6392.1		
35.676	57.418	19467	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	2822.7		
57.418	57.418	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.714	57.714	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.800	57.800	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.831	57.831	4.5	بارد	مطب	1	10.5		47.25	كمين البدن
57.896	57.896	4.5	بارد	مطب	1	10.5		34.65	كمين البدن
58.024	58.024	3.1	بارد	مطب	1	7.7		23.56	كمين البدن
57.418	72.639	659	ساخن	محور	1	7.6			
57.418	72.639	15221	ساخن	مستمر جنب	2	0.131	28.8		
57.418	72.639	14562	ساخن	مستمر سنتر	1	0.147	4475.0		
61.892	61.892	2.7	بارد	مطب	1	0.146	2126.1		
62.063	62.063	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	4	بارد	نوز	1	38		76	مدخل نويبع
63.110	63.110	2.2	بارد	عدد ٦ سهم	1	6		13.2	مدخل نويبع
64.658	64.658	4	بارد	مطب	1	7.3		29.2	بنزينة مصر
65.490	65.490	4	بارد	مطب	1	11.1		44.4	الجامع
63.578	63.578	3.5	بارد	تهشير	1	44		154	نويبع ١ ut
66.557	66.557	3.5	بارد	تهشير	1	23.2		81.2	نويبع ٢ ut
67.487	67.487	3.6	بارد	مطب	2	8.5		61.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	مستمر	4	0.15		213.6	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	50/50	1	0.15		53.4	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	محور	4	0.15		71.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	سهم 6		6		13.2	وادي وتير
67.961	67.961	2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.961	67.961	4.5	بارد	مطب	1	8.5		38.25	وادي وتير
67.961	67.961	3.6	بارد	مطب	1	8.5		30.6	وادي وتير
70.870	70.870	4.5	بارد	مطب	1	10.7		48.15	بنزينة وطنيه
70.870	70.870	2.2	بارد	سهم 16				35.2	
71.137	71.137	4.5	بارد	مطب	1	11.4		51.3	اتجاه دهب نويبع
71.137	72.639	800	ساخن	50/50	1	0.144	57.6		ut
72.639	72.639	250	ساخن	مستمر	1	0.146	36.5		النوزه
72.639	72.639	10	بارد	نوز	1	40		200.0	مدخل نويبع
		1923.6		الاجمالي			27100.7		

مدير المصنع
15

مدير المصنع
15


حصص اعمال التخطيط من المنفذ حتي كمين طابا

البيان	المسطح ب	المسطح س	عرض الخط	عدد الخطوط	نوع الخط	نوع التخطيط	طول القطاع	الي الكم	من الكم
					تهشير	بارد	5	0.000	0.000
الجوابه	60.0		12		محور	ساخن	300	0.040	0.040
		14.5	0.145	1	عدد ٤ سهم	بارد		0.040	0.040
عند الصينيه	14.4				عدد ٤ سهم	بارد		0.100	0.100
عند الصينيه	14.4				50/50	ساخن	110	0.190	0.080
		16.0	0.145	1	مطب	بارد	3.5	0.300	0.300
تفتيش	23.8		6.8		مطب	بارد	3.5	0.365	0.365
مستشفى	23.8		6.8		مطب	بارد	3.5	0.365	0.365
مستشفى	4.4				عدد ٢ سهم	بارد	2.2	0.365	0.365
سوق طابا	24.2		6.9		مطب	بارد	3.5	0.723	0.723
سوق طابا	15.4		8.1		مطب	بارد	1.9	0.765	0.765
الجوازات	32.2		8.7		مطب	بارد	3.7	0.880	0.880
		116.2	0.144	2	محور	ساخن	1210	1.210	0.000
		711.5	0.147	4	مستمر جنب	ساخن	1210	1.210	0.000
نوزه العروسه	47.3		21	1	نوزه	بارد	4.5	1.210	1.210
قبل وبعد العروسه	13.6				عدد ٦ سهم	بارد	2.2	1.210	1.210
بعد العروسه	33.6		8.4		مطب	بارد	4	1.210	1.210
		18.1	0.146	1	50/50	ساخن	248	1.210	1.210
		391.3	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	1331	2.541	1.210
		190.3	0.143	1	مستمر سنتر	ساخن	1331	2.541	1.210
					عدد ٤ سهم	بارد	2.2	1.720	1.720
المخابرات	8.8				مطب	بارد	2.4	1.720	1.720
المخابرات	29.8		12.4		مطب	بارد	2.4	1.762	1.762
المخابرات	26.4		11		مطب	بارد	2.4	1.762	1.762
		391.6	0.147	4	مستمر جنب	ساخن	666	3.207	2.541
		62.6	0.141	2	محور	ساخن	666	3.207	2.541
ازاله اصفر	199.8		0.15	2	مستمر	بارد	666	3.207	2.541
صلاح الدين	38.3		8.7		مطب	بارد	4.4	5.925	5.925
صلاح الدين	35.3		8.4		مطب	بارد	4.2	6.359	6.359
		1727.0	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	5874	9.081	3.207
		59.1	0.141	1	محور	ساخن	1258	9.081	3.207
		684.3	0.146	1	مستمر سنتر	ساخن	4687	9.081	3.207
القرية البدويه	20.7		7.4	1	مطب	بارد	2.8	8.252	8.252
القرية البدويه	18.5		7.4	1	مطب	بارد	2.5	8.356	8.356
كمين طابا	45.0		10	1	مطب	بارد	4.5	9.152	9.152
كمين طابا	21.3		8.5	1	مطب	بارد	2.5	9.152	9.152
كمين طابا	50.0		11.1	1	مطب	بارد	4.5	9.152	9.152
كمين طابا	39.2		11.2	1	مطب	بارد	3.5	9.152	9.152
كمين طابا	38.9		11.1	1	مطب	بارد	3.5	9.152	9.152
كمين طابا	15.6		5.2	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	15.9		5.3	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	35.5		7.1	1	مطب	بارد	5	9.152	9.152
كمين طابا	28.8		9.6	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	29.4		9.8	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	29.1		9.7	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	103.2		0.15	1	مستمر	بارد	688	9.152	9.152
	1136.3	4382.4			الاجمالي				

مدير المدينه
طابا

مدير المدينه
طابا
٢٠٠٤
١٨٧

تفصيلي مساحة السهم

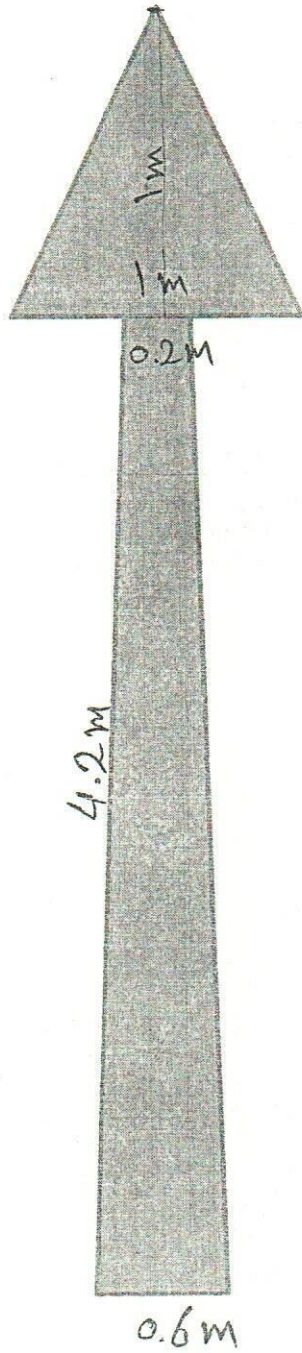

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال التخطيط لطريق طابا / نويبع

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٩)

تنفيذ : الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية

نحيط سيادتكم علماً بأنه يوجد بكراسة الشروط الخاصة يتم توريد عدد (١) حاسب (بجميع

مشمالاته) بأحدث المواصفات وغير متواجد بالمنطقة

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان



أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (١٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤ بمبلغ ٤,٩٣٧,٦٢٥ جنيه (فقط وقدرة أربعة مليون وتسعمائة سبعة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وعشرون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " أعمال التخطيط لطريق طابا / نويبع (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى ((المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

- ٣ - على المقاول تعيين أحد الفنيين مسئولاً عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسليح المقاول ويكون لديه خبرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة قدرها ١٠٠ مائتان جنيهاً) عن كل يوم لا يتواجد فيه مسئول تأمين سلامة المرور بالموقع .
- ٤ - يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في التشغيل تحت اشراف المنطقة و لا يتم البدء في العمل إلا بعد سحب العينات للإختبار .
- ٥ - يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (١) حاسب الي بجميع مشتملاته بأحدث المواصفات علي أن يتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (أربعون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد خلال مدة المشروع .

بند (٤١) : الضمان : يضاف الاتي :-

- ١ . على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لانتهاء جميع اجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ ورود قرار التقييم .

مصرية لاستشارات المثلوث
مساهمة مصرية
س. ت. ٧٥٨٥ م. ق. ٤٣٠ - ٧٤
يد. ق. ١٨٧ - ١٥٠ - ٢٠٥

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
(للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تحية طيبة وبعد ،،،،

ايماءا الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٩) المؤرخ في ٢٩/٠٧/٢٠٢٤ والخاصة بعملية
اعمال التخطيط لطريق طابا / نويبع بالامر المباشر.

نحيط علم سيادتكم بأن شركتنا ليس لديها مانع من تختيم هذا العقد بنسبة نقص ٥١,٩٤ %
من العقد الأصلي للعملية عالية وذلك نظرا لعدم الانتهاء من رصف هذه المسافة دون الرجوع
علي الهيئة حاليا أو مستقبلا بأي شيء ماليا أو فنيا.

ولسيادتكم جزيل الشكر،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب /

وليد لطفي احمد

محمد الاستاذ
