

حصر كميات

مستخلص جارى رقم (٧)


مشروع

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات

(على باشا حلمى - اطسا - الكفور - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بنى قرة - الحواتكة)

البيان المجمع للكباري مستخلص رقم (٧)
مشروع انشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات
(على باشا حلمي - اطسا - الكفور - اييوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بني قرة - الحواتكة)

م	البند	الوحدة	الفئة	كمية الصحراوية حتى مستخلص ٦٠٢	كميات كوبري جزيرة شندويل	كميات كوبري هيكل باشا	كميات كوبري تل العمارنة	كميات كوبري بني قرة	كميات كوبري الكوم الأحمر	كميات كوبري بهجورة	إجمالي الكمية	إجمالي الكمية شندويل-بهجورة - الكوم الأحمر	اجمالي كميات انشاء الطرق مستخلصات ٥٤٤٣,٧
أولاً : أعمال الكباري													
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعدات	م.ط	١١	٢٥٤	٠	٥٨	٧٠	٩٥	٠	٠	٤٧٧	٠	٢٢٣
٢	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات والبند تشمل نقل ماكينات الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكراتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف استشاري الهيئة طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٨٥	٠	٥٠	٨٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٣٧٠	١٧٠	٣٧٠
	١ - المتر الطولي أعمال جسات بالير.	م.ط	١٣٦٠	٢٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٠	٠	٠
٣	بالمتر المكعب تكسير الخرسانة مسلحة (بلاطات - كمر - كوستات الكباري) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتسليم جديد التسليح الناتج من التكسير بحالته إلى مندوب الهيئة مع تطهير المجرى المائي من مخلفات التكسير وتسليمه كما كان بحالته والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٧٠	٠	٠	١٦٨	٠	٠	٠	٠	١٦٨	٠	١٦٨
٤	بالمقطوعة فك ونقل البواقي المعدنية الموجودة على المجاري المائية والبند يشمل فك القطاعات المعنية بتوفير أوتاش ذات المحولات الكبيرة والتي تستخدم في أعمال رفع الكمرات والتريالات التي تنقل أجزاء الباكيت إلى المخازن الرئيسية التابعة للجهة المالكة ويشمل الأوتاش التي تستخدم في تنزيل وتشوين الباكيت في المخازن والبند شامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات	مقطوعة	١٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	٠	٢
٥	بالمتر المسطح أعمال فك حديد كيرتال أعلى الاسوار وتسليمها إلى مخازن الجهة المالكة طبقا لتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٩٠	٠	٠	٠	١٣٠	٢٠٣	٠	٠	٣٣٣	٠	٣٣٣
٦	بالطن فك ونقل هيكل معدنية تشمل عمل (مظلات - حوامل - أعمدة انارة ... الخ) وتسليمها إلى مخازن الجهة المالكة وذلك طبقا لمتطلبات المالك والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٢٠٤٠	٠	٠	٠	٠	٢٠,٥٣	٠	٠	٢٠,٥٣	٠	٢٠,٥٣
٧	بالعد نقل ماكينات الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة على الموقع والبند يشمل المعدات والأوتاش اللازمة للفك والتركيب والموقع وتكلفة النقل وكترات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (وجه قبلي)	عدد	٢٧٥٠٠٠	٤	١	١	١	١	١	١	١٠	٣	٦
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالين (Board Piles) قطر ١٠٠ سم يحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي / مقاوم الكبريتات طبقا لتقرير الجسات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (والسعر لا يشمل جديد التسليح) ونهوض العمل كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ألا تقل أطوال اشابير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبخ داخل المخدة.	م.ط	٣٣٤٠	١٢٠	١٧٠	٣٢٠	١٨٨,٧٦	١٨٥,٥	١٨٨,٤	١١٧٢,٦٦	٤٩٣,٩	١١٧٢,٦٦	١١٧٢,٦٦
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالمجري محفورة ومصبوبة بمواقعها (bord piles) قطر ١٠٠ سم ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة الميزية للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ سم اسمنت بورتلاندي عادي و مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخندات فوقها والعمل لنهوض العمل والسعر لا يشمل جديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الاعمال والمواصفات والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٤٠٠	٨٢٢	٠	٠	١٤٢,٥	٥٧٦,٥٣	١٥٤١,٠٣	٠	١٥٤١,٠٣	٠	٧١٩,٠٣
١٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت غلاف معدني بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش أو ما يعادلها)	طن	٣٤٠٠٠	٢٦,٩١	٥,٢٧	٠	١٩,٥٢	٣٠,٥٥	٦,٤	٥,٢١	٩٣,٨٦	١٦,٨٨	٦٦,٩٥
١١	بالعد عمل تجرية تحميل على الخوازيق غير عامل بنسب قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٠٠ سم) ويضعف الحمل التصميمي (٢٠٪) والفتة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أعلى تجرية التحميل للوصول إلى حمل التجرية المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجرية التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر لا يشمل قيمة الخوازيق ويشمل دفع جميع الكراتات اللازمة لزوم أعمال الردم وتوريد الأجهزة اللازمة لأجراء التجرية واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٨٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢	بالمتر المكعب أعمال حفر في جميع أنواع التربة عدا التربة المتعاسكة وشديدة التماسك والصخرية (بالعمق المطلوب لزوم عمل الأساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والرسومات التنفيذية الفتة تشمل نزع الجوفية وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية والقياس طبقا لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠	٠	٩١٥,٦	٠	٠	٠	٠	٠	١١٨,١٨	٢٠٢,٥٨	١١٨,١٨
١٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالعمق المطلوب لزوم عمل الأساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والرسومات التنفيذية والفتة تشمل نزع المياة الجوفية وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية والقياس طبقا لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٩٠	٠	٩٠,٤٣	١١٠	٠	٠	٠	٠	٣٢١,٦٥	٢١١,٦٥	٣٢١,٦٥
١٤	بالمتر المكعب توريد ودمك زرع زائفة أو تربة زائفة موددة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض العمل طبقا لإبعاد الرسومات طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٣٥	١٦١,٢٨	١٠٨,٥١	٠	٥٦٦,٦٤	١٩٦,٧٥	٠	٠	١٠٣٣,١٨	٣٠٥,٢٦	٨٧١,٩
١٥	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة للسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول المجري المائي والسعر يشمل إزالة أعمال الردم بعد إتمامها من الأعمال وتطهير المجري حتى المنسوب لتصميمي للقاء والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحملها لمكينات الخوازيق وسارات صيب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لإتمام العمل	م.ط	٩٥	٠	٦٠٣٤,٢	٣١١٤	٢٥٣٧,٦٨	٣٦٣١,٨٢	٢٥٨٧,٨٤	١٧٩٠,٥٤	٦٢١٩,٦٦	١٧٩٠,٥٤	١٧٩٠,٥٤
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانشائية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم. والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٦٩٠	٢٩,٨٨	٨,٤١	٨,٨٩	٥٥,٥٤	٢١,٥١	١٢,٤٨	٤,٤١	٩١,١٢	٢٥,٣	٦١,٢٤
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأرضية والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ والتشطيب الجيد بالهيكوتر المسطح الخرسانة والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٧٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠



صفحة (٢ / ٣)

البيان المجمع للكباري مستخلص رقم (٧)
مشروع انشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات
(على باشا حلمي - اطسا - الكفور - ايخوا - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بني قرة - الحواثكة)

م	البند	الوحدة	الفئة	كمية الصحراوية حتى مستخلص ٦٠٢	كميات كوبري جزيرة شندويل	كميات كوبري هيكل باشا	كميات كوبري تل العمارنة	كميات كوبري بني قرة	كميات كوبري الكوم الأحمر	كميات كوبري بهجورة	إجمالي الكمية	إجمالي الكمية شندويل-بهجورة - الكوم الأحمر	اجمالي كميات انشاء الطرق مستخلصات ٥٤٠٣,٧
١	بالمقطوعه تكسير كباري على ترعة الإبراهيمية بطول من ٤٠ م وحتى ٤٥ م وعرض من ٨ م إلى ١٠ م شامل تطهير المجرى وتكسير الهامات ورؤوس الخوازيق داخل المجرى المائي حتى منسوب المياه والفتة شاملة مما جميعه	مقطوعية	٨٥٠٠٠	٢	٠	٠	١	٠	٠	٠	٣	٠	١
٢	بالعد للكوبري الواحد نقل ذات طبيعه خاصه وحمولات عالية لرفع كمر سابق الصب ذات بحور واوازن عالية اعلى التربة الابراهيمية والبند شامل التريلات الناقلة لأجزاء الروافع الى موقع العمل وتركيب أجزاء الروافع في الموقع وتوريد وتركيب البنتوم في موقع العمل وكافة التصاريح والتسقيقات مع الجهات المعنية	عدد	٤٧٥٠٠٠٠	٠	٠	١	٠	١	١	٠	٣	١	٣
٣	علاوة زيادة الجهد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنتي الى ٤٩٠ كجم/سم ^٢ بند ٩ (بالمتر الطولي حفر وصب خوازيق بالمجرى قطر ١٠٠ سم)	م.ط	٨٥	٠	٠	٠	٠	٥٧٦,٥٣	٠	٠	٥٧٦,٥٣	٠	٥٧٦,٥٣
٤	علاوة زيادة الجهد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنتي الى ٤٧٠ كجم/سم ^٢ بند ٢١ (بالمتر المكعب صب خرسانة لزوم القواعد بالمجرى المائي)	م.ط	١١٥	٠	٠	٠	٠	١٤٤	٠	٠	١٤٤	٠	١٤٤
٥	بالمتر المسطح تكسير كباري بطول من ١٠ م إلى ٤٠ م على المجارى المائية شامل تطهير المجرى المائي وتكسير الهامات ورؤوس الخوازيق داخل المجرى المائي حتى منسوب المياه والفتة شاملة مما جميعه والفتة لا تشمل فك وتسليم البواقي المعدنية	م.ط	٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٠	٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠
٦	بالمتر المسطح تكسير كباري أطول من ٤٥ م على المجارى المائية شامل تطهير المجرى المائي وتكسير الهامات ورؤوس الخوازيق داخل المجرى المائي حتى منسوب المياه والفتة شاملة مما جميعه والفتة لا تشمل فك وتسليم البواقي المعدنية	م.ط	١٨٩٠	٠	٠	٠	٠	٥٢٠	٠	٠	٥٢٠	٠	٥٢٠
ثانياً : أعمال الطرق													
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنبه لكل كيلومتر للزيادة أو النقص	م.ط	٦١	١٩,٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩,٦	٠	٠
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلب المتدرجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة للمشروع نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والازيد الامتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأسيولية للتوصل الى القصي كثافة جافه ولا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفتة وتشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم) احتساب علاوة ١ جنبه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.	م.ط	٢٢٤	٠	١٠٥	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٥	٠	١٠٥
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC ٣٠٠٠ بمعدل ٠,٥ كجم ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيد ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٩	٠	٠	٠	٣١٦١,٢	٠	٠	٠	٣١٦١,٢	٠	٣١٦١,٢
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارده من شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفتة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٤٣	٠	٠	٠	١٥٨٠,٦	٠	٠	٠	١٥٨٠,٦	٠	١٥٨٠,٦
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ (٣ ب) وارده من شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفتة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٣٧	٠	٠	٠	١٥٨٠,٦	٠	٠	٠	١٥٨٠,٦	٠	١٥٨٠,٦
ثالثاً : أعمال الكهراء													
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC باقطار مختلفة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٦	٠	٠	٠	١٨٤,٢	٠	٠	٠	٢٥٠,٢	٦٦	٢٥٠,٢
	١ - ماسورة ٣ بوصة	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	ب - ماسورة ٦ بوصة	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

مشروع إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الإبراهيمية عند مداخل المزلقات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

بيان أعمال بالكميات المنفذة بكوبرى مزلقان بنى قرة
عن المدة من بداية الاعمال حتى ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	وصف البند	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اعمال رفع مساحي	م.ط	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	
٢	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات بالبر	م.ط	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	
٤	بالمقطوعية فك و نقل البواكى المعدنية الموجودة على المجارى المائية	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	
٥	بالمتر المسطح اعمال فك حديد كرتال أعلى الأسوار و تسليمها الى مخازن الجهة المالكة	م	٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	
٦	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات - حوامل - اعمدة انارة - الخ)	طن	٢٠,٥٣	٠,٠٠	٢٠,٥٣	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى الموقع	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر قطر ١٠٠ سم	م.ط	١٨٨,٧٦	٠,٠٠	١٨٨,٧٦	
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	م.ط	٥٧٦,٥٣	٠,٠٠	٥٧٦,٥٣	
١٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى)	طن	٣٠,٥٥	٠,٠٠	٣٠,٥٥	
١٤	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة أو تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات	م	٤٥٠,٠٠	١١٦,٦٤	٥٦٦,٦٤	
١٥	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق	م	٠,٠٠	٢٥٣٧,٦٨	٢٥٣٧,٦٨	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	م	١٥,١١	٦,٤٠	٢١,٥١	
١٨	بالمتر المسطح اعمال دسمة لقواعد المجري المائى والهيكل العلوى	م	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم كميرات سابقة الصب	م	٦٥٦,٢٨	١٦,٢٠	٦٧٢,٤٨	
٢١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية بالمجرى المائى	م	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية بالبر	م	٩٨,٤٦	٦٤,٨٢	١٦٣,٢٨	
٢٢-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	م	٩٨,٤٦	٦٤,٨٢	١٦٣,٢٨	
٢٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات العلوية	م	٨٣,٨٣	٥١٢,١٢	٥٩٥,٩٥	
٢٤-أ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح	طن	٥٧١,٢٢	٧٦,٨٧	٦٤٨,٠٩	
٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجين على البار	م	٠,٠٠	١٠٢,٥٦	١٠٢,٥٦	
٢٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكريلك مانعة للتآكل في المجرى المائى ومواد مقاومة للعوامل الجوية	م	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٤٨٥٩,١٢	
٢٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	
بند مستحدث	بالعدد للكوبرى الواحد نقل روافع ذات طبيعه خاصة وحمولات عالية لرفع كمر سابق الصب	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	
بند مستحدث	علاوة زيادة الجهد الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة المحتوى الاسمنتى الى ٤٩٠ كجم /م ^٣ بند ٩	م	٥٧٦,٥٣	٠,٠٠	٥٧٦,٥٣	
بند مستحدث	علاوة زيادة الجهد الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة المحتوى الاسمنتى الى ٤٧٠ كجم /م ^٣ بند ٢١	م	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	
بند مستحدث ٦	بالمتر المسطح تكسير كبارى أطول من ٤٥ م على المجارى المائية شامل تطهير المجرى المائى وتكسير الهامات ورؤوس الخوازيق داخل المجرى المائى	م	٥٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	
طرق ٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC .٣٠٠٠	م	٠,٠٠	٣١٦١,٢٠	٣١٦١,٢٠	
طرق ٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك	م	٠,٠٠	١٥٨٠,٦٠	١٥٨٠,٦٠	
طرق ١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	م	٠,٠٠	١٥٨٠,٦٠	١٥٨٠,٦٠	
كهرباء ١٧-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار خدائيات PVC ماسورة ٣ بوصة	م.ط	٠,٠٠	١٨٤,٢٠	١٨٤,٢٠	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة النشل العامة للإنشاء والتطويق

مهندس /
التوقيع

مهندس /
التوقيع



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.ت.م.)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البند _____ د	الوحدة	العدد	الاجمالي	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعتضات	م.ط	٩٥	٩٥	بنى قرة
	الاجم_____الى (متر طولي)			٩٥	

مهندس الهيئة

[Handwritten signature]

مهندس الشركة

٣/١٢ محمد بن العباس



مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزقات (نل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش . ت . م . م)

کوبری مزلقان بنی قره

رقم البند	البند _____ د	الوحدة	الطول	الكمية	ملاحظات
(٢-أ)	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات بالير لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشارى	م.ط	٣٠	٣٠	جسة رقم ١
		م.ط	٣٠	٣٠	جسة رقم ٢
	الاجمه _____ الى (م.ط)			٦٠	

مهندس الهيئة

۱۳۷۹

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقانات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

الهيئة العامة
للطرق و الجسور و الدكرى
(GARBLT)
المسئله العامة لشؤون الطرق



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)


كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنــــــــــــد	الوحدة	العدد	الاجمالى	ملاحظات
٤	بالمقطوعية فك و نقل البواكى المعدنية الموجودة على المجارى المائية و البند يشمل فك القطاعات المعدنية بتوفير الأوناش ذات الحمولات الكبيرة و التى تستخدم فى أعمال رفع الكمرات و التولات التى تنقل أجزاء الباكىة الى المخازن الرئيسية التابعة للجهة المالكة و الخ و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و المواصفات .	مقطوعية	١	١	بنى قرة
	الاجمــــــــــــــــالى (مقطوعية)			١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(GARBET)
 الفلظق و الكباري و الفلظق الفلظق
 الفلظق الفلظق الفلظق



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش.م.ت.م.)

کوبری مزلقان بنی قره

رقم البند	البنـــــد	الوحدة	الطول	الارتفاع	الإجمالي	ملاحظات
٥	بالمتر المسطح أعمال فك حديد كريتال أعلى الأسوار و تسليمها الى مخازن الجهة المالكة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣.٠	١	٣.٠	بنى قرة
	الأجمـــــــــــــــالى إلى (م ^٢)					
					٣.٠	

مهندس الشركة

ماری ایلر





مهندس الشركة

مہمان سہیل پور جسے





رقم البند	البنــــــــــــد	الوحدة	العدد	الإجمالي	ملاحظات
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الى الموقع و البند يشمل المعدات و الاوناش اللازمة للتركيب بالموقع و تكلفة النقل و كارتات الطريق و البند شامل مما جمييعه طبقا لأصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	العدد	١	١	بني قرة
	الاجمـــــــــــــالى الى (العدد)			١	


م ای ر ا ج ر ف

~~_____~~



م ای ای





مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل
المزلقانات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

للبيوت العامة
للطرق و الكباري و لتقليل (ديري
(GARBLT)
للمنطقة الحضرية حوض جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنـد	الوحدة	التكرار	الطول	وزن المتر الطولى (طن/م)	الاجمالى (طن)	ملاحظات
١٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري المائى حتى منسوب أسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش أو ما يماثلها) .	طن	٤	٦,٢	٠,١٥٤	٣,٨٢	محور ٢
		طن	١	٧,٢	٠,١٥٤	١,١	محور ٢
		طن	١	٩,٢	٠,١٥٤	١,٤٢	محور ٢
		طن	٦	١٣	٠,١٥٤	١٢,٠١	محور ٣
		طن	٦	١٣,٢	٠,١٥٤	١٢,٢٠	محور ٤
	الاجمــــــــــــــــالى الى (طن)					٣٠,٥٥	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

$$\text{وزن المتر الطولى للقيسون} = ٧,٨٥ * \frac{٣,١٤}{٤} * (٢٨(١,٠٥٢) - ٢٨(١,٠٤)) = ٠,١٥٤ \text{ طن/م}$$

شعار وزارة النقل



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.ت.م.م)

کویری مزلقان بنی قره

رقم البند	البنـــــــــــــــد	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي	ملاحظات
١٤	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة أو تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبرى و حسب تعليمات المهندس المشرف	٣م	١٨	٦	٣	٣٢٤	محور ١
		٣م	١٨	٤	٣,٣٧	٢٤٣	محور ٥
	الاجمــــــــــــــــالى الى (٣ م)						٥٦٦,٦٤

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الإبراهيمية عند مداخل المزقات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)
المسجلة تجاريًا و قانونيًا
(CARSLT)
المسجلة تجاريًا و قانونيًا



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنية	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالى	ملاحظات
١٥	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بأترية صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة السند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول المجري المائي والسعر يشمل ازالة اعمال الردم بعد الإنتهاء من الاعمال وتطهير المجري حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسئولة مسؤولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لإتمام العمل	٣م	١٥٠	١٣,٥٣	١,٢٥	٢٥٣٧,٦٨	محور ١
	الاجملى الى (٣م)					٢٥٣٧,٦٨	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . ت . م . م)

کوبری مزلقان بنی قره

مهندس الهيئة


مهندس الشركة



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R." or similar, located at the bottom right of the page.



مهندس الشركة



بيان بكميات الكمر سابق الصب الاجمالية لكوبري مزلقان بني قرة

مهندس / أحمد عبد السلام
التوقيع /



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.ت.م.م)

كوبري مزلقان بنی قره

حصر کمر باکیات (۲-۱) و (۵-۴) بطول ۱۸،۳۰ م


رقم البند	البند	الوحدة	التكرار	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالى	ملاحظات
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم كميرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لايقبل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (الفئة لا تشمل حديد التسليح)	٣م	١	١,٣٠	٠,٤٥	١,٢٥	٠,٧٣١٢٥	
		٣م	١	١٧,٠٠	٠,٤٥	١,٢٥	٩,٥٦	
		٣م	١	١٧,٠٠	١,٥	٠,١٢٥	٣,١٩	فلانجة
	اجمــالى عدد ١ كمرة (٣م)						١٣,٤٨	
	اجمــالى عدد ١٦ كميرات (٣م)						٢١٥,٧٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




2



حصر کمر باکیات (۳-۲) و (۴-۳) بطول ۲۹,۵ م

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R".



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.م.)

کوبری مزلقان بنی قرة

رقم البند	البند	الوحدة	التكرار	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالى	ملاحظات
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقه الصب وأعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا افيوم أو ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ و الفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا الأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	٣م	١	١٦	٤,٧٦٧		٧٦,٢٧٢	بلاطة محور ١-٢
		٣م	١٤	١,٥	٠,٣٦		٧,٥٦	الكمر العرضى
		٣م	١	١٦	٤,٧٦٧		٧٦,٢٧٢	بلاطة محور ٤-٥
		٣م	١٤	١,٥	٠,٣٦		٧,٥٦	الكمر العرضى
		٣م	١	١٦	٧,٥٥٧٥		١٢٠,٩٢	بلاطة محور ٢-٣
		٣م	١٤	١,٥	٠,٣٦		٧,٥٦	الكمر العرضى
		٣م	١	١٦	٧,٥٥٧٥		١٢٠,٩٢	بلاطة محور ٣-٤
		٣م	١٤	١,٥	٠,٣٦		٧,٥٦	الكمر العرضى
		٣م	٢	٩٥	٠,٧٩		١٥٠,١	الرصيف الجانبي والكوبسته
		٣م	١	٩٥	٠,٢٥		٢٣,٧٥	الرصيف الوسطى
	٣م	١٤	١,٢	٠,٥	٠,٣	-٢,٥٢	فتحات الاعمدة	
	الاجمه الى (٣م)	٥٩٥,٩٥٤						

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

بيان بكميات الحديد الاجمالية لكوبرى مزلقان بنى قرة

حتى تاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٤

الاجمالي (بالطن)	الكمية	العدد	البند
٢٧,٤٤٩	٢,٢٨٧	١٢	خوازيق محور ١ & محور ٥
٢٥,٤٣٨	٤,٢٤٠	٦	خوازيق محور ٢
٢٤,١٥٦	٤,٠٢٦	٦	خوازيق محور ٣
٢٥,٢٤٢	٤,٢٠٧	٦	خوازيق محور ٤
١٢,٠٨٨	١٢,٠٨٨	١	هامة محور ١
٩,٤٢١	٩,٤٢١	١	هامة محور ٢
١٠,٧٥٢	١٠,٧٥٢	١	هامة محور ٣
٩,٤٢١	٩,٤٢١	١	هامة محور ٤
١١,٦٩٩	١١,٦٩٩	١	هامة محور ٥
٩,١٨٤	٩,١٨٤	١	بلاطة انتقالية محور ١
٦,٤٠٢	٦,٤٠٢	١	بلاطة انتقالية محور ٢
١٢٢,٦٨٥	٧,٦٦٨	١٦	كمر سابق الصب بطول ١٨,٣٠ م
٢١٤,٣٣٦	١٣,٣٩٦	١٦	كمر سابق الصب بطول ٢٩,٥٠ م
٥٥,٠٠٣	٢٧,٥٠١	٢	بلاطة علوية محور ١-٢ & ٤-٥
٨٤,٨١٨	٤٢,٤٠٩	٢	بلاطة علوية محور ٢-٣ & ٣-٤
٦٤٨,٠٩٣			الإجمالي (طن)


مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس /
التوقيع /

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مهندس /
التوقيع /

مزايا النقل



البند: بالطن تصنيع وتشغيل حديد التسليح

[illegible]

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات
(تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(GARBL)
الهيئة العامة للنقل



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

البند : بالطن تصنيع وتشغيل حديد التسليح

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر	الطول	الطول الكلى	وزن المتر الطولى	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
٢٤	خوازيق محور ٢	١	٣٠	٢٥	١٢	٣٦٠	٣,٨٥	١٣٨٦,٠٠	حديد رئيسى
		١	٣٠	٢٢	١٢	٣٦٠	٢,٩٩	١٠٧٦,٤٠	حديد رئيسى
		١	٣٠	٢٢	١٢	٣٦٠	٢,٩٩	١٠٧٦,٤٠	حديد رئيسى
		١	١٧	١٨	٣	٥١	٢	١٠٢,٠٠	أطواق
		١			٩٧٠,٦٦		٠,٦٢	٥٩٨,٩٠	السوستة
	الاجم	الى (كجم)							٤٢٣٩,٧
	الاجم	الى لعدد ٦ خازوق (طن)							٢٥,٤٤

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات
(تل العمارنة – بنى قرة – معصرة ملوى - الخ)

شركة النيل العامة
للتنفيذ والبناء و النقل (ش.م.م.)
(GARBLT)
المقر: القاهرة - شارع محمد علي - حي النور



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

البند: بالطن تصنيع وتشغيل حديد التسليح

رقم البند	العنصر	العدد	دد الأسيا	القطر	الطول	الطول الكلى	وزن المتر الطولى	الاجمالى (كجم)	ملاحظات	
٢٤	خوازيق محور ٣	١	٢٨	٢٥	١٢	٣٣٦	٣,٨٥	١٢٩٣,٦٠	حديد رئيسى	
		١	٢٨	٢٢	١٢	٣٣٦	٢,٩٩	١٠٠٤,٦٤	حديد رئيسى	
		١	٢٨	٢٢	١٣	٣٣٦	٣,٩٩	١٠٠٤,٦٤	حديد رئيسى	
		١	٢٠	١٨	٣	٦٠	٢	١٣٠,٠٠	أطواق	
		١	٩٧٧,٤٦			٠,٦٢	٦٠٣,٠٩	السوستة		
	الاجم_____الى (كجم)								٤٠٣٦,٠	
	الاجم_____الى لعدد ٦ خازوق (طن)								٢٤,١٦	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



البند: بالطن تصنيع وتشغيل حديد التسليح

مهندس الشركة

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R." or similar, located at the bottom right of the page.

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على تربة الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
العمارنة - بني قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

الهيئة العامة
للشؤون و التشغيل
(GARBLT)
المصلحة العامة للشؤون



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان بني قرة (فريم محور ١)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري و السعريشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب


رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	توزيع (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
	حديد سفلي	١	١٥	٢٥	١٢	٣,٨٥	٦٩٣,٠٠		٦٩٣,٠٠	
	حديد علوي	١	١٥	٢٥	٨	٣,٨٥	٤٦٢,٠٠		٤٦٢,٠٠	
	البرندات	١	٢٠	٢٥	١٢	٣,٨٥	٩٢٤,٠٠		٩٢٤,٠٠	
		١	٢٠	٢٥	٨	٣,٨٥	٦١٦,٠٠		٦١٦,٠٠	
		١	١٢	١٦	٧	١,٥٨	١٣٢,٧٢		١٣٢,٧٢	
		١	١٢	١٦	٧	١,٥٨	١٣٢,٧٢		١٣٢,٧٢	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكانة الخارجية	١	١٢٧	١٨	٦	٢,٠٠	١٥٢٤,٠٠		١٥٢٤,٠٠	
	الكانة الحبابية	٣	٩٢	١٢	٣,٤٢	٠,٨٨٨	٨٣٨,٢٠		٨٣٨,٢٠	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
	السوستة أسفل الركائز	١	٣٢	١٦	٥,٨	١,٥٨	٢٩٣,٢٥		٢٩٣,٢٥	
	حديد المرايا	١	١٥٩	١٨	٦	٢,٠٠	١٩٠٨,٠٠		١٩٠٨,٠٠	
	حديد القوسيلة	١	١٥٩	١٨	٥	٢,٠٠	١٥٩٠,٠٠		١٥٩٠,٠٠	
	البرندات للمرايا	١	٣٦	١٨	١٢	٢,٠٠	٨٦٤,٠٠		٨٦٤,٠٠	
		١	٣٦	١٨	٥,٢٨٥	٢,٠٠	٣٨٠,٥٢		٣٨٠,٥٢	
	البرندات للقوسيلة	١	٧	١٨	١٢	٢,٠٠	١٦٨,٠٠		١٦٨,٠٠	
		١	٧	١٨	٥,٢٨٥	٢,٠٠	٧٣,٩٩		٧٣,٩٩	
	أشاور البلاطة الانتقالية	١	٨٠	٢٢	٢,٤	٢,٩٩	٥٧٤,٠٨		٥٧٤,٠٨	
	حديد تسليح الجراوت أسفل الركائز	٨	٧	١٨	٢,٣	١,٥٨	٢٠٣,٥٠		٢٠٣,٥٠	
	حديد تسليح الجراوت أسفل الركائز	٨	٤	١٨	٢,٤	١,٥٨	١٢١,٣٤		١٢١,٣٤	
	الاجمالي لعدد (١) فريم (كجم)						١٢٠٨٧,٦٤		١٢٠٨٧,٦٤	
	الاجمالي لعدد (١) فريم (طن) لمحور ١						١٢,٠٩		١٢,٠٩	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على تربة الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
العمارة - بني قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل
(GARBLT)
مصلحة العامة للنقل



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . ن . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (فريم محور ٢)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تزييل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
١-٢٤	حديد سقلى	١	٢٢	٢٥	١٢	٣,٨٥	١٠١٦,٤٠		١٠١٦,٤٠	
		١	٢٢	٢٥	٨	٣,٨٥	٦٧٧,٦٠		٦٧٧,٦٠	
	حديد علوى	١	٢٢	٣٢	١٢	٦,٣٢	١٦٦٨,٤٨		١٦٦٨,٤٨	
		١	٢٢	٣٢	٨,٨١	٦,٣٢	١٢٢٤,٩٤		١٢٢٤,٩٤	
	البرندات	١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكانة الخارجية	١	١٢٧	١٨	٧	٢,٠٠	١٧٧٨,٠٠		١٧٧٨,٠٠	
	الكانة الحباية	١	٤٣٠	١٢	٣,٣٨	٠,٨٨٨	١٢٩٠,٦٢		١٢٩٠,٦٢	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
	السوستة أسفل الركائز	١	٦٤	١٦	٥,٨	١,٥٨	٥٨٦,٥٠		٥٨٦,٥٠	
	حديد تسليح الجراوت اسفل الركائز	١٦	٤	١٨	٢,٤	١,٩٩	٣٠٥,٦٦		٣٠٥,٦٦	
	الاجمالى لعدد (١) فريم (كجم)								٩٤٢٠,٩١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على تربة الإبراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
العسارنة - بني قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للحرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
مصلحة الحادبة حشر سوس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . ن . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (فريم محور ٣)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
١٠٢٤	حديد سفلى	١	٢٠	٢٥	١٢	٣,٨٥	٩٢٤,٠٠		٩٢٤,٠٠	
		١	٢٠	٢٥	٨	٣,٨٥	٦١٦,٠٠		٦١٦,٠٠	
	حديد علوى	١	٣٢	٢٥	١٢	٦,٣٢	٢٤٢٦,٨٨		٢٤٢٦,٨٨	
		١	٣٢	٢٥	٨,٣١٥	٦,٣٢	١٦٨١,٦٣		١٦٨١,٦٣	
	البرندات	١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكانة الخارجية	١	١٢٧	١٦	٧	٢,٠٠	١٧٧٨,٠٠		١٧٧٨,٠٠	
	الكانة الحبابية	١	٥٠٨	١٢	٣,٤٦	٠,٨٨٨	١٥٦٠,٨٢		١٥٦٠,٨٢	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
	السوستة أسفل الركائز	١	٦٤	١٦	٥,٨	١,٥٨	٥٨٦,٥٠		٥٨٦,٥٠	
	حديد تسليح الجراوت أسفل الركائز	١٦	٤	١٨	٢,٤	١,٩٩	٣٠٥,٦٦		٣٠٥,٦٦	
	الاجمالي لعدد (١) فريم (كجم)								١٠٧٥٢,٢٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.ت.م.)

كوبري مزلقان بنی قرۃ (فریم محوری)

توصيف البند :- بالطنن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
١٠٢٤	حديد سفلى	١	٢٢	٢٥	١٢	٣,٨٥	١٠٦,٤٠		١٠٦,٤٠	
		١	٢٢	٢٥	٨	٣,٨٥	٦٧٧,٦٠		٦٧٧,٦٠	
	حديد علوى	١	٢٢	٣٢	١٢	٦,٣٢	١٦٦٨,٤٨		١٦٦٨,٤٨	
		١	٢٢	٣٢	٨,٨١	٦,٣٢	١٢٢٤,٩٤		١٢٢٤,٩٤	
	البرندات	١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	٢٤	١٦	١٣	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكائنة الخارجية	١	١٢٧	١٨	٧	٢,٠٠	١٧٧٨,٠٠		١٧٧٨,٠٠	
	الكائنة الحياية	١	٤٣٠	١٢	٣,٣٨	٠,٨٨٨	١٢٩٠,٦٢		١٢٩٠,٦٢	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
السوستة أسفل الركائز	١	٦٤	١٦	٥,٨	١,٥٨	٥٨٦,٥٠		٥٨٦,٥٠		
حديد تسليح الجراوات أسفل الركائز	١٦	٤	١٨	٢,٤	١,٩٩	٣٠٥,٦٦		٣٠٥,٦٦		
الاجمــــــــــــــــالى لعدد (١) فريم (كجم)										
						٩٤٢٠,٩١			٩٤٢٠,٩١	


مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
الصارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

دهيئة اعمامة
للطرق و الكبارى و لنقل لوبرى
(CARBLT)
مخطط المادى حشر سوس سسا



شركة النيل العامة للانشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة (فريم محور ٥)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولى	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
	حديد سقلى	١	١٥	٢٥	١٢	٣,٨٥	٦٩٣,٠٠		٦٩٣,٠٠	
		١	١٥	٢٥	٨	٣,٨٥	٤٦٢,٠٠		٤٦٢,٠٠	
	حديد علوى	١	٢٠	٢٥	١٢	٣,٨٥	٩٢٤,٠٠		٩٢٤,٠٠	
		١	٢٠	٢٥	٨	٣,٨٥	٦١٦,٠٠		٦١٦,٠٠	
	البرندات	١	١٢	١٦	٧	١,٥٨	١٣٢,٧٢		١٣٢,٧٢	
		١	١٢	١٦	٧	١,٥٨	١٣٢,٧٢		١٣٢,٧٢	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكانة الخارجية	١	١٢٧	١٨	٦	٢,٠٠	١٥٢٤,٠٠		١٥٢٤,٠٠	
	الكانة الحبابية	٣	٨٥	١٢	٣,٤٢	٠,٨٨٨	٧٧٤,٤٢		٧٧٤,٤٢	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
١-٢٤	السوستة أسفل الركائز	١	٣٢	١٦	٥,٨	١,٥٨	٢٩٣,٢٥		٢٩٣,٢٥	
	حديد المرايا	١	١٥٩	١٨	٦	٢,٠٠	١٩٠٨,٠٠		١٩٠٨,٠٠	
	حديد القوسيلة	١	١٥٩	١٨	٥	٢,٠٠	١٥٩٠,٠٠		١٥٩٠,٠٠	
	البرندات للمرايا	١	٣٦	١٨	١٢	٢,٠٠	٨٦٤,٠٠		٨٦٤,٠٠	
		١	٣٦	١٨	٥,٢٨٥	٢,٠٠	٣٨٠,٥٢		٣٨٠,٥٢	
	البرندات للقوسيلة	١	٧	١٨	١٢	٢,٠٠	١٦٨,٠٠		١٦٨,٠٠	
		١	٧	١٨	٥,٢٨٥	٢,٠٠	٧٣,٩٩		٧٣,٩٩	
	أشاور البلاطة الانتقالية	١	٨٠	٢٢	٢,٤	٢,٩٩	٥٧٤,٠٨		٥٧٤,٠٨	
	الاجمــــــــالى لعدد (١) فريم (كجم)								١١٦٩٩,٠١	
	الاجمــــــــالى لعدد (١) فريم (طن) لمحور ٥								١١,٧٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات
(تل العمارة - بني قرة - معصرة ملوي - الخ)

الهيئة العامة
للطرق و الجسور و النقل
(GARBLT)
المحافظ العام المساعد لشؤون صيانة شبكات



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان بني قرة (البلاطة الانتقالية محور ١)


توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
	الحديد السفلى	١٦٠	٢٢	٦	٢,٩٩	٢٨٧٠,٤٠		٢٨٧٠,٤٠	الفرش السفلى
		٦٠	١٦	١٢	١,٥٨	١١٣٧,٦٠		١١٣٧,٦٠	الغطاء السفلى
		٦٠	١٦	٥	١,٥٨	٤٧٤,٠٠		٤٧٤,٠٠	الغطاء السفلى
	الحديد العلوى	٦٠	١٦	١٢	١,٥٨	١١٣٧,٦٠		١١٣٧,٦٠	الغطاء العلوى
		٦٠	١٦	٥	١,٥٨	٤٧٤,٠٠		٤٧٤,٠٠	الغطاء العلوى
		١٦٠	١٨	٦	٢	١٩٢٠,٠٠		١٩٢٠,٠٠	الفرش العلوى
	البرندات	١	١٢	٤٥,٥	٠,٨٨٨	٤٠,٤٠		٤٠,٤٠	
	حديد الكوبستة	١٢٠	١٦	٣	١,٥٨	٥٦٨,٨٠		٥٦٨,٨٠	الرئيسى
	حديد الكوبستة	١٢٠	١٦	٢,٤	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	الرئيسى
	حديد الرصيف	٦٠	١٢	٢	٠,٨٨٨	١٠٦,٥٦		١٠٦,٥٦	
	الاجمالي لعدد (١) بلاطة انتقالية (كجم)					٩١٨٤,٤٠		٩١٨٤,٤٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

شعار وزارة النقل



توصيف البند :- الباطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعريشمل القطع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعري أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطولى	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
	الحديد السفلى	١٦٠	٢٢	٤	٢,٩٩	١٩١٣,٦٠		١٩١٣,٦٠	الفرش السفلى
		٤٠	١٦	١٣	١,٥٨	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	الغطاء السفلى
		٤٠	١٦	٥	١,٥٨	٣١٦,٠٠		٣١٦,٠٠	الغطاء السفلى
	الحديد العلوى	٤٠	١٦	١٣	١,٥٨	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	الغطاء العلوى
		٤٠	١٦	٥	١,٥٨	٣١٦,٠٠		٣١٦,٠٠	الغطاء العلوى
		١٦٠	١٨	٤	٢	١٢٨٠,٠٠		١٢٨٠,٠٠	الفرش العلوى
	البرندات	١	١٣	٤٥,٥	٠,٨٨٨	٤٠,٤٠		٤٠,٤٠	
	حديد الكوبستة	٨٠	١٦	٥,٥	١,٥٨	٦٩٥,٢٠		٦٩٥,٢٠	الرئيسى
	حديد الكوبستة	٨٠	١٣	٢	١,٥٨	٢٥٢,٨٠		٢٥٢,٨٠	الرئيسى
	حديد الرصيف الوسطى	٤٠	١٣	٢	٠,٨٨٨	٧١,٠٤		٧١,٠٤	
	الاجمــــــــــــــــالى لعدد (١) بلاطة انتقالية (كجم)					٦٤٠١,٨٤		٦٤٠١,٨٤	

مهندس الشركة



2

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
العمارنة - بني قرة - معصرة ملوى - الخ)

المشرف و المصمم و المصنف
(CARBIT)
مهندسة المعمارية م. م. م. م. م.



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (كمر بريكست بطول ١٨,٣٠ م)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السليخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٢٤	٦,٣٢	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	رقعة ١
		٥	٣٢	٢٤	٦,٣٢	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	رقعة ٢
		٥	٣٢	١٩	٦,٣٢	٦٠٠,٤٠		٦٠٠,٤٠	رقعة ٣
		٥	٣٢	١٧	٦,٣٢	٥٣٧,٢٠		٥٣٧,٢٠	رقعة ٤
	حديد علوى لل web	٥	٢٥	٢٨,١	٣,٨٥	٥٤٠,٩٣		٥٤٠,٩٣	رقعة ١
		٤	٢٥	٢٧	٣,٨٥	٤١٥,٨٠		٤١٥,٨٠	رقعة ٢
	البرندات	١٦	١٦	١٢	١,٥٨	٣٠٣,٣٦		٣٠٣,٣٦	
		١٦	١٦	٨	١,٥٨	٢٠٢,٢٤		٢٠٢,٢٤	
	الكانة الخارجية	١٨٣	١٦	٤,٣٧	١,٥٨	١٢٦٣,٥٤		١٢٦٣,٥٤	في مسافة توزيع ١٨,٣
	الكانة الحبابية	١٨٣	١٢	٣,٧٥	٠,٨٨٨	٦٠٩,٣٩		٦٠٩,٣٩	في مسافة توزيع ١٨,٣
	الكانة الكلبس	١٤	١٦	٢,٤	١,٥٨٠	٥٣,٠٩		٥٣,٠٩	كلبسات في مسافة ١,٤
١-٢٤	حديد السفلى لل fange	١٦٩	١٢	٢	٠,٨٨٨	٣٠٠,١٤		٣٠٠,١٤	الفرش السفلى
		١٦	١٢	١٧,٥	٠,٨٨٨	٢٤٨,٦٤		٢٤٨,٦٤	الغطاء السفلى
	حديد العلوى لل fange	١٦٩	١٢	١,٨٩	٠,٨٨٨	٢٨٣,٦٤		٢٨٣,٦٤	الغطاء العلوى
		١٦	١٢	١٧,٥	٠,٨٨٨	٢٤٨,٦٤		٢٤٨,٦٤	الفرش العلوى
	shear concetor	١٧٢	١٢	٠,٨٤	٠,٨٨٨	١٢٨,٣٠		١٢٨,٣٠	
	ال hook	٨	٢٥	٤	٣,٨٥٠	١٢٣,٢٠		١٢٣,٢٠	
		٨	٢٥	١,٥	٣,٨٥٠	٤٦,٢٠		٤٦,٢٠	
	السوستة أعلى الركائز	٨	١٦	٢,٤	١,٥٨	٣٠,٣٤		٣٠,٣٤	
	اشاير الكمره العرضية	١٦	١٨	٣	٢,٠٠	٩٦,٠٠		٩٦,٠٠	
	برندات الكمره العرضية	٢٠	١٨	٣	٢,٠٠	١٢٠,٠٠		١٢٠,٠٠	
	الاجمالي لعدد (١) كمره (كجم)					٧٦٦٧,٨٤		٧٦٦٧,٨٤	
	الاجمالي لعدد (١٦) كمره (طن)					١٢٢,٦٩		١٢٢,٦٩	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل
المزلقانات (تل العمارة - بني قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(GARBLT)
المستطد العامة عند جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (كمر بريكست بطول ٢٩,٥ م)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعريشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات
الغطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتثبيت

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السيخ (م)	وزن المتر الطولى	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٤٠,٥٤	٦,٣٢	١٢٨١,٠٦		١٢٨١,٠٦	رقعة ١
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٤٠,٢٨	٦,٣٢	١٢٧٢,٨٥		١٢٧٢,٨٥	رقعة ٢
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٣٩,٨٣	٦,٣٢	١٢٥٨,٦٣		١٢٥٨,٦٣	رقعة ٣
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٢٩	٦,٣٢	٩١٦,٤٠		٩١٦,٤٠	رقعة ٤
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٢٤	٦,٣٢	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	رقعة ٥
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٢١	٦,٣٢	٦٦٣,٦٠		٦٦٣,٦٠	رقعة ٦
	حديد علوى لل web	٥	٣٢	٤٢	٦,٣٢	١٣٢٧,٢٠		١٣٢٧,٢٠	رقعة ١
	حديد علوى لل web	٢	٣٢	٣٢,٦	٦,٣٢	٤١٢,٠٦		٤١٢,٠٦	رقعة ١
	البرندات	٧	١٦	٦٣,٠٨	١,٥٨	٦٩٧,٦٦		٦٩٧,٦٦	
	البرندات	٢	١٦	٥٤,٠٤	١,٥٨	١٧٠,٧٧		١٧٠,٧٧	
	الكانة الخارجية	٩٠	١٢	٥,٢٤	٠,٨٨٨	٤١٨,٧٨		٤١٨,٧٨	(A-A) SEC
	الكانة الحياية	٩٠	١٢	٤,٦٧	٠,٨٨٨	٣٧٣,٢٣		٣٧٣,٢٣	
	الكانة الخارجية	٤٨	١٢	٥,٢٤	٠,٨٨٨	٢٢٣,٣٥		٢٢٣,٣٥	(B-B) SEC
	الكانة الحياية	٤٨	١٢	٤,٦٧	٠,٨٨٨	١٩٩,٠٥		١٩٩,٠٥	
	الكانة الخارجية	٤٠	١٦	٥,٣٢	١,٥٨٠	٣٣٦,٢٢		٣٣٦,٢٢	(C-C) SEC
	الكانة الحياية	٤٠	١٢	٤,٦٧	٠,٨٨٨	١٦٥,٨٨		١٦٥,٨٨	
	الكانة الخارجية	٨	١٦	٤,٩٢٥	٢	٦٢,٢٥		٦٢,٢٥	المنطقة المدرجة
	الكانة الحياية	٨	١٢	٤,٢٧٥	٠,٨٨٨	٣٠,٣٧		٣٠,٣٧	
	الكانة الخارجية	٢٢	١٨	٤,٥٦	٢	٢٠٠,٦٤		٢٠٠,٦٤	(D-D) SEC
	الكانة الحياية	٢٢	١٦	٣,٩٥	١,٥٨٠	١٣٧,٣٠		١٣٧,٣٠	
	الكانة الخارجية	١٢	١٨	٤,٥٦	٢	١٠٩,٤٤		١٠٩,٤٤	(E-E) SEC
	الكانة الحياية	١٢	١٦	٣,٩٥	١,٥٨	٧٤,٨٩		٧٤,٨٩	
	الكانة الكلبس	١٢	١٨	٢,٥٢	٢,٠٠٠	٦٠,٤٨		٦٠,٤٨	
	حديد السفلى لل fange	٢٨١	١٢	٢	٠,٨٨٨	٤٩٩,٠٦		٤٩٩,٠٦	الفرش السفلى
	حديد السفلى لل fange	١٦	١٢	٢٩,٤١٢	٠,٨٨٨	٤١٧,٨٩		٤١٧,٨٩	الغطاء السفلى
	حديد العلوى لل fange	٢٨١	١٢	١,٨٩	٠,٨٨٨	٤٧١,٦١		٤٧١,٦١	الغطاء العلوى
	حديد العلوى لل fange	١٦	١٢	٢٩,٤١٢	٠,٨٨٨	٤١٧,٨٩		٤١٧,٨٩	الفرش العلوى
	shear concetor	١٨٨	١٢	٠,٨٥٩	٠,٨٨٨	١٤٣,٤٠		١٤٣,٤٠	
	ال hook	٨	٢٥	٤,٧١٥	٣,٨٥	١٤٥,٢٢		١٤٥,٢٢	
	ال hook	٨	٢٥	١,٥٦	٣,٨٥	٤٨,٠٥		٤٨,٠٥	
	السوستة أعلى الركائز	٨	١٦	٢,٤	١,٥٨	٣٠,٣٤		٣٠,٣٤	
	اشاير الكمره العرضية	١٢	١٨	٣	٢	٧٢,٠٠		٧٢,٠٠	
	الاجملى لعدد (١) كمره (كجم)					١٣٣٩٥,٩٧		١٣٣٩٥,٩٧	
	الاجملى لعدد (١٦) كمره (طن)					٢١٤,٣٤		٢١٤,٣٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات
(تل العمارة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(GARBLT)
الهيئة العامة للنقل النهري



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة (البلاطة العلوية محور ١ - ٢ و ٤ - ٥)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعريشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولى	الوزن (كجم)	تفصيل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
	الحديد السفلى	١٦٠	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٨٩٦,٣٠		١٨٩٦,٣٠	الغطاء السفلى
		١٦٠	١٦	١٢	١,٥٨	٣٠٣٤,٠٧		٣٠٣٤,٠٧	الغطاء السفلى
		١٨٣	١٨	٣,٦	٢,٠٠	١٣١٧,٦٠		١٣١٧,٦٠	الفرش السفلى
		١٨٣	١٨	١٢	٢,٠٠	٤٣٩٢,٠٠		٤٣٩٢,٠٠	الفرش السفلى
	الحديد العلوى	١٥٤	١٢	١٢	٠,٨٩	١٦٤٢,٦٧		١٦٤٢,٦٧	الغطاء العلوى
		١٥٤	١٢	٣,٥	٠,٨٩	٤٧٩,١١		٤٧٩,١١	الغطاء العلوى
		١٧٢	١٨	٥,٨	٢,٠٠	١٧٨١,٩٢		١٧٨١,٩٢	الفرش العلوى
		١٧٢	١٨	١٢	٢,٠٠	٤١٢٨,٠٠		٤١٢٨,٠٠	الفرش العلوى
		٨	١٨	١٢	٢,٠٠	١٩٢,٠٠		١٩٢,٠٠	الفرش العلوى اعلى الكمر العرضى
		٨	١٨	٨,٥	٢,٠٠	١٣٦,٠٠		١٣٦,٠٠	الفرش العلوى اعلى الكمر العرضى
	شوكة	٣٢٠	١٦	٢	١,٥٨	١٠١١,٣٦		١٠١١,٣٦	
	كانات الكمر العرضى	٢٢١	١٢	٣	٠,٨٩	٥٨٩,٣٣		٥٨٩,٣٣	
	كانات الكمر العرضى	٢٢١	١٦	٣,٥	١,٥٨	١٢٢٢,٣٢		١٢٢٢,٣٢	
	حديد الكوبستة	٣٨٠	١٦	٥,٥	١,٥٨	٣٣٠٢,٧٢		٣٣٠٢,٧٢	
	حديد الكوبستة	٣٨٠	١٢	٢	٠,٨٩	٦٧٥,٥٦		٦٧٥,٥٦	
	برندات النيوجيرسى	٨٤	١٢	١٢	٠,٨٩	٨٩٦,٠٠		٨٩٦,٠٠	
	برندات النيوجيرسى	٨٤	١٢	٧	٠,٨٩	٥٢٢,٦٧		٥٢٢,٦٧	
	الرصفى الوسطى	٩٢	١٢	٢	٠,٨٩	١٦٣,٥٦		١٦٣,٥٦	
	برندات الرصفى الوسطى	٧	١٢	١٩	٠,٨٩	١١٨,٢٢		١١٨,٢٢	
	الاجملى الى لعدد (١) بلاطة علوية بطول ١٨,٣ م (كجم)								
	الاجمالى لعدد (٢) بلاطة علوية بطول ١٨,٣ م (طن)								
						٢٧٥٠١,٤٠		٢٧٥٠١,٤٠	
						٥٥,٠٠		٥٥,٠٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مطلوب على استكش

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات
(تل العمارة - بني قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل
(GARBLT)
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (البلاطة العلوية محور ٣ - ٢ و ٣ - ٤)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
	الحديد السفلى	١٦٠	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٨٩٦,٣٠		١٨٩٦,٣٠	الغطاء السفلى
		٣٢٠	١٦	١٢	١,٥٨	٦٠٦٨,١٥		٦٠٦٨,١٥	الغطاء السفلى
		٢٨٧	١٨	٣,٦	٢,٠٠	٢٠٦٦,٤٠		٢٠٦٦,٤٠	الفرش السفلى
		٢٨٧	١٨	١٢	٢,٠٠	٦٨٨٨,٠٠		٦٨٨٨,٠٠	الفرش السفلى
	الحديد العلوى	١٥٤	١٢	٧	٠,٨٩	٩٥٨,٢٢		٩٥٨,٢٢	الغطاء العلوى
		٣٠٨	١٢	١٢	٠,٨٩	٣٢٨٥,٣٣		٣٢٨٥,٣٣	الغطاء العلوى
		٢٨٧	١٨	٥,١٨	٢,٠٠	٢٩٧٣,٣٢		٢٩٧٣,٣٢	الفرش العلوى
		٢٨٧	١٨	١٢	٢,٠٠	٦٨٨٨,٠٠		٦٨٨٨,٠٠	الفرش العلوى
		٨	١٨	١٢	٢,٠٠	١٩٢,٠٠		١٩٢,٠٠	الفرش العلوى اعلى الكمر العرضى
		٨	١٨	٨,٥	٢,٠٠	١٣٦,٠٠		١٣٦,٠٠	الفرش العلوى اعلى الكمر العرضى
	شوكة	٣٢٠	١٦	٢	١,٥٨	١٠١١,٣٦		١٠١١,٣٦	
	كانات الكمر العرضى	١٦٨	١٢	٣	٠,٨٩	٤٤٨,٠٠		٤٤٨,٠٠	
	كانات الكمر العرضى	١٦٨	١٦	٣,٥	١,٥٨	٩٢٩,١٩		٩٢٩,١٩	
	حديد الكوبستة	٥٨٠	١٦	٥,٥	١,٥٨	٥٠٤٠,٩٩		٥٠٤٠,٩٩	
	حديد الكوبستة	٥٨٠	١٢	٢	٠,٨٩	١٠٣١,١١		١٠٣١,١١	
	برندات النيوجيرسى	١٦٨	١٢	١٢	٠,٨٩	١٧٩٢,٠٠		١٧٩٢,٠٠	
	برندات النيوجيرسى	٨٤	١٢	٧	٠,٨٩	٥٢٢,٦٧		٥٢٢,٦٧	
	الرصيف الوسطى	٩٢	١٢	٢	٠,٨٩	١٦٣,٥٦		١٦٣,٥٦	
	برندات الرصيف الوسطى	٧	١٢	١٩	٠,٨٩	١١٨,٢٢		١١٨,٢٢	
الاجمالى لعدد (١) بلاطة علوية بطول ٢٩ م (كجم)						٤٢١٢٧,٠٣		٤٢٤٠٨,٨١	
الاجمالى لعدد (٢) بلاطة علوية بطول ٢٩ م (طن)						٨٤,٢٥		٨٤,٨٢	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محلولة على استكس
بعد تعديل الرسومات والكوبستة
خ

مهندس الشركة



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.ت.م.)

كوبرى مزلقان بنى قرة (العزل)

توصيف البند: بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البیتومین والدهان وجهین علی البارد

رقم البند	البند _____ د	الوحدة	الطول	العرض	الكمية	ملاحظات
٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين علي البارد	٢م	١٦	٣,٢٠٥	٥١,٢٨	محور ١
		٢م	١٦	٣,٢٠٥	٥١,٢٨	محور ٥
	الاجمـــــــــــــــ الى (٢م)				١٠٢,٦	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

2

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل
المزلقانات (تل العمارة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

توصيف البند: بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكليك مانعة للنفاذية فى المجرى المائى ومواد
مقاومة للابخرة والعوامل الجوية

رقم البند	البند	التكرار	الكمية	الاجمالي	ملاحظات
٢٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكليك مانعة للنفاذية فى المجرى المائى	١	٩٨,٤٤	٩٨,٤٤	محور ١
		١	٨٤,٠٨	٨٤,٠٨	محور ٢
		١	٨٤,٠٨	٨٤,٠٨	محور ٣
		١	٨٤,٠٨	٨٤,٠٨	محور ٤
		١	٩٨,٤٤	٩٨,٤٤	محور ٥
		١٦	٧١,٧٦	١١٤٨,١٦	كمر بطول ١٨,٣٠
		١٦	١٣٩,٧٤	٢٢٣٥,٨٤	كمر بطول ٢٩,٤٥
		٢	٤٤١,٧٥	٨٨٣,٥	الكوبستة الخارجية
		١	١٤٢,٥	١٤٢,٥	الرصيف الوسطى
	الاجمالي الى (م)		٤٨٥٩,١	3200 m ²	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

لجنة عمل استكشاف ودراسة
والتصميم للوجبة الأرضية
وتقديم اعتماد الجداول

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقانات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(CARBLT)
مجلس ادارة الجندية جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنــــــــــــد	الوحدة	العدد	الاجمالى	ملاحظات
٢٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	٦٤	٦٤	بنى قرة
	الاجمــــــــــــــــالى (عدد)			٦٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقانات (تل العمارنة - بني قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

الهيئة العامة
للحرق و الغاز و لنقل الكبريت
(GARBLT)
السلطة العامة للغاز و الكهرباء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان بني قرة


رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الاجمالي	ملاحظات
بند مستحدث ٢	بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعة خاصة وحمولات عالية لرفع الكمر سابق الصب ذات بحور واوزان عالية والبند شامل التريلات الناقلة لاجزاء الروافع الى موقع العمل وتركيب اجزاء الروافع في موقع العمل	عدد	١	١	بني قرة
	الاجمالي الى (عدد)			١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات
(تل العمارنة - بني قرة - معصرة ملوي - الخ)

المهندسة العامة
للحفر و الكباري و التفتت الكبري
(CARBEL)
المهندسة العامة قسم حفر و تفتت




شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان بني قرة

رقم البند	البنـد	الوحدة	طول	عرض	الاجمالي	ملاحظات
بند مستحدث ٦	بالمتر المسطح تكسير كباري أطول من ٤٥ م على المجاري المائية شامل تطهير المجرى المائي وتكسير الهامات ورؤوس الخوازيق داخل المجرى المائي حتى منسوب المياه والفئة شاملة مما جميعه والفئة لا تشمل فك وتسليم البواكي المعدنية .	٣م	٨	٦٥	٥٢٠	بني قرة
	الاجمالي الى (٣م)				٥٢٠	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة



رقم البند	البنـد	الوحدة	الطول	العرض	الاجمالى	ملاحظات
٨	طرق النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢ م	١٠	١٥,٥	١٥٥	
			١٠٥,٦	١٣,٥	١٤٢٥,٦	
	الاجمــــــــــــــــــــــــــــــــالى الى (عدد)				١٥٨٠,٦	
	الاجمــــــــــــــــــــــــــــــــالى الى (عدد ٢ طبقة رابطة + سطحية)				٣١٦١,٢	



م (الحق) - ك



رقم البند	البنـــــــــــــــد	الوحدة	الطول	العرض	الاجمالى	ملاحظات
٩ طرق	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارده من شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٠	١٥,٥	١٥٥	
			١٠٥,٦	١٣,٥	١٤٢٥,٦	
	الاجمـــــــــــــالى الى (عدد)				١٥٨٠,٦	

مهندس الشركة

سم احمد حسن

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى -
الخ)

المشرف و الفني و المصمم
المهندس محمد عبد الحليم
المهندس محمد عبد الحليم



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنـد	الوحدة	الطول	العرض	الاجمالى	ملاحظات
١٠	طرق	٢م	١٠	١٥,٥	١٥٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ (٣) ب (وارده من شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراءات التجارب المحلية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات. العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
			١٠٥,٦	١٣,٥	١٤٢٥,٦	
					١٥٨٠,٦	
						الاجمــالى (عدد)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على تربة الابراهيمية عند
مداخل المزلقانات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ

إمبنة العامة
للشركة العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)
(GARBLT)
المنطقة الحاصلة من جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنـد	الوحدة	العدد	الطول	الاجمالى	ملاحظات
٧-أ كهرباء	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار عدايات PVC باقطار مختلفة وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ١- ماسورة ٣ بوصة	م.ط	٢	٩٥,٦	١٩١,٢	
			٢	٣,٥-	٧-	
	الاجمــالى (عدد)				١٨٤,٢	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م.ت. تعلية نسبة ١:٤ من الأعمال
كين الاحجار وتحديد اسلاك, بكر, بار

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة بأسسيوط

تخية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى موافقة السيد اللواء/ مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة على احتساب كميات كباري جزيرة شندويل / بهجورة / الكوم الأحمر على عملية إنشاء (١١) كوبري على مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا وأسسيوط تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري.

نتشرف بالإحاطة بأنه تم تنفيذ الكميات التالية :-

م	بيان الأعمال	الكميات المنفذة			ملاحظات
		مقدار العمل السبق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	
١	أعمال الجسات بالبر	١٧٠ م.ط	٠ م.ط	١٧٠ م.ط	يتم المراجعة والصرف طبقا لعقد العملية المنوه عنها بعاليه.
٢	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٣ بالعدد	٠ بالعدد	٣ بالعدد	
٣	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١,٠ م	٤٩٣,٩ م.ط	٠ م.ط	٤٩٣,٩ م.ط	
٤	أعمال توريد وتركيب غلاف معدني معالج ضد الصدأ	١٦,٨٨ طن	٠ طن	١٦,٨٨ طن	
٥	أعمال حفر في جميع أنواع التربة عدا المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب	٢٠٢,٥٨ م٣	٠ م٣	٢٠٢,٥٨ م٣	
٦	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة	٢٢١١,٦٥ م٣	٠ م٣	٢٢١١,٦٥ م٣	
٧	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة	٢٤٣,٦ م٣	٦١,٦٦ م٣	٣٠٥,٢٦ م٣	
٨	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق	٦٢١٩,٦٦ م٣	٠ م٣	٦٢١٩,٦٦ م٣	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد بالبر	١٨٣,٠٨ م٣	١٩,٥٢ م٣	٢٠٢,٦ م٣	
١٠	أعمال خرسانة عادية للأساسات	١٧,٢٣ م٣	٨,٠٧ م٣	٢٥,٣ م٣	
١١	أعمال خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب	١٢٥,٩١ م٣	٠ م٣	١٢٥,٩١ م٣	
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	١٠٧,٠٤ م٣	٨,٩٦ م٣	١١٦,٠٠ م٣	
١٣	أعمال توريد وتركيب حدد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	٢٠٥,٤٢ طن	٧,١٤ طن	٢١٢,٥٦ طن	

—

١٤	بالمتر المربع عمل عزل من البيتومين علي البارد	٢م ١٤١,٥٤	٢م ٠	٢م ١٤١,٥٤
١٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بجوايط حمولة ٢٥٠ طن	١٤ بالعدد	٠ بالعدد	١٤ بالعدد
١٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بدون جوايط حمولة ٢٥٠ طن	٨ بالعدد	٠ بالعدد	٨ بالعدد
١٦	بالمقطوعية تكسير كباري والفئة شاملة مما جميعه	١- بالمقطوعية	٠ بالمقطوعية	١ بالمقطوعية
١٧	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عزل مضادة للكربنة ذات أساس اكليريك	٢م ٤٩٤,٩	٢م ٧٥,٢	٢م ٤١٩,٧
١٨	بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعة خاصة وحمولات عالية لرفع الكمر سابق الصب	١ بالعدد	١ بالعدد	٠ بالعدد
١٩	بالمتر المسطح تكسير كباري بطول من ١٠,٠٠ م الي ٤٠,٠٠ علي المجاري المائية	٢م ١٨٠	٢م ١٨٠	٢م ٠
ثالثا: أعمال الكهرباء				
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب عدايات pvc قطر ٣ بوصة	٦٦ م.ط	٠ م.ط	٦٦ م.ط

التشويينات :-

١	أعمال توريد وتركيب حدد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	١٠٠ طن	(٦٤,٨٩) طن	٣٥,١١ طن	يصرف نسبة ٦٠٪ من إجمالي التشويينات
---	--	--------	------------	----------	------------------------------------

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو صرف الكميات عالية بالاستخلص الجاري طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

تصديراً في ٢٠٢٤/٩/٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



٢

عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات
إنشاء كباري مداخل المزلقانات (الكوم الاحمر)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	السابق	ما تم تنفيذه خلال المده	جملة ما تم تنفيذه	ملاحظات
أ-2	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات	م ط	60.00	0.00	60.00	
7	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع العمل	عدد	1.00	0.00	1.00	
أ-8	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة بالبر ومصبوبة في مواقعها قطر ١٠٠ سم	م ط	185.50	0.00	185.50	
10	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني معالج ضد الصدأ بمادة معتمدة	طن	6.40	0.00	6.40	
11	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة عدا التربة المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب	م3	202.58	0.00	202.58	
12	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالعمق المطلوب لزوم عمل الأساسات	م3	60.61	0.00	60.61	
14	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفه	م3	135.09	61.66	196.75	
15	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة حتي منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة داخل المجري المائي	م3	3631.82	0.00	3631.82	
16	بالمتر المكعب خرسانه عاديه للأساسات و البلاطات الانتقاليه	م3	4.41	8.07	12.48	
19	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للكمات سابقة الصب	م3	51.51	0.00	51.51	
22	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للقواعد بالبر	م3	60.75	19.52	80.27	
23	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	م3	45.08	8.96	54.04	
أ-24	الطن توريد وتركيب ورس التسليح (٤٠/٦٠) (لزام جميع العنصر الانشائية للكوبرى	طن	81.35	7.14	88.49	
27	بالمتر المربع عمل طبقة عزل من البيتومين و جهين على البار	م2	57.57	0.00	57.57	
28	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عزل مضاده للكرينه ذات اساس اكريك	م2	419.7	75.20	494.90	استقطاع 5% لحين ظهور نهو الاعمال
أ-29	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بجوايط حموله 250 طن	عدد	14	0.00	14	استقطاع 10% لحين ظهور نتائج الاختبارات

مهندس الهينه /

مهندس الشركة /

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	السابق	ما تم تنفيذه خلال المدة	جملة ما تم تنفيذه	ملاحظات
--------------	-----------	--------	--------	----------------------------	----------------------	---------

بنود مستحدثة :

1	بالمقطوعيه تكسير كباري و الفئه شامله مما جميعه	مقطوعيه	1.00	1.00-	0.00	تم تغيير هذا البند و احتسابه بالمتر المسطح
2	بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعه خاصه و حمولات عاليه لرفع الكمر سابق الصب	عدد	0.00	1.00	1.00	
3	بالمتر المسطح تكسير كباري بطول من 10 م الي 40 م على المجاري المائيه	م2	0.00	180.00	180.00	

تشويينات :

24-ا	الطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠ لزوم جميع العنصر الانشائية للكوبرى	طن	50.00	50.00-	0.00	يصرف نسبة 60 % من اجمالي التشويينات
------	--	----	-------	--------	------	--

مهندس الهينه /

مهندس الشركة /

عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات

إنشاء كباري مداخل المزلقانات (بهجوره القبلي)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	السابق	ما تم تنفيذه خلال المدة	جملة ما تم تنفيذه	ملاحظات
2-أ	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات	م ط	60.00	0.00	60.00	
7	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع العمل	عدد	1.00	0.00	1.00	
8-أ	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة بالبر ومصبوبة في مواقعها قطر ١٠٠ سم	م ط	188.40	0.00	188.40	
10	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني معالج ضد الصدأ بمادة معتمدة	طن	5.21	0.00	5.21	
12	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالعمق المطلوب لزوم عمل الأساسات	م3	60.61	0.00	60.61	
15	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بتربة صالحة حتي منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة داخل المجري المائي	م3	2587.84	0.00	2587.84	
16	بالمتر المكعب خرسانه عاديه للأساسات و البلاطات الانتقاليه	م3	4.41	0.00	4.41	
22	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للقواعد بالبر	م3	64.60	0.00	64.60	
24-ا	الطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) (لزوم جميع العنصر الانشائية للكوبرى	طن	32.27	0.00	32.27	
تشوينات :						
24-ا	الطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) (لزوم جميع العنصر الانشائية للكوبرى	طن	50.00	14.890-	35.11	يصرف نسبة 60 % من اجمالي التشوينات

مهندس الهينه /

مهندس الشركة /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة بأسسيوط

تخية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة على احتساب كميات كباري جزيرة شندويل / بهجورة / الكوم الأحمر على عملية إنشاء (١١) كوبري على مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا وأسسيوط تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري.

نتمشرف بالإحاطة بأنه تم تنفيذ الكميات التالية :-

م	بيان الأعمال	الكميات المنفذة			ملاحظات
		مقدار العمل السبق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	
١	أعمال الجسات بالبر	١٧٠ م.ط	٠ م.ط	١٧٠ م.ط	يتم المراجعة والصرف طبقا لعقد العملية المنوه عنها بعاليه.
٢	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٣ بالعدد	٠ بالعدد	٣ بالعدد	
٣	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١,٠٠ م	٤٩٣,٩ م.ط	٠ م.ط	٤٩٣,٩ م.ط	
٤	أعمال توريد وتركيب غلاف معدني معالج ضد الصدأ	١٦,٨٨ طن	٠ طن	١٦,٨٨ طن	
٥	أعمال حفر في جميع أنواع التربة عدا المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب	٣٢٠٢,٥٨ م.ط	٣ م.ط	٣٢٠٢,٥٨ م.ط	
٦	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة	٣٢١١,٦٥ م.ط	٣ م.ط	٣٢١١,٦٥ م.ط	
٧	بالمتر المكعب توريد ورد برمال نظيفة	٣٢٤٣,٦ م.ط	٣ م.ط	٣٢٤٣,٦ م.ط	
٨	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق	٣٦٢١٩,٦٦ م.ط	٣ م.ط	٣٦٢١٩,٦٦ م.ط	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد بالبر	٣١٦٨,٣٩ م.ط	٣١٤,٦٩ م.ط	٣١٨٣,٠٨ م.ط	
١٠	أعمال خرسانة عادية للأساسات	٣١١,٣٥ م.ط	٣٥,٨٨ م.ط	٣١٧,٢٣ م.ط	
١١	أعمال خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب	٣١٢٥,٩١ م.ط	٣ م.ط	٣١٢٥,٩١ م.ط	يتم استقطاع نسبة ١٠٪ لحين ظهور نتائج الاختبارات
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	٣٤٥,٠٨ م.ط	٣٦١,٩٦ م.ط	٣١٠٧,٠٤ م.ط	
١٣	أعمال توريد وتركيب حدد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	١٧٨,٤١ طن	٢٧,٠١ طن	٢٠٥,٤٢ طن	

٢

١٤	بالمتر المربع عمل عزل من البيتومين علي البارد	٢م ١٤١,٥٤	٢م ٠	٢م ١٤١,٥٤
١٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بجوايط حمولة ٢٥٠ طن	١٤ بالعدد	٠ بالعدد	١٤ بالعدد
١٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بدون جوايط حمولة ٢٥٠ طن	٨ بالعدد	٨ بالعدد	٠ بالعدد
١٦	بالمقطوعية تكسير كباري والفئة شاملة مما جميعه	١ بالمقطوعية	٠ بالمقطوعية	١ بالمقطوعية
١٧	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عزل مضادة للكربنة ذات أساس اكليريك	٢م ٤١٩,٧	٢م ٠	٢م ٤١٩,٧
ثالثا: أعمال الكهرباء				
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب عدايات pvc قطر ٣ بوصة	٦٦ م.ط	٦٦ م.ط	٠ م.ط

التشوينات :-


١	أعمال توريد وتركيب حدد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	١٠٠ طن	(٦٤,٨٩-) طن	٣٥,١١ طن	يصرف نسبة ٦٠٪ من إجمالي التشوينات
---	--	--------	-------------	----------	-----------------------------------

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو صرف الكميات عالية بالمستخلص الجاري طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

تحريرا في ٢٠٢٤/٦/٢٥

رئيس الإدارة المركزية



عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات
 إنشاء كباري مداخل المزلقانات (كوبري جزيرة سندويل)
 بيان اعمال بالكميات المنفذه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣.

رقم البيد	نوع العمل	الوحدة	المباقي	ما تم تنفيذه خلال المدة	جملة ما تم تنفيذه	ملاحظات
٢٠١	بالمتر انطولي اعمال تنفيذ انجسات	د.م	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	
٧	بالمتر مكيمة الخوازيق الي موقع العمل	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	
٨٠١	بالمتر انطولي خوازيق ارتكاز محفورة بتبر ومصبوية في مواقعها قطر ١٠٠ سم	د.م	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر توريد وتركيب غلاف معنني معالج ضد انصداء بمادة معتمدة	م.م	٥,٢٧	٠,٠٠٠	٥,٢٧	
١٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوية بالمعنى المصنوب نزود عمر الاساسات	م.م	٩٠,٤٣	٠,٠٠٠	٩٠,٤٣	
١٤	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة	م.م	١٠٨,٥١	٠,٠٠٠	١٠٨,٥١	
١٦	بالمتر المكعب خرسانه عاقيه للاساسات و البلاطات الانتقالية	م.م	٢,٥٣	٥,٨٨	٨,٤١	
١٩	بالمتر المكعب خرسانه مسحه تنكمرات سابقة انصب	م.م	٧٤,٤	٠,٠٠٠	٧٤,٤	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانه مسحه تنقواعد بتبر والبلاطات الانتقالية	م.م	٤٣,٠٤	١٤,٦٩	٥٧,٧٣	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسحه للبلطات العلوية	م.م	٠	٢١,٩٦	٢١,٩٦	
٢٤٠١	الطن توريد وتركيب ورص اسمنج (٤٠/٦٠) (نزود جميع العناصر الاساسية للكوبري	م.م	٦٤,٧٩	٢٧,٠١	٩١,٨٠	
٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عزل من البتومين و جهين عني التبارد	م.م	٨٣,٩٧	٠,٠٠٠	٨٣,٩٧	
٢٩	بالمتر توريد وتركيب ركائز بدون جوايط حمولة ٢٥٠ طن	عدد	٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	
تأسيس اعمال الكوبرياء						
٣	بالمتر انطولي توريد عديات PVC قطر ٣ بوصة	د.م	٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	

مهندس الشركة /
 مهندس انبينه /

مهندس الشركة /

بند رقم ٢٩
بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط

كمية	وحدة	بند	رقم البند
8	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	29

مهندس الهيئة

٦١٢ م
٢٠٤٤

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية الثامنة - قنا
الشركة المنفذه / شركة النيل العامه للانشاء والطرق
عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات
(كوبرى شندويل)

م	البند	الوحده	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	المكعب	ملاحظات
1	الجزء المحصور بين الاكتاف	3م	2	6.75	2.1	0.25	7.09	
2	الجزء خارج الاكتاف	3م	2	8	1.9	0.25	7.60	
<u>اجمالي الخرسانه المسلحه للبلاطات الانتقاليه</u>								<u>14.69</u>

مهندس الهيئة /
2/4
2.44

مهندس الشركة /
2/4
2.44

المشروع : كوبرى شندويلى

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى
المقاول العام : شركة النيل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

حصر خرسانات كوبرى شندويلى

م	البند	العدد	الوحده	الطول	العرض	الارتفاع	الجزئى	خصم	اجمالى	ملاحظات
1	الخرسانه العاديه اسفل الهامات	2	3م	8.2	1.83	0.1	3.00	0.47	2.53	خصم تفريغ عدد 6 خوازيق قطر 1م باجمالى مكعب 0.47 م3
2	الخرسانه العاديه اسفل البلاطات	2	3م	6.75	2.1	0.1	2.84		2.84	الجزء المحصور بين الاكتاف
3	الانتقاليه	2	3م	8	1.9	0.1	3.04		3.04	الجزء خارج الاكتاف
				الاجمالى				8.41	3م	

مهندس الهيئة /
212
ع.ع.ع

مهندس الشركة /
A

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الادارة المركزية الثامنة - قنا

الشركة المنفذه / شركة النيل العامه للانشاء والطرق

عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات

(كوبرى شندويل)

بند رقم (23) بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقه الصب وأعلى الكمرات المعدنية

م	البند	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	المكعب	ملاحظات
1	مسطح البلاطه العلويه	1	23.70	8.00	0.25	47.40	الطول حتي وجه الكمرات العرضيه
2	الرصيف	2	25.00	1.00	0.15	7.50	
3	الكمرات العرضيه (الجزء المستمر اعلى كمر سابق الصب)	2	8.00	0.65	0.40	4.16	
4	الكمرات العرضيه (الجزء المتقطع بين كمر سابق الصب)	6	1.42	0.40	0.85	2.90	
اجمالي الخرسانه المسلحه للبلاطه العلويه (كوبرى شندويل)							متر مكعب
61.96							

مهندس الهيئة /
7/12
ع.ع.ب




مهندس الشركة /
7/12

حديد تسليح البلاطة العلوية (كوبري جزيرة شندويل)

Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
①	Y12		12000	60	639.25	3%	-T2-STAGG.
②	Y12		12000	60	639.24	3%	-T2-STAGG.
③	Y12		2400	60	127.82	0.6%	-T2-STAGG.
④	Y16		2600	60	246.25	1.1%	-B2-STAGG.
⑤	Y16		12000	60	1136.42	5.3%	-B2-STAGG.
⑥	Y16		12000	60	1136.44	5.3%	-B2-STAGG.
⑦	Y12		12000	22	234.39	1.1%	-S.B-STAGG.; -T2-STAGG.
⑧	Y12		12000	14	149.16	0.7%	-T2-STAGG.
⑨	Y12		2600	14	32.31	0.1%	-T2-STAGG.
⑩	Y16		2800	20	88.4	0.4%	-B2-STAGG.

مهندس الهيئه / محمد جواد
7/2
c.c.c




مهندس الشركة /

Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
(11)	Y16		12000	20	378.81	1.8%	-B2-STAGG.
(12)	Y16		12000	20	378.81	1.8%	-B2-STAGG.
(13)	Y18		6600	238	3137.93	14.5%	-B1
(14)	Y18		3885	476	3693.9	17.1%	-T1/B1
(15)	Y18		7820	238	3717.7	17.2%	-T1
(16)	Y16		1750	476	1314.6	6.1%	PARAPET-RFT
(17)	Y16		3290	476	2471.76	11.4%	PARAPET-RFT
(18)	Y18		11190	12	268.23	1.2%	-T1
(19)	Y16		1915	120	362.77	1.7%	-B2
(20)	Y16		2015	40	127.24	0.6%	-B1

712 / مهندس الهيكلة
e.e.e

مهندس الشركة /

حديد تسليح البلاطات الانتقاليه (كوبري جزيرة شندويل)

Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
①	Y22		2220	12	79.49	3%	-B1
②	Y18		2220 2003	12	53.21 48.72	2%	-T1
③	Y22		4320	68	876.53	32.9%	-B1
④	Y18		4320 4130	68	586.77 561.68	22%	-T1
⑤	Y16		7010 6850	42	464.69 454.63	17.5%	-T2; -B2
⑥	Y16		8260 8100	38	495.4 486.4	18.6%	-T2; -B2
⑦	Y22		1050	34	106.53	4%	CONNECTORS
Total mass = 2663 kg 2613.98 kg							

طن	5.226	اجمالي حديد تسليح عدد (٧) بلاطة انتقاليه
----	-------	--

5-2279


مهندس الهيئه /

مهندس الشركة /

7/2
c.c.c

حديد تسليح الكراسي (كوبري جزيرة شندويل)

BBS FOR ONE PEDESTAL

Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
①	Y16		2166	6	20.51	69.3%	-VL. RFT
②	Y16		2316	2	7.31	24.7%	-VL. RFT
③	Y12		2010	1	1.78	6%	-OUTER STIRR.
Total mass = 30 kg							

طن	0.24.183	اجمالي حديد تسليح عدد (٨) بلاطه انتقاليه
----	----------	--

مهندس الهيئه /

مهندس الشركة /

7/4
ccc



اجمالي حديد التسليح حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٣

	طن	64.79	حديد السابق صرفه
	طن	0.163	حديد تسليح الكراسي الركائز (PEDSTAL)
	طن	21.614	حديد تسليح البلاطات العلويه
	طن	5.2279	حديد تسليح البلاطات الانتقاليه
	طن	91.795	اجمالي حديد التسليح

مهندس الهيئه /

٢٠٢٤
٥٠٤٤

مهندس الشركة /

٢٠٢٤

ثالثا اعمال الكهرباء بند رقم ٣
بالمتر الطولى توريد عديت PVC قطر ٣ بوصة

رقم البند	بند	وحدة	كمية
ثالثا الكهرباء بند ٣	بالمتر الطولى توريد عديت PVC قطر ٣ بوصة	م ط	66

مهندس الهيئة

٦/٨ / ٢٠٢٢

مهندس الشركة

٦/٨ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة { أسيوط }

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة على إدراج أعمال إنشاء كوبرى هيكل باشا نطاق الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا إلى عملية إنشاء (١١) كوبرى على مزلقات السكة الحديد بمحافظة المنيا وأسيوط .
تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى .

نشرف بالإحاطة بأنه تم تنفيذ الكميات التالية :-

ملاحظات	الكميات المنفذة			بيان الأعمال	م
	جملة مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	مقدار العمل السابق لإجراءه		
١. يتم المراجعة والصرف طبقاً لعقد العملية المنوه عنها بهاليه . مهندس العملية	٥٨	—	٥٨	أعمال الرقع المساحى بالمتر الطولى	١
	٨٠	—	٨٠	أعمال الجسات	٢
	١٦٨	—	١٦٨	أعمال تكسير أكتاف الكوبرى القديم	٣
	١	—	١	نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٧
	١٧٠	—	١٧٠	تنفيذ خوازيق قطر ١ متر	٨
	٩١٥,٦٠	٩١٥,٦٠	—	حفر فى جميع أنواع التربة	١٢
	١١٠	—	١١٠	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	١٣
	٦٠٣٤,٢٠	٣١٦٢,٤٤	٢٨٧١,٧٦	أعمال الردم المؤقت	١٥
	٨,٨٩	—	٨,٨٩	خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الأنتقالية	١٦
	٢٨,٢٦	—	٢٨,٢٦	أعمال الدمسة	١٨
	١٥١,٤٤	١٢,١٧	١٣٩,٢٧	خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب	١٩
	١٦٨,٨٠	٩٥,٥٩	١٠٣,٢١	خرسانة مسلحة للقواعد	٢٢ أ
	١٣٧,٣٠	٤١,٧٤	٩٥,٥٦	خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية أعلى الكمر	٢٣
	١٧٦,٧٨	٥,٣٨	١٧١,٤٠	توريد ورص حديد تسليح	٢٤
	٢٥٥,٩٠	٢٥٥,٩٠	—	طبقة عازلة من البيتومين	٢٧
	١٤	—	١٤	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	٢٩ أ
	١٠٥	١٠٥	—	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٦ طرق
	—	—	—	بند مستحدث	
	١	١	—	نقل روافع ذات طبيعة خاصة وحمولات عاليه	١

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو الصرف لتلك الأعمال باستخلص الجارى طرفكم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

السيد / مهندس /
سوى سامى صالح
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة شرق الدلتا

تحريراً فى : ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات : { تقرير معمل الموقع

{ جسر الأمتلة المنفذة

للطرق والكبارى والنقل البرى

إدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

قسم المصالحات

المصدر : ٥٠١٦

معاينة

٢٠٢٤ / ١١ / ١٢



حصر اعمال مشروع :انشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع عدد (11) كوبري
على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات

تخطيط وإعمار وإعمار المدن

مستخلص ()



رقم البند	بيان الاعمال	الكميات المنفذه		
		مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت
1	اعمال الرفع المساحي بالمتر الطولي	٥٨,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠
2	اعمال الجسات	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠
3	بالمتر مكعب اعمال تكسير اكتاف الكوبري القديم	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠
7	نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
8	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 1 م	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠
12	حفر في جميع انواع التربة	٠,٠٠	٩١٥,٦٠	٩١٥,٦٠
13	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠
15	اعمال الردم المؤقت	٢٨٧١,٧٦	٣١٦٢,٤٤	٦٠٣٤,٢٠
16	خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	٨,٨٩	٠,٠٠	٨,٨٩
18	بالمتر مسطح اعمال دمسمة	٢٨,٢٦	٠,٠٠	٢٨,٢٦
19	اعمال خرسانة مسلحة لزوم كميرات سابقة الصب	١٣٩,٢٧	١٢,١٧	١٥١,٤٤
١-22	بالمتر مكعب اعمال خرسانة مسلحة للقواعد	١٠٣,٢١	٦٥,٥٩	١٦٨,٨٠
23	بالمتر مكعب اعمال خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلي الكمر	٩٥,٥٦	٤١,٧٤	١٣٧,٣٠
24	بالطن توريد ورص حديد التسليح	١٧١,٤٠	٥,٣٨	١٧٦,٧٨
27	بالمتر المربع طبقة عازلة من الببوتومين	٠,٠٠	٢٥٥,٩٠	٢٥٥,٩٠
١-29	بالعدد توريد وتركيب ركانزحمولة 250 طن بجوابط	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠
6-طرق	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس	٠,٠٠	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠
	بند مستحدث			
1	بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعه خاصه وحمولات عاليه لرفع الكمر سابق الصب	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠

مهندس الهيئة
[Signature]


١٣ / محمد السامي

مهندس الشركة

[Signature]



حصر اعمال مشروع :انشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع
(١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات




اسم العنصر حددت طرف السحاح

العنصر	التكرار	العدد	الطول	قطر السبخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الاجمالي (كجم)
	1	15	10	16	1.58	237
برندات القاعدة حديد رئيسي	1	15	6	16	1.58	142.2
	4	25	2	18	2	400
	4	15	2	16	1.58	189.6
الاجمالي لعدد ١ غرفة						968.8
الاجمالي لعدد ٢ غرفة						1937.6

مهندس الهيئة
١٢ محمد باهم

مهندس الشركة
١٢ المحوري

حصر اعمال مشروع :انشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات



اسم العنصر: حديد كمر pre cast

العنصر	التكرار	العدد	طول السيخ (م)	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الاجمالي (كجم)
الحديد السفلي						
B1	١	٧	٣٦	٣٢	٦,٣٢	١٥٩٢,٦٤
B2	١	٧	٣٦	٣٢	٦,٣٢	١٥٩٢,٦٤
B3	١	٧	٢٦	٣٢	٦,٣٢	١١٥٠,٢٤
B4	١	٤	١٢	٣٢	٦,٣٢	٢٠٣,٣٦
الحديد العلوي						
	٢	٧	٣٠	٣٢	٦,٣٢	٢٦٥٤,٤
الكانات						
اول واخر ٥ م	٢	٥١	٥	١٦	١,٥٨	٨٠٥,٨
	٢	٥١	٤	١٢	٠,٨٩	٣٦٣,١٢
منتصف الكمر مسافة ١٠,٩٥	١	١١١	٢	١٨	٢	٤٤٤
	١	١١١	٤	١٢	٠,٨٩	٣٩٥,١٦
	١	١١١	٢,٤	١٢	٠,٨٩	٢٣٧,٠٩٦
جزء التقاطي ١ م	٢	١١	٢,٤	١٢	٠,٨٩	٤٦,٩٩٢
	٢	١١	٤	١٢	٠,٨٩	٧٨,٣٢
برندات	١	١٠	٥٢	١٨	٢	١٠,٤٠
الفلاتجه						
حديد طولي سفلي وعلوي	٢	١٢	٢٤	١٢	٠,٨٩	٥١٢,٦٤
حديد عرضي سفلي وعلوي	١	٢٢٩	٢	١٢	٠,٨٩	٤٠٧,٦٢
	١	٢٢٩	٢	١٢	٠,٨٩	٤٠٧,٦٢
الكراسي	١	١٥٤	٢	١٢	٠,٨٩	٢٧٤,١٢
سيخين طولي اعلي الويب	١	٢	٢٤	٣٥	٣,٨٦	١٨٥,٢٨
هوكات	١	٨	٤	٣٢	٦,٣٢	٢٠٢,٢٤
حديد ربط الكمر	٢	٤	٤	١٨	٢	٦٤
الاجمالي لعدد ١ كمره						١٢٧٥٧,٢٨٨
الاجمالي لعدد ٧ كمرات						٨٩٣٠١,٠١٦

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

١٣ / ١٢ / ٢٠١٦

١٢ / ١٢ / ٢٠١٦

حصر اعمال مشروع :انشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات



حديد الديفرام

العنصر	التكرار	العدد	طول السيخ (م)	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الإجمالي (كجم)
الحديد العلوي للديفرام	١٢	٦	١,٢	١٨	٢	١٧٢,٨
الكانات الخارجية	١٢	٦	٦	١٨	٢	٨٦٤
الكانات الداخلية	١٢	٦	٣	١٨	٢	٤٣٢
الإجمالي						١٤٦٨,٨

اسم العنصر: حديد البلاطة الانتقالية


العنصر	التكرار	العدد	الطول	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الإجمالي (كجم)
الاتجاه العرضي						
سفلي	1	40	15	18	2	1200
الحديد العلوي	1	40	15	18	2	1200
الاتجاه الطولي						
سفلي وعلوي	2	140	3.9	22	2.99	3265.08
الإجمالي لبلاطة واحدة						5665.08
الإجمالي لعدد ٢ بلاطة انتقالية						11330.16

مهندس الهيئة

١٢ محمد سالم

مهندس الشركة

١٢ محمد محمد



١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقات

اسم العنصر: حديد البلاطة للكوبري

الوزن الإجمالي (كجم)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السبيخ (مم)	الطول	العدد	التكرار	العنصر
						الاتجاه العرضي
٦١٦٢	١,٥٨	١٦	١٥	٢٦٠	١	سفلي
١٢٣٢,٤	١,٥٨	١٦	١,٥	٢٦٠	٢	
٦١٦٢	١,٥٨	١٦	١٥	٢٦٠	١	الحديد العلوي
						الاتجاه الطولي
٥٩٨٠,٨	٠,٨٩	١٢	٢٤	١٤٠	٢	سفلي وعلوي
٢٠٥٤	١,٥٨	١٦	٢,٥	٢٦٠	٢	
١٤٧٨,٨٨	١,٥٨	١٦	١,٨	٢٦٠	٢	الكوبستة
٩٣٩,٨٤	٠,٨٩	١٢	٢٢	٢٤	٢	
٢٤٠٠٩,٩٢						الإجمالي

3/ محمد صالح
مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر اعمال مشروع :انشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع
عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات



البنء : المءر المكعب حفر في جميع انواع التربة بنء ١٢

ملاحظات	إجمالي بعد الخصم	مساحات أو مكعبات			ارتفاع	مقاسات			عدد	وحدة القياس	نوع الأعمال و التوريدات	رقم البنء
		خصم	اجمالي	مساحات		العرض	الطول	الارتفاع				
	٣٥٠,٠٠٠		٣٥٠,٠٠٠		٥	٥	١٤		١	م ^٣	حفر لازالة العوائق اثناء حفر الخوازيق قاعدة ١	١٢
	٢٨٠,٠٠٠		٢٨٠,٠٠٠		٥	٤	١٤		١		الماسورة ناحية كفر غنام	
	١٤٥,٦٠٠		١٤٥,٦٠٠		٢,٦	٤	١٤		١		حفر لخط المياه العمومي	
	١٤٠,٠٠٠		١٤٠,٠٠٠		١	٥	١٤		٢		حفر لزوم الاحلال	
	١١٥,٦٠٠		١١٥,٦٠٠									

مهندس الهيئة
١٣١٣


مهندس الشركة
١٢

البنء : المءر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة بنء ١٣

ملاحظات	إجمالي بعد الخصم	مساحات أو مكعبات			ارتفاع	مقاسات			عدد	وحدة القياس	نوع الأعمال و التوريدات	رقم البنء
		خصم	اجمالي	مساحات		العرض	الطول	الارتفاع				
	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠		٢	٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠		٢	م ^٣	البنء : المءر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة	١٣
	١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠									
	١١٠,٠٠٠		١١٠,٠٠٠									

مهندس الهيئة
١٣

مهندس الشركة
١٢



حصر اعمال مشروع :انشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات



البنء : بالمرء المكعب اعمال الرءم المؤءء بنء 15

ملاحءاء	إءمأى بعء الخصم	مسءاءاء أو مكعباء			مقاساءاء			عءء	وءءة القياس	نوءع الاعماءال واءوراءاء	رقم البناء
		خصم	اءمأى	مسءاءاء أو مكعباء	ارءقاء	العرض	الطول				
										البنء : بالمرء المكعب اعمال الرءم المؤءء	15
	٢٨٤٣,٥٠	٠,٠٠		٢٨٤٣,٥٠	٤,٧٠	٢٧,٥٠	٢٢,٠٠	١,٠٠	٣ م		
	٠,٢٨,٢٦	٢٨,٢٦				٣,١٤	٩,٠٠	١,٠٠	٣ م	خصم ماسوره بمءرى المصرف	
	٣٨٤,٠٠			٣٨٤,٠٠	٣,٠٠	٤,٠٠	١٦,٠٠	٢,٠٠		رءم القواءع	
	٥٢٥,٠٠			٥٢٥,٠٠	١,٥٠	١٠,٠٠	٣٥,٠٠	١,٠٠	٣ م	رءم لءءهءز الأوناأ	
	٢٣١٠,٠٠			٢٣١٠,٠٠	٥,٥٠	٢٨,٠٠	١٥,٠٠	١,٠٠	٣ م	رءم طرءق الأربلة	
	٦٠٣٤,٢٤									الإءمأى	

مهندس الهءنه

مهندس الأشركة

١٣ / أءرلساءى

١٢ / أءرلساءى

البنء : بالمرء المكعب خرساءة عاءه للاساساء والبلاطاء الاءءاقاله بنء 16

ملاحءاء	إءمأى بعء الخصم	مسءاءاء أو مكعباء			مقاساءاء			عءء	وءءة القياس	نوءع الاعماءال واءوراءاء	رقم البناء
		خصم	اءمأى	مسءاءاء أو مكعباء	ارءقاء	العرض	الطول				
										البنء : بالمرء المكعب خرساءة عاءه اسفل القواءع	16
	٥,٢٠	٠,٠٠		٥,٢٠	٠,١٠	١,٨٣	١٤,٢٠	٢,٠٠	٣ م	لءوم اعمال القواءع	
	٣,٦٩	٠,٠٠		٣,٦٩	٠,١٠	١,٣٠	١٤,٢٠	٢,٠٠	٣ م	لءوم اعمال الساءرة (طلب المصرف)	
	٨,٨٩									الإءمأى	

مهندس الهءنه


مهندس الأشركة

١٣ / أءرلساءى

١٢ / أءرلساءى

[illegible][illegible]

مهديس الهديه



حصر اعمال مشروع : إنشاء كوبري امام مزلقان هيكل باندا المحمل على مشروع عدد (11) كوبري على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات



البند : بالمتر المكعب خرسانته مسلحة للقواعد بند 22 أ

ملاحظات	إجمالي بند الخصم	مساحات أو مكعبات		مقاسات			عدد	وحدة القياس	نوع الأعمال و التوريدات	رقم البند
		إجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	الطول				
	٣٦,٥١		٠,٠٠	٠,٨٠	١,٦٣	١٤,٠٠	٢,٠٠	م ³	لزوم اعمال القواعد	22
	١٠,٠٨		٠,٠٠	٠,٣٠	١,٢٠	١٤,٠٠	٢,٠٠	3م	لزوم اعمال اسفل البلاطة (طلب الصرف)	
	١٤,١١		٠,٠٠	١,٦٠	٠,٣٢	١٤,٠٠	٢,٠٠	3م	الحائط اعلى القاعدة	
	٥,١٨		٠,٠٠	٢,٤٠	٠,٦٠	١,٨٠	٢,٠٠	3م	الكفنين	
	٢١,٩٨		٠,٠٠		١,٥٧	١٤,٠٠	١,٠٠	3م	الترابية	
	٢٨,٠٠				١,٠٠	١٤,٠٠	٢,٠٠		الكوابيل	
	٣٩,٤٨			٠,٣٠	١٤,٠٠	٤,٧٠	٢,٠٠	3م	البلاطات الانتقالية	
	١٣,٥٠			١,٥٠	٠,٥٠	٩,٠٠	٢,٠٠	3م	غرفتين اسفل البلاطة الانتقالية خاصة بالامياه	
	١٦٨,٨٥									

مهندس الهيكلة

مهندس الشركة

البند : بالمتر المكعب خرسانته مسلحة للبلاطات الطولية اعلى الكمر بند 23

ملاحظات	إجمالي بند الخصم	مساحات أو مكعبات		مقاسات			عدد	وحدة القياس	نوع الأعمال و التوريدات	رقم البند
		إجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	الطول				
	٩٥,٧٦			٠,٣٠	١٤,٠٠	٢٢,٨٠	١,٠٠	3م	البلاطة	23
	١٥,٠٥				٠,١١	٢٢,٨٠	٦,٠٠			
	٤,٥٦			٠,١٠	١,٠٠	٢٢,٨٠	٢,٠٠		الرصيف	
	١٥,٩٦				٠,٣٥	٢٢,٨٠	٢,٠٠		الكويستة	
	٦,٠٠				٠,٦٠	٢,٥٠	٤,٠٠		الوينجات	
	١٣٧,٣٣									

مهندس الهيكلة

مهندس الشركة

١٣ محرم ١٤٣٥

١٣ محرم ١٤٣٥



حصر اعمال مشروع : إنشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع
عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات



البند : باطن توريد وتشغيل حديد التسليح بند ٢٤

ملاحظات	إجمالي بعد الخصم	مسطحات أو مكعبات		مقاسات		عدد	وحدة القياس	نوع الأعمال و التوريدات	رقم البند
		إجمالي	خصم	الارتفاع	عرض				
								البند : باطن توريد وتشغيل حديد التسليح بند ٢٤	٢٤
	٢٥,٤٩٠					١٠		خوارق	
	٢١,٠٩٨					٢		قواعد	
	١,٨٩٦					١		ستائر خفف القواعد	
	٨٩,٢٩٩					٧		كمر سابقى الصب	
	١,٤٦٨					١		الديفرام	
	٢٤,٠٠٩					١		بلاطة الكوبري	
	١١,٣٢٠					٢		البلاطات الانتقالية	
	١,٩٣٦					٢		غرفتين للمحاسب اسفل الانتقالية	
	١٧٦,٥٢٦								
	١٧٦,٥٢٦								

مهندس الشركة


١٣/٩/١٤٤١هـ

البند : باطن للمربع عمل طبقة عزلة من الببوتومين بند ٢٧

ملاحظات	إجمالي بعد الخصم	مسطحات أو مكعبات		مقاسات		عدد	وحدة القياس	نوع الأعمال و التوريدات	رقم البند
		إجمالي	خصم	الارتفاع	عرض				
								البند : باطن للمربع عمل طبقة عزلة من الببوتومين بند ٢٧	٢٧
	٤٤,٨٠٠			٠,٨٠٠		٤		عزل القواعد	
	٥,٢١٦			٠,٨٠٠		٤			
	٤٥,٦٤٠				١,١٣٠	٢		وش القاعدة	
	٦٧,٢٠٠				١,٢٠٠	٤		الستارة	
	١,٤٤٠			٠,٣٠٠	١,٢٠٠	٤			
	٨٩,٦٠٠			١,٦٠٠		٤		المرابيات	
	٢,٠١٦			١,٦٠٠	٠,٣١٥	٤			
	٢٥٥,٩١٢								
	٢٥٥,٩١٢								

مهندس الشركة

١٣/٩/١٤٤١هـ



حصر اعمال مشروع : إنشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع
عدد (١١) كوبري على تربة الابراهيمية على مدخل المزلقانات



البند : بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس بند ٦- طرق

ملاحظات	إجمالي بعد الخصم	مساحات أو مكعبات		مقاسات			عدد	وحدة القياس	نوع الأعمال و التوريدات	رقم البند
		إجمالي	خصم	إجمالي	ارتفاع	العرض	الطول			
	١٠٥,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٠,٧	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢ م ^٢	البند : المتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس	٦
	١٠٥,٠٠٠			الاجمالي						

مهندس الشريكه

مهندس الهيئه

١٢/٢/٢٠٢٠

١٢/٢/٢٠٢٠

البند : بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعة خاصه وحمولات عاليه لرفع الكمر سابق الصب

ملاحظات	إجمالي بعد الخصم	مساحات أو مكعبات		مقاسات			عدد	وحدة القياس	نوع الأعمال و التوريدات	رقم البند
		إجمالي	خصم	إجمالي	ارتفاع	العرض	الطول			
	١							١	بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعة خاصه وحمولات عاليه لرفع الكمر سابق الصب	١
	١,٠٠٠			الاجمالي						

مهندس الشريكه

مهندس الهيئه

١٢/٢/٢٠٢٠

١٢/٢/٢٠٢٠

حصر اعمال مشروع :انشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات



للجسور، والجسور، والنقل البري



اسم العنصر / تذييل شوازيق

اسم العنصر	شكل التفريضة	تكرار	عدد	طول	قطر	وزن /م	الوزن الاجمالي (كجم)
الوصلة رقم ١		1	30	12	25	3.858	1388.89
الوصلة رقم ٢		1	30	7	22	2.988	627.41
الموسطة		1	41	12	12	0.889	437.33
الاطواق		1	12	4	18	2.000	96.00
الاجمالي لعدد (١) خازوق							2549.63
الاجمالي لعدد ١٠ خازوق							25496.30

مهندس الهيئه

مهندس الشركة

م/ع/س/م

١٢ محمود



حصر اعمال مشروع : انشاء كوبري امام مزلقان هيكل باشا المحمل على مشروع
(١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مدخل المزلقانات

للجوارى والخيول والجمال والبر



اسم العنصر : حديد القاعدة

العنصر	التكرار	العدد	الطول	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولي(كجم)	الوزن الاجمالي(كجم)
سفلي	1	10	16.7	32	6.32	1055.44
الحديد العلوي	1	15	16.7	25	3.86	966.93
الكثافات	1	116	6	16	1.58	1099.68
	3	116	2.1	12	0.89	650.412
برئندات القاعدة	1	8	32	16	1.58	404.48
الحائط	1	116	4.8	16	1.58	879.744
	1	116	2.4	16	1.58	439.872
برئندات الحائط	1	14	32	18	2	896
الاكتاف	2	13	6	18	2	312
برئندات الكتف	2	12	4	18	2	192
	2	14	4	18	2	224
	2	14	4	18	2	224
المرابطة	1	100	6	18	2	1200
	1	30	16	16	1.58	758.4
كثاه شدش	7	8	6	18	2	672
dewels	1	128	1.5	22	2.99	574.08
حديد الستارة خلف القاعدة						
الحديد الطولي	1	20	16	16	1.58	505.6
الحديد العرضي	1	140	2	16	1.58	442.4
11497.038	الاجمالي لعدد ١ قاعدة					
22994.076	الاجمالي لعدد ٢ قاعدة					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ احمد السامح

م/ محمودى

مرفقات مستخلص جارى رقم (٧)

مشروع

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقات

(على باشا حلمى - اطسا - الكفور - ايبوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بنى قرة - الحواتكة)

- تكسير مكعبات
- اختبارات ركائز
- اختبار التراسونيك
- اختبارات حديد
- اختبارات اسفلت

ملف رقم

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،

تحرير افي : 2024/8/28

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (249) بتاريخ 2024/8/28
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسنولية من احضرها

(مهندس المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 668 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/7/25

التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

المواصفات	بعد 28 يوم	ع.ر 668
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	431	مكعب رقم 1
	431	مكعب رقم 2
	461	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	441	المتوسط

تحريرا في 2024 / 8 / 28

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسلة الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا في : 2024/7/15

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (198) بتاريخ 2024/7/15
عملية: كوبري تل العمارنة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

العينات مسئوليّة من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
رقم و نوع العينات:

- 1- عينة رقم 513 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/16
- 2- عينة رقم 514 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/14
- 3- عينة رقم 515 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/12
- 4- عينة رقم 516 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/8

التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 28 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 515	بعد 28 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 514	بعد 28 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 513
	494	مكعب رقم 1	430	مكعب رقم 1	583	مكعب رقم 1
	436	مكعب رقم 2	455	مكعب رقم 2	515	مكعب رقم 2
	385	مكعب رقم 3	530	مكعب رقم 3	660	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	438	المتوسط	472	المتوسط	586	المتوسط

المواصفات	بعد 28 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 516
	505	مكعب رقم 1
	455	مكعب رقم 2
	533	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	498	المتوسط

تحريرا في 2024 / 7 / 15

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

تقرير رقم (198)

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبية باللائم.
و تفضلا وسادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،

تحرير فى : 2024/5/21

عدد (1) تقرير محمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)

تقرير رقم (133) بتاريخ 2024/5/21
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

رقم و نوع العينات:

1- عينة رقم 318 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة لخوازيق تاريخ الصب 2024/4/24

التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 318
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	337	مكعب رقم 1
	355	مكعب رقم 2
	378	مكعب رقم 3
		المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 21

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد أمين

ملف رقم

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسلة الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا في : 2024/5/21

عدد (1) تقرير معمل

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 317 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/13
التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج:-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 317
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	254	مكعب رقم 1
	578	مكعب رقم 2
	391	مكعب رقم 3
		المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 20

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد أمين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا فى : 2024/7/1

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (176) بتاريخ 2024/7/1
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئوليّة من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للتشياء والطرق
رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 432 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/4/24
- 2- عينة رقم 433 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/14
- 3- عينة رقم 434 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/16

التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 434	بعد 7 يوم	ع.ر 433	بعد 28 يوم	ع.ر 432
	الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)	
	533	مكعب رقم 1	583	مكعب رقم 1	609	مكعب رقم 1
	406	مكعب رقم 2	487	مكعب رقم 2	406	مكعب رقم 2
	659	مكعب رقم 3	533	مكعب رقم 3	583	مكعب رقم 3
		المتوسط		المتوسط		المتوسط

تحريرا في 2024 / 7 / 1

رئيس الادارة المركزية
مهندس/
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس/
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للانشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف ان نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا فى : 2024/5/21

عدد(1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد اعين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

تقرير رقم (133) بتاريخ 2024/5/21
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولية من احضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النول العامة للاتشاء و الطرق
رقم ونوع العينات:
1- عينة رقم 318 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/4/24
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ج 318
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	337	مكعب رقم 1
	355	مكعب رقم 2
	378	مكعب رقم 3
		المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 21

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد أمين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للانشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا فى : 2024/5/21

عدد (1) تقرير معمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

تقرير رقم (132) بتاريخ 2024/5/21
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسلووية من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم ونوع العينات:
1- عينة رقم 317 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/13
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج:-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 317
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	254	مكعب رقم 1
	578	مكعب رقم 2
	391	مكعب رقم 3
		المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 20

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للانشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائزم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فاتق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا في : 2024/5/20

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسيوط
ملف رقم

تقرير رقم (130) بتاريخ 2024/5/20
عملية: كوبري تل العمارنة

ورددت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / عمرو محمد انور
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 313 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/8
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 313
	الاجهاد (كجم/سم2)	
	441	مكعب رقم 1
	350	مكعب رقم 2
	464	مكعب رقم 3
	418	المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 20

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا في : 2024/8/28
عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل
مهندس / مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية
مهندس / (اسلام محمد فوزي)
مهندس /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

تقرير رقم (249) بتاريخ 2024/8/28
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولية من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم و نوع العينات:
1- عينة رقم 668 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/7/25
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 28 يوم	ع.ر 668
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	431	مكعب رقم 1
	431	مكعب رقم 2
	461	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	441	المتوسط

تحريرا في 2024 / 8 / 28

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتبنيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،

تحرير فى : 2024/7/15

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس /

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

تقرير رقم (198) بتاريخ 2024/7/15
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولة من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرقة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للأشياء و الطرق
رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 513 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/16
- 2- عينة رقم 514 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/14
- 3- عينة رقم 515 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/12
- 4- عينة رقم 516 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/8

التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 28 يوم	ع.ر 515	بعد 28 يوم	ع.ر 514	بعد 28 يوم	ع.ر 513
	الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)	
	494	مكعب رقم 1	430	مكعب رقم 1	583	مكعب رقم 1
	436	مكعب رقم 2	455	مكعب رقم 2	515	مكعب رقم 2
	385	مكعب رقم 3	530	مكعب رقم 3	660	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	438	المتوسط	472	المتوسط	586	المتوسط

المواصفات	بعد 28 يوم	ع.ر 516
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	505	مكعب رقم 1
	455	مكعب رقم 2
	533	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	498	المتوسط

تحريرا في 2024 / 7 / 15

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

ملف رقم

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،

تحريرا في : 2024/7/15
عدد (1) تقرير معمل

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

عسليّة: كوبرى بنى قرية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسوط

ملف رقم

السيد المهندس / رئيس قطاع الكباري
لشركة النيل العامة للإنشاء والبناء
تحية طيبة ... وبعد

نشرف ان نرفق طيه تقرير معملتي بتدريج مكملات حوض سد الكباري
برجاء التفصيل بالتعليق باللائم
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية...

صورة مرسله الى :

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة و العلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية

تحريرا في : 2024/4/15

تد: (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس /

مصطفى محمد امين

مهندس /
مصطفى محمد امين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

تقرير رقم (106) بتاريخ 2024/4/15
عملية: كوبري بني قرة

العينات مسئولية من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمود متولى (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم و نوع العينات:
1- عينة رقم 258 عدد (6) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة من بلاطة الكوبري تاريخ السب 2024:3/20
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

ع.ر 258	بعد 7 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	بعد 7 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 1	436	مكعب رقم 1
مكعب رقم 2	547	مكعب رقم 2
مكعب رقم 3	421	مكعب رقم 3
المتوسط		

تحريرا في 2024 / 4 / 15

رئيس الادارة لمراقبة
مهندس /
(مصطفى)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

تقرير عن ركيزة للكباري

من شركة عطايا للمقاولات

ورد الى المركز القومي للبحوث عينة ركيزة للكباري من انتاج شركة عطايا للمقاولات الخاصة بمشروع كوبري بني قرة، المالك الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مقلول شركة النيل العامة للأشياء والطرق، بالخطاب المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٨ وذلك لاختبارها طبقا للمواصفة الأوروبية ١٣٣٧/٣-٢٠٠٥، وكانت النتائج كالتالي:

تمت الاختبارات باستخدام جهاز

Compression testing machine with max. vertical load 500ton


أولاً: وصف العينة

العينة عبارة عن ركيزة على شكل متوازي مستطيلات من المطاط ومدعمة بألواح معدنية وتحمل ختم بارز ATAYA وأبعاد الركيزة كالتالي

A	B	Tb	nr	Ti
mm	mm	mm	-	mm
400	300	101C4	8	8

Where:-

A; length of bearing
B; width
tb: Total thickness of bearing.
nr : Number of rubber layer .
ti: Thickness of rubber layer.

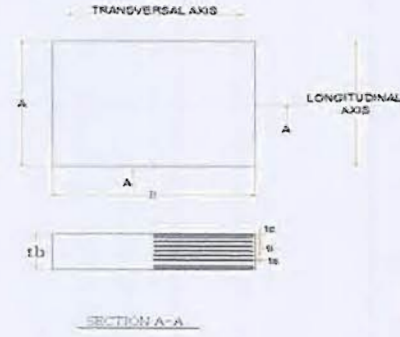

د. محمد لطفي
١٣/١٠/٢٠٢٣



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يقدم علي مسئولية الباحث الرئيسي

١٠/٢٠٢٣

I. Shear bond test Annex G, item 4.3.2.1

.Description of the shear bond test method:

- Loading the bearing with vertical compression load. A mean pressure of 12 MPa, vertical compression load = 144 ton /bearing.
- Apply horizontal force with rate 100mm/min to reach maximum deflection ($2t_q$) = $2 \times 64 = 1280$ mm.
- The horizontal force and deflection were recorded 10 equal intervals.
- Stay loading bearing for 5 min at max deflection $2t_q$.
- Remove horizontal force and examine the bearing visually, while still under the compressive load.

T_q	σ_c	V
mm	MPa	mm/min
64	12	100

Where:

T_q :- Average total initial thickness of rubber.

σ_c :- Value of compressive stress

V :- Speed of shear specific deformation

١٣/١٠/٩٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

١٠/١٠/٩٩

National Research Centre

Paints, Plastics, Rubber
and Adhesives Unit
Tahrir St., Dokki, Cairo
Tel. and Fax : 33355146



المركز القومي للبحوث


وحدة البويات والبلاستيك والمطاط والمواد اللاصقة
شارع التحرير - الدقي - القاهرة
ت مبشر وفكس : ٣٣٣٥٥١٤٦



Before testing



During shear bond test

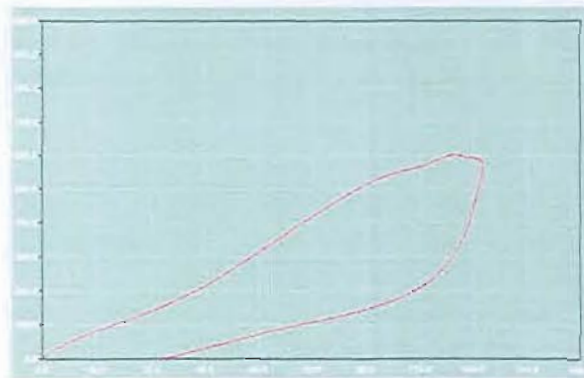

• The result

******No fracture was observed in the bearing as shown in the figures**

م. محمد الحضر
١٣/١٠/٢٠١٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

م. محمد الحضر
١٠/١٠/٢٠١٩

III. Compression Test Annex H, item 4.3.3.2

Test description

- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- Apply the maximum vertical load 180ton vertical load
- After the first loading Re apply vertical loading up to the maximum vertical load = 180 tons/bearing on 6 increments
- Visual inspection is performed after reaching the maximum loading value to check for the appearance of cracks, cuts or failure in the specimen.
- Remove the load

TEST RESULT

Fz2	Fz1	Tq	Vz2	Vz1	Ecs	Cc
KN	KN	mm	mm	mm	MPa	N/mm
1800	600	64	2.185	0.948	517	960.09

• Where :-

Fz2:- Max Compressive Load.

Fz1:- 1/3 of Max Compressive Load

Tq:- Total thickness of rubber.

Vz2:- Vertical deflection on maximum load.

Vz1:- Vertical deflection on 1/3 of maximum load.

Ecs:- Intersecting Compression modulus.

Cc:- Intersecting Compression stiffness.

مستطيل
٢٣/١٠/٢٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يقدم علي مسئولية الباحث الرئيسي

٢٣/١٠/٢٩

National Research Centre

Paints, Plastics, Rubber
and Adhesives Unit
Tahrir St., Dokki, Cairo
Tel. and Fax : 33355146




المركز القومي للبحوث

وحدة البويات والبلاستيك والمطاط والمواد اللاصقة
شارع التحرير - الدقي - القاهرة
ت مبلتر وفاكس : ٣٣٣٥٥١٤٦

تحت ٢٤/١٥/٢٠١٩
جس النيل لانتشاء الطلاء - بنى قرة

****No fracture was observed after the testing as shown in the figure

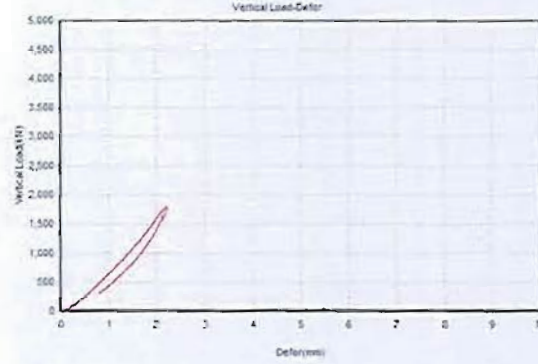

مما سبق يتضح أن العينة الواردة قد اجتازت الاختبارات وتمثل هذه النتائج العينة الواردة الي المركز دون أدنى مسؤولية عن باقي التوريد أو اختبارات أخرى.

الباحث الرئيسي

د. مدحت لطفي توفيق

د. مدحت لطفي توفيق
١٣/١٠/٢٠١٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسؤولية الباحث الرئيسي

د. مدحت لطفي توفيق
١٠/١٠/٢٠١٩

تقرير عن ركيزة للكباري

من شركة عطايا للمقاولات

ورد الي المركز القومي للبحوث عينة ركيزة للكباري من انتاج شركة عطايا للمقاولات الخاصة بمشروع كوبري بني قرة، المالك الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مقابل شركة النيل العامة للأشياء والطرق، بالخطاب المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٨ وذلك لاختبارها طبقا للمواصفة الأوروبية ٣٠٠٥-٣/١٣٣٧، وكانت النتائج كالتالي:

تمت الاختبارات باستخدام جهاز

Compression testing machine with max. vertical load 500ton

أولا: وصف العينة

العينة عبارة عن ركيزة علي شكل متوازي مستطيلات من المطاط ومدعمة بألواح معنوية وتحمل ختم بارز ATAYA وأبعاد الركيزة كالتالي

A	B	Tb	nr	Ti
mm	mm	mm	-	mm
400	300	90C4	7	8

Where:-


A; length of bearing

B; width

tb: Total thickness of bearing.

nr : Number of rubber layer .

ti: Thickness of rubber layer.

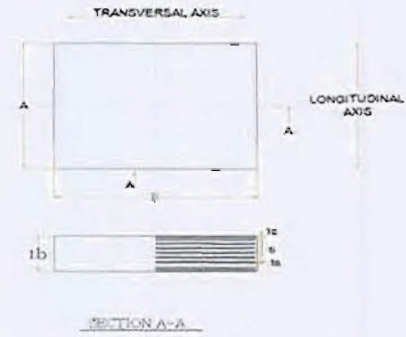

د. محمد لطفي
١٣/١٠/٢٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

١٣/١٠/٢٩

I. Shear modulus strength Annex F, item 4.3.1.1**Test description**

- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- Loading the bearing with vertical compression load .a mean pressure of 6 MPa, vertical compression load =72 ton/bearing.
- Apply horizontal force with rate 150mm/min to reach maximum deflection (0.7-0.9tq) =0.8*56=44.8mm.
- Stay unloading for 5 minuets
- Reapply the vertical force
- Apply horizontal force with rate 150mm/min to reach maximum deflection and The horizontal force and deflection are recorded 10 equal intervals
- Remove horizontal force and examine the bearing visually, while still under the compressive load.

The Results:

Tq	Σc	V	Fx1	Vx1	Fx2	Vx2	Gg
mm	MPa	mm/min	KN	mm	KN	mm	MPa
56	6	150	0.335	15.12	0.655	32.48	1.032

Tq:- Average total initial thickness of rubber . σc :- Value of compressive stress

V :- Speed of shear specific deformation.

Fx1 :- Shear force at 0,27 Tq.

Vx1 :- Shear deformation at 0,27 Tq.

Fx2 :- Shear force at 0,58 Tq.

Vx2 :- Shear deformation at 0,58 Tq

Gg :- Calculated shear modulus.(0.75 $\leq$ Gg $\leq$ 1.05)

12/1/2019



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يقدم علي مسئولية الباحث الرئيسي
ع.ع.ع.ع.
١٠/٢٩

National Research Centre

Paints, Plastics, Rubber
and Adhesives Unit
Tahrir St., Dokki, Cairo
Tel. and Fax : 33355146



المركز القومي للبحوث


وحدة البويات والبلاستيك والمطاط والمواد اللاصقة
شارع التحرير - الدقي - القاهرة
ت مباشر وفكس : ٣٣٣٥٥١٤٦



Before testing



During testing

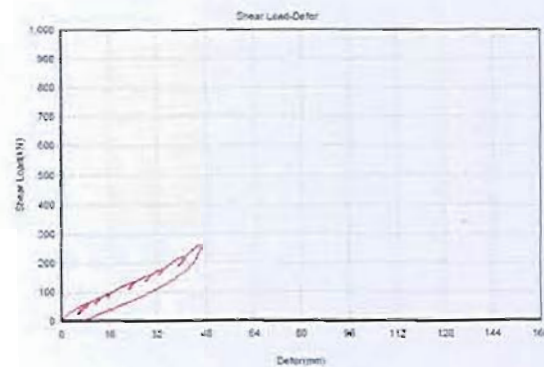

******No fracture was observed in the bearing during testing**

د. م. م. م.
٢٣/١٠/٢٠١٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

٢٣/١٠/٢٠١٩

II. Compression Test Annex H, item 4.3.3.2

Test description

- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- Apply the maximum vertical load 180ton vertical load
- After the first loading Re apply vertical loading up to the maximum vertical load = 180 tons/bearing on 6 increments
- Visual inspection is performed after reaching the maximum loading value to check for the appearance of cracks, cuts or failure in the specimen.
- Remove the load

TEST RESULT

Fz2	Fz1	Tq	Vz2	Vz1	Ecs	Cc
KN	KN	mm	mm	mm	MPa	N/mm
1800	600	56	2.301	1.164	492.2	1055.41

• Where :-

Fz2:- Max Compressive Load.

Fz1:- 1/3 of Max Compressive Load

Tq:-Total thickness of rubber.

Vz2:- Vertical deflection on maximum load.

Vz1:- Vertical deflection on 1/3 of maximum load.

Ecs:- Intersecting Compression modulus.

Cc:- Intersecting Compression stiffness.

د. محمد لطفي
١٣/١/٢٠١٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323




يُعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

٢٠٢٣
١٠/١/٢٠١٩

10/10/23 2
مجمع المجلس لانشاء الطرق بني هرة

*****No fracture was observed after the testing as shown in the figure**

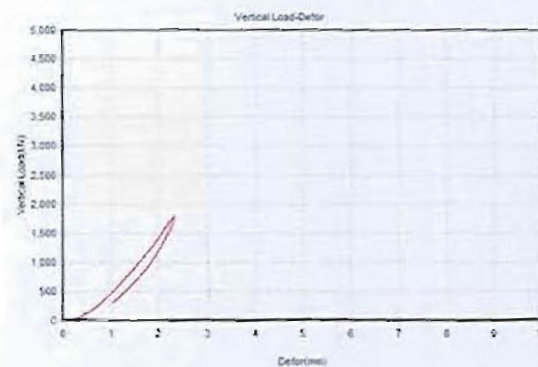

مما سبق يتضح أن العينة الواردة قد اجتازت الاختبارات وتمثل هذه النتائج العينة الواردة الي المركز دون أدنى مسؤولية عن باقي التوريد أو اختبارات أخرى.

الباحث الرئيسي

د. محبت لطفي توفیق

ملحق لصفحة ١٠٩
١٣/١٠/٩٩

Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

C.CP / 25
1. C9



إسم العميل : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
إسم المشروع : إنشاء كباري مزلقانات ترعة الابراهيمية - كوبري تل العمارنة - المنيا
الموضوع : اختبارات الجس الصوتي
رقم الصادر : E - 037
التاريخ : 2024/01/30

تحية طيبة وبعد ،،،


بالإشارة إلى الموضوع عاليه، مرفق لسيادتكم عدد (2) نسخة من تقرير اختبارات الجس الصوتي الزيارة التي تمت بتاريخ 2023/11/12 - لعدد (5) خازوق


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مكتب النيل الهندسي الإستشاري (مصر)
د.مهندس / أنور فاروق القاضي
" العضو المنتدب "

المرفقات :

■ عدد (2) نسخة من التقرير.





Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Tal Al-Amarna Surface Bridge, Minya Gov.
To : General Nile for Roads Construction.
NECB Ref. : SIT044/0735/2022.
Checked by : A. F. El-Kadi, PhD



Document History

Title	NECB Ref.	Rev.	Status	Date	Remark
SIT Report	SIT044/0735/023	0	Formal/ Final	12-11-2023	-



Contents

1. Introduction	4
2. The Measuring Technique	5
2.1 Applicable standards:	5
2.2 Additional measurement	5
2.3 Testing Equipment	5
3. Conclusion	5
Tips:	6
ANNEXES	7
ANNEX 1	7
Tested Pile(s) on November 12 th , 2023	7
ATTACHMENTS	8
1. SIT Method Statement	8
2. SIT Equipment Calibration Certificate.	8
3. Site Handover Sheet.	8

1. Introduction

1.1 Upon the request of "General Nile for Roads Construction Co." Sonic Integrity Testing (SIT) following the Project specifications executed to verify the integrity of (5) concrete pile(s).

1.2 The testing activities may be summarized as follows:

Project /Location	Tal Al-Amarna Surface Bridge, Minya Gov.
Date /Time	12-Nov- 2023
Witnessed	Project Engineer; and Client Engineer
NECB Staff	Kamel Ahmed, BSc.
Tested Element (s) Information	Concrete / Bored / Cast-in situ All piles` information as stated in Annex 1 measured <i>from level of test</i>
Visual Inspection	As stated in the Reflectogram footer



FIG. 1 SIT IN PROGRESS



2. The Measuring Technique

2.1 Applicable standards:

2.1.1 The measuring technique fully complies with ASTM Standard D5882-17, EA Pfähle 2012, CUR-Aanbeveling 109:2013, AFNOR NF P 94-160-2 and NF P 94-160-4.

2.1.2 The detailed method statement attached in the attachments.

2.2 Additional measurement

2.2.1 N/A.

2.3 Testing Equipment

2.3.1 Profound B.V. manufactured the used testing equipment.

2.3.2 All testing equipment data are in the attachments.



3. Conclusion

Based on test results interpretation using available nearest borehole logs, the following may be stated:

3.1 The test results for all tested and report piles shows acceptable lengths according to the pile's execution data as shown in annex 1;

3.2 Test results for all tested and reported piles are matching site average and soil layers' sequence.

Generally, it is be concluded that:

- 1) No major construction anomalies are evident from the test results;
- 2) All tested and reported piles are Integrity Wisely Accepted.

يمكن تلخيص نتائج الاختبار لعدد (5) خازوق خرساني والموضحين بالجدول المرفق أدناه بان جميع الخوازيق المختبرة ذات تكاملية جيدة ومقبولة (في الطول المقاس من منسوب الاختبار ومتوسط القطر)، وبدون أي عيوب جوهرية أو اختناقات مؤثرة على تكامليتها.

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Tal Al-Amarna Surface Bridge, Minya Gov.
To : General Nile for Roads Construction.
NECB Ref. : SIT044/0735/2022.
Checked by : A. F. El-Kadi, PhD




General Tips:

- Depending on our instrument accuracy, while the pile length is less than or equal to 25 times the pile diameter. The measurement accuracy is about 95%;
- Pile marked (poor pile head preparation) means surface cracks appear due to pile head demolishing, which does not affect either the wave quality or the integrity of this pile.
- Pile marked (anomaly @ pile head) means the marked pile needs to demolish for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
- The truth of the tested elements ID and input data is in the client's responsibility.

Cairo, 12 Nov 2023

**NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
(NECB- MISR)**

Dr. ENG. A. F. EL-KADI





ANNEXES

ANNEX 1

Tested Pile(s) on November 12th, 2023

GEOTECHNICAL QC&QA DEPARTMENT

SIT Field Results for "Tal Al-Amarna Surface Bridge, Minya Gov. "

2023, 12 Nov



S	Type	Pile ID Cap/ No.	Details	Reflectogram	Pile toe/ Analysis/Conclusion
1	Bored	P5/1	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P1 11/12/2023 $v = 2.4 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.29 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted
2	Bored	P5/2	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P2 11/12/2023 $v = 2.0 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.32 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted
3	Bored	P5/3	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P3 11/12/2023 $v = 2.6 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.34 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted
4	Bored	P5/4	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P4 11/12/2023 $v = 2.5 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.32 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted
5	Bored	P5/5	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P5- 6 11/12/2023 $v = 3.5 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.23 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted



Anomaly @ pile head means the marked pile need to be demolished for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.

Poor pile head preparation means surface cracks appears due to pile head demolishing, that doesn't the integrity of this pile.

Bulging @ Pile head means the difference between diameter of the first segment of pile compared by the designed diameter affecting the wave shape nor the pile integrity



ATTACHMENTS

1. SIT Method Statement.
2. SIT Equipment Calibration Certificate.
3. Site Handover Sheet.

Sonic Integrity Testing (SIT) – Generic Method Statement



Rev	Status	Date	Editor	Checked by
0	Final	May, 2022	SHERIF SALAH, BSc 	DR. ENG. A. F. EL – KADI 

Contents

Sonic Integrity Testing(SIT) - Method Statement.....	1
1) General	2
2) Applicable Standard.....	2
3) SIT Requirement	2
4) Testing equipment and tools	2
5) Testing procedure.....	2
6) Interpretation of results	2
7) SIT accuracy	2
8) Advantages of SIT	2
9) Limitations of SIT include.....	3
10) SITWAVE (optional)	3
11) Reports:	3

1) General

- Integrity testing of piles is designed to provide data about the physical dimensions, continuity, and consistency of material used in piles, not to give direct information about the performance of piles under the conditions of loading.
- An acoustic technique, developed by the institute for building material and building construction research of the Netherlands (TNO). The method, called Sonic Integrity Testing, has been in use in Europe since 1965.
- SIT classified as a most quickly and cheapest testing of pile integrity.
- The test itself takes no more than a few minutes, and over 100 piles a day can be easily tested.



Fig. 1 SIT General Scheme

2) Applicable Standard

SIT-system fully complies with the following standard : ASTM Standard D 5882; CUR109, EA PFähle, AFNOR, NF, P94-160-214.

3) SIT Requirement

3.1 In the cast -in- place concrete piles, integrity tests shall not be carried out until at least 5 days from the casting date or reach to 75% of the designed strength.

3.2 "Client Obligation"

3.2.1 The pile head must be clean, accessible, sound, and free from standing water so that a small

accelerometer can be pressed against it.

3.2.2 All related data for the tested piles (pile numbers, lengths, diameters, soil data, execution sheets) should be turned over to NECB's technical office as required via any available form "E-mail, Whatsup, or hard copy".

4) Testing equipment and tools

Testing equipment consists of:

- 4.1 Portable Computer containing required software;
- 4.2 Accelerometer connected to the computer
- 4.3 Teflon Head Hammer; and
- 4.4 Pile head cleaning tool.

NECB has a four sets of Testing equipment as follows:

- SIT+ Sys. manufactured by Profound B.V;
- SIT Pro. manufactured by Profound B.V; and
- Two ALLSIT sys. manufactured Allnamics USA.

The available equipment will do the required tests as available.

The related testing equipment information and calibration certificates shall be included in the test results reports.

5) Testing procedure

The testing of the piles shall follow the following steps:

- 5.1 Preparation of pile heads to avoid any loose concrete particles and standing water;
- 5.2 Press a small accelerometer against the pile head, and implement a number of three hits to the pile head using a Teflon Hammer;
- 5.3 Receive the equivalent waves on the portable computer screen;

- 5.4 Check that at least three waves are as similar as possible;



Fig.2 Pile head preparation

- 5.5 Check the waves and implement preliminary evaluation;
- 5.6 In case a defect is obvious it is recommended to implement several tests to assure the defect; and
- 5.7 Save results on the computer for later thorough interpretation and reporting.

5.8 SIT duration:

- 5.8.1 Test takes about 3 to 5 minute /pile in the normal conditions, poor pile head preparation, wet surface or other reasons may affect this duration.



Fig.4 Test in progress

6) Interpretation of results

- 6.1 It must be emphasized that results of integrity testing need to be interpreted with the requisite experience, and that all methods have limitations.
- 6.2 It should be appreciated that anomalous results can arise which may be capable of alternative interpretations. Integrity testing may also identify minor defects, which shall not necessarily affect pile performance, and the experienced person(s) shall have to

exercise his judgment as to the acceptability or refusal of such a pile. Full details of the ground conditions, pile dimensions construction method and, logs shall be made available to the specialist in order to facilitate interpretation of the results.

7) SIT accuracy

- 7.1 The accuracy of the pile length depends directly on the accuracy of the stress wave velocity. When the pile length is known, the stress wave velocity can be measured by adjusting this velocity until the pile length corresponds with the known pile length.

- 7.2 Also to be clarified that the pile length is not one of the major findings of the test and does have an accuracy of 90-95%, while the stress wave velocity range (3000 to 4400m/sec), where:

- 7.2.1 Length of the pile <25 Diameter, the accuracy is about 95%;

- 7.2.2 Length of the pile >25 Diameter, the accuracy is about 90%.

- 7.3 The pile length is for the stored signal data. If the pile length is too short, the measured signal will be too short to determine the pile toe. The pile length should be estimated between 80% and 130% of the real pile length.

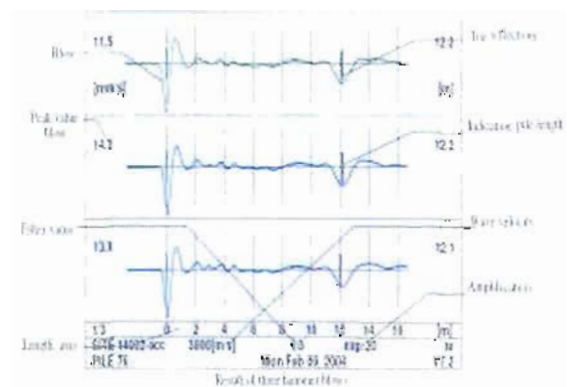


Fig. 5 SIT interface

8) Advantages of SIT

- 8.1 First line quality assurance against major faults;
- 8.2 Hundreds of piles can be tested in a single day;
- 8.3 Testing on any accessible pile;

- 8.4 Defects discovered at an early stage;
- 8.5 Quick and economical compared to other methods;
- 8.6 Equipment is portable and easy to operate.

9) Limitations of SIT include

- 9.1 Can not estimate bearing capacity;
- 9.2 Minor defects are not easily seen (local loss of cover to steel or small inclusions);
- 9.3 Length is difficult to determine for very long piles with very high shaft friction;
- 9.4 The thickness of a debris layer at the pile toe can not be determined.



10) SITWAVE (optional)

- 10.1 Numerical analysis (SITWAVE) is a finite element using the computer program TNOWAVE based on one-dimensional wave propagation theory. This allows the behavior of a pile and the Surrounding ground under an impact load to be simulated. The algorithm for the program in the past was developed by TNO and applied in the program TNOWAVE.
- 10.2 SITWAVE analysis consists of two or three phases. The first step is to create a computer model based on the reliable reference pile with the ground profile. There are the theoretical dimensions of the pile and bring the sounding introduced (cone resistance with a depth of soil).
- 10.3 After entering the data, the measurement results of the reference pile are compared with the output of the theoretical model. By means of (signal processing/ comparison techniques) and signal matching the basic model in the computer is adjusted so that as much as possible consistent with the measurement of the reference pile. The reference piles will not usually be a pile of constant diameter and in the second phase, a match is made on the pile diameters.

10.4 The third phase is to run a match to the suspect signal pile. This is the basic model taken from the previous stage and the pile diameter is adjusted to that corresponding to the measurement of the suspect pile.

- SITWAVE calculates the wave signal of a modeled pile (with or without discontinuities or soil behavior) Experience with simulated SIT signals greatly helps the understanding of real SIT signals. When normal interpretation is not possible or too difficult, TNOWAVE calculations can clarify a discontinuity in a pile.
- SITWAVE may use for the following causes:
 - I. Recording a major problem during the pile execution,
 - II. Recording an abnormal SIT result from the rest of the result; and
 - III. The client requested an analysis of a random sample.

Therefore, official approval to conduct the analysis is required.

11) SITWAVE requirement

- IV. Measurement signals for selected pile ;
- V. Pile record sheet including all casting data (theoretical and actual concrete, casting date, pile diameter, pile toe penetration, and any related information);
- VI. Related or nearest borehole;
- VII. Static and /or dynamic test report (if available);
- SITWAVE output
 - I. Graph of velocity as a function of time or length;
 - II. Graph of Radius and velocity as a function of time;
 - III. Graph of equivalent diameter along pile axis;
 - IV. Graph of pile cross-section along pile axis; and Excel sheet of the defected segments reading.

12) Reports:

- SIT final report for each site visit will be ready to submit at NECB office in Nasr City branch within less than 48Hr. Soft copy will be available as needed.



Calibration Certificate of The Profound *SIT*-Series

System data	
Serial number	SIT02004
Manufacturing year	2010
Software version	7.95
System model	<i>SIT</i> +
Customer	NECB-MISR

The *SIT* with s/n SIT02004


Complies with the following governing codes:

ASTM D5882-16
CUR aanbeveling 109
Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle April 2007
AFNOR NF P94-160-2 (1993).
AFNOR NF P94-160-4 (1994)¹.

Typical Values

A/D conversion : 24bit.
Temperature range : -20°C to 60 °C
System weight : 2.3 kg

Note 1: For compliance with the mentioned code AFNOR NF P94-160-4 the use of an instrument hammer is required.

Report		Approved by
Calibration Date	08/01/2023	Signature 

The calibration equipment consists of an electronic generated reference pile by a Waveform Generator Agilent 33220A

Profound BV
P.O. Box 469
2740 AL Waddinxveen
The Netherlands

Website WWW.profound.nl
E-mail info@profound.nl
Phone +31 182 640 964
Fax +31 182 649 664



Calibration Certificate of The Profound *SIT*-Series Acceleration sensor

Sensor data	
Serial number	57389
Manufacturing year	2013

The *SIT* acceleration sensor with s/n 57389
Complies with the following specification s of
Governing codes:

ASTM D5882-16
CUR aanbeveling 109
Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle April 2007
AFNOR NF P94-160-2 (1993).
AFNOR NF P94-160-4 (1994).

Typical Values

Temperature range : -20°C to 60 °C
Sensor weight : 60 g
Measuring range : ± 50 g peak.
Resonance Frequency : 32 KHz

Report		Approved by
Calibration Date	08/01/2023	Signature 

The calibration is related to an accelerometer type 4381 from Brüel & Kjær (sn. 1682064). The calibration equipment consists of a calibration amplifier, a multimeter Agilent 34410A (Sn. MY45000561), a function generator Agilent 33220A (sn.MY44010188), and a Gearing & Watson Electronic Ltd GWV-4 Vibrator with power amplifier.

Profound BV
P.O. Box 469
2740 AL Waddinxveen
The Netherlands

Website WWW.profound.nl
E-mail info@profound.nl
Phone +31 182 640 964
Fax +31 182 649 664

2009

11/11/11 ✓

الملائكة / الهيئته العامه للطوق والجوارى
الحميل / النيل العامة لاناء والطوق

المشروع / انشاء جباري فوق قناتان بترعة الابراهيميه - كوي
تحت الصاروخ - المنيا

المهبطه العامه للطرق والبحار / المصارف - الميه

Piles	Diameter cm	length m	Total n
P ₅	100	20	5

مفتي المال

1971

مفتي الحبش

پایان



CONCERNING: **SIT** REPORT ON (**12**) CONCRETE PILE(S) IN

EXPANSION PROJECT OF THE RAILWAY SURFACE BRIDGES IN ASSIUT

(BANI QORA RAILWAY CROSSING BRIDGE)



Rev
0

Status
FINAL

Date
14-AUG-2023

Editor
SHERIF SALAH, BSc

Checked by
DR. ENG. A. F. EL – KADI

sherif salah

A. F. EL – KADI

NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU (MISR)

PRO.DR.ING./ FAROUK.I.K.EL KADI

DR.ING./ ANWAR FAROUK EL KADI

EXPERT HOUSE OF ENGINEERING CONSULTANTS

05 Dr. Abdel Hameed Lotfy Street

Po. Box 11371

Nasr City-Cairo-Egypt

Tel : +2-02-22877600

Fax : +2-02-22700553

E-mail : anwarfelkadi@gmail.com

Internet: www.necb-misr.net



مكتب النيل الهندسي الاستشاري
٢٣ شارع النهر النيل شقة ٥١ - مصر
ت ٢٢٨٣١٨٨٠ ف ٢٢٨٣٥٦٥٩٠
هذا التقرير خاص بمشروع
رقم :
تاريخ :
ملاحظات :
ولا يجوز استخدامها لأي مشروع آخر ومن يخالف
ذلك يعرض لمسائلة القانونية م

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut.

To : General Nile for Roads &Construction.

NECB Ref. : SIT044/0532/2022.

Checked by : **A. F. El-Kadi, PhD****Document History**

Title	NECB Ref.	Rev.	Status	Date	Remark
SIT Report	SIT044/0532/023	0	Formal/ Final	14-08-2023	-



CONCERNING: **SIT REPORT ON (** 12 **) CONCRETE PILE(S) IN**

EXPANSION PROJECT OF THE RAILWAY SURFACE BRIDGES IN ASSIUT

(**BANI QORA RAILWAY CROSSING BRIDGE**)



Rev	Status	Date	Editor	Checked by
0	FINAL	14-AUG-2023	SHERIF SALAH, BSc	DR. ENG. A. F. EL - KADI

NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU (MISR)

PRO.DR.ING./ FAROUK.I.K.EL KADI

DR.ING./ ANWAR FAROUK EL KADI

EXPERT HOUSE OF ENGINEERING CONSULTANTS

05 Dr. Abdel Hameed Lotfy Street

Po. Box 11371


Nasr City-Cairo-Egypt

Tel : +2-02-22877600

Fax : +2-02-22700553

E-mail : anwarfelkadi@gmail.com

Internet: www.necb-misr.net





Title	NECB Ref.	Rev.	Status	Date	Remark
SIT Report	SIT044/0532/023	0	Formal/ Final	14-08-2023	-

Document History

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department
 Subject : SIT Final Report _Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut.
 To : General Nile for Roads &Construction.
 NECB Ref. : SIT044/0532/2022.
 Checked by : A. F. El-Kadi, PhD





Contents

1.	Introduction	4
2.	The Measuring Technique	5
2.1	Applicable standards:	5
2.2	Additional measurement	5
2.3	Testing Equipment	5
3.	Conclusion	5
	Tips:	6
	ANNEXES	7
	ANNEX 1	7
	Tested Pile(s) on Aug 14 th , 2023	7
	ATTACHMENTS	8
1.	SIT Method Statement	8
2.	SIT Equipment Calibration Certificate	8
3.	Site Handover Sheet	8

1. Introduction

1.1 Upon the request of "General Nile for Roads & Construction Co." Sonic Integrity Testing (SIT) following the Project specifications executed to verify the integrity of (12) concrete pile(s).

1.2 The testing activities may be summarized as follows:

Project/Location	Date/Time	Witnessed	NECB Staff	Tested Element (s) Information	Visual Inspection
Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut Gov. / Bani Qora Railway Crossing Bridge / Axis's A3&A4	14-Aug- 2023	Project Engineer, and Client Engineer	Kamel Ahmed, BSc.	Concrete / Bored / Cast-in situ All piles' information as stated in Annex 1 measured <i>from level of test</i> As stated in the Reflectogram footer	



FIG. 1 SIT IN PROGRESS

ويكون أي عيوب جوهريّة أو اختلالات مؤثّرة على تكاملتها.

، الخوازيق المختبرة ذات تكاملية جيدة وعقولة (في الطول المقاس من منسوب الاختبار ومتوسط القطر) يمكن تلخيص نتائج الاختبار لعدم (12) خازوق خرساني والموضحين بالجدول المرفق أدناه بأن جميع

2) All tested and reported piles are Integrity Wisely Accepted.

1) No major construction anomalies are evident from the test results;

Generally, it is be concluded that:

soil layers' sequence.

3.2 Test results for all tested and reported piles are matching site average and

according to the pile's execution data as shown in annex 1;

3.1 The test results for all tested and report piles shows acceptable lengths

may be stated:

Based on test results interpretation using available nearest borehole logs, the following

3. Conclusion

2.3.2 All testing equipment data are in the attachments.

2.3.1 Profound B.V. manufactured the used testing equipment.

2.3 Testing Equipment

2.2.1 N/A.

2.2 Additional measurement

2.1.2 The detailed method statement attached in the attachments.


CUR-Aanbeveling 109:2013, AFNOR NF P 94-160-2 and NF P 94-160-4.

2.1.1 The measuring technique fully complies with ASTM Standard D5882-17, EA Pfhle 2012,

2.1 Applicable standards:

2. The Measuring Technique

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department
 Subject : SIT Final Report _ Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut.
 To : General Nile for Roads & Construction.
 NECB Ref. : SIT044/0532/2022.
 Checked by : A. F. El-Kadi, PhD



Cairo, 14 Aug 2023

- responsibility.
- The truth of the tested elements ID and input data is in the client's for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
 - Pile marked (anomaly @ pile head) means the marked pile needs to demolish integrity of this pile.
 - Pile marked (poor pile head preparation) means surface cracks appear due to pile head demolishing, which does not affect either the wave quality or the equal to 25 times the pile diameter. The measurement accuracy is about 95%.
 - Depending on our instrument accuracy, while the pile length is less than or

General Tips:

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical & C&A Department
 Subject : SIT Final Report - Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut.
 To : General Nile for Roads & Construction.
 NECB Ref. : SIT044/0532/2022.
 Checked by : A. F. El-Kadi, PhD








ANNEXES

ANNEX 1

Tested Pile(s) on Aug 14th, 2023

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department
 Subject : SIT Final Report Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut
 To : General Nile for Roads & Construction.
 NECB Ref. : SMO/4/0532/2022.
 Checked by : A. F. El-Kadi, PhD

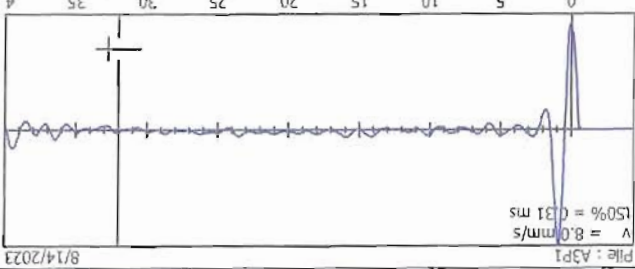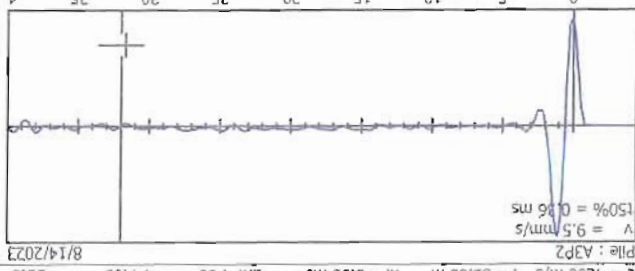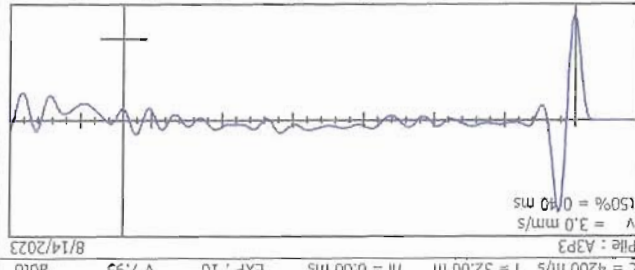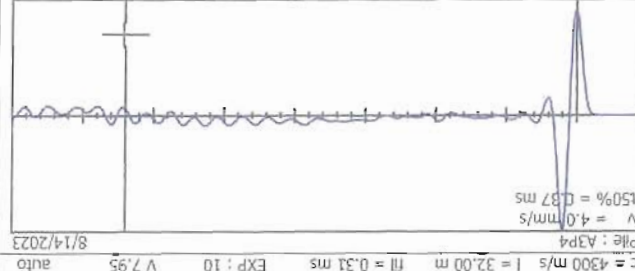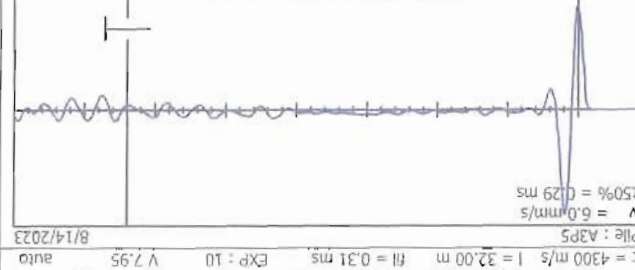

S	Type	Pile ID	Cap/ No.	Details	Reflectogram	Pile toe/ Analysis/Conclusion
1	Bored	A3/1		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	 Pile : A3P1 V = 8.0 mm/s 150% = 0.31 ms C = 4200 m/s I = 32.00 m fll = 0.00 ms EXP : 10 V 7.95 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted
2	Bored	A3/2		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	 Pile : A3P2 V = 9.5 mm/s 150% = 0.16 ms C = 4200 m/s I = 32.00 m fll = 0.00 ms EXP : 10 V 7.95 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted
3	Bored	A3/3		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	 Pile : A3P3 V = 3.0 mm/s 150% = 0.40 ms C = 4300 m/s I = 32.00 m fll = 0.31 ms EXP : 10 V 7.95 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted
4	Bored	A3/4		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	 Pile : A3P4 V = 4.0 mm/s 150% = 0.87 ms C = 4300 m/s I = 32.00 m fll = 0.31 ms EXP : 10 V 7.95 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted
5	Bored	A3/5		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	 Pile : A3P5 V = 6.0 mm/s 150% = 0.29 ms C = 4200 m/s I = 32.00 m fll = 0.00 ms EXP : 10 V 7.95 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted

Anomaly @ pile head means the marked pile need to be demolished for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
Poor pile head preparation means surface cracks appears due to pile head demolishing, that doesn't the integrity of this pile.
Bulging @ pile head means the difference between diameter of the first segment of pile compared by the designed diameter affecting the wave shape nor the pile integrity

2023, 14 Aug

S	Type	Pile ID	Cap/ No.	Details	Reflectogram	Pile toe/ Analysis/Conclusion
6	Bored	A3/6		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : A3P6-4 V = 3.4 mm/s 150% = 0.86 ms C = 4200 m/s l = 32.00 m fil = 0.00 ms EXP : 10 V 7.95 auto 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted
7	Bored	A4/1		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P1 V = 2.5 mm/s 150% = 0.89 ms C = 4300 m/s l = 32.00 m fil = 0.31 ms EXP : 10 V 7.95 auto 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted
8	Bored	A4/2		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P2 V = 2.3 mm/s 150% = 0.89 ms C = 4300 m/s l = 32.00 m fil = 0.31 ms EXP : 10 V 7.95 auto 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted
9	Bored	A4/3		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : A4P3 V = 8.4 mm/s 150% = 0.82 ms C = 4200 m/s l = 32.00 m fil = 0.00 ms EXP : 10 V 7.95 auto 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted
10	Bored	A4/4		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P4-8 V = 9.0 mm/s 150% = 0.87 ms C = 4300 m/s l = 32.00 m fil = 0.31 ms EXP : 10 V 7.95 auto 8/14/2023	Clear No major anomaly Integrity accepted



Anomaly @ pile head means the marked pile need to be demolished for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
 Poor pile head preparation means surface cracks appears due to pile head demolishing, that doesn't the integrity of this pile.
 Bulging @ Pile head means the difference between diameter of the first segment of pile compared by the designed diameter affecting the wave shape nor the pile integrity

2023, 14 Aug



S	Type	Pile ID	Cap/ No.	Details	Reflectogram	Pile toe/ Analysis/Conclusion
11	Bored	A4/5		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P5 V = 2.6mm/s 150% = 0.86 ms c = 4300 m/s l = 32.00 m rl = 0.31 ms EXP : 10 V 7.95 8/14/2023 auto	Clear No major anomaly Integrity accepted
12	Bored	A4/6		D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P6 V = 2.2mm/s 150% = 0.87 ms c = 4300 m/s l = 32.00 m rl = 0.31 ms EXP : 10 V 7.95 8/14/2023 auto	Clear No major anomaly Integrity accepted



Anomaly @ pile head means the marked pile need to be demolished for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
 Poor pile head preparation means surface cracks appears due to pile head demolishing, that doesn't the integrity of this pile.
 Bulging @ pile head means the difference between diameter of the first segment of pile compared by the designed diameter affecting the wave shape nor the pile integrity



ATTACHMENTS

1. SIT Method Statement.
2. SIT Equipment Calibration Certificate.
3. Site Handover Sheet.

Sonic Integrity Testing(SIT) – Generic Method Statement



Rev 0	Status Final	Date May, 2022	Editor SHERIF SALAH, BSc <i>Sherif Salah</i>	Checked by DR. ENG. A. F. EL – KADI <i>A. F. El-Kadi</i>
----------	-----------------	-------------------	--	--



Contents

1) General	2
2) Applicable Standard.....	2
3) SIT Requirement	2
4) Testing equipment and tools	2
5) Testing procedure.....	2
6) Interpretation of results	2
7) SIT accuracy	2
8) Advantages of SIT	2
9) Limitations of SIT include.....	3
10) SITWAVE (optional)	3
11) Reports:	3

1) General

- Integrity testing of piles is designed to provide data about the physical dimensions, continuity, and consistency of material used in piles, not to give direct information about the performance of piles under the conditions of loading.
- An acoustic technique, developed by the institute for building material and building construction research of the Netherlands (TNO). The method, called Sonic Integrity Testing, has been in use in Europe since 1965.
- SIT classified as a most quickly and cheapest testing of pile integrity.
- The test itself takes no more than a few minutes, and over 100 piles a day can be easily tested.



Fig. 1 SIT General Schematic

2) Applicable Standard

SIT-system fully complies with the following standard : ASTM Standard D 5882; CUR109, EA PFähle, AFNOR, NF, P94-160-214.

3) SIT Requirement

3.1 In the cast –in- place concrete piles, integrity tests shall not be carried out until at least 5 days from the casting date or reach to 75% of the designed strength.

3.2 "Client Obligation"

3.2.1 The pile head must be clean, accessible, sound, and free from standing water so that a small

4) Testing equipment and tools

- 4.1 Portable Computer containing required software;
- 4.2 Accelerometer connected to the computer
- 4.3 Teflon Head Hammer; and
- 4.4 Pile head cleaning tool.

NECB has a four sets of Testing equipment as follows:

- SIT+ Sys. manufactured by Profound B.V;
- SIT Pro. manufactured by Profound B.V; and
- Two ALLSIT sys. manufactured Allnamics USA.

The available equipment will do the required tests as available.
The related testing equipment information and calibration certificates shall be included in the test results reports.

5) Testing procedure

The testing of the piles shall follow the following steps:

- 5.1 Preparation of pile heads to avoid any loose concrete particles and standing water;
- 5.2 Press a small accelerometer against the pile head, and implement a number of three hits to the pile head using a Teflon Hammer;
- 5.3 Receive the equivalent waves on the portable computer screen;

accelerometer can be pressed against it.

3.2.2 All related data for the tested piles: (pile numbers, lengths, diameters, soil data, execution sheets) should be turned over to NECB's technical office as required via any available form "E-mail, Whatsapp, or hard copy".

5.4 Check that at least three waves are as similar as possible;



Fig.2 Pile head preparation

5.5 Check the waves and implement preliminary evaluation;

5.6 In case a defect is obvious it is recommended to implement several tests to assure the defect; and

5.7 Save results on the computer for later thorough interpretation and reporting.

5.8 SIT duration:

5.8.1 Test takes about 3 to 5 minute /pile in the normal conditions, poor pile head preparation, wet surface or other reasons may affect this duration.



Fig.4 Test in progress

6) Interpretation of results

6.1 It must be emphasized that results of integrity testing need to be interpreted with the requisite experience, and that all methods have limitations.

6.2 It should be appreciated that anomalous results can arise which may be capable of alternative interpretations. Integrity testing may also identify minor defects, which shall not necessarily affect pile performance, and the experienced person(s) shall have to

(SIT MS Doc.)

7) SIT accuracy

exercise his judgment as to the acceptability or refusal of such a pile. Full details of the ground conditions, pile dimensions construction method and, logs shall be made available to the specialist in order to facilitate interpretation of the results.

7.1 The accuracy of the pile length depends directly on the accuracy of the stress wave velocity. When the pile length is known, the stress wave velocity can be measured by adjusting this velocity until the pile length corresponds with the known pile length.

7.2 Also to be clarified that the pile length is not one of the major findings of the test and does have an accuracy of 90-95%, while the stress wave velocity range (3000 to 4400m/sec), where:

7.2.1 Length of the pile <25 Diameter, the accuracy is about 95%;

7.2.2 Length of the pile >25 Diameter, the accuracy is about 90%.

7.3 The pile length is for the stored signal data. If the pile length is too short, the measured signal will be too short to determine the pile toe. The pile length should be estimated between 80% and 130% of the real pile length.

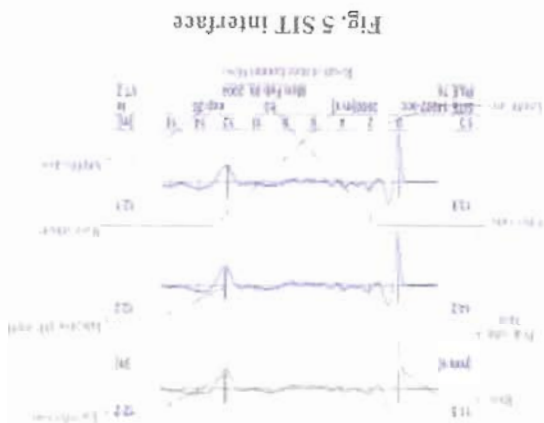


Fig.5 SIT interface

8) Advantages of SIT

8.1 First line quality assurance against major faults;


8.2 Hundreds of piles can be tested in a single day;

8.3 Testing on any accessible pile;

- 8.4 Defects discovered at an early stage;
- 8.5 Quick and economical compared to other methods;
- 8.6 Equipment is portable and easy to operate.

9) Limitations of SIT include

- 9.1 Can not estimate bearing capacity;
- 9.2 Minor defects are not easily seen (local loss of cover to steel or small inclusions);
- 9.3 Length is difficult to determine for very long piles with very high shaft friction;
- 9.4 The thickness of a debris layer at the pile toe can not be determined.



10) SITWAVE (optional)

- 10.1 Numerical analysis (SITWAVE) is a finite element using the computer program TNOWAVE based on one-dimensional wave propagation theory. This allows the behavior of a pile and the surrounding ground under an impact load to be simulated. The algorithm for the program in the past was developed by TNO and applied in the program TNOWAVE.

- 10.2 SITWAVE analysis consists of two or three phases. The first step is to create a computer model based on the reliable reference pile with the ground profile. There are the theoretical dimensions of the pile and bring the sounding introduced (cone resistance with a depth of soil).

- 10.3 After entering the data, the measurement results of the reference pile are compared with the output of the theoretical model. By means of (signal processing/ comparison techniques) and signal matching the basic model in the computer is adjusted so that as much as possible consistent with the measurement of the reference pile. The reference piles will not usually be a pile of constant diameter and in the second phase, a match is made on the pile diameters.

- 10.4 The third phase is to run a match to the suspect signal pile. This is the basic model taken from the previous stage and the pile diameter is adjusted to that corresponding to the measurement of the suspect pile.

- SITWAVE calculates the wave signal of a modeled pile (with or without discontinuities or soil behavior) Experience with simulated SIT signals greatly helps the understanding of real SIT signals. When normal interpretation is not possible or too difficult, TNOWAVE calculations can clarify a discontinuity in a pile.

- SITWAVE may use for the following causes:
 - I. Recording a major problem during the pile execution;
 - II. Recording an abnormal SIT result from the rest of the result; and
 - III. The client requested an analysis of a random sample.

- 11) SITWAVE requirement
 - IV. Measurement signals for selected pile;
 - V. Pile record sheet including all casting data, (theoretical and actual concrete, casting date, pile diameter, pile toe penetration, and any related information);
 - VI. Related or nearest borehole;
 - VII. Static and for dynamic test report (if available);

- SITWAVE output
 - I. Graph of velocity as a function of time or length;
 - II. Graph of Radius and velocity as a function of time;
 - III. Graph of equivalent diameter along pile axis;
 - IV. Graph of pile cross-section along pile axis; and Excel sheet of the detected segments reading.

12) Reports:

- SIT final report for each site visit will be ready to submit at NECB office in Nasr City branch within less than 48Hr. Soft copy will be available as needed.

Calibration Certificate of The Profound *SIT*-Series

System data	
Serial number	SIT02004
Manufacturing year	2010
Software version	7.95
System model	SIT+
Customer	NECB-MISR

Typical Values

The *SIT* with s/n SIT02004
Complies with the following governing codes:

ASTM D5882-16	ASTM D5882-16
CUR aanbeveling 109	CUR aanbeveling 109
Empfehlungen des Arbeitskreises Pflähe April 2007	Empfehlungen des Arbeitskreises Pflähe April 2007
AFNOR NF P94-160-2 (1993).	AFNOR NF P94-160-2 (1993).
AFNOR NF P94-160-4 (1994)¹.	AFNOR NF P94-160-4 (1994)¹.
A/D conversion	: 24bit.
Temperature range	: -20°C to 60 °C
System weight	: 2.3 kg

Note 1: For compliance with the mentioned code AFNOR NF P94-160-4 the use of an instrument hammer is required.

Report		Approved by
Calibration Date	08/01/2023	Signature
		

The calibration equipment consists of an electronic generated reference pile by a Waveform Generator Agilent 33220A

Profound BV
P.O. Box 469
2740 AL Waddinxveen
The Netherlands

Website WWW.profound.nl
E-mail info@profound.nl
Phone +31 182 640 964
Fax +31 182 649 664



Calibration Certificate of
The Profound *SIT*-Series
Acceleration sensor

Sensor data	
Serial number	157389
Manufacturing year	2013

Typical Values

The *SIT* acceleration sensor with s/n 57389
Complies with the following specifications of
Governing codes:

ASTM D5882-16
CUR aanbeveling 109
Empfehlungen des Arbeitskreises Pähle April 2007
AFNOR NF P94-160-2 (1993).
AFNOR NF P94-160-4 (1994).
Temperature range : -20°C to 60 °C
Sensor weight : 60 g
Measuring range : ±50 g peak.
Resonance Frequency : 32 KHz

Report	Calibration Date	Signature
	08/01/2023	
Approved by		

The calibration is related to an accelerometer type 4381 from Brüel & Kjær (sn. 1682064). The calibration equipment consists of a calibration amplifier, a multimeter Agilent 34410A (Sn. MY45000561), a function generator Agilent 33220A (sn.MY44010188), and a Gearing & Watson Electronic Ltd GWV-4 Vibrator with power amplifier.

Profound BV
P.O. Box 469
2740 AL Waddinxveen
The Netherlands

Website WWW.profound.nl
E-mail info@profound.nl
Phone +31 182 640 964
Fax +31 182 649 664



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-01

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقانات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحواكة

Specimen : نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٢ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد والصلب المورد بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	12	12	12
Weight	(g m)	537	536	532
Length	(mm)	608	607	602
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	113.23	113.20	113.29
Actual Average Diameter	(mm)	12.00	12.00	12.00
Yield load	(KN)	60.4	59.7	59.8
Ultimate load	(KN)	76.2	74.5	75.7
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	533.4	527.3	527.8
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	672.9	658.1	668.1
Ultimate / Yield Stress (R m / Re)		1.261	1.248	1.265
Elongation . A5	(%)	17.2	18.6	17.8
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		42	42	42
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل والمركز ليس عليه ادنى مسؤولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل .



اختبار
مختبر
مركز



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-02

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقانات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قره - الحواتكة

Specimen : نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٦ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب الموردة بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	16	16	16
Weight	(g m)	943	948	951
Length	(mm)	601	604	606
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	201.16	201.22	201.19
Actual Average Diameter	(mm)	16.00	16.00	16.00
Yield load	(KN)	108.3	107.2	108.6
Ultimate load	(KN)	138.5	138.8	137.3
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	538.3	532.7	539.7
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	688.5	689.7	682.4
Ultimate / Yield Stress(R m / Re)		1.279	1.294	1.264
Elongation . AS	(%)	17.2	16.9	17.7
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		56	56	56
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه ادني مسئولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب اقاده العميل.

اعتماد
محمد السيد فاروق



إختبار
مفتوح
فأله الموهبت



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-03

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقانات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحواكة

Specimen : نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٨ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب المورد بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	18	18	18
Weight	(g m)	1392	1386	1398
Length	(mm)	701	698	704
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	254.58	254.57	254.58
Actual Average Diameter	(mm)	18.00	18.00	18.00
Yield load	(KN)	139.2	137.9	138.7
Ultimate load	(KN)	175.3	176.2	176.8
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	546.7	541.6	544.8
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	688.5	692.1	694.4
Ultimate / Yield Stress (R m / Re)		1.259	1.277	1.274
Elongation . A5	(%)	17.2	17.9	17.6
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		90	90	90
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود و متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه انني مسئولة إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل .

اعتماد

عادل الدين مازوقه



اختبار

مهندس مازوقه
فادى ابو الحسن



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-04

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقانات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحواتكة

Specimen :

نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ٢٥ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد والصلب المورد بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	25	25	25
Weight	(g m)	2683	2694	2690
Length	(mm)	700	703	702
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	491.39	491.30	491.27
Actual Average Diameter	(mm)	25.00	25.00	25.00
Yield load	(KN)	265.7	264.9	266.3
Ultimate load	(KN)	349.6	348.8	350.7
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	540.7	539.1	542.0
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	711.4	709.9	713.8
Ultimate / Yield Stress(R m / Re)		1.315	1.316	1.316
Elongation . A5	(%)	16.6	16.2	16.9
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		125	125	125
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفي بأنها تتجاوز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)

علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل والمركز ليس عليه ادنى مسئولية إلا عن العينة المختبرة .

* البيانات بعالية حسب افاده العميل.



اختبار
مراجعة
فادى احمد



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-06

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحواكة
نتائج اختبار عينات حديد تسليح إنتاج مصنع المصريين للحديد والصلب المورد بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Specimen :

Chemical Analysis

Chemical Analysis For Elements %	Nominal diameter (mm)					ES 262-2 / 2015 Limits Grade B500 DWR
	12	16	18	25	32	
C	0.310	0.313	0.311	0.316	0.315	0.32- 0.03
Si	0.194	0.201	0.198	0.206	0.217	0.55-0.05
S	0.021	0.023	0.027	0.024	0.026	0.04-0.008
P	0.019	0.012	0.014	0.017	0.020	0.04-0.008
Mn	1.119	1.123	1.117	1.113	1.121	1.8-0.08
N	0.004	0.006	0.008	0.007	0.007	0.012-0.002
CEV	0.554	0.558	0.567	0.588	0.593	0.610

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود و متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢١٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل والمركز ليس عليه ادني مسئولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل .

اعتماد

مراجعة

اختبار

عادل طارق الكاش

لعمري

بنصره
عادل طارق الكاش



مشروع : كوبري بني قرة

مقاوله : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

ملف رقم ٥٩٩٦١٠

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج تجارب أجريت على عينات خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة للعملية عاليه.

الاختبار	عدد العينات	تحضير العينة	رسوم الاختبار	الجملة
الاستخلاص	1	100	550	650
اعداد التقرير			250	250

900	إجمالي الرسوم المعملية
135	15% مصاريف إدارية
144.90	14% الضريبة المضافة
1179.90	**إجمالي التكاليف المعملية

أعلى الترخيص
محمد محمد المكي
مدير

برجاء التفضل بالتنبيه نحو إجراء اللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات عدد

(1) نسخ تقرير معلمي

رقم (230) بتاريخ 2024/8/11

مدير معامل المنطقة

م/

مصطفى محمد أمين

العمود
٢٠٢٤
١٤
٨

السيد المهندس / رئيس قطاع الكباري
لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج عينات خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،

تحريرا في : 2024/8/11

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (230) بتاريخ 2024/8/11
عملية: كوبري بني قرة

العينات مسنولية من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمود متولى (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النول العامة للإنشاء و الطرق
رقم ونوع العينات:
1- عينة رقم 582 خلطة إسفلتية رابطته (د3)
التجارب التي أجريت:
1 الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
النتائج:

سعة للمهرة	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200	نسبة الاسفلت
% للمار	100	94	60	35	26	17	10	4	2	4.~
ع.ر 582	100	85/95	52/62	31/39	25/31	13/19	5/11	2/4	0.3	0.25~4.55
حدود										
المواصفات										

1- العينات داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة
تحريرا في 2024/ 8/ 11

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد امين)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)
