

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بياته: (١-١) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية
الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٣ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٥٥٧٣	٥١,١٥	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٢٤١	٢٨,٤٨	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٣٧٢٢	٢٧,٤٤	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٢٢٩١٨	٤٥,٨٤	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٧٦٤٥٤,٣١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٧٦٤٥٤,٣١	الاجمالي الكلى (٣م)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم حلاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند وبيانه: (١-١) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية
الكمية المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٠٤٤,٨	٢,٠٩	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٨٣٥,٥	١,٦٧	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثاني
٨٠٣,٩	١,٦١	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٤٤٥,٠	٠,٨٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+٦٠٠	القطاع الرابع
٣١٢٩,٢٣	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٣١٢٩,٢٣	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه: (١-١) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية
الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠.٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٢٢٢,٩	١٧,٤١	٣٠٠	٤٢٦+٢٤٠	٤٢٥+٩٤٠	القطاع الأول
١٩٣,٥	٠,٦٠	٣٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٦+٢٨٠	القطاع الثاني
٥٤١٦,٤٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٤١٦,٤٦	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخطوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات الكميات المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٥٤٥٨	٥٠,٩٢	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٠٩٥٢	٢١,٩٠	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثانى
٩٩٠١	١٩,٨٠	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٦٥١٠	١٣,٠٢	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٥٢٨٢١,٤٠	اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٢٨٢١,٤٠	الاجمالى الكلى (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند وبيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢

تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٤٦٦	١٦,٩٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٤٣٨٣	٨,٧٧	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٤٧٧٥	٩,٥٥	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٣٨٤٨	٧,٧٠	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٢١٤٧٢,٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢١٤٧٢,٢٠	الاجمالي الكلى (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال سبتمبر ٢٠٢٢

تـنـقـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٦٣١٥,٢	٧٢,٦٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٨٦٦,٧	٢٣,٧٣	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٦٦٧٥,٠	٣٣,٣٥	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
١٠٩٦٢,٨	٢١,٩٣	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٧٥٨١٩,٦٢	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٧٥٨١٩,٦٢	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة -العاصمة الإدارية -العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٨٥٩٤,١	٥٧,١٩	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٠٦٣٤,٠	٢١,٢٧	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثانى
١٢٧٥٤,١	٢٥,٥١	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٨٣٩٨,٨	١٦,٨٠	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٦٠٣٨٠,٩٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٦٠٣٨٠,٩٥	الاجمالي الكلى (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخطوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشى

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند وبيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢

تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٦٤٥٢,٩	٣٢,٩١	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٨٦٠٦,٥٩	١٧,٢١	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٠٣٣٣,٩	٢٠,٦٧	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
١٠٠٠٠,٨	٢٠,٠٠	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٤٥٣٩٤,١٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٤٥٣٩٤,١٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣

تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ١٠,٠٠٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٧١٣,٥٥	٧,٤٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٥٦,٥٦	٣,١١	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٨٩٥,٧٧	٣,٧٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
١٩٤٥,٧٦	٣,٨٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٩١١١,٦٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٩١١١,٦٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٧١٣,٥٥	٧,٤٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٥٦,٥٦	٣,١١	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٨٩٥,٧٧	٣,٧٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٢٥٧٨٣٤,١٢	٥١٥,٦٧	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٢٦٥٠٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٦٥٠٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم النعلاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥+٦٠٠ الى الكم ٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٧١٣,٥٥	٧,٤٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٥٦,٥٦	٣,١١	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٨٩٥,٧٧	٣,٧٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٢٥٧٨٣٤,١٢	٥١٥,٦٧	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٢٦٥٠٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٦٥٠٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخطاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر القراي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين المنخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) بالمتنر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade)
من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
الكميات المنقذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣
تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٠٠,١٢	٤,١١٨	٣٤٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+٢٦٠	القطاع الأول
٤٥٠٠,٧٢	٨,٠٣٧	٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثاني
٣٣٧٥,٥٤	٨,٠٣٧	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
٩٢٧٦,٣٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٩٢٧٦,٣٨	الاجمالي الكلى (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الشاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade)
من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٣٠٤,٤٢	٨,٠٣٧	٦٦٠	٤٢٦+٢٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٣٣٢,٤٦	٣,٩١٩	٣٤٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+٢٦٠	القطاع الثاني
٦٦٣٦,٨٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٦٦٣٦,٨٨	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade)

من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

الكميات المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣

تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٦٠,٧٤	٨,٠٣٧	٢٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٧+١٤٠	القطاع الأول
١٦٠,٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٦٠,٧٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) قيمة المادة المحجيرة

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٩٥٩,٥٠	٣,٩١٩	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٥٣٠٤,٤٢	٤,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٤٧٩١,٥٨	٥,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
١٦٠٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٦٠٧٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحكاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تقدير شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٩٥٩,٥٠	٣,٩١٩	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٥٣٠٤,٤٢	٤,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٤٧٩١,٥٨	٥,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
١٦٠٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٦٠٧٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ إلى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الأعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٩٥٩,٥٠	٣,٩١٩	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٥٣٠٤,٤٢	٤,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٤٧٩١,٥٨	٥,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
١٦٠٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٦٠٧٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات الكميات المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣
تنفذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ١,٠٠٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٦٦٥,٩٦	٢,٩٩١	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٢٥٦,٢٢	٢,٩٩١	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثاني
٥٩٢٢,١٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٩٢٢,١٨	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات الكميات المنقذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
تـنفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٤٦٨	٢,٨٦٤	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٧,١٠	٥,٨٥٥	٢٠	٤٢٧+١٨٠	٤٢٧+١٦٠	القطاع الثاني
١٢٠٢,٨٨	٢,٨٦٤	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
٤٢٧٦,٦٥٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٤٢٧٦,٦٥٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥٠+٦٠٠ الى الكم ٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم

تنفذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٤٦٨	٢,٨٦٤	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٧,١٠	٥,٨٥٥	٢٠	٤٢٧+١٨٠	٤٢٧+١٦٠	القطاع الثاني
٥٦١٣,٨٩	٢,٨٦٤	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
١٠١٩٨,٨٣٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٠١٩٨,٨٣٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الجنوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ إلى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) قيمة الماة المحجيرة

تنفذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٢م

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٤٦٨	٢,٨٦٤	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٧,١٠	٥,٨٥٥	٢٠	٤٢٧+١٨٠	٤٢٧+١٦٠	القطاع الثاني
٥٦١٣,٨٩	٢,٨٦٤	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
١٠١٩٨,٨٣٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٠١٩٨,٨٣٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب ديسد الجيوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٤-٢) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٤٦٨	٢,٨٦٤	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٧,١٠	٥,٨٥٥	٢٠	٤٢٧+١٨٠	٤٢٧+١٦٠	القطاع الثاني
٥٦١٣,٨٩	٢,٨٦٤	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
١٠١٩٨,٨٣٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٠١٩٨,٨٣٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الجنائى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانته عاديه بسمك ١٥ سم

تنفذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠٠٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايمة
	العرض	طول	الى	من	
٥٠٠	٢,٥٠	٢٠٠	٤٢٥+٨٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٥٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٠٠	الاجمالي الكلى (٣م)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هشام مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ إلى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية

تفريذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٢م

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٥,٨٠	٠,٣٠	١٨٦	٤٢٥+٧٨٦	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٥٥,٨٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٥,٨٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هشام مختار

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
ننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة لبنود الأعمال بتاريخ
١٨-١٢-٢٠٢٣ للقطاع الآتي :-

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
١	شركة داربو للمقاولات العامة والانشاءات	٤٢٥+٦٠٠	٤٢٧+٦٠٠	الاتجاهين

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه



مشروع الخط الكهربي لخط السرعة قطاع (الطين - فوكه)
المقايضة المعدلة بعد المفاوضات بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨ لنموذج الاصل تنفيذ شركة داربو للمقاولات العامة والإنشاءات الإتحاديين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ إلى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١	أعمال الحفر				
١.١	وأكثر المقام، اتصال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عمدا التربة السطحية و تسوية السطح بالآلات الترسية والفرش بدماء الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بتهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند لتحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والتوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لأمور الصقاعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري، وتعليمات المهندس المشرف. وفي حدة زيادة مسافة لكل لتحت الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم صلاب ٨٠ جنيه لكل متر زيادة	م	٧٦٤٥٤,٣١	٧٠	١٥٢٩٠,٨٦,٢٠
	الكمية المعلقة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢				
	الكمية المعلقة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢				
	الكمية المعلقة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢				
٢	أعمال الإزالة والتطهير				
٢.١	بأكثر المسطح اصلي تطهير الموقع من الاشجار والنباتات والمخلفات في مناطق الدفلة ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب الرسمية تمهيدا لاصول الرقع المساحي للحدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٦٠,٠٠٠	٥	٣٠٠,٠٠٠
٣	أعمال الرعي				
١.٢	بأكثر المقام، اتصال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتجهيزها باستخدام آلات الترسية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملمس ٢ متر ويسمى لا يزيد عن ٢٥ سم لتحميل المنسوب التصميمي لتكوين الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كثرافورزا لا تقل عن ٩٥٪) ورشها بدماء الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وقدمك الجود بتهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التتمة طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لأمور الصقاعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. على حدة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الترمك عن ٩٥٪ حسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الترمك لكل ١٪ مسافة لتقلل حتى ٢ كم و يتم احتساب بخلاف ١,٥ جنيه لكل متر زيادة - تسعر يشمل قيمة المادة العمورية	م	٥٢٨٢١,٤٠	٨٥	٤,٤٨٩,٨١٩
	الكمية المعلقة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢				
	الكمية المعلقة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢				
	الكمية المعلقة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢				
	الكمية المعلقة خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢				
	الكمية المعلقة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢				
	الكمية المعلقة خلال شهر يناير ٢٠٢٣				
	حالة مسافة خلال ١٥١ كم				
	حالة تحميل رسوم الكثرة والمولين طبقا لائحة شركة الرقمية				

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني قياض

مدير مشروع (الهيئة)

م / السيد محمد حجازي

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / هاشم مختار



مشروع القطر الكهربى لخط السرعة قطاع (الطنين - قوكة)
المقايسة المعدلة بعد المفاوضات بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لتبوء الاصل تنفيذ شركة داربو للمقاولات العامة و الإنشاءات الإحبابين
القطاع من المطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	المدة	الإجمالي
1	طبقات الأساس				
1-1	بأشتر المكعب أصل توريد وفرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المقترجة نتاج تكسير كتسرات و المطابقة للمواصفات والقسي حجم الحبيبات ١٠٠ مم و لا يزيد نسبة النمار من مثقل ١٠٠ عن ١١ % و التخرج الوراء بالاشترطت الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و لا تزيد نسبة القلج بجهاز لوس البنوس عن ٣٠ % و لا يزيد الانكسار عن ١٠ % و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من درجة لوح التصلب عن ٨٠ بجهاز سكي و يتم فردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الصلبة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشا ودماء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المتكوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قسي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المصغية و اللدة تشمل اجراء التجارب المصغية و الحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصانعة و الرسومات التفصيلية المصعدة و البند بجمع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف مسافة تقال لا تقل عن ١٠ كم و يتم احتساب كلوة ١,٣ جولة لكل ١ كم بزيادة في التفتن	م ^٣			
	كثمية المقلدة خلال شهر مارس ٢٠٢٣		٩٢٧٦,٣٨	١٤٣,٣	١,٣٢٩,٣٠٥
	كثمية المقلدة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣		٩٦٣٦,٨٨	١٤٤,٩	٩٦٦,٦٨٤
	كثمية المقلدة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣		١٦٠,٧٤	١٤٦,٤	٢٣,٥٣٢
	قيمة المادة المصغرية		١٦٠,٧٤	١٦٦	٢,٥٨٧,٩١٤
	علاوة مسافة تقال ١٧٠ كم		١٦٠,٧٤	١٩٥	٣,١٣٤,٤٣٠
	علاوة تصويل رسوم الكارة و الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية		١٦٠,٧٤	٢٥	٤٠١,٨٥٥
1-2	بأشتر المكعب أصل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترجة نتاج تكسير كتسرات و المطابقة للمواصفات والقسي حجم الحبيبات ما بين ٣٧,٥ مم الى ١٠٠ مم و لا يزيد نسبة النمار من مثقل ٢٠٠ عن ٥ % و التخرج الوراء بالاشترطت الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من درجة لوح التصلب عن ١٢٠ ميماسقل و لا يزيد نسبة القلج بجهاز لوس البنوس عن ٣٠ % و لا يزيد الانكسار عن ١٥ % و يتم فردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الصلبة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشا ودماء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المتكوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قسي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المصغية و اللدة تشمل اجراء التجارب المصغية و الحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصانعة و الرسومات التفصيلية المصعدة و البند بجمع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف مسافة تقال لا تقل عن ١٠ كم و يتم احتساب كلوة ١,٣ جولة لكل ١ كم بزيادة	م ^٣			
	كثمية المقلدة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣		٩٢٧٦,٦٥٤	١٥١,٣	١,٤٧٠,٥٥٨
	كثمية المقلدة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣		١٦٠,٨٢٤	١٧٥,٠	١,٧٨٤,٧٨٦
	قيمة المادة المصغرية		١٦٠,٨٢٤	١٩٥	١,٩٨٨,٧٧٣
	علاوة مسافة تقال ١٧٠ كم		١٦٠,٨٢٤	٢٥	٢٥٤,٩٧١
	علاوة تصويل رسوم الكارة و الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية		١٦٠,٨٢٤	٢٥	٢٥٤,٩٧١


مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني قواض

مدير مشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الصناوي

مدير المشروع الاستشاري



مدير المشروع المقاول



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (الطين - فوكة)
المقايضة المعلقة بعد المفاوضات بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لتبني الاعمال لتنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات الاتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملي
١-٥	القطارات الكهربائية والمقر المسطح اتصال توريد وصب خرسانة عاتية سمك ١٥ سم لحماية الأثاث والممول الجانبية تتكون من ٣٠٠,٨ من فولاديت مكسوخ ٤ ٣٠٠,٨ رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فوير + سيجا) على أن يكون الحرس نظيف ومسحوق والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القوية مع وضع قوالب (بالفاصل) سمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والربط يتمل تجهيز وشحنها بالمسرب القوية الضخمية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة (جهد ٤٠ نال عن ٢٨٠ كجم / سم ٢) وتطهير السطح ومن الفواصل بالبتونمين الدمل والانتارة طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المحددة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم معالجة علوة قرة ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تشمل لكل مسطح (أفقال عن ٥ متر رأسي)	٢م	٥٠٠	٤٥٧	٢٢٨,٥٠٠
٢-٥	الكمية المعلقة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ والمقر المسطح اتصال توريد وصب خرسانة عاتية سمك ١٥ سم لحماية الأثاث والممول الجانبية تتكون من ٣٠٠,٨ من فولاديت مكسوخ ٤ ٣٠٠,٨ رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فوير + سيجا) على أن يكون الحرس نظيف ومسحوق والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القوية مع وضع قوالب (بالفاصل) سمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والربط يتمل تجهيز وشحنها بالمسرب القوية الضخمية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة (جهد ٤٠ نال عن ٢٨٠ كجم / سم ٢) وتطهير السطح ومن الفواصل بالبتونمين الدمل والانتارة طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المحددة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٥,٨٠	٢٦٦,٢٠	١٤٨,٧١٨
	الاجملي				١٠٣,٧٨٧,٤٥٦

(مائة وثلاثة مليون وسبع مائة وسبع وثلاثون ألف وأربع مائة وستة وخمسون جنيه فقط لا غير)

مدير مشروع (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجدي

مدير المشروع المقاول

م/ هاشم مختار

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندسين /
"هاني محمد محمود طه"





محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين مطروح)
(قطاع العلمين فوكة) فى المسافة من كم ٦٠٠ + ٢٥٥ الى الكم ٦٠٠ + ٢٧٤ بطول ٢ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/١٨ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلوانى مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوى مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٣- السيد المهندس / شريف الهوارى مدير مشروع - شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية فى التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ هو تاريخ استلام الموقع وبداية الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣-
٢-
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاستشارية

مهندس

هاني محمد

مشروع القطر السريع (الطين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات من المحطة ٦٠٠+٢٥ إلى المحطة ٦٠٠+٢٧

محضر تحديد مسافة نقل سن

(نقل سن)

انه في يوم الاثنين الموافق :- ٢٠٢٣/٢/٢٧

- بناءً على طلب شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات لتحديد مسافة نقل سن من كسارة الراغب

على طريق وادي النطرون للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب (XYZ) |
| ٤- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل مكتب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٥- السيد المهندس / شريف الهواري | ممثل شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات |

احداثي الكسارة : $30^{\circ}39'58.4''N$ $29^{\circ}49'12.7''E$

احداثي منتصف القطاع : $30^{\circ}58'15.05''N$ $28^{\circ}42'22.61''E$

وتبين ان الكسارة على مسافة ١٧٠ كم من منتصف قطاع الشركة

وعلى ذلك تم توقيع،،،

٥- شريف الهواري
٤- كمال نجيب
٣- محمد خليل
٢- مصطفى نجم
١- ابراهيم الحناوي

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات - من المحطة 425+600 الى المحطة 427+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة |
| 4- السيد المهندس / شريف الهواري | مندوب شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات |

وتبين ان المحجر علي مسافة 154 كم من منتصف قطاع شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

احد اثي المحجر N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7 "

احد اثي منتصف القطاع N 30° 58' 15.05" E 28° 42' 22.61 "



وعلي ذلك تم توقيع،،،

4- شريف الهواري

3- محمد خليل

2- مركز استشارات الهندسية
SGAC للمحركات والمخترعات
أ.د. سعد محمد الجبوشي
مشروع القطار السريع

1-



مهلة اضافية واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إسم العملية: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية
ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥.٦٠٠ الى
الكم ٤٢٧.٦٠٠ بطول ٢ كم فى الاتجاهين

إسم الشركة المنفذة: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

عقد العملية رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧)

قيمة التعاقدية: ١٠٣.٧٨٧٤٥٦ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية: ٢٠٢٢/٧/١٨

تاريخ النهو طبقا للتعاقد: ٢٠٢٣/٣/١٧

المطلوب: مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٩/١٧

المبررات:- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذة بشأن مد مدة العملية للأسباب الآتية:-
بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بتدقيق جميع التعاقدات
الجارية تنفيذها لمدة (٦ أشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات
العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة
المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وهى كالتالى:

- عدم توافر المواد الخام
- عدم توافر قطع غيار المعدات

- إعداد مهندس:

مدير عام (صيانة/التنفيذ)

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية:

رأى الإدارة القانونية:

المختبر:

المرزوق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

أوافق ويعتمد ...

مع العملية المدة المفردة من مجلس الوزراء
مع عدم تحصيل مقابل تأخير من الشركة
لعدم توافر مناظرة ذلك P.O. / ساءد
١٥ أكت ٢٠٢٣

التوقيع
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

1386040

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

موجده هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المشروع عليها بمادة القانون) والمستأجر الوارد اسمه بعمول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وعلائقها بهذه الوثيقة
بمقابل تمديد اصدار الاصدار الذي سبق بعمول وإصدار الوثيقة بموعد المشترك على التمسير والاستمرار التي تمتعت بسب تحقق أي من الاخطار المتعلقات الواردة بالوثيقة وذلك خلال السنة
للمدة هذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والإجراءات الواردة بهذه الوثيقة

معلومات الوثيقة

رقم الوثيقة	3689/2024	تاريخ الوثيقة رقم	2193/2023
اسم الشركة (المستأجر)	شركة دار الجبال للمباني العامة والاسواق	الخط	
المسجل	الإسماعيلية - مركز النيل الكبير - مدينة السلام	تاريخ الوثيقة رقم	
اسم المهندس	الهيئة العامة للطرق والكباري	تاريخ الوثيقة رقم	
اسم العميل	أهلاً على عمار رقم (37 / 2022 / 7023) استكمال تنفيذ أعمال البصر الترابي بمشروعات المشروع ضمن مشروع إنشاء المطار الكبري السويح (المنطقة - العاصمة الإدارية - الملقين - مطروح) لتحت المسافة من الكم 425+600 إلى الكم 427+600 بطول 2 كم (الانجاز)	تاريخ الوثيقة رقم	
موقع العمل	مشروع إنشاء المطار الكبري السويح (المنطقة - العاصمة الإدارية - الملقين - مطروح)	تاريخ الوثيقة رقم	
اسم المهندس		تاريخ الوثيقة رقم	
تاريخ الاصدار	جدا بالتأمين في	تاريخ الوثيقة رقم	2024/09/21
تاريخ الاصدار	ويشمل في	تاريخ الوثيقة رقم	2025/09/20
تاريخ الاصدار	تأمين	تاريخ الوثيقة رقم	
تاريخ الاصدار	وتشمل في	تاريخ الوثيقة رقم	
مبلغ التأمين	103,787,456.00	تاريخ الوثيقة رقم	
نظام الدفع	الاحصاء الشهرية	تاريخ الوثيقة رقم	
نظام الدفع	المسئولية المتدفع قبل الجهر	تاريخ الوثيقة رقم	

تحت مفعول وثائقه جاري وسلسلة وسبعة وتمتلكها وأعمالها وسائر حصيلتها بمصر



تاريخ الوثيقة رقم 16/09/2024
اسم المستأجر جاني عارف
كود المنتج 36897
مستطفي محمد مصطفى

Head Office
Mohandeseen Branch
Nase City Branch
Alexandria Branch
Shouja Branch
El Mansouria Branch
Port said Branch
Ismailia Branch
Port said Branch
Damietta Branch

25 Menoufia st. (Dokki) - Giza
30 Ward of 14-1st, Mohandeseen - Giza
El Khasa El Khasa st. - Nase City - Giza
58 Fouad st. (El Khasa Road) - Alexandria
50 Fawzy Muz Street - Smouha - El Gharbiyeh
Awad Alla Building 2, El Gharbiyeh - El Mansouria
1000 2/A, Al Mansouria and Mohamed Salah Street - East Side - El Mansouria
Shouja Street - Port Said - Port Said
El Mansouria Street - Port Said
El Mansouria Street - Port Said
El Mansouria Street - Port Said

19685

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الوثيقة التأمينية هي وثيقة تأمينية صادرة عن شركة وثاق للتأمين التكافلي (المشروع عليها بمادة القانون) والمستأجر الوارد اسمه بعمول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وعلائقها بهذه الوثيقة
بمقابل تمديد اصدار الاصدار الذي سبق بعمول وإصدار الوثيقة بموعد المشترك على التمسير والاستمرار التي تمتعت بسب تحقق أي من الاخطار المتعلقات الواردة بالوثيقة وذلك خلال السنة
للمدة هذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والإجراءات الواردة بهذه الوثيقة

القسم الأول: المصراع الثاني

صافي خالص الفائض للتقويم الاول = 103,787,456.00

(2) حدود التعويض لكي تكون حافلة لا تخلو من العوائد الناشئة عن القفلة وأصلها.

742

تاريخ النشر: 2024
الطبعة: الأولى



Head Office	25 Macdonell St., Gokki - Giza
Motahedeen Branch	20 Wardi St. No. 2, Mahandess - El-Dokki
New City Branch	6 Abbas El Agha St., Near City - Cairo
Alexandria Branch	44 Fouad St., El Heli Pasha - Alexandria
Souhail Branch	20 Tawfiq Mazhar St., Giza Station - Giza
El Mansouria Branch	Arrest Alley Building 2, El Gish St., El Mansouria
Port Said Branch	Block 2, El Mansouria - El Mahmoudiyya - Port Said
Ismaïlia Branch	El-Nasr St., Andalous Tower - Front of Financial Directorate
Port Said Branch	General Abdul Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharmia Synagogue
Samietta Branch	Cairo St., El Nile Fourth Section, Corner El Alili Bulevard, above El Tech and Nala Bank

19685

[illegible]

تاريخ جدول وثيقة التأمين: جميع الخطوط المتولين رقم: 2689/2024
لوثيقة رقم: 2193/2023

ج.م	10,746.00	الإشراف العام
ج.م	591.03	مكتب البيع الفنية
ج.م	26.10	لشركة للتجارة
ج.م	100.16	مكتب استشاري
ج.م	64.48	مكتب الإشراف و الإدارة / حقة في الألف
ج.م	21.49	مكتب استشاري حقة في الألف
ج.م	10.75	مكتب استشاري حقة في الألف
ج.م	11,560.00	الإشراف العام

يعتقد المراجع التالفة والمدمرة فيتم إيلس (الرفقة جو) أ لا يشعر، من هذا أو ...

وَقَدْ وَفَّقَ الْفَتَاوَى الْحَقَّ إِلَى مَقَرِّهِ

7.4

16/09/2024
 16/09/2024



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.

Head Office	25 Kasrah St., Dokki - Giza	www.wohni-egypt.com	E: info@wohni-egypt.com
Mohandessin Branch	20 Ward of Nile St., Mohandessin - Giza		
Nasr City Branch	20 Abbas El-Khalil St., Nasr City - Giza		
Al-Nasr City Branch	58 Farafra St., El-Farafra - Al-Nasr City		
El-Maadia Branch	90 Farafra St., El-Maadia - Giza		
El-Maadia Branch	Awam Al-Bulatan St., El-Ghali St., El-Maadia		
Port Said Branch	Block 3, Al-Maadia St., Port Said - Giza		
El-Maadia Branch	Shed 1, Sh. Al-Maadia - Port Said		
Port Said Branch	Central Abdel-Hakim St., Agricultural Society Building, Port Said		
El-Maadia Branch	Central El-Maadia St., El-Maadia - Port Said		

www.wednet.org/pl.com Enr.allworth@pl-wednet.org www.fishbase.org/country/usa

19685

[illegible]

1386043

تاريخ جواز وثيقة تأمين جميع أخطر المقاولين رقم : 2689/2024 تجديد لوثيقة رقم 2193/2023

الشروط والتغطيات

يعد موضوع الوثاق الخفية سافى ملكة ثابتة وحلقة - في جلة استجابته في أعمال الخرسانية بعدة عن السنى أو العنبر بمساحة كافية تحت الإحتفاظ - مظهر، تقوية الجير في الموقع وإن تكون حفر، للاستعمال القوي و - مساحته للاستخدام - مظهر، بعد ذلك من العمل بترتيب كاملاً على استخدام المعدات وشتر مظهرهم بالستور للتدخل القوي تحت تسيب استخدام معدات التحريك والمزج في الأماكن الضيقة أو التي يكون بها مواد خفيفة للاستعمال من المظهر العنق - على لا تشرى بغطية حقل المظهر - أو السرفه بالأفراء - على العدد والتشويكات والموس عليها إلا داخل المخازن فستور بالاعتماد السلع على الفقراء أو افراد الامن المكثف - كما أنه

يشتري مظهرين جوادة مسلحة بمساحة الماحة طول ال 34 ساحة على المخازن والا يقطع حق المظهر في التعويض من المظهر، التحليل عليه - بعد على السرفه الماحة كوثية جيل أخطر المظهر في ان الوثيقة تغطي أخطر الخرق والسطو - هذا الملاح - على استمره سلة على كذا شروط الوسعة والستاد، انه بعناية للثبات من الجاهي بالمحافظة التقنية قبل سادها الذي يعتبر قولاً سادها كذا شروط والاشتراطات - ان في حالة وقوع حادث تعيق هذه الوثيقة منع كافة التعويضات المسجلة للملاح البنية العامة للقوق والكاري - كما لا يجوز - افراد ال تعيق أو تحجب أو العاء على هذه الوثيقة إلا بعد اذ موافقة كتابية من الهيئة العامة لتتلق الكاري - استثناء العند المباني و دار هاب والتخريب والشعب والأضرابات الاخوية والأضرابات العمالية والاختبار الطبيعية استثناء الممتلكات القديمة والمحيطه بالمشروع وإزالة النقص والحطام استثناء كبر ومن كور ودا (مرفق) استثناء الأخر من السحبه (مرفق) المرفق

لا يعد الوثيقة تنوي بحدود الاستمحة النوع "UR-100"

ملحق رقم 009 استثناء العورة والمزور أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)

ملحق رقم 010 استثناء العورة والمزور أو المسؤولية الناتجة عن تفتيش أو غير الجلاء (مرفق)

ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الترياح المسببة بالمياه (مرفق)

ملحق رقم 106 استثناء من الحسب بالوثاق الأصل المصد (مرفق)

ملحق رقم 112 شروط حاسبه عند خلق بوسائل مكافحة الحريق والاسار من الحريق في مواقع التنبه (مرفق)



4 من 7

تاريخ اصدار : 16/09/2024
لدى المستلم : مدير المنطقة

Head Office : 75 Monasheh St., Giza - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandessen - Giza
Near City Branch : 6 Abbasi El Aspi St., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
Sidi Barrani Branch : 90 Fawziya St. - Sidi Barrani - Matruh
El Mansouria Branch : Ayat Alla Building 2, El Gharb St., El Mansouria
Port Said Branch : Dokki A, El Mansouria and Wadi el Sedq Street - Port Said
Ismailia Branch : Sokh El Sedq and El Sedq - Front of Financial Directorate
Port Said Branch : El Mansouria Street - Agricultural Society Building - Port Said
Damietta Branch : El Mansouria Street - El Mansouria Building - Port Said



www.wethaq-egypt.com | E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com | www.facebook.com/wethaq

الفرع الرئيسي : 75 شارع مناشي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباسي - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد - الإسكندرية
فرع سيدي براني : 90 فوزي - سيدي براني - مطروح
فرع المنصورة : 2 شارع غربي - المنصورة
فرع بورسعيد : 88 شارع فؤاد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 90 فوزي - الإسماعيلية
فرع الدقهلية : 88 شارع فؤاد - الدقهلية
فرع الزقازيق : 88 شارع فؤاد - الزقازيق
فرع دمياط : 88 شارع فؤاد - دمياط

المسألة الأولى

⁷ بعد التوقيع العامة المتعددة من الهيئة العامة للأوقاف المالية لوثيقة دعمه النظام القانوني والمالي، والدخول في حالة الإفلاس.

* البرقة البيضاء في تونس الكبرى

هذه المطالبات بالتعويض على حال من أي صدد وقع تحت أو تحت من

(COVID-19) = 125, 000 (3)

المعروف باسم فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2).

تتمثل أهمية هذا البحث في أنه يسلط الضوء على دور كوفيد-19 في تعزيز الممارسات الجيدة في التعليم الإلكتروني، مما يمكن المؤسسات التعليمية من الاستفادة من هذه الممارسات في المستقبل.

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا بَيْنَ أَيْمَانِهِ هَذِهِ وَأَيْمَانِ ذُو الْأُنْثَىٰ هَذِهِ ۚ

$$A_{\text{eff}} = \frac{A}{1 + \frac{A}{A_0}} \quad (1)$$

من المبادئ والاسبق عليه أنه يفتقر النظر عن أي من الشروط الاستثنائية والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه النوعية أو أي من مصادرها، فله يستثنى كتابة الخصائر والإصرار وقصد الإيذاء أو عند الإيذاء الطارئ والتكاليف المتعلقة بالنتيجة بشرط ما أو بشكل غير عائل من نفسية عوي أو الأمر ليس المستعجيه بمذفي تلك الحالات التلوث أو أو أعمال التضيير أو أو اصداء كسود أو في قرارات صادرة من سلطات قضائية فيما يتعلق بالإغلاق أو أو التقدير أو منع الوصول عند التعامل مع نفسية هذه الأمور المعنية.

* المقصود من (1) ليس التمسك بالصور أو المسؤولية الناتجة عن الإزالة

(في حالة الإخلال بالشروط والاستحداث والاحكام والشرايط المتضمنة في التوقيع أو الملحقة بها، فإن الشركة ليست مسؤولة عن توفير الخدمات أو الصيانة أو التصرفات المباشرة أو غير المباشرة النشئة من الوثيقة على الإطلاق)

٦. ملحق: (أ) الملحق الخميرة أو الصور أو الصلابة النشطة عن الفحص أو غير ذلك

من المبرور عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والآثار نصت السطور على الوثيقة أو السجلات
بما لا يترتب عنه حقوق عن تعويض الممتلكات أو التلف أو المصروفات المعتبرة أو غير المعتبرة المنسوبة عن
أو المبرور عليه نصت أو نصت عليه.

[illegible]

من الجود والكرم في الخلق أو الثقل أو المسألة الباردة أو غير المناسبات الثلاثة

من أجل ذلك، فإنَّنا نرى أنَّه لا بدَّ من أنْ تكونَ هذه المبادئ الثلاثة هي الأساسُ الذي تُبنى عليه كلُّ سياسةٍ اقتصاديةٍ سليمةٍ، وأنَّها هي التي تُؤمِّنُ لنا مستقبلَنا الاقتصاديَّ، وأنَّها هي التي تُؤمِّنُ لنا مستقبلَنا الاجتماعيَّ، وأنَّها هي التي تُؤمِّنُ لنا مستقبلَنا الثقافيَّ، وأنَّها هي التي تُؤمِّنُ لنا مستقبلَنا السياسيَّ، وأنَّها هي التي تُؤمِّنُ لنا مستقبلَنا الوطنيَّ، وأنَّها هي التي تُؤمِّنُ لنا مستقبلَنا العالميَّ.

* لا يجوز منعه من العمل بطواله الاقسام المجدة

في التعمد، إضافة إلى ذلك، ومع عدم الاعتناء بالشروط والإجراءات، لا يتبين أن المصير الطبيعي للوثيقة أو الملحق بها، في التعمد، يقوم على أساس التسليم على أن تلك هي أفعال أو مسئولية أحدثت بمقتضى أو غير مسئولة للحيثيات والقوانين، حيث أن التسليم والمصارف والمصارف والمصارف.

هذا النص هو نص (250) من وحدة النص 3 القادم من العنبر، في النص الوحد

المادة ١٤ - لا يجوز للمالك أن يبيع أو يعرض للبيع أو يتبرع بملكه في نواحي التلصيص

شركة وسائل التعليم - مصر

748

16/09/2024 22:50

أحمد المصطفى علي عفيف

[illegible]

www.wednet.org E-mail: wednet@wednet.org www.facebook.com/wednet

19685

[illegible]

1386045

تاريخ وثيقة التأمين 2689/2024 تاريخ الوثيقة رقم 2193/2023

انه من الظاهر والمتفق عليه ومع هذه الاعمال والتسويات والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو السعة بها وحدها ذلك
في الشرعة بكونها تلتزم بالتسوية المستوفى عن العبرة أو التلف المنسوب بصحة حادثة الحريق أو الانفجار وذلك فقط بشرط ما يلي :-

- 1- ان يكون هناك تلف في الممتلكات المغطاة في جميع الاوقات مع تقيد العمل
- 2- ان يكون هناك خسارة مادية حريق ظاهر في وسع التغطية الكسب بموجب حتى المستوى الاقل مماثله من المستوى الحريق العمل به وان يكون مغطى بالقيمة
بوقت
- 3- ان يحدد المصنف المصنف على كرات هرايم الحريق ويحدد الحريق المبوية على تفرات منطقة وما لا يقل عن مرقع كل مرقع
- 4- ان يحدد كبر الخسائر مع تفرات الحريق المبوية وفقا لائحة المنطقة ما يمكن بعد ازالة التبعات المستخدمة في الانشاء
- 5- ان لا حد العمل الموقت لفترات العمل المباشرة ، التبعات والخدمات وان هو تفرات الحريق ما يمكن وما لا يحاذر التبعات في العمل المجهز
- 6- ان يحدد الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 7- ان يحدد المصنف المصنف على اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- تغطية الحريق - التغطية
- اعتماد احدث النظم المصرية في التغطية
- اعتماد التغطية المصنف
- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 8- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 9- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 10- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 11- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 12- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 13- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 14- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 15- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 16- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل
- 17- ان لا يكون هناك خسارة في الممتلكات المغطاة في اية الممتلكات الثلاثة للتعامل من جميع الادوار التي يتفرع عنها وذلك في نهاية كل يوم عمل

حد كبر الخسائر 125.000 حد



6 من 7

16/09/2024

عفي عطفه



Head Office: 25 Mersa Matruh St., Giza - Egypt
 Mohandeseen Branch: 25 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 Naser City Branch: 6 Abbasi El Agha St., Naser City - Cairo
 Alexandria Branch: 111 Fouad St., El Horra Road - Alexandria
 Sidi Barrani Branch: 90 Fouad St., Sidi Barrani - Sidi Barrani
 El Mansoura Branch: 100 Fouad St., El Mansoura - El Mansoura
 Port Said Branch: 100 Fouad St., Port Said - Port Said
 Ismailia Branch: 100 Fouad St., Ismailia - Ismailia
 Port Said Branch: 100 Fouad St., Port Said - Port Said
 Damietta Branch: 100 Fouad St., Damietta - Damietta

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

الفرع الرئيسي: 25 شارع مرسى مطروح - الجيزة
 فرع المحندسين: 25 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر: 6 شارع عباسي - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية: 111 شارع فؤاد - الإسكندرية
 فرع سيدي براني: 90 شارع فؤاد - سيدي براني
 فرع المنصورة: 100 شارع فؤاد - المنصورة
 فرع بورسعيد: 100 شارع فؤاد - بورسعيد
 فرع إسماعيلية: 100 شارع فؤاد - إسماعيلية
 فرع الدقهلية: 100 شارع فؤاد - الدقهلية
 فرع البحيرة: 100 شارع فؤاد - البحيرة
 فرع شبراخيت: 100 شارع فؤاد - شبراخيت
 فرع دمياط: 100 شارع فؤاد - دمياط

1386046

تجديد أول

نوع التأمين : التأمين التكملي

نوع التأمين : جمع حصر الموقوفين

تاريخ رقم : 2689/2024

ملحق رقم : 2689/2024

الفرع : المركز الرئيسي

اسم الممول : شركة اربو للمقاولات العامة والانشاءات

العمول : التأمين - مركز الشئ الكبير - منشية السلام

المبلغ : لهذه العانة بطرق والكبرى

تاريخ التوقيع : 21/09/2024

التاريخ : 20/09/2025


العملة : ج.م

مبلغ التأمين : 103.787.456.00

تحت مائة وثلاثة ملايين وسبع مائة وثمانون ألف واربعمائة وستة وخمسون جنيه مصر

م	10,746.00	:	الاشتراك
م	591.03	:	صافي التبعة للتبعية
م	100.16	:	مصاريف الاصدار
م	26.10	:	العمولة المئوية
م	64.48	:	نسبة الاعتراف و الرقابة مئة في الالف
م	21.49	:	التركيب صندوق جعلة الوثائق / ائتمان في الالف
م	10.75	:	معدل خصم مراجعة واعتماد : واحد في الالف
م	11,560.00	:	المحالي الاشتراك

(تحت احد عشر الفا وخمسة وستون جنيه مصري)



تاريخ اصدار : 16/09/2024

اسم المستلم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

5 % 537.30

قيمة الضوابط الاسلامية قبل الاستقطاعات



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Al-Nasr St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi El-Nasr, Mohandeseen - Giza
 Nasr City Branch : 15 Al-Nasr St., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 10 El-Fouad St., (El-Nasr Road) - Alexandria
 Sinaia Branch : 90 Farafra St., El-Dokki Station Next
 El-Mahout Branch : 100 El-Nasr St., El-Mahout
 Port Said Branch : 100 El-Nasr St., Port Said
 Damietta Branch : 100 El-Nasr St., Damietta

البريد الإلكتروني : 25 شارع النصر - الدقي - الجيزة
 فرع المحندeseen : 20 وادي النصر - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 15 شارع النصر - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الاسكندرية : 10 شارع الفؤاد (الشارع الجديد) - الاسكندرية
 فرع سيناء : 90 شارع فارافرا - سيناء
 فرع الماهوت : 100 شارع النصر - الماهوت
 فرع بورسعيد : 100 شارع النصر - بورسعيد
 فرع الدقهية : 100 شارع النصر - الدقهية
 فرع دمياط : 100 شارع النصر - دمياط

السادة / الهيئة العامة للحرق والكبارى

الحياة الطبيعية وبعد

تتمتع بالإحاطة بأن الوثيقة رقم 2024/2689 جميع أخطار المقاولين، باسم: شركة داريو للمحولات العامة والإنشاءات، والقبض
الإجمالي مبلغ 11,560.00 جنيه مصري فقط أحد عشر ألفاً وخمسة مئة وثمانون جنيه مصري، والمعقد بها لتأمين أصل الحكم عن
الفترة من 21/09/2024 إلى 20/09/2025 حالية المفعول عن الفترة المشار إليها أعلاه، وتم السداد بإيداع بلانيتك وتم التحصيل بحساب
الشركة

وَقَضُوا إِلَيْكُمْ قُيُوتَكُمْ وَأَقْرَبُوا إِلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

23697

2024/09/17

2

— *Journal of the American Medical Association*

1999

100

Figure 1

4000





وثاق التأمين التكافلي - مصر
Weibay Takaful Insurance - Egypt

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance-related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA

You can also visit the head office or any of our branches. Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com
- Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.
- Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

"عميلنا العزيز"

حرصاً على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة عن وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتساب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم
والفصل بالهيئة العامة لمراقبة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علماً بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات غير المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا نرسل لعملائنا أي روابط إلكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على .

- الخط الساخن: 19685
البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com
يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية
غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.
، احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات
المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات
للشركة

الشركة العامة للتأمينات البحرية والبرية

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

الإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المدقولين رقم 2689 بالاسم وأصالح الهيئة العامة للصرف والكمالي عن المدة من 2024/09/21 إلى 20/09/2025 بإجمالي مبلغ مالي 103787450 جنيه مصري يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المستوصف عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة

الممتلكات الحقيقية / السوفية موضوع التأمين حيث أن وكيال التأمين يتضمن شرط التغطية.
كما نلاحظ على ما ذكره من التعريفات المتداخلة والمبسطة في التعريفات الاقتصادية الكلية والتي لها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها
توجه عام سيلاحظ أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها مما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المأخوذ من القيمة في
الوقت أو أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوفية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إقتدار بفتحكم في زيادة مبلغ التأمين لتتناسب
مع القيمة الحقيقية / السوفية للممتلكات

تَعْرِيفُ شَرْطِ التَّيَمُّنَةِ

هو أن لا يقتضي دفعه أن كانت قيمة الممتلكات الموزعة عليها عند وقوع القطر الموزع منه أقوى المبلغ الموزع به بغض الممتلك / المستفيد
بمالية موزع لدى إقترعه بالفرد بين التوزيع ويحتمل تبعاً لذلك تصنيفه من الخصخصة أو في حالة الخصخصة الكلية (الانفصال التام) فإن الشركة
تدفع ويقتضي أيضاً أن تكون التوزيعات المتضمنة عليه بوثيقة القاموس أو التهمة الوثيقة فيما قل

وَنُحَلِّقُ بِقَبُولِ فَائِزِ الْأَحْزَامِ وَالتَّقْدِيرِ



د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والنتيجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، انصداء أو التآكسد، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمكينات والآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي، قصور أو كسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

ح) الخسائر والتلفيات للعلقات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول:

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب الأتقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:

بالنسبة للبند (١):

إجمالي قيمة عقد المعاولة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبندين (٢ ، ٣):

القيمة الاستبدالية للمعدات وسهلات والآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع وسعة الصنع ونفس الكفاءة.

ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات تقلبات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعركة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التحويل وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصاً قيمة المخلفات.

(ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصاً قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون المشترك قد أتفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالمعاد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نجت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات متطوياً أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأسس أعلاه في (ب).

وتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المحتملة إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تعطى هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تعطى الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل المربح بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني: المسئولية المدنية قبل الغير:

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبعد أقصى المبالغ المحددة بحصول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسئولاً عن دفعها قانوناً تعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتسييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

(أ) الإصابات الحسائية أو الأمراض (سواء أنت إلى الوفاة أم لا).

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بملمتلكات الغير.

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يسببها طالب التعويض من المشترك.

الاستثمارات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حصة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي :-

- تغطية العجز من احتياطي حيلة الوثائق إن وجد.
- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز ومداؤه من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويؤوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز مئته ٥٠% من رأس المال المنفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ١٥% للعام الثاني، ١٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

- توزيع الفائض التأسيسي: يتم توزيع الفائض التأسيسي والخاص بحيلة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة أشر اكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لتطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

- اجر الصارفة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتقدضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠% من الفائض التأسيسي

- هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلى مصر كل من:-

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة

٢- محبلة الشيخ / حاك عبد المحسن الحنڤى عضو اللجنة

٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محبت عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠

- موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلى

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأمين والنظام الاساسى للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن الجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

جدول ٤: ثقة تامين الحوادث الشخصية

Figure 2

Quercus laevis

—

© Copyright 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

Figure 1

Journal of Management Inquiry 18(1)

منار لکھنؤ

هذا هو المصنف المسمى بـ

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

الحمد لله الذي جعل في هذه العجالة من العجالات ما لا يحصى (بسم الله الرحمن الرحيم) -



2000

المؤلفون

17. 2000

WWW.WORLDNET-USA.COM

Exponential functions of the form $y = a^x$

www.fishbase.org

[illegible]

19685

[illegible]

Journal of Management Inquiry 22(1)

—

- استثناء الأخطار السالبة
- استثناء غير وبن كوروا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

2 من 4

عبد الله بن عبد الله	23597	عبد الله بن عبد الله
----------------------	-------	----------------------

[illegible]

19685

[illegible]

Answer:

مراجعة وثيقة تأمين العوائل الصحية رقم 4002/2024

1386049

نوع استثناء الأمراض المعدية

من العلوم والمفاهيم عليه انه يحضر النظر عن أي من الشروط والامتيازات والاحكام والاستراتيجيات المخصوص عليها في هذه الزاوية او أي من ملاحظته ، فانه يستلزم كافة الخبرات والاصرار وفهم الايراد و/أو فهم الايراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الصحة بشكل مبسوط أو مبسط عن معاصر من نقض عوي و/أو أمراض المنعوية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم او أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالإغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نفس هذه الامراض المنعوية .

مرکز استانی هیئت ورزش کوروش

هذا التامس لا يعطى إلا طالباً بالتعويض بأي حال من أي صرر وقع سبب أو نتج عن

(COVID-19) ۱۱

(س) جدوى كورونا المرتبط بالسلالة النمطية الحادة الشبيهة النوع (SARS-CoV-2)

ج) أي مخيمات أو مخيمات أو ملائمة تتشابه فيروس كورونا المستجد (التفصيلية الحالة الشبيهة النوع (SARS-CoV-2)

(١) أي حصار مالي ينتج خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه.

16/05/2024

Year	U.S. has a right to intervene (%)	U.S. does not have a right to intervene (%)
1980	65	35
1981	68	32
1982	70	30
1983	72	28
1984	74	26
1985	75	25
1986	73	27
1987	75	25
1988	78	22
1989	80	20
1990	82	18
1991	84	16
1992	85	15
1993	86	14
1994	87	13
1995	88	12
1996	89	11
1997	85	15

17/09/2024

References

عبد الله بن عبد الرحمن

1

23697 مصطفى محمد مصطفى

252

453



Hyatt Office 25 West 42nd St., Upper - 34th
 Manhattan Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th
 New York Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th
 Alexandria Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th
 Syracuse Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th
 El Monte Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th
 Port of Spain Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th
 Jamaica Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th
 Port of Spain Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th
 Dominican Branch 25 West 42nd St., Upper - 34th

[illegible]

السلافة / البيئة العامة للطرف والكبارى

الحية طعنة وأبعد

نشرف بالاحاطة على الوثيقة رقم: 2024/4002 الحوائث الشخصية بنسب: شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات والقسط الاجمالي مبلغ: 600.00 جنيه مصري فقط مستأجرة جتية مصري، والمعقود بها التأمين لصالحكم عن الفترة من: 21/09/2024 الى 20/09/2025 مارية للسفوح عن الفترة المشار اليها اعلاه، وتم السداد باليداع بالبنك وتم التحصيل بحساب الشركة ونفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

23697

2024/09/17

تحت إشراف

4



٢٠٢٢
٢٠٢٢



وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance-Egypt

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches. Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com
- Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.
- Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهييكم عن عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة علنا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والتسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com
- يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

- احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة

$$\begin{array}{r} 2.2 \\ \hline 2.22 \end{array}$$


وہابی

وثاق التامين التكافلى - مصر
Wethaq Tahatul Insurance - Egypt

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم إلى الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحق بها،

تتعهد شركة وثق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو لستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا تحققت بالشركة خلال مدة التأمين السببية لهذه الوثيقة أو أية مدة لاحقة يتفق عليها، أية إصابة جسمانية نتيجة حادث نشأ عن عوامل فجائية عارضة طيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدة السببية بجدول الوثيقة.

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

اولا : في حالة الوفاة :

مؤدي الخدمة يمنع التماس المسجل بجدول الوثيقة إلى المستفيدين الواردة بينهم بالتحويل أو على المستفيدين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين، على أنه إذا توخى المستفاد بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستفيدين المشار إليهم فقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقي المستفيدين أو المستفيدين.

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتراك أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كليا مستديما في الحالات الآتية:

- فقد اصغر العفيف نهديا
- فقد السقي او القدمين
- فقد راع وقلم
- فقد به وقلم
- فقد الترابيل او البدين
- فقد راع وساق
- فقد به وساق

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة. ولا يستحق المشترك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً.

ثالثاً : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للتأمين مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

١- الأطراف العليا	نسبة العجز الجزئي		٢- الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي
	الأيمن	الأيسر		
الفقد الكامل للذراع أو اليد	٦٠%	٥٠%	الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة	٥٠%
الفقد الكامل لحركة الكتف	٢٥%	٢٠%	الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة	٤٠%
الفقد الكامل لحركة المرفق	٢٠%	١٥%	النتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	٣٠%
الفقد الكامل لحركة المعصم	٢٠%	١٥%	الفقد الكامل لحركة الحرقة	٣٠%
الفقد الكامل للإبهام و السبابة	٣٠%	٢٥%	الفقد الكامل لحركة الركبة	٣٠%
الفقد الكامل للإبهام والأصبع غير السبابة	٢٥%	٢٠%	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	١٥%
الفقد الكامل للسبابة والأصبع غير الإبهام	٢٠%	١٥%	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	٨%
الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة	٢٥%	٢٠%	٣- الكسور	
الفقد الكامل للإبهام فقط	٢٠%	١٥%	كسر لم يلتحم بالساق	٣٠%
الفقد الكامل للسبابة فقط	١٥%	١٠%	كسر لم يلتحم بالقدم	٢٠%
الفقد الكامل للوسطى فقط	١٠%	٨%	كسر لم يلتحم بالرصعة	٢٠%
الفقد الكامل للبصر فقط	٨%	٧%	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	٢٥%
الفقد الكامل للخنصر فقط	٧%	٦%	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضرار بابت وظيفته	١٠%

المدة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة
مخصوصاً من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة
التأمين على أحد الأقسى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر
بالإضافة إلى المبالغ التي قد نتحقق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن
ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.
ويحق للشركة عندئذ أن توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد،
وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشترك الجزء النسي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن إخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا
البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتتخضع مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك
الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سداده.

البند الخامس : سقوط الحق

يسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

(أ) إذا أُلغى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث
الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلائها بها قبل بدأ
سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة
عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من
ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عجز طلب التعويض ببيانات تدليس أو إذا كان الحادث
مفتعلاً.

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك أن يخبر الشركة في مركزه الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن
أي حادث يقع له، ويجب عليه أيضاً أن يضع نفسه في أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص، وإذا لم تسلم الشركة
الإخطار المذكور خلال سبعة

أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة ما لم يقدم المشترك عنراً مقبولاً للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي
مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو مندوبها المكلف بذلك بفحص المشترك متى رأت الشركة
ضرورة ذلك للتحقق من سدي الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة.

البند السابع : مدة العقد

لا تلزم الشركة بتحديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز بالتعلق الطرفين تحديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويحدد ذلك الشرط الثاني من المقتضى.

البيد الثامن: التقاليد

تخصص الخطبة مع حب هذه الثقة لشروط التقديم اعسالا ينقص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري

البند التاسع: المحاكم المختصة

مثل الممارسات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في أي من الجهات التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط القاسخ

لشركة الموقعة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لتسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، و الا اعتبر العقد مفسوخا فإذا لم يتم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى شركة أخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد . و ذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول . وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند الحادي عشر: شرط الإنهاء

يجوز للشركة التامين بعد انقضاء عشرة ايام من اخطار كل من المشترك والمستفيد (ان وجد) بخطاب موصى عليه يرسل اليهما على اخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التامين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التامين بعد موافقة المستفيد (ان وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التامين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التامينية محل الإلغاء.

جدول العدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
أمدّة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المستقر مشتركاً مع غيره من المستثمرين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمندوب عنها فيما بعد بالمرحلة وتعتبر الشركة من النظام التأمين بصيغة التضامنية وفقاً للاتى:

- تنظر الشركة كل من أعمال التأمين و الأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة تابعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشاركين بشأن استحقاقات هذا الأخير لتسليمه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق .
- تخصص كل من أعمال التأمين و أنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من لوائقي معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والتسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر
- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الضامن إن وجد وذلك بنهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة التراكبهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.
- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسند من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة
- في حالة عدم استثمار أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للتقاعذ والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن
- مفهوم نظام المضاربة: تنظر الشركة كل من أعمال التأمين و الأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة تابعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً .
- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثائق التأمين التكافلي - مصر والمشاركين : يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثائق التأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض عن حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الأقساط المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة
المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة

لاستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

يناير ٢٠٢٣

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة داريو ، إلى المركز الهندسي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بخصوص تحديد مدى صلاحية عينة تربة ممثلة للقطاع من الكم (٦٠٠+٤٢٥) : (٦٠٠+٤٢٧) لإستخدامها في مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين - فوكة) . تم توريد العينة الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالبى التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهرى .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الاختبارات :

العينة:

Brownish yellow , med/coarse silty sand ,pieces of cemented sand, trace pebbles.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبارات التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

نسبة المار من منخل ٧٥"	(%)	93.0%
نسبة المار من منخل رقم 200 (%)	(%)	15.0%

جدول رقم (١)



جامعة الإسكندرية
كلية الهندسة

بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح بالشكل رقم (2) حيث كانت النتائج كما يلي:

2.10	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
8.0	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

٤. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للإحلال:

التصنيف	USCS	SC
	AASHTO	A-1-b
الصلاحية وفقاً لمواصفات المشروع	صالحة	
ملاحظات	العينة صالحة وفقاً لمواصفات المشروع طبقاً لإفادة الإستشاري (سيسترا).	

العينة (صالحة) للإستخدام في المشروع السابق ذكره

مدير المعمل




أ.د. عمرو زكريا الوكيل

13/4/23




مهندس المعمل



م. سمير محمد أبو الحسن



Project	مشروع القطار الكهربائي (العلمين)
Client	شركة داربو
Classification	
425+300	Sieve Analysis (ASTM D-1140)

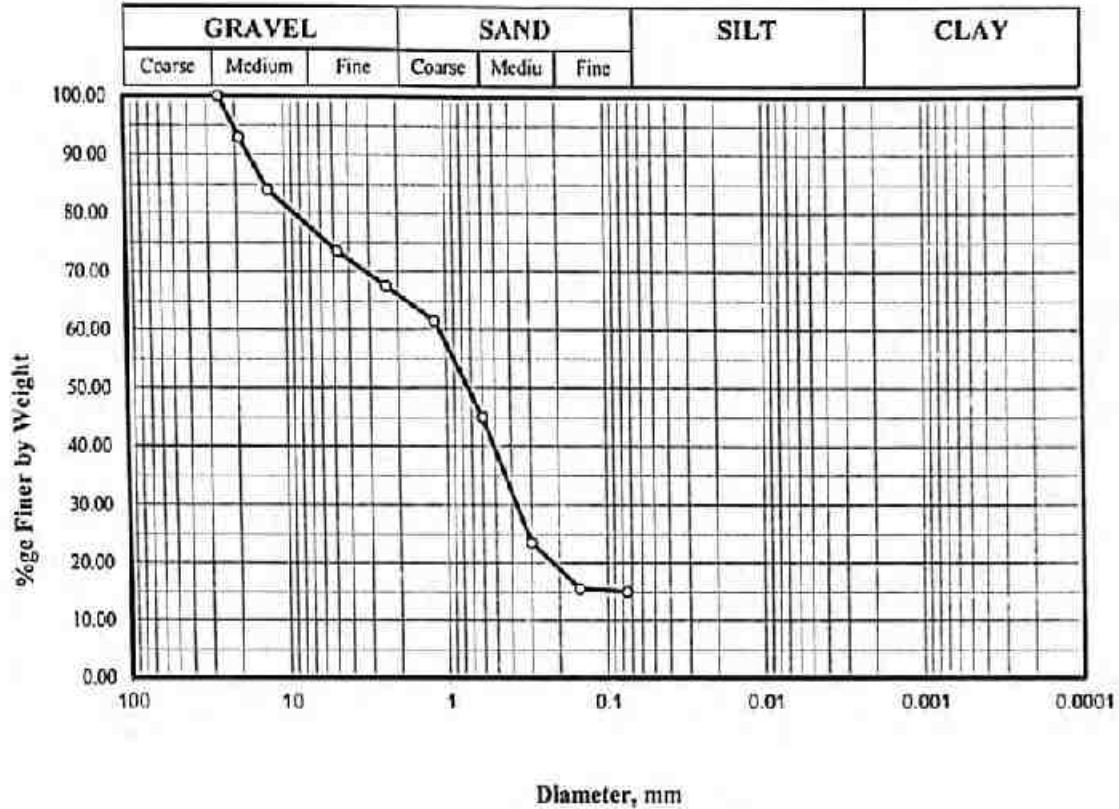

Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
% Finer by weight		100.0	100.0	93.0	84.0	73.5	67.5	61.5	45.0
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063				
% Finer by weight		23.5	15.5	15.0	15.0				
Effective Diameter	N/A	mm							
Uniformity Coefficient	N/A								
Passing sieve no. 200	15.0	%							

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة إنشاء. المعمل غير مسؤول عن كفاءة استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. م. محمد أبو الحسن

Figure 1

مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الاسكندرية




Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (03) 592-5550 Fax (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
شماره تليفون ٥٩٢٠٥٥٥٠ - ٥٩٢٠١٨٥٣ فاكس

Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داريلو
Description	

425+900

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

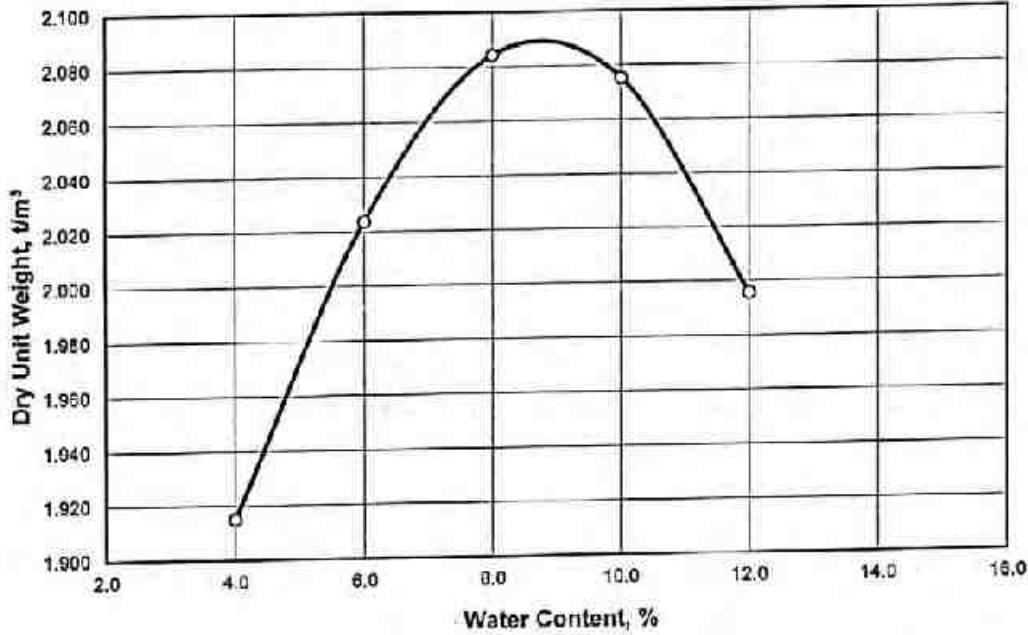

Sample	1	2	3	4	5	6		
Water Content	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	0.0		
Moist Unit Weight, t/m³	1.99	2.15	2.25	2.28	2.24	0.00		
Dry Unit Weight, t/m³	1.91	2.02	2.08	2.08	2.00	0.00		
Percentage of aggregate > 19mm						7.0%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.08	t/m³	
Max Modified Unit weight						2.10	t/m³	
Optimum moisture content						8.00	%	

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة إنشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



جامعة الاسكندرية

كلية الهندسة
المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة

لإستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

يناير ٢٠٢٣

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة داريو ، إلى المركز الهندسي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بخصوص تحديد مدى صلاحية عينة تربة ممثلة للقطاع من الكم (٦٠٠+٤٢٥) : (٦٠٠+٤٢٧) لإستخدامها في مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين - فوكة) . تم توريد العينة الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالى التقرير.

٢. التجارب المعملة:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهري .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الاختبارات :

العينة:

Brownish yellow , pieces of cemented, sand med/coarse silty sand, trace pebbles.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبارات التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

نسبة المار من منخل $\frac{1}{4}$ (%)	81.7%
نسبة المار من منخل رقم 200 (%)	14.0%

جدول رقم (١)



بروتوكول القياس :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح بالشكل رقم (2) حيث كانت النتائج كما يلي:

2.15	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
10.0	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

٤. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للتحليل:

GC	USCS	التصنيف
A-1-b	AASHTO	
صالحة	الصلاحية وفقاً لمواصفات المشروع	
العينة صالحة وفقاً لمواصفات المشروع طبقاً لإفادة الإستشاري (سيسترا).		ملاحظات

العينة (صالحة) للإستخدام في المشروع السابق ذكره

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل


م. سمير محمد أبو الحسن





Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داربو
Classification	

425+400

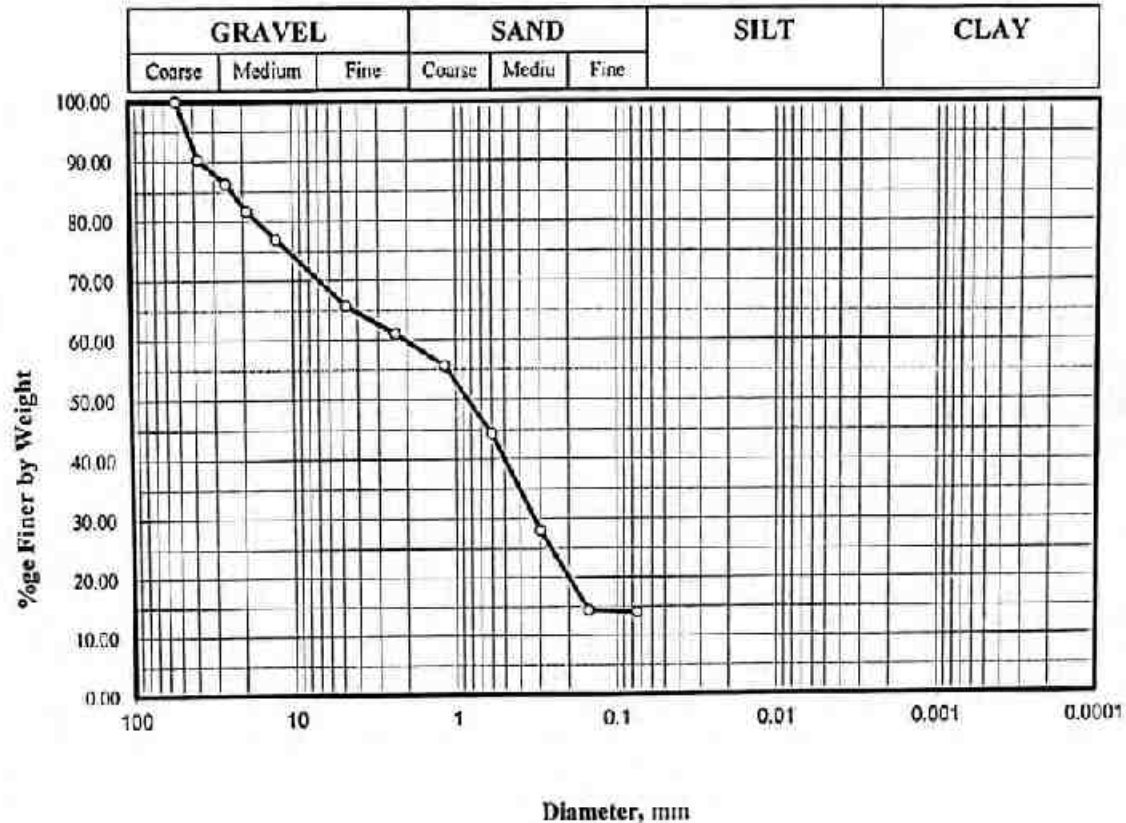Sieve Analysis (ASTM D-1140)


Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
%ge Finer by weight		90.3	86.3	81.7	77.0	65.7	61.0	55.7	44.3
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063				
%ge Finer by weight		28.0	14.3	14.0	14.0				
Effective Diameter		N/A mm							
Uniformity Coefficient		N/A							
Passing sieve no. 200		14.0 %							

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات، و صلاحيتها، المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة إنشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن


Figure 1



Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داربو
Description	

426+400

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

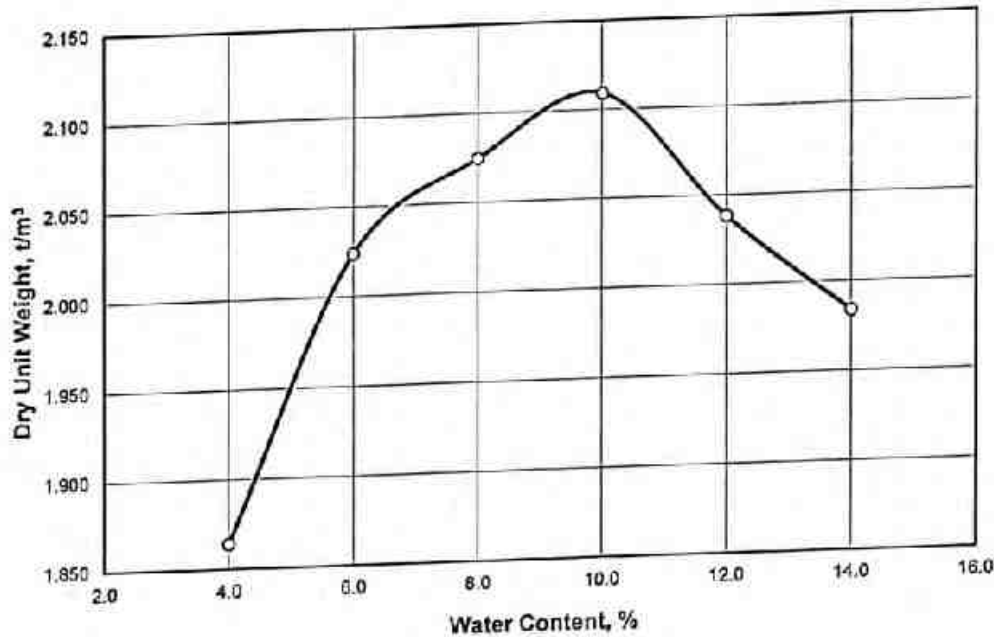

Sample	1	2	3	4	5			
Water Content	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0			
Moist Unit Weight, γ_m	1.94	2.15	2.24	2.32	2.28			
Dry Unit Weight, γ_d	1.86	2.02	2.07	2.11	2.04			
Percentage of aggregate > 19mm						18.3%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.11	γ/m^3	
Max Modified Unit weight						2.15	γ/m^3	
Optimum moisture content						10.00	%	

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المستفزة أو صلاحيتها للاستخدام كعملة البناء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة

المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة

لاستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

يناير ٢٠٢٣

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة داريو ، إلى المركز الهندسي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخصوص تحديد مدى صلاحية عينة تربة ممثلة للقطاع من الكم (٦٠٠+٤٢٥)؛ (٦٠٠+٤٢٧) لإستخدامها في مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين - فوكة) ، تم توريد العينة الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالبي التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهري .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الاختبارات :

العينة:

Brownish yellow pieces cemented sand, med/coarse silty sand, and some pebbles.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج اختبارات التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

نسبة المار من ماخل ¼ (%)	93.0%
نسبة المار من ماخل رقم 200 (%)	7.0%

جدول رقم (١)



بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح بالشكل رقم (2) حيث كانت النتائج كما يلي:

2.17	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
8.0	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

٤. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للاحلال:

SC	USCS	التصنيف
A-1-b	AASHTO	
صالحة	الصلاحية وفقاً لمواصفات المشروع	
العينة صالحة وفقاً لمواصفات المشروع طبقاً لإفادة الإستشاري (سيسترا).	ملاحظات	

العينة (صالحة) للإستخدام فى المشروع السابق ذكره .


مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمر محمد أبو الحسن



Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داريو
Classification	
426+100	Sieve Analysis (ASTM D-1140)

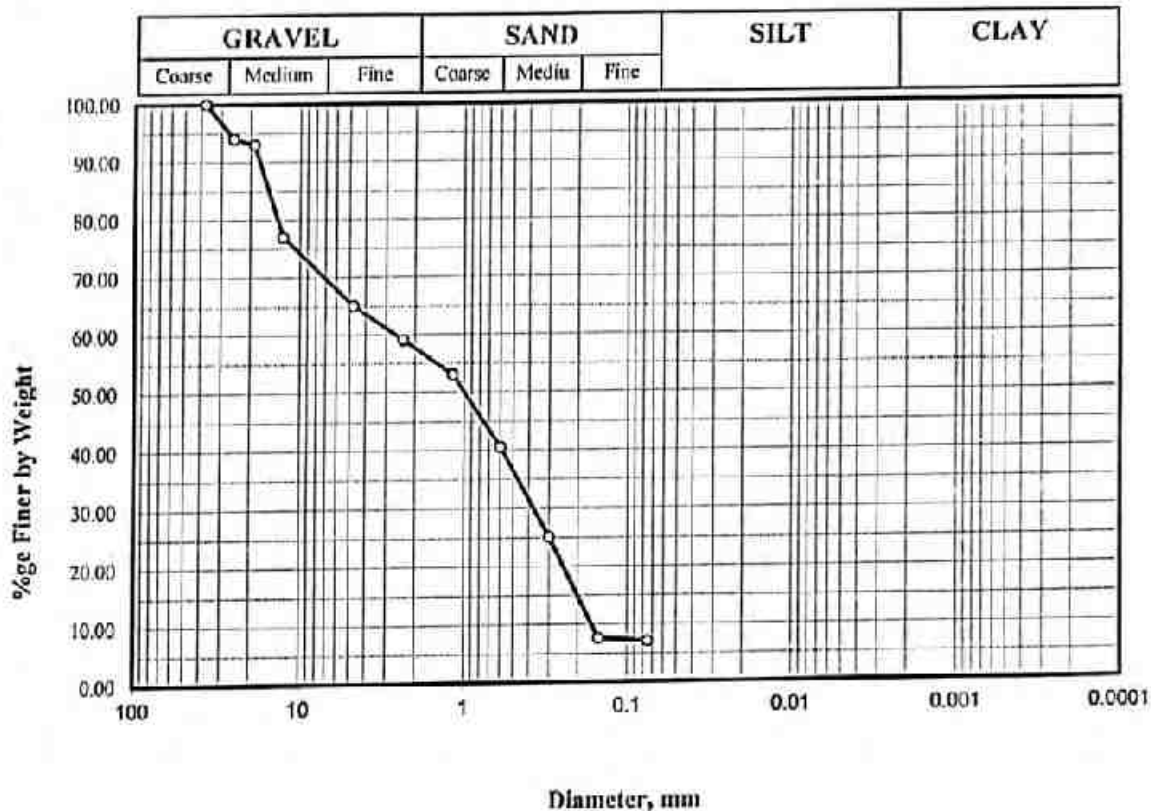

Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
% Finer by weight		100.0	94.0	93.0	77.0	65.0	59.0	53.0	40.5
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063				
% Finer by weight		25.0	7.5	7.0	7.0				
Effective Diameter		0.17 mm							
Uniformity Coefficient		16.01							
Passing sieve no. 200		7.0 %							

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة البناء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبينة على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن


Figure 1



Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داريو
Description	

426+100

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

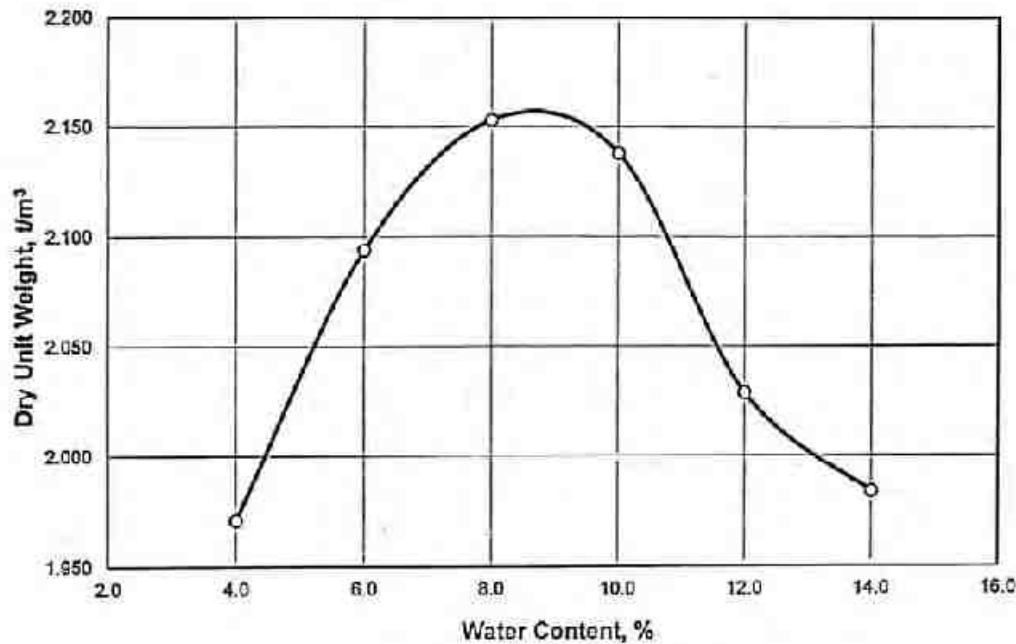

Sample	1	2	3	4	5			
Water Content	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0			
Moist Unit Weight, γ_m	2.05	2.22	2.33	2.35	2.27			
Dry Unit Weight, γ_d	1.97	2.09	2.15	2.14	2.03			
Percentage of aggregate > 19mm						7.0%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.15	t/m³	
Max Modified Unit weight						2.17	t/m³	
Optimum moisture content						8.00	%	

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و سببها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المستخدمة أو صلاحيتها للاستخدام كبناء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبينة على ذلك.

تحذير:

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن
