



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. / EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants



الهيئة العامة
للطرق و (الغباري)
(GAR B)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة التامة بقنا

مشروع إنشاء محور دشنا الحر على النيل (القطاع الغربي)

بيان اعمال بالمستخلص رقم ٢

رقم البند (١٥) بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند (١٥)	بالمر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	م ^٣	كوبري C	2515	459	0	2974
الاجمالي							
2974							

السابق	2515
المنفذ الحالي	459
اجمالي ما تم تنفيذه	2974

عن الاستشاري
عن الهيئة

عن الشركة
عن الشركة



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. J. EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants



الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GAR B)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع إنشاء محور دشنا الحر على النيل (القطاع الغربي)

بيان اعمال بالمستخلص رقم ٢

رقم البند (٢٠) بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادلية للمخدرات والاساسات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند (٢٠)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للمخدرات والاساسات	م ^٣	قواعد كوبرى C	90	0	0	90.00
			بلاطات حماية لخط الغاز	0	48	0	48.00
			الاجمالي				

السابق	المنفذ الحالي	اجمالي ما تم تنفيذه
90	48	138

عن الاستشاري
عن الهيئة

عن الشركة



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. / EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants



الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GAR B)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمحافظة القائمة بـ

مشروع إنشاء محور دنشا الحر على النيل (القطاع الغربي)

بيان اعمال بالمستخلص رقم ٢

رقم البند (٢٦) بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند (٢٦)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة	م ^٣	كوبرى C	0	96	0	96.00
الاجمالي							
96.00							

السابق	المتفق الحالي	اجمالي ما تم تنفيذه
0	96	96

عن الاستشاري 
عن الهيئة 

عن الشركة
١٣ محمد عبد الجبار





NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. / EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants



الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)
مؤازرة النيل
الإدارة المركزية للمنطقة الثانية

مشروع إنشاء محور دشنا الحر على النيل (القطاع الغربي)

بيان اعمال بالمستخلص رقم ٢

رقم البند (٢٨) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمريات سابق الصب بالير

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند (٢٨)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمريات سابق الصب بالير	م ^٣	كوبرى C	240	212	0	452.00
الاجمالي							452.00

السابق	240
المنفذ الحالي	212
اجمالي ما تم تنفيذه	452

عن الاستشاري

عن الهيئة

عن الشركة

١٣ تمديد



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمحافظة القائمة بقطاع

مشروع إنشاء محور دشنا الحر على النيل (القطاع الغربي)

بيان اعمال بالمستخلص رقم ٢

رقم البند (٣٥) بالطن توريد وتركيب ورص التسليح ٤٠/٦٠ بطول ١٢ متر لجميع العناصر الانشائية

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند (٣٥)	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح بالطن ٤٠/٦٠ بطول ١٢ متر لجميع العناصر الاشمائية	بالطن	خوازيق كوبري C	303	19	0	322.00
			قواعد كوبري C	290	0	0	290.00
			اعددة كوبري C	0	24	0	24.00
			كمر كوبري C	154	45.8	0	199.80
			بلاطات حماية لخط الغاز	0	4.2	0	4.20
			الاجمالي				

747	السابق
93	المنفذ الحالي
840	اجمالي ما تم تنفيذه

عن الاستشاري
عن الهيئة

عن الشركة
عن الهيئة



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. / EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants



الهيئة العامة
للحرق و (البحار)
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة القائمة بقنا

مشروع إنشاء محور دشنا الحر على النيل (القطاع الغربي)

بيان اعمال بالمستخلص رقم ٢

رقم البند (٤١) بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند (٤١)	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد	م ^٢	كوبرى C	1152	375	0.0	1527
الاجمالي							1527

السابق	1152
المنفذ الحالي	375
اجمالي ما تم تنفيذه	1527

عن الاستشاري

عن الهيئة

عن الشركة

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

بند ٤١ بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد

عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد كوبري سكة حديد ابو طرطور (c)							
م	عدد القواعد	عدد الواجه	الطول	العرض	اجمالي جزني	خصم العمود	الاجمالي
C3	2	4	6.5	2.2	114.4		114.4
	2	1	6.5	6.5	84.5	5.96	78.54
C4	2	4	6.5	2.2	114.4		114.4
	2	1	6.5	6.5	84.5	5.96	78.54
C5	2	4	6.5	2.2	114.4		114.4
	2	1	6.5	6.5	84.5	5.96	78.54
C6	2	4	6.5	2.2	114.4		114.4
	2	1	6.5	6.5	84.5	5.96	78.54
C7	2	4	6.5	2.2	114.4		114.4
	2	1	6.5	6.5	84.5	5.96	78.54
C8	2	4	6.5	2.1	109.2		109.2
	2	1	6.5	6.5	84.5	5.96	78.54
C9	2	4	6.5	2	104		104
	2	1	6.5	6.5	84.5	5.96	78.54
C10	2	4	6.5	2.2	114.4		114.4
	2	1	6.5	6.5	84.5	5.96	78.54
بالمر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد							1527.92
				اجمالي اعمال مستخلص جاري (١)		1152.44	
				اجمالي اعمال مستخلص جاري (٢)		375.48	

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر حديد تسليح بلاطات الحماية على خط الغاز

المسار الرئيسي للمحور بطول ٤٤ متر وعرض ٣.٧٥ م

الكوڊ	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
1	5.00	12.00	3.70	0.888	16.43
2	20.00	12.00	0.95	0.888	16.87
3	5.00	12.00	3.70	0.888	16.43
4	20.00	12.00	0.95	0.888	16.87
الاجمالي للبلاطة الواحدة كجم					66.20
اجمالي الحديد بالطن لعدد ٤٤ بلاطة					2.91
رامب رقم ١٠ بطول ٢١ متر وعرض ٣.٧٥ م					
الكوڊ	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
1	5.00	12.00	3.70	0.888	16.43
2	20.00	12.00	0.95	0.888	16.87
3	5.00	12.00	3.70	0.888	16.43
4	20.00	12.00	0.95	0.888	16.87
الاجمالي للبلاطة الواحدة كجم					66.20
اجمالي الحديد بالطن لعدد ٢١ بلاطة					1.39
اجمالي حديد التسليح لبلاطات الحماية على المسار الرئيسي ورامب ١٠					4.30

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر نموذج حديد الكمره الوسطية محور C3-C4 , C4-C5 كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكمود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
SH/CO					
35	62	12	0.92	0.888	51
36	62	12	0.88	0.888	48
32	8	32	4.2	6.31	212
33	8	25	1.2	3.85	37
39	8	18	3.5	2	56
SLAB					
13	10	12	1.7	0.888	15
10	10	12	12	0.888	107
10	10	12	12	0.888	107
10	10	12	12	0.888	107
10	10	12	12	0.888	107
12	10	12	1.7	0.888	15
الاجمالي كجم					10,565

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر نموذج حديد الكمره الوسطية محور C3-C4 , C4-C5 كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
sec A- A					
22	16	16	5.28	1.58	133
23	16	12	4.14	1.58	105
26	16	16	2.12	1.58	54
72	14	16	3	1.58	66
73	12	22	3.5	2.98	125
sec B- B					
22	62	16	5.28	1.58	517
23	62	12	4.14	0.888	228
9a	46	12	2	0.888	82
9b	46	12	2	0.888	82
9c	30	12	2.07	0.888	55
9d	30	12	2.04	0.888	54
sec C- C					
24	30	16	4.83	1.58	229
23	30	12	4.14	0.888	110
27	30	12	1.7	0.888	45
28	30	16	2.64	1.58	125
9a	30	12	2	0.888	53
9b	30	12	2	0.888	53
sec D- D					
25	100	16	4.38	1.58	692
28	100	16	2.64	1.58	417
27	149	12	1.7	0.888	225
9a	149	12	2	0.888	265
9b	149	12	2	0.888	265

Handwritten signature

Handwritten signature

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر نموذج حديد الكمره الوسطية محور C3-C4 , C4-C5 كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكمود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
رئيسي سفلي					
1	5	32	12	6.31	379
	7	32	12	6.31	530
	7	32	12	6.31	530
	7	32	12	6.31	530
	7	32	12	6.31	530
2	7	32	12	6.31	530
3	7	32	7.75	6.31	342
4	7	32	7	6.31	309
5	7	32	5	6.31	221
	7	32	5	6.31	221
6	5	32	6	6.31	189
رئيسي علوي					
7	8	22	12	2.98	286
	8	22	5.2	2.98	124
	8	22	12	2.98	286
8	8	22	3	2.98	72
	8	22	3	2.98	72
برندات					
18	6	16	6.5	1.58	62
18	6	16	6.5	1.58	62
19	6	16	6.5	1.58	62
19	6	16	6.5	1.58	62
20	6	16	12	1.58	114
20	6	16	12	1.58	114
21	6	16	5.25	1.58	50
21	6	16	5.25	1.58	50

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر نموذج حديد الكمره الطرفية محور C3-C4 , C4-C5 كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
		sec a-a			0
22	16	16	5.28	1.58	133
23	16	12	4.14	0.888	59
9e	16	12	3	0.888	43
70	12	16	2.4	1.58	46
71	12	22	3	2.98	107
35	62	12	0.92	0.888	51
36	60	12	0.88	0.888	47
32	4	32	4.2	6.31	106
	4	32	4.2	6.31	106
33	8	25	1.2	3.85	37
39	4	18	3.5	2	28
	4	18	3.5	2	28
الاجمالي كجم					10,376

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر نموذج حديد الكمره الطرفية محور C3-C4 , C4-C5 كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
		slab			
10	10	12	12	0.888	107
	10	12	12	0.888	107
	10	12	12	0.888	107
	10	12	12	0.888	107
12	10	12	3.15	0.888	28
13	10	12	1.7	0.888	15
		sec c-c			
23	30	12	4.14	0.888	110
24	30	16	4.83	1.58	229
27	30	12	1.7	0.888	45
28	30	16	2.64	1.58	125
9a	30	12	2	0.888	53
9b	30	12	2	0.888	53
		sec d-d			
25	100	16	4.38	1.58	692
27	149	12	1.7	0.888	225
28	100	16	2.64	1.58	417
9a	149	12	2	0.888	265
9b	149	12	2	0.888	265
		sec b-b			
22	62	16	5.28	1.58	517
23	62	12	4.14	0.888	228
9a	46	12	2	0.888	82
9b	46	12	2	0.888	82
9c	30	12	2.06	0.888	55
9d	30	12	2.04	0.888	54

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صيري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر حديد تسليح لعمود محور C3R كوبري سكة حديد ابو طرطور					
	الكانات				
734	1.58	6.64	16	70	19
511	0.888	4	12	144	20
348	0.888	2	12	196	21
212	1.58	6.4	16	21	22
470	0.888	4.2	12	126	23
60	1.58	7.61	16	5	24
128	0.888	4.8	12	30	25
80	1.58	10.08	16	5	26
160	0.888	6	12	30	27
101	0.888	5.7	12	20	28
6,372	الاجمالي كجم				

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة





الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر حديد تسليح لعمود محور C3L كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
		الرئيسي			
10	30	32	7.40	6.31	1,401
11	30	32	5.40	6.31	1,022
12	10	16	5.50	1.58	87
13	10	16	3.50	1.58	55
17	30	16	5.65	1.58	268
17	30	16	5.65	1.58	268
18	30	16	2.00	1.58	95
18	30	16	2.00	1.58	95

Be 7

Q

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر حديد تسليح لعمود محور C3L كوبري سكة حديد ابو طرطور					
	الكانات				
692	1.58	6.64	16	66	19
426	0.888	4	12	120	20
327	0.888	2	12	184	21
212	1.58	6.4	16	21	22
470	0.888	4.2	12	126	23
60	1.58	7.61	16	5	24
128	0.888	4.8	12	30	25
80	1.58	10.08	16	5	26
160	0.888	6	12	30	27
101	0.888	5.71	12	20	28
5,947	الاجمالي كجم				

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة





الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)


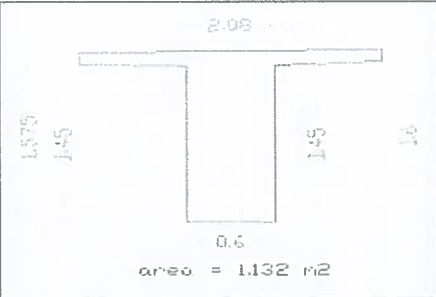
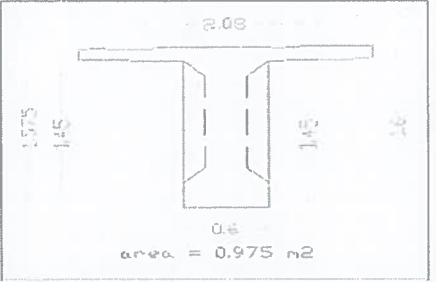
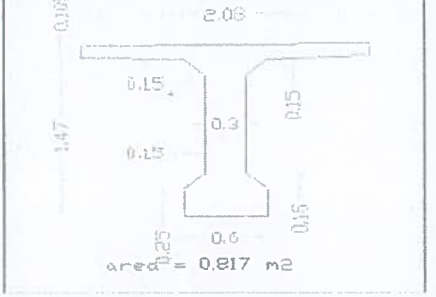
حصر نموذج حديد الكمره الطرفية محور C3-C4 , C4-C5 كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
رئيسي سفلي					
1	5	32	12	6.31	379
	7	32	12	6.31	530
	7	32	12	6.31	530
	7	32	12	6.31	530
	7	32	12	6.31	530
2	7	32	12	6.31	530
3	7	32	7.75	6.31	342
5	7	32	7	6.31	309
	7	32	5	6.31	221
	7	32	5	6.31	221
6	5	32	6	6.31	189
رئيسي علوي					
7	8	22	6.8	2.98	162
8	8	22	12	2.98	286
	8	22	12	2.98	286
برندات					
18	6	16	6.5	1.58	62
18	6	16	6.5	1.58	62
19	6	16	6.5	1.58	62
19	6	16	6.5	1.58	62
20	6	16	12	1.58	114
20	6	16	12	1.58	114
21	6	16	5.25	1.58	50
21	6	16	5.25	1.58	50

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)


حصر خرسانة الكمره الوسطية محور C3-C4 , C4-C5 كوبري سكة حديد ابو طرطور

	الكمية	الطول	مساحة المقطع	
	1.262	1.45	0.87	zone 1
	7.402	6.55	1.13	zone 2
	2.925	3	0.975	zone 3 (avr)
	12.170	14.896	0.817	zone 4
	23.758	الاجمالي		

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة

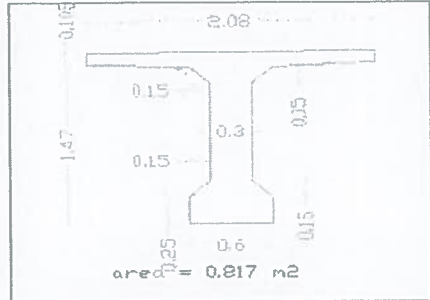
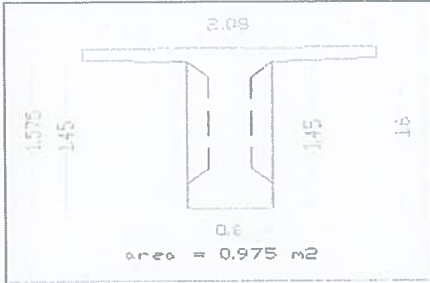
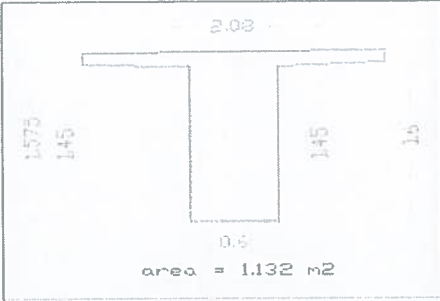
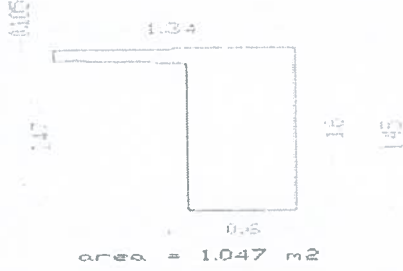


المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر خرسانة الكمرات الطرفية محور C3-C4 , C4-C5 كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكمية	الطول	مساحة المقطع	
1.518	1.45	1.047	zone 1
7.415	6.55	1.132	zone 2
2.925	3	0.975	zone 3 (avr)
12.170	14.896	0.817	zone 4
24.028	الاجمالي		



مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

الشركة المنفذة / الشركة القائمة لمشروعات الطرق

استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سعدان

اسم الممشروع / محور دشنا الحضر على النيل القطاع الغربي

كوبري سدقة حديد ابو ظرطور

بالطن توريد ورص حديد تسليح ١٠/٠٠ لتفصيل جميع العناصر الإنشائية للكوبري

بند ٣٥

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المالك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية

م	رقم المورد	الخواريق		المقاييد		الاصحاح		الفريجات		الكمرات		الاجمالي الكلي
		الكمية	العدد	الكمية	العدد	الكمية	العدد	الكمية	العدد	الكمية	العدد	
1	CE	6	19.14	0	0	0	0	0	0	0	0	19.14
2	CD	10	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0	19.2
3	CC	10	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0	19.2
4	CB	10	19.2	2	13.620	0	0	0	0	0	0	46.44
5	CA	10	19.2	1	13.620	0	0	0	0	0	0	32.82
6	C1	10	19.2	2	13.620	0	0	0	0	0	0	46.44
7	C2	0	2.315	0	13.620	0	0	0	0	0	0	0
8	C3	10	23.15	2	13.620	0	0	0	0	0	0	209.863
9	C4	10	23.15	2	13.620	0	0	0	0	0	0	115.214
10	C5	10	23.15	2	13.620	0	0	0	0	0	0	50.39
11	C6	10	23.15	2	13.620	0	0	0	0	0	0	50.39
12	C7	10	23.21	2	13.620	0	0	0	0	0	0	50.45
13	C8	10	23.21	2	12.912	0	0	0	0	0	0	49.034
14	C9	10	20	2	14.920	0	0	0	0	0	0	49.84
15	C10	10	20.68	2	14.920	0	0	0	0	0	0	50.52
16	C11	8	3.513	0	0	0	0	0	0	0	0	32.459
الاجمالي المنفذ		144	36.59	21	289.80	0	0	0	0	0	0	841.400
الاجمالي المتبقي		12		7								
مستخلص جاري رقم (١)		خوارق	303	قواعد	290	اصحاح	0	الفريجات	0	الكمرات	154	747
مستخلص جاري رقم (٢)		خوارق	19	قواعد	0	اصحاح	24	الفريجات	0	الكمرات	50	93.0

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر حديد تسليح لعمود محور C4L كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكمود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
			الرئيسي		
10	30	32	7.00	6.31	1,325
11	30	32	5.00	6.31	947
12	10	16	5.65	1.58	89
13	10	16	3.65	1.58	58
17	60	16	5.65	1.58	536
18	60	16	2.00	1.58	190
			الكانات		
0					
19	66	16	6.64	1.58	692
20	120	12	4.00	0.888	426
21	196	12	2.00	0.888	348
22	21	16	6.40	1.58	212
23	126	12	4.18	0.888	468
24	5	16	7.61	1.58	60
25	30	12	4.78	0.888	127
26	5	16	10.08	1.58	80
27	30	12	6.00	0.888	160
28	20	12	5.70	0.888	101
			الاجمالي كجم		
					5,819

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصار حديد عمود

column C4R

الكوڊ	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
					الرئيسي
10	30	32	8.00	6.32	1,517
11	30	32	6.00	6.32	1,138
12	10	16	6.00	1.58	95
13	10	16	4.00	1.58	63
17	60	16	6.00	1.58	569
18	60	16	2.00	1.58	190
					الكانات
19	70	16	6.64	1.58	734
20	144	12	4.00	0.888	511
21	196	12	2.00	0.888	348
22	21	16	7.14	1.58	237
23	126	12	4.18	0.888	468
24	5	16	8.31	1.58	66
25	30	12	4.78	0.888	127
26	5	16	11.54	1.58	91
27	30	12	6.00	0.888	160
28	20	12	5.70	0.888	101
					الاجمالي كجم
					6,415

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر حديد تسليح لعمود محور C3R كوبري سكة حديد ابو طرطور

الكمود	العدد	القطر	الطول	وزن م ط	اجمالي الوزن
		الرئيسي			
10	30	32	8	6.31	1,514
11	30	32	6	6.31	1,136
12	10	16	6	1.58	95
13	10	16	4	1.58	63
17	30	16	6	1.58	284
17	30	16	6	1.58	284
18	30	16	2	1.58	95
18	30	16	2	1.58	95



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. / EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة التابعة بقنا

مشروع إنشاء محور دشنا الحر على النيل (القطاع الغربي)

بيان اعمال بالمستخلص رقم ٢

ثانيا : اعمال الطرق

رقم البند (٦) بالمتر المكعب اعمال نقل وتحميل تربة صالحة للردم وتشغيلها لزوم تشكيل الجسر والاكتاف

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند (٦)	بالمتر المكعب اعمال نقل وتحميل تربة صالحة للردم وتشغيلها لزوم تشكيل الجسر والاكتاف	م ^٣	المسار الرئيسي	40350	15600	0.0	55950
			رامب ١٠	0	1600		1600
			الصينية ١	0	5600		5600
			L1	0	1100		1100
		الاجمالي					

40350	السابق
23900	المنفذ الحالي
64250	اجمالي ما تم تنفيذه

عن الاستشاري

عن الهيئة

عن الشركة

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المالك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

بند ١٥	حفر ميكانيكي بين الخوازيق للقواعد المسلحة كوبري سكة حديد ابو طرطور (C)										
	خصم					اضافة					
	الاجمالي	اجمالي الخصم	الارتفاع	مساحة المقطع	عدد الخوازيق	اجمالي جزئي	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	م
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C D
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C C
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C B
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C A
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C 1
	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C 2
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C 3
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C 4
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C 5
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C 6
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C 7
	221.21	21.195	2.7	0.785	10	242.406	2.7	6.7	6.7	2	C 8
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C 9
	229.40	21.98	2.8	0.785	10	251.384	2.8	6.7	6.7	2	C 10
	2974.1	285.0				3259.0					
	459				اجمالي اعمال مستخلص جاري (٢)		2515				اجمالي اعمال مستخلص جاري (١)

اجمالي المنفذ بالمتر المكعب حفر قواعد

حصر اعمال

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)					
بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية					٢٠
خرسانة عادية بالمسار الرئيسي للمحور بطول ٤٤ متر وعرض ٣.٧٥ م					
الاجمالي م٣	السمك	العرض	الطول	العدد	
33.00	0.20	3.75	1.00	44	
خرسانة عادية برامب رقم ١٠ بطول ٢١ متر وعرض ٣.٧٥ م					
الاجمالي	السمك	العرض	الطول	العدد	
15.75	0.20	3.75	1.00	21	
48.75	اجمالي الخرسانة العادية لبلاطات الحماية على المسار الرئيسي ورامب ١٠				

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي
حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

بند ٢٠ بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية

خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية كوبري سكة حديد ابو طرطور (c)

الاجمالي	خصم				اضافة					
	اجمالي الخصم	الارتفاع	مساحة المقطع	عدد الخوازيق	اجمالي جزئي	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	م
0	0	0.1	0.785	8	0	0.1	2	34.55	1	CE
0	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	CD
0	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	CC
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	CB
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	CA
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C1
0	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C2
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C3
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C4
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C5
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C6
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C7
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C8
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C9
8.193	0.785	0.1	0.785	10	8.978	0.1	6.7	6.7	2	C10
بلاطات الحماية لخط الغاز الطبيعي										
33	0	0	0	0	33	0.2	3.75	1	44	مسبار الرئيسي
15.75	0	0	0	0	15.75	0.2	3.75	1	21	رامب ١٠
138.873					الاجمالي بالمتر المكعب					

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

بند ٢٦ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة كوبري سكة حديد ابو طرطور (c)								
م	النوع	العدد	الارتفاع	مساحة المقطع	الكمية	جمالي جزئي	خصم	الاجمالي
C3	R	1	6.15	AVR	24.43	24.43	0	24.43
	L	1	5.8	AVR	23.38	23.38	0	23.38
C4	R	1	6.22	AVR	24.66	24.66	0	24.66
	L	1	5.88	AVR	23.64	23.64	0	23.64
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة								- 96.11

0	اجمالي اعمال مستخلص جاري (١)
96	اجمالي اعمال مستخلص جاري (٢)

مهندس الاستشاري





مهندس الشركة



المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري المالك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر خرسانة مسلحة لعمود محور C3L كوبري سكة حديد ابو طرطور

القطاع	الكمية	الطول	مساحة المقطع	
 area = 2.981 m ²	6.556	2.2	2.98	zone 1
 area = 5.58 m ²	13.268	3.1	4.28	zone 2 (avr) (2.98, 5.58)
 area = 7.127 m ²	3.564	0.5	7.127	zone 3
	23.388			الإجمالي م ^٣




مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر خرسانة مسلحة لعمود محور C3R كوبري سكة حديد ابو طرطور

القطاع	الكمية	الطول	مساحة المقطع	
 area = 2.981 m2	7.599	2.55	2.98	zone 1
 area = 5.58 m2	13.268	3.1	4.28	zone 2 (avr) (2.98, 5.58)
 area = 7.127 m2	3.564	0.5	7.127	zone 3
	24.431		الإجمالي م ٣	




مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المالك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر خرسانة مسلحة لعمود محور C4L كوبري سكة حديد ابو طرطور

القطاع	الكمية	الطول	مساحة المقطع	
 area = 2.981 m ²	6.809	2.285	2.98	zone 1
 area = 5.58 m ²	13.268	3.1	4.28	zone 2 (avr) (2.98,5.58)
 area = 7.127 m ²	3.564	0.5	7.127	zone 3
	23.641			الاجمالي م ٣



مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري المالك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

حصر خرسانة مسلحة لعمود محور C4R كوبري سكة حديد ابو طرطور

القطاع	الكمية	الطول	مساحة المقطع	
 area = 2.981 m ²	7.828	2.627	2.98	zone 1
 area = 5.58 m ²	13.268	3.1	4.28	zone 2 (avr) (2.98, 5.58)
 area = 7.127 m ²	3.564	0.5	7.127	zone 3
	24.660			الاجمالي م ^٢

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

الملك / الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري الملك / مكتب النيل للاستشارات الهندسية
 الشركة المنفذة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق
 استشاري الشركة المنفذة / مكتب د/ صبري سمعان
 اسم المشروع / محور دشنا الحر على النيل القطاع الغربي

حصر اعمال المستخلص الجاري رقم (٢)

بند ٢٨ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابق الصب بالبر

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابق الصب بالبر كوبري سكة حديد ابو طرطور (C)							
م	النوع	العدد	الطول	الارتفاع	الكمية	جمالي جزئي	خصم
C3-C4	وسطية	10	26	1.45	23.75	237.5	0
	طرفية	4	26	1.45	24.03	96.12	0
C4-C5	وسطية	4	26	1.45	23.75	95	0
	طرفية	1	26	1.45	24.03	24.03	0
452.65	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابق الصب بالبر						

240	اجمالي اعمال مستخلص جاري (١)
212	اجمالي اعمال مستخلص جاري (٢)

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. / EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل
(GARRI T)
مدرج تحت الطرق القدر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

النيل العامة للطرق الصحراوية

تنفيذ شركة

بيان اعمال الحصر للاعمال الترابية بمحور دشنا
مستخلص رقم (٢) جاري

بالمر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية
بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف الخ

رقم البند وبياناته:
ثانيا : اعمال الطرق
بند : ٦

الطريق الرئيسي

الكمية	عرض الطبقة	الطول	المسافة		منسوب الطبقة
			الى	من	
646.8	36.96	70	6+400	6+330	-1.75
646.8	36.96	70	6+740	6+670	
1108.8	36.96	120	6+120	6+000	
8690.4	36.21	960	6+960	6+000	-1.5
362.1	36.21	40	7+260	7+220	
362.1	36.21	40	7+510	7+470	
12322.35	35.46	1390	7+510	6+120	-1.25
6334.575	34.71	730	6+850	6+120	-1
5727.15	34.71	660	7+510	6+850	
2377.2	33.96	280	6+400	6+120	-0.75
5178.9	33.96	610	7+510	6+900	
5064.525	33.21	610	7+510	6+900	-0.5
892.65	32.46	110	7+110	7+000	-0.25
1785.3	32.46	220	7+500	7+280	-0.5
1293.6	36.96	70	6+030	5+960	-3
1693.6	42.34	80	6+090	6+010	-2.5
1523.6	38.09	80	6+090	6+010	-2
56010.45	الاجمالي للطريق الرئيسي				

مهندس المكتب الاستشاري

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
PROF. DR. ING. / EL-KADI
Expertise House for Engineering Consultants

الهيئة العامة
للطرق والكباري و
(GARBIT)
مدرج في سجل المهندسين



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

النيل العامة للطرق الصحراوية

تنفيذ شركة

بيان اعمال الحصر للاعمال الترابية بمحور دشنا
مستخلص رقم (٢) جاري

بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية
بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف الخ

رقم البند وبياناته:
ثانيا : اعمال الطرق
بند : ٦

ROUND 1

الكمية	عرض الطبقة	الطول	المسافة		منسوب الطبقة
			الى	من	
2403.5	21.85	440	0+560	0+120	0
3201.8	22.87	560	0+560	0+000	-0.25
5605.30	الاجمالى للصينية ١				

رامب ١٠

الكمية	عرض الطبقة	الطول	المسافة		منسوب الطبقة
			الى	من	
325.75	13.03	100	0+370	0+270	0
1299.625	14.05	370	0+370	0+000	-0.25
1625.38	الاجمالى رامب ١٠				

L1

الكمية	عرض الطبقة	الطول	المسافة		منسوب الطبقة
			الى	من	
569.525	20.71	110	0+130	0+020	-1
541.475	19.69	110	0+130	0+020	-0.75
0	0	110	0+130	0+020	-0.5
0	0	110	0+130	0+020	-0.25
0	0	110	0+130	0+020	0
1111.00	اجمالى L1				
64352.13	اجمالى الاعمال الترابية				

مهندس المكتب الاستشارى

التوقيع /

مهندس الشركة - العنفة

التوقيع /

تقرير رقم (٢٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١١٢٧) الى (١١٢٩)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٣٥٠	قيمة اجراء التجارب
٥٢.٥	١٥% مصاريف إدارية
٤٠٢.٥	الجملة
٥٦.٤	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٤٥٨.٩	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ٥ / ٣٠

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /مصطفى سعد (استشاري الهيئة)

حماية خط الغاز			الموقع الكيلو متري
٢٠٢٣/٥/٢٣			تاريخ الصب
٢٠٢٣/٥/٣٠			تاريخ الكسر
خرسانه عادية			النوع
جهد الكسر بعد ٧ ايام من الصب			
١١٢٩	١١٢٨	١١٢٧	أرقام العينات
٢٤٠	٢٢٧	٢٣٦	جهد الكسر
٢٣٤			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (١٨٧.٥) كجم/سم ^٣ بعد (٧) ايام من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٣/٥/٣٠

فني المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

مدير المعمل

مهندس المعمل



تقرير رقم (٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمالية/ محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١٦١) الى (١٦٦)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٥٥٠	قيمة إجراء التجارب
٨٢.٥	١٥% مصاريف إدارية
٦٣٢.٥	الجملة
٨٨.٦	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٧٢١.١	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٧/٢٧

فني المعمل،،،

مدير المعمل
م/

مهندس المعمل
م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ك

(عبداد حسين)





تقرير رقم (٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق والكباري

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /مصطفى سعد (استشاري الهيئة)

B3 C3,C4		P27 CD		الموقع الكيلو متري		
٢٠٢٣/٦/٢٢		٢٠٢٣/٦/٢١		تاريخ الصب		
٢٠٢٣/٧/٢٤				تاريخ الكسر		
خرسانة مسلحة				النوع		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب						
١٦٦	١٦٥	١٦٤	١٦٣	١٦٢	١٦١	أرقام العينات
٣٢٢	٣٢٦	٣٦٢	٣٧١	٣٦٢	٣٥٣	جهد الكسر
٣٣٧			٣٦٢			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٤٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) ايام من تاريخ الصب			لا يقل عن (٣٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) ايام من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٣/ ٧/٢٧

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٨٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (٢٧٢) الى (٢٧٧)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٥٥٠	قيمة اجراء التجارب
٨٢.٥	١٥ % مصاريف إدارية
٦٣٢.٥	الجملة
٨٨.٦	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
٧٢١.١	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٨ / ١٠

فني المعمل،،،



مهندس المعمل
[Signature]

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)



تقرير رقم (٨٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /مصطفى سعد (استشاري الهيئة)

P81 CD			P82 CD			الموقع الكيلو متري
٢٠٢٣/٧/١١						تاريخ الصب
٢٠٢٣/٨/٩						تاريخ الكسر
خرسانة مسلحة						النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب						
٢٧٧	٢٧٦	٢٧٥	٢٧٤	٢٧٣	٢٧٢	أرقام العينات
٣٥٨	٣٧١	٣٦٢	٣٥٨	٣٦٧	٣٦٢	جهد الكسر
٣٦٤			٣٦٢			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٣٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب						حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٣/٨/١٠

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

مدير المعمل
م

مهندس المعمل
م

فني المعمل
م



تقرير رقم (٣٤٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١٢٥٧) الى (١٢٥٩)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٣٥٠
١٥% مصاريف إدارية	٥٢.٥
الجملة	٤٠٢.٥
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٥٦.٤
المبلغ الاجمالي	٤٥٨.٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٦ / ٢٥
فني المعمل،،،


مدير المعمل
م

مهندس المعمل
م

رئيس الادارة المركزية
مهندس/

(عماد حسين)





تقرير رقم (٣٤٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /مصطفى سعد (استشاري الهيئة)

قاعدة يمين C10			الموقع الكيلو متري
٢٠٢٣/٦/١٣			تاريخ الصب
٢٠٢٣/٦/٢٠			تاريخ الكسر
خرسانه مسلحه			النوع
جهد الكسر بعد ٧ ايام من الصب			
١٢٥٩	١٢٥٨	١٢٥٧	ارقام العينات
٣٤٠	٣٥٣	٣٥٣	جهد الكسر
٣٤٩			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٣٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٧) ايام من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٣/٦/٢٥

فني المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مدير المعمل

مهندس المعمل



تقرير رقم (٣٤٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١٢٤٩) الى (١٢٥١)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٣٥٠
١٥% مصاريف إدارية	٥٢.٥
الجملة	٤٠٢.٥
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٥٦.٤
المبلغ الاجمالي	٤٥٨.٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٦ / ٢٠

فني المعمل،،،

مدير المعمل
م

مهندس المعمل
م

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣٤٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /مصطفى سعد (استشاري الهيئة)

P31 CD			الموقع الكيلو متري
٢٠٢٣/٦/٥			تاريخ الصب
٢٠٢٣/٦/١٥			تاريخ الكسر
خرسانه مسلحه			النوع
جهد الكسر بعد ٧ ايام من الصب			
١٢٥١	١٢٥٠	١٢٤٩	ارقام العينات
٢٣٦	٢٣٦	٢٣٦	جهد الكسر
٢٣٦			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٦٢.٥) كجم/سم ^٣ بعد (٧) ايام من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٣/٦/٢٠

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / (عماد حسين)



تقرير رقم (٣٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١٢٦٠) الى (١٢٦٢)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٣٥٠
١٥% مصاريف إدارية	٥٢.٥
الجملة	٤٠٢.٥
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٥٦.٤
المبلغ الاجمالي	٤٥٨.٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/ ٦ / ٢٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /مصطفى سعد
(استشاري الهيئة)

P20 CC			الموقع الكيلو متري
٢٠٢٣/٥/٢٠			تاريخ الصب
٢٠٢٣/٦/٢٠			تاريخ الكسر
خرسانه مسلحه			النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب			
١٢٦٢	١٢٦١	١٢٦٠	ارقام العينات
٣٨٥	٤٠٣	٤٠٨	جهد الكسر
٣٩٩			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٣٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) ايام من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٣/٦/٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٥

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١٤) الى (١٦)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٣٥٠
١٥% مصاريف إدارية	٥٢.٥
الجملة	٤٠٢.٥
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٥٦.٤
المبلغ الاجمالي	٤٥٨.٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٧ / ١٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

(علاء حسين)



تقرير رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٦
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس /مصطفى سعد (استشاري الهيئة)

P23 CC			الموقع الكيلو متري
٢٠٢٣/٥/٢٧			تاريخ الصب
٢٠٢٣/٧/٦			تاريخ الكسر
خرسانه مسلحه			النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب			
١٦	١٥	١٤	أرقام العينات
٣١٧	٣٣١	٣٣١	جهد الكسر
٣٢٦			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٣٥٠) كجم/سم ^٢ بعد (٢٨) ايام من تاريخ الصب			حدود المواصفات

٢٠٢٣/٧/١٥٠ تحرير افر

تحريرا في : ٢٠٢٣/٧/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)





تقرير رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / محور دشنا على النيل
تنفيذ/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تحية طيبة - وبعد،،،

تشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (٥٩٨) الى (٦٠٣)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٥٥٠	قيمة اجراء التجارب
٨٢.٥	١٥% مصاريف إدارية
٦٣٢.٥	الجملة
٨٨.٦	١٥% ضريبة القيمة المضافة
٧٢١.١	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تاريخ في: ٢٠٢٣ / ٤ / ١٢


أذني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)



تقرير رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤
بخصوص/نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/محور دشنا على النيل
تنفيذ/شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تم صلب المكعبات بمعرفة المهندس /مصطفى سعد (استشاري الهيئة)

خازوق P34-C1						المرجع الخيلو متري
٢٠٢٣/٣/٧						تاريخ الصب
٢٠٢٣/٤/٦			٢٠٢٣/٣/١٤			تاريخ الكسر
خرسانة مسلحة						النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب			جهد الكسر بعد ٧ ايام من الصب			
٦٠٣	٦٠٢	٦٠١	٦٠٠	٥٩٩	٥٩٨	ارقام العينات
٣٩٩	٣٩٢	٣٧١	٣٦٢	٣٢١	٣١٩	جهد الكسر
٣٨٧			٣٣٤			جهد الكسر
لا يقل عن (٣٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			لا يقل عن (٢٦٢.٥) كجم/سم ^٣ بعد (٧) ايام من تاريخ الصب			حدود المواصفات
٢٠٢٣/٤/١٢						

قرار رقم: ٢٠٢٣/٤/١٢

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

