

## السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :::::

### بيان حصر المواد المحجرية

مشروع : - اعمال معالجة الاذهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا / السبعية الزراعي الغربي بطول ٣٠٠ م.م - محافظة الأقصر  
تنفيذ / اي جي ار انترناشونال

عقد رقم : ٢٠٢٤ / ١٥٤٥ / ٢٠٢٣

يرجى التفضل بالإهاطة والتنبيه باتخاذ مايلزم من التنصل من سعادتكم بالعلم أن المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالي :-

الجهة للحصول على الخام	الكمية	الوحدة	نوع المادة المحجرية	م
محجر حمادة الرشيدى	٦٢٤٢,٨٩	م³	أتربة	١
محجر حمادة الرشيدى	٢٥٨٩,٩٤	م³	سن	٢
محجر حمادة الرشيدى	١٢٩٤,٩٧	م³	رمل طبيعى	٤

برجاء التكرم من سعادتكم بالعلم والإهاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضوا بقبول وافر التحية والتقدير :::

تمريفي / ٢٠٢٥ /

التوقيع  
مهندس / عماد حسـن  
رئيس الإدارـة المركـبة



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

المنطقة الثامنة بقنا(سوهاج - قنا - الأقصر)

بيان كميات المخابر

عملية : أعمال معالجة الانهارات لمسافات متفاوتة من طريق انسنا / السياعية الزراعي الغربي بطول ٣٠٠ م . ط محافظة الاقصر

تنفيذ شركة أي بي ار انترنشونال

وزاره النقل

الى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : المنطقة الثالثة بقنا

عقد رقم : ٢٠٤٥/٢٣٠٢/٢٠٢٠

ملاحظات	بيان كميات المخابر			(الكمية المنسحبة بالاتفاق)	(الوحدة)	بيان الاموال	(نقطة العقد)	بيان النبذة بالتفصيل
	النسبة	النسبة	النسبة					
-	-	-	-	١٢٦,٢.	٣,٤٢٠	٣٠	السن	١ بالطرق اعمال تنفيذ خوازق مفاسدة حفر بريحة مستمرة قدر ٣٠ سم في اى انواع التربة
-	-	-	-	٢٧,٧٧	٥٥,٥٠	٣٠	٣٠	٢ اعمال خرسانة المساجلة للخدمات فوق وقوس الخوازق
-	-	-	-	-	٨٣,٩٣	٣٠	طن	٣ بالاطلن تزويد وتشغيل وتركيب صلب حديد تسليح
-	-	-	-	-	٦٢٤,٨٩	٣٠	٣٠	٤ بالفتر المكتب تزويد وتشغيل تربة حصوية مع الفرش والدملن
-	-	-	-	-	٢	٢	عدد	٥ بعد اعمال نقل ماكيده الخوازق ذات بعد صغيرة
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٢٦,٩٧	٢٠٨٩,٩٤	٣٠	٣٠	٦ اجمالي الكميات

٢٤٣



## شهادة

مشروع : اعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي

بطول ٣٠٠ م . ط - محافظة الأقصر

تنفيذ : شركة اي جي ار انترناشونال

تقر المنطقة بأنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها

بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقايسة الختامية للأعمال التي نعمت

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

مهندس / محمود أحمد فؤاد

تحريراً في ٢٠٢٥/٤/٢٠

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



رئيس الإدارات المركزية

محمد حسین

## شہادة

• مشروع : اعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي

طول ٣٠٠ م . ط - محافظة الأقصر

• تنفيذ : شركة أي جي ار انترناشونال

• تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابراهيم احمد عارف

٤-٢٠١٣ (اللوگو)

جهاز الإشراف

مهندس / محمود احمد فؤاد

تحريراً في ٢٠٢٥/٤/٣٠



رئيس الإدراة المركزية

مهندس /

عماد حسين

## شهادة المهندسين

• مشروع : اعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي

بطول ٣٠٠ م . ط - محافظة الأقصر

• تنفيذ : شركة اي جي ار انترناشونال

• أسم مهندسي الشركة المنفذة :

١- م/ احمد حسام الدين

٢- م/ مصطفى عيد البدرى

سير و سلوك مهندسي الشركة : جيد

### جهاز الإشراف

مدير المشروع/ محمود أحمد فؤاد

تحريراً في ٢٠٢٥/٤/٣٠

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
محمد حسين



الإداره المركزيه للمنطقة الثامنة بقنا

شـ ٥٠٢

- مشروع : اعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي  
بطول ٣٠٠ م . ط - محافظة الأقصر
- تنفيذ : شركة اي جي ار انترناشونال
- تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقاً التعاقد ووفقاً للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات  
المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتى تاريخه

جهاز الإشراف


مدير المشروع

مهندس / 

مهندس المشروع

مهندس / 

رئيس الإداره المركزيه

مهندس /   
عماد حسین



مقاييس ختامية

أعمال معالجة الآثار لمسافات متفرقة من طريق إسنا / السباعية الزراعي الغربي بطول ٣٠٠ م.ط (محافظة الأقصر)

تنفيذ شركة AGR انترناشونال

اشراف ( المنطقة الثامنة - قنا )

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفنة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه
١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ اسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	٢١٦٨	٢٠٨٠	٦٥٨٩٤٤٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لأساسات والبلاطات الإنتقالية والمدارات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً للتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م	٦٩,٤٣	٢٨٢٥	١٩٦١٣٩,٧٥
٣	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الأساسية للكوبري حتى ١٢ م و السعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل تهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٨٣,٩٣	٥٨٣٠٠	٤٨٩٣١١٩,٠٠
٤	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت باترية صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسد جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذة داخل مبول المجرى المائي والسعر يشمل إزالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير المجرى حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام العمل .	م	٦٢٤٢,٨٩	١٠٥	٦٥٥٥٠٣,٤٥
٥	بالعدد نقل ماكينة خوازيق ذات ابعاد صغيرة والمستخدمة خصيصاً للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول إليها باستخدام الماكينات الكبيرة والبند يشمل المعدات والأتوش والتربلات اللازمة لنقل الماكينة وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة	عدد	٢	٦٥٠٠	١٩٥٠٠
الاجمالي					١٢٥٢٩٢٠٢,٢٠

رئيس الإدارة المركزية



مهندس / عماد حسين



١٤

بشكل مثالي امرأة على طلباتي من طلب من ١٠٣٠ ط متقدمة الماء  
٢٠٠٣٠ ط متقدمة الماء

$$\text{area} = 19.19 \text{ m}^2$$

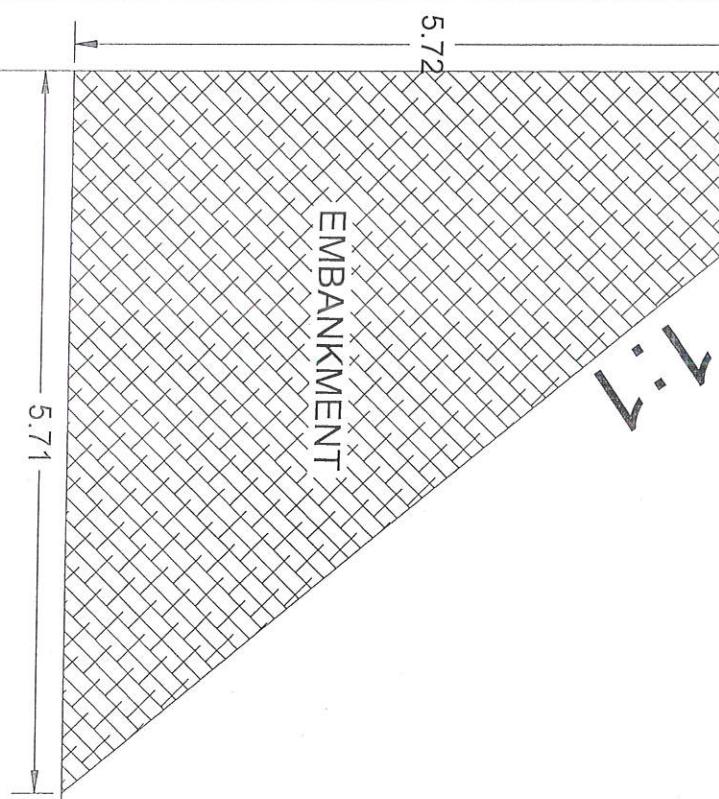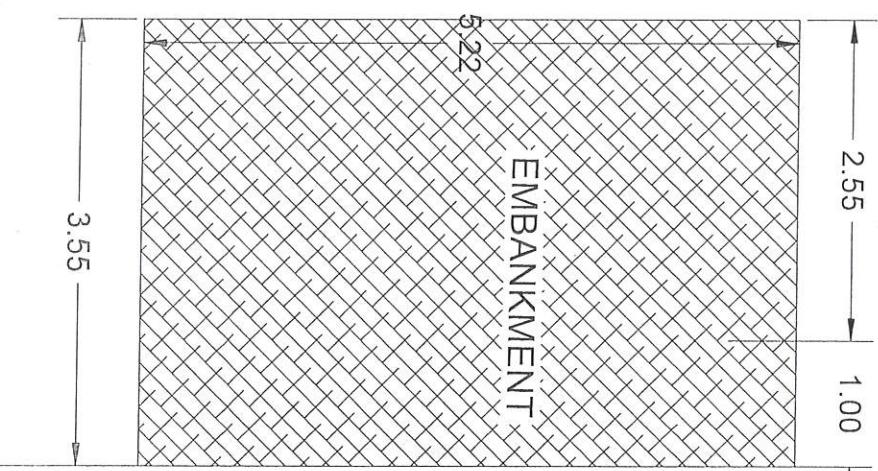


$$\text{pile D} = 0.60 \text{ M}$$

Section 1



(from ST 0+200 to ST 0+264.5)

$$3.55 * 5.22 * 64.6 + 19.19 * 64.6 = 2436.77 \text{ m}^3$$

$$\text{area} = 19.19 \text{ m}^2$$

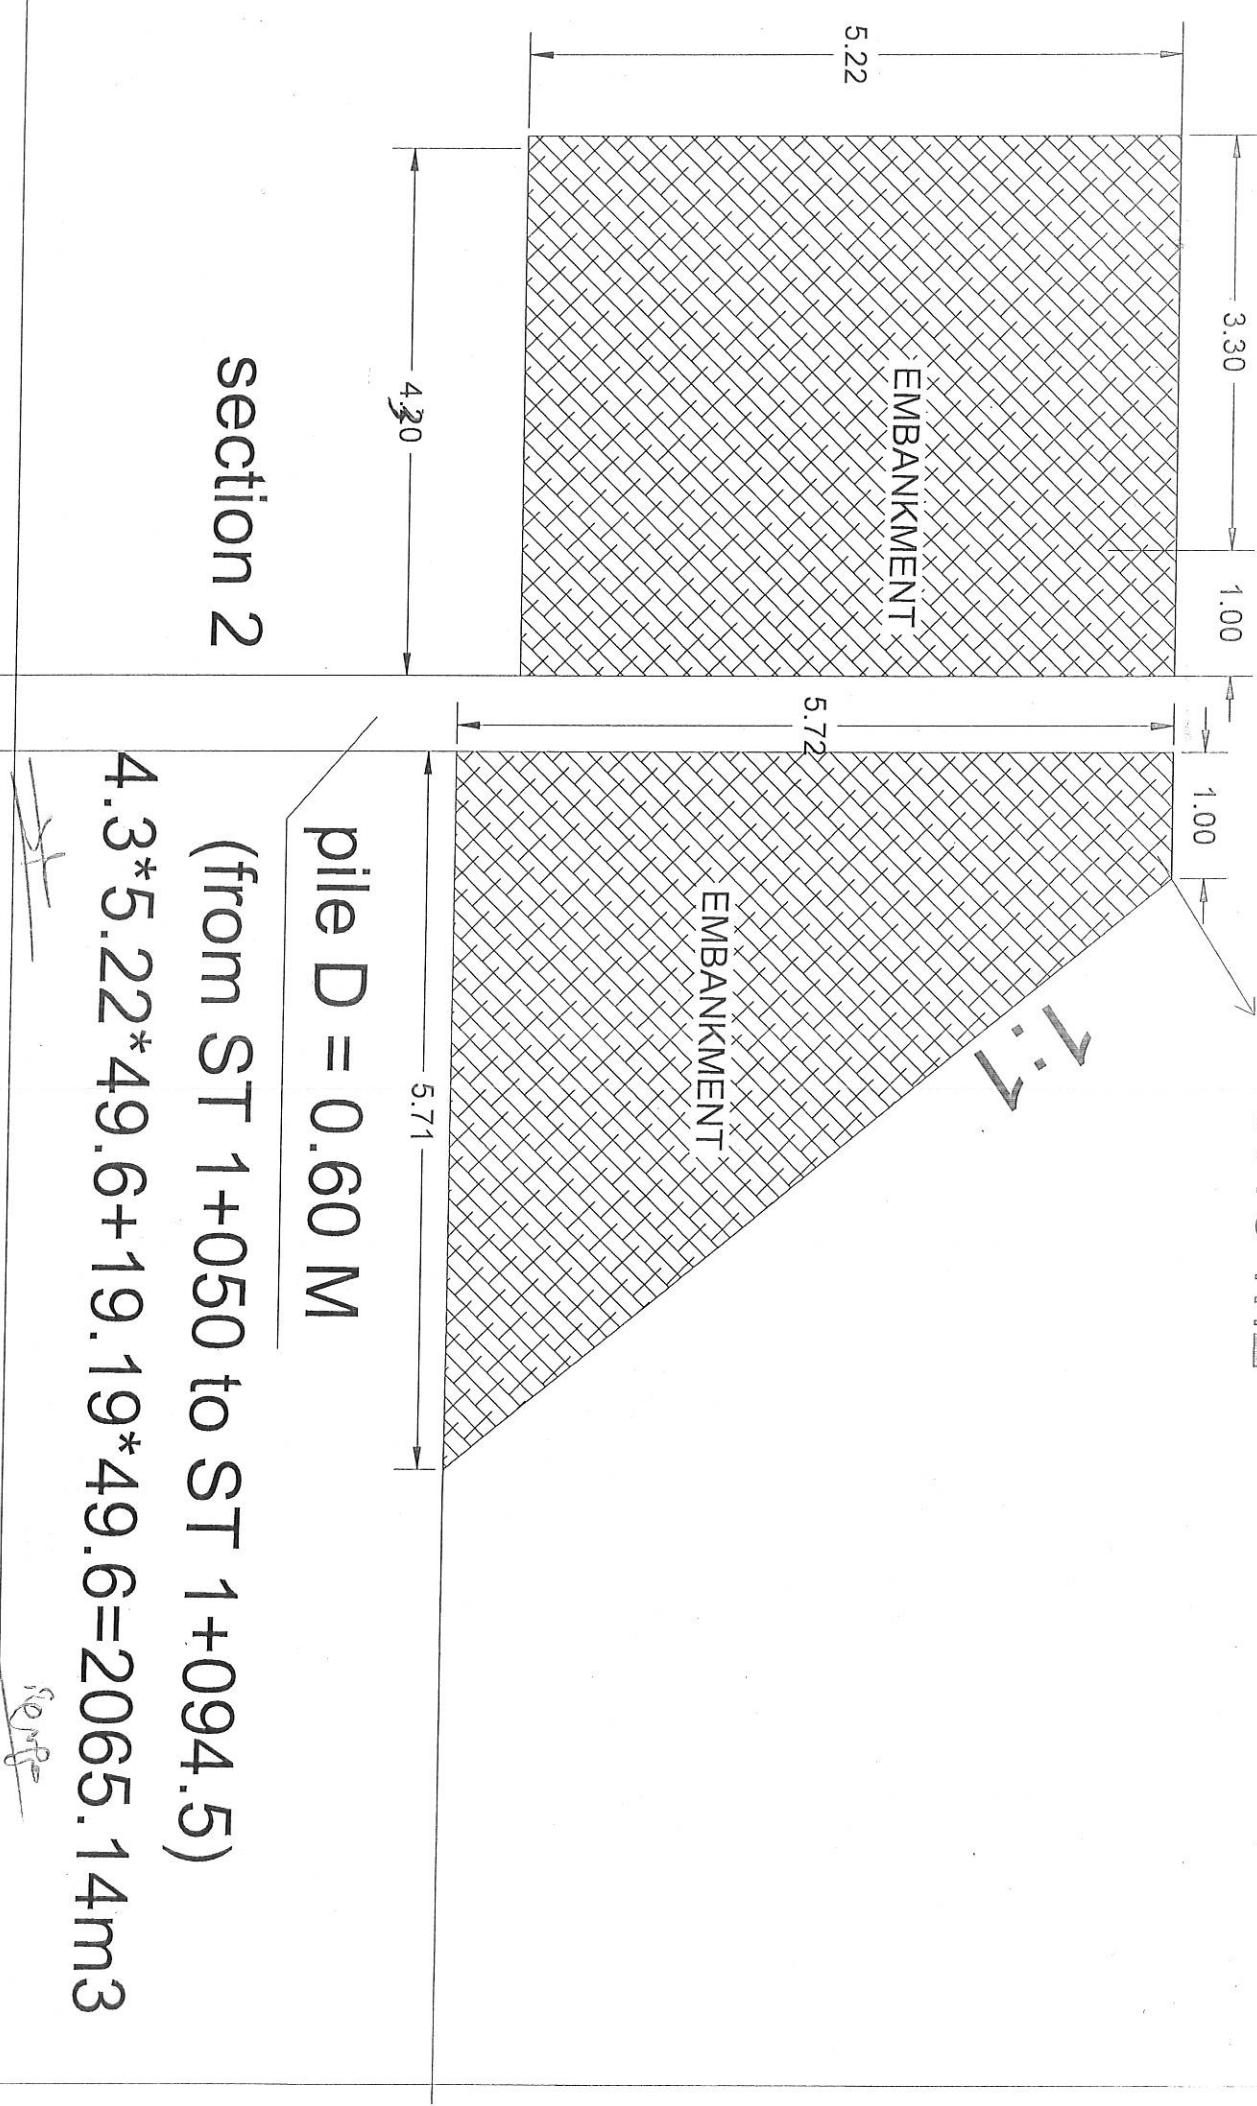

$$\text{area} = 19.19 \text{ m}^2$$

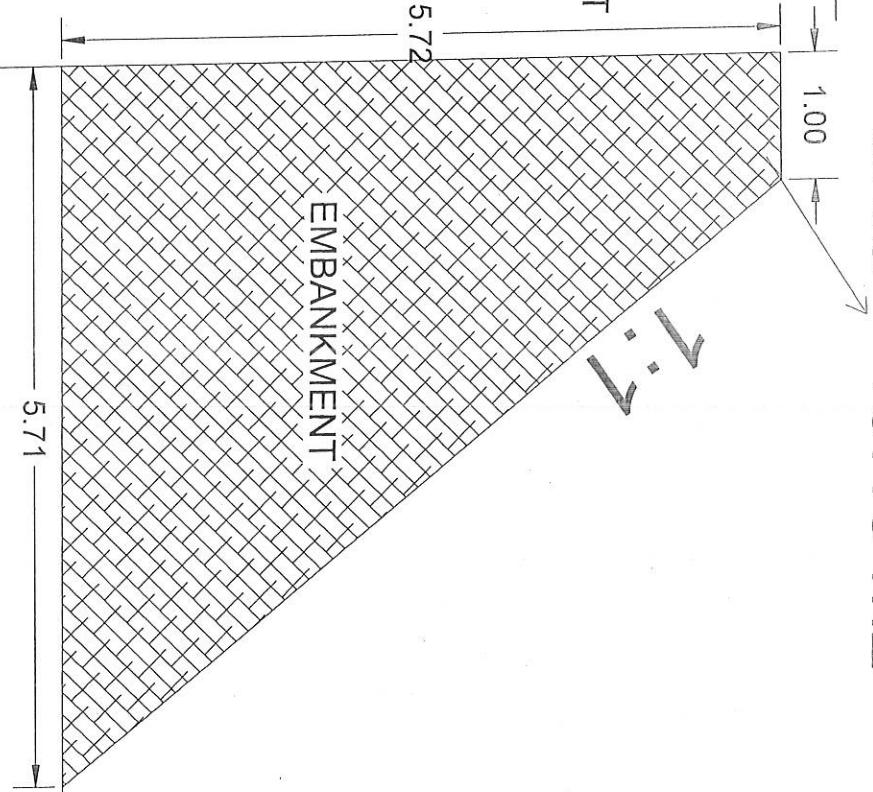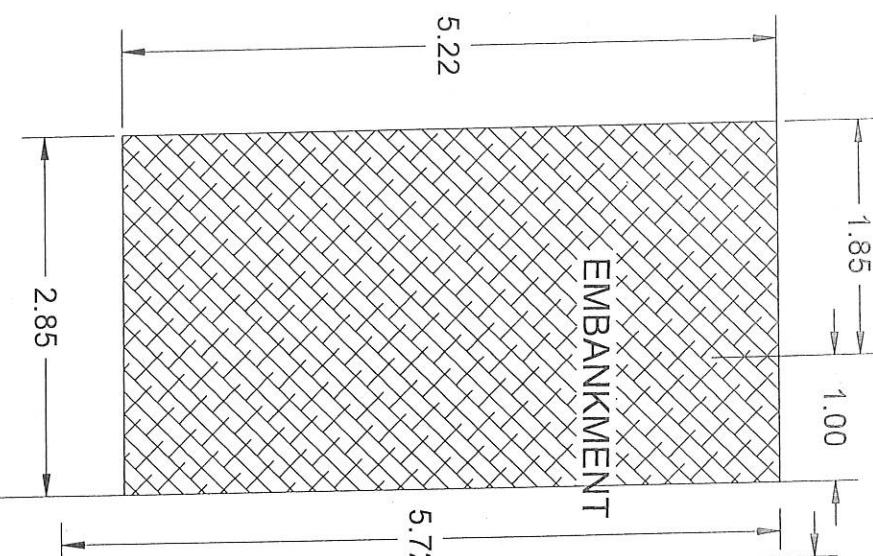

$$\text{pile D} = 0.60 \text{ M}$$

Section 3  
(from ST 1+890 to ST 1+941)

$$\begin{aligned} & 2.85 * 5.22 * 50.8 + 19.19 * 50.8 = 1730.60 \text{ m}^3 \\ & \cancel{2.85 * 5.22 * 50.8} \\ & \cancel{19.19 * 50.8} \\ & 1740.98 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

3.00

00021

R250±339±1295  
340

0.15

① 15216 N:1 L:0000

0.15


0.15

00022

15.00

15.00

A



حصر تسليح كمرة طول ٢٧,٧٣ م

البيان الاعمال	م	القطر Ø	العدد الكلى	طول السبيخ (م)	الطول الكلى (م)	وزن ط / م كجم / م	الوزن الكلى كجم	اجمالي الوزن (طن) ملحوظات
حديد رئيس	1	١٦	١٤	١٢	١٦٨	١,٥٨٠	٧٦٥	حديد رئيس
حديد رئيس	1	١٧	١٤	١٢	١٦٨	١,٥٨٠	٧٦٥	حديد رئيس
حديد رئيس	1	١٦	١٤	٦	٨٤	١,٥٨٠	١٣٣	حديد رئيس
كانة رئيسية	3	١٠	١٦٨	٢,٤	٤٠٣,٢	٠,٦١٧	٦٤٨,٨٨٩	كانة رئيسية
كانة رئيسية	4	١٠	١٦٨	١,٧١	٢٨٧,٢٨	٠,٦١٧	١٧٧,٣٣٣	كانة رئيسية
طن	1					١,٠٩٠		وزن الخازوق الواحد بالطن

مهندس الشركة


التوقيع / PM

مهندس الهيئة

التوقيع /           


الاسم /           

الاسم /

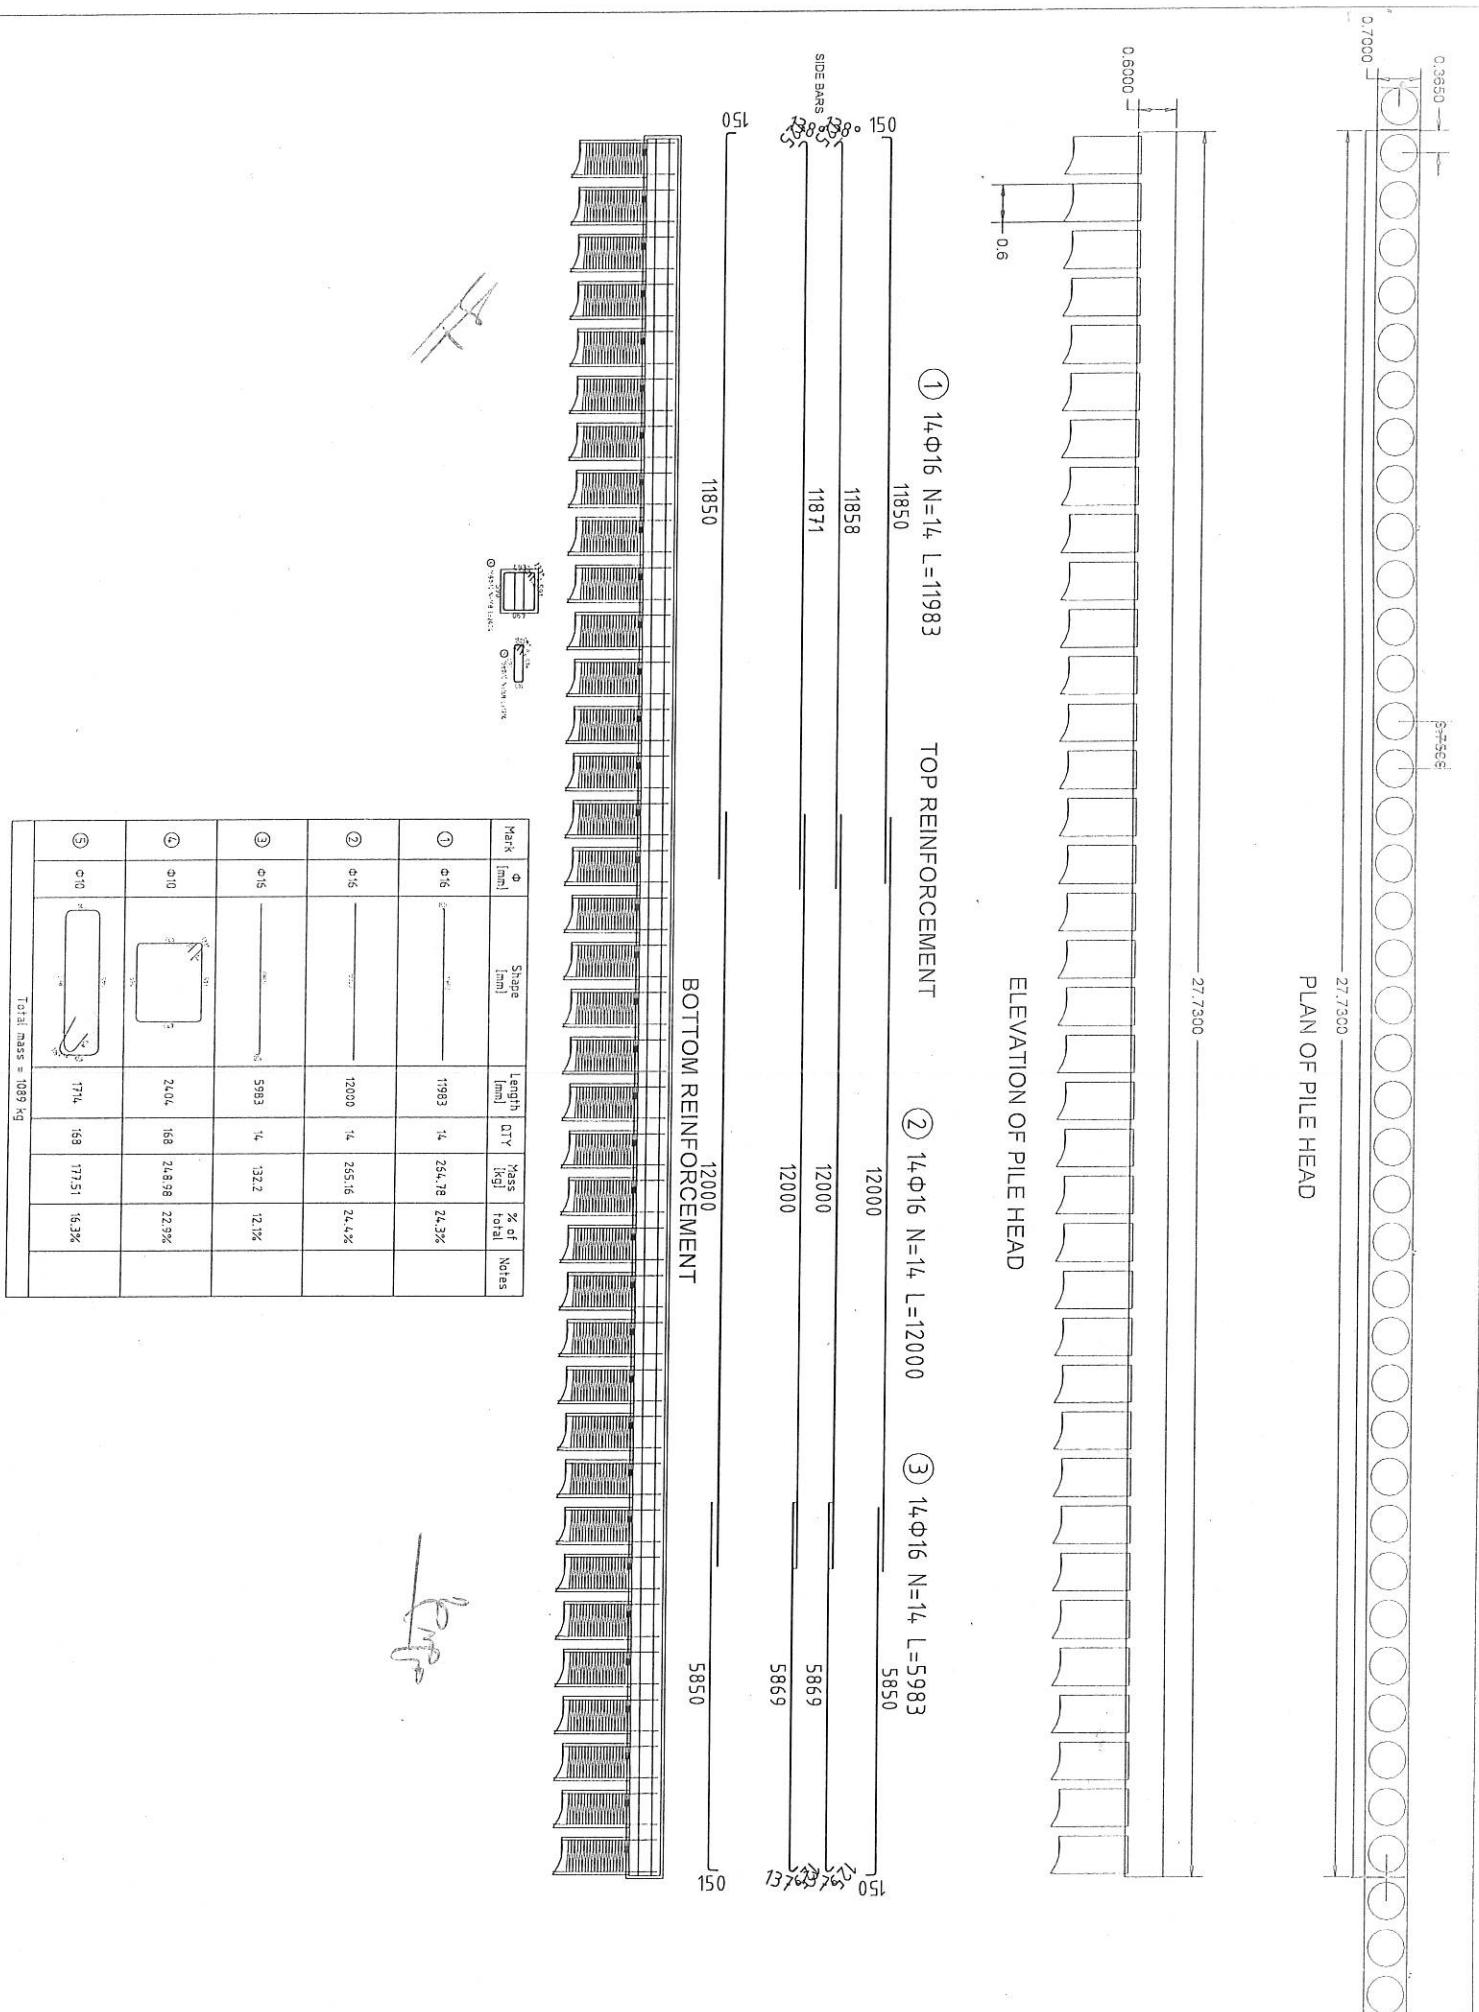



الطبقة العامة  
للطريق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)



### حصر تسليح كمرة طول ٢٧,٧٣ م

بيان الاعمال	م	القطر Ø	العدد الكلي	طول السبيخ (م)	الطول الكلي (م)	وزن م.ط / م كجم	الوزن الكلي كجم	اجمالي الوزن (طن) (طن) ملحوظات
حديد رئيسي	1	١٦	١٤	١٢	١٦٨	١,٥٨٠	٧٦٠	حديد رئيسي
حديد رئيسي	1	١٦	١٤	١٢	١٦٨	١,٥٨٠	٧٦٠	حديد رئيسي
حديد رئيسي	1	١٦	١٤	٦	٨٤	١,٥٨٠	١٣٣	حديد رئيسي
كائنة رئيسية	3	١٠	١٦٨	٢,٤	٤٠٣,٢	٠,٦١٧	٧٤٨,٨٨٩	كائنة رئيسية
كائنة رئيسية	4	١٠	١٦٨	١,٧١	٢٨٧,٢٨	٠,٦١٧	١٧٧,٣٣٣	كائنة رئيسية
طن	1,٠٩٠							وزن الخازوق الواحد بالطن

مهندس الهيئة

التواقيع /


الاسم /

مهندس الشركة


التواقيع /

الاسم /

PLAN OF PILE HEAD




ELEVATION OF PILE HEAD



11850                                  12000                                  5850

BOTTOM REINFORCEMENT



Mark	$\Phi$ [mm]	Shape [mm]	length [mm]	G/TY [kg]	% of Total	No's
①	Φ16		11983	14	254.78	24.3%
②	Φ16		12050	14	265.16	24.4%
③	Φ16		5983	14	322.12	12.1%
④	Φ10		24.04	168	246.98	22.9%
⑤	Φ10		17.14	168	177.51	16.3%

Total mass = 1089 kg

تقرير رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥  
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعمليّة / معالجة الانهيارات بطريق الاقصراينا /  
السباعية الزراعي الغربي  
تنفيذ / شركة ايه جى ار انترناشيونال

## السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة ايه جى ار انترناشيونال

تحية طيبة — وبعد،،

نشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار صلاحية عينات اتربه	٤١٩-٤١٨

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

٤٦٤٠	قيمة إجراء التجارب
٦٤٩.٦	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
٥٢٨٩.٦	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٩ / ١٢  
في المعمل،،

مدير المعمل،،

٢٠٢٤ / ٩ / ١٢

رئيس الادارة المركزية



( عماد حسين )

تقریر رقم (۱۸۶) بتاریخ ۲۰۲۴/۹/۵

**بخصوص /نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
عملية/معالجة الانهيارات بطريق اسنا /السباعيه الزراعي الغربي  
تفايز/شركة اى جي ار انترناشيوナル**

حضرت العينة بمعرفة المهندس / عبد الرحيم محمد حسين

حدود المواصفات	٤١٩	٤١٨	أرقام العينات
	ارتفاع ردم	المسافة بين كوبرى الخزان وكوبرى ابو حميد	الطبقة المختبرة
	١٠٠	١٠٠	"٢٥
	١٠٠	٩٢	"٢
	٨٥	٧١	"١.٥
	٦٩	٦٥	"١
	٦٠	٦٢	"٤/٣
	٤٦	٥٤	"٨/٣
	٤٠	٤٩	رقم ٤
	٣٨	٤٣	رقم ١٠
	٢٥.٣	٢٨.٦	رقم ٤٠
	٥.٢	٥.٩٨	رقم ٢٠٠
—	%٥	%٥	نسبة المياه الملاينة
—	٢.٢٢	٢.٢٣	أقصى كثافة جافة طن /م <sup>٣</sup>
لا تزيد عن %٢	صفر	صفر	الانسخ
لا تقل عن %١٠	%٤٨	%٥٢	C.B.R
لا تزيد عن %٣٠	صفر	صفر	د السيولة
صفر - ٨	عديمة	عديمة	مال اللدونة
—	A1-A	A1-A	مج التصنيف

٢٠٢٤/٩/١٢ تحريراً في:

فنى المعمل ، ، ،

مدير المعمل ،،،

1p





رئيس الادارة المركزية / مهندس عماد حسين

تقرير رقم (١٤٤) بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٠  
 بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي ثبتت  
 بعمليه/ معالجه الانهيارات بطريق الاقصري اسنا/  
 السباعية الزراعي الغربى  
 تنفيذ/ شركة ايه جى ار انترناشيونال

### السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة ايه جى ار انترناشيونال

تحية طيبة — وبعد،،

ننشر بان نرسل رفق هذا تقرير معملى كالاتى:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار كسر مكعبات خرسانيه	من (٥٥١) الى (٥٥٣)

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتى:-

قيمة إجراء التجارب	١٣٧٥
١٤٪ ضريبة القيمة المضافة	١٩٢,٥
المبلغ الاجمالي	١٥٦٧,٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،

٢٠٢٥ / ٤ / ٢٨  
 في المعلم،،

مدير المعلم،،  
 ٦١٢

رئيس الإداره المركزية

( عماد حسين )

مهندس/



تقرير رقم (١٤٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨

بخصوص نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
عملية/معالجه الانهيارات بطريق اسنا/ السباعيه الزراعي الغربى  
تنفيذ / شركة ايه جى ار انترناشونال

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمد عبدالستار (مهندس الهيئة)


الموقع الكميو مترى	كمرا رابطة فوق الخوازيق قطاع(٣)		
تاريخ الصب	٢٠٢٤/١٢/٣١		
تاريخ الكسر	٢٠٢٥/٤/٢٩		
نوع الخرسانة	خرسانه مسلحه(خوازيق)		
أرقام العينات	٥٥٣	٥٥٢	٥٥١
جهد الكسر	٣٩٤	٤١٢	٤٠٣
متوسط جهد الكسر	٤٠٣		
حدود المواصفات	لا يقل عن (٣٠٠) كجم/سم ٢ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب		

تحريرا في : ٢٠٢٥/٤/٢٩

في المعلم

رئيس الإداره المركزية

عماد حسين



مدير المعلم

٢٠٢٥/٤/٢٩

عبدالنبي عوض عثمان

Signature of Abd Al-Naby Awad Osman



المنطقة الثامنة بـ  
GARBLT (النقل البري والطياري) - البيئة العامة

**مشروع / أعمال معالجة الانهارات لمسافات متفرقة طريق الأقصر / اسنا السبعية الزراعي الغربي بطول .٣٠٠ م.م محافظة الأقصر**



www.east-easy.com

مهندس الشركة


3



مشروع / أعمال معالجة الإزهارات لمسافات متفرقة طبقاً الأقصر / استئنافية الزراعي الغربي بحلول  
 ٣٠٠ م.ط محافظة الأقصر

البيئة العامة  
 (GARBLT)  
 وزارة النقل  
 (الخططة الشائكة بفتحها)

نوع الحجز	مكعبات الخرسانة	بيان العمل						نوع الحجز
		الإجمالي	إضافة	خصم	غير	غير	الموقع الكيلومترى	
من	إلى						الكمية	
قطاع ١ (من كوبوري خزان استنا باتجاه القاهرة)	٢٧,١٣	٠,٦٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٨٦	٠,٦٤	٠,٦٤	٢٠٠٠
قطاع ٢ (من كوبوري خزان استنا باتجاه القاهرة)	٢٠,٨٣	٠,٦٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٦٦	٠,٦٤	٠,٦٤	١٤٠٠
قطاع ٣ (من كوبوري خزان استنا باتجاه القاهرة)	٢١,٤١	٠,٦٠	٠,٧٠	٠,٥٠	٠,٦٨	٠,٥١	٠,٥١	١٤٠١
الاجمالي								٦٩,٤٣



مهندس الشركة

محمد

مهندس المهمة

محمد




卷之三

الطباطبائي  
الطباطبائي  
الطباطبائي  
الطباطبائي

**مشروع / أعمال معالجة الانهياارات لمسافات متفرقة طريق الاقصر / اسنا السبعية الزراعي الغربي**  
**بطول .٣٠٠ م.ط محافظة الاقصر**

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

- 1 -



www-agir-egypt-com  
C O M P A N Y T R A D E A G I R

**مشروع / أعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة طبقاً للأقصر / إسنا السبعية الزراعي  
الغربي بطحون .٣٠ م.ط محافظة الأقصر**

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية  
المختصة بالابتكار والتكنولوجيا

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

1987



**AGIP** INTERNATIONALE  
[www.agip-egypt.com](http://www.agip-egypt.com)


**مشروع / أعمال معالجة الأنهار لمسافات متفرقة طريق الأقصر / اسنا السبعية الزراعي الغربي بطول ٣٠٠ م.ط محافظة الأقصر**

مكتبة الفيل  
المختصة الشاملة بـ

مهندس الشركة

~~Steve~~

مهندس البيئة





Gebalco Misr Company  
For Ready Mix Concrete  
Quality Department  
Nagh Hamady plant

### Compressive Strength Report

Project	أعمال معالجة الأزهيرات لمسافة من طريق استا السبعية الزراعي بطول 300 متر طولي محافظة الإسكندرية من طريق الأزهيرات
Owner	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الثانية - قنا

Consultant	المنطقة الثانية - قنا
Contractor	A G R انترنشنال

Date of Casting	31-12-24
Date of testing	07-01-25

Strength	300
Cement Content	350

Type of Cement	SRC
Element	الحمراء الارابطة للخوازيق قطاع 1,2,3

Dimension of Mold	15*15*15
Serial Number Of Sample	29 m <sup>3</sup>

Cube No	Age Day	Weight Kg	Average Density T/m <sup>3</sup>	Average Loading KN	Average KN/cm <sup>2</sup>	Average Kg/cm <sup>2</sup>	Average MPA/cm <sup>2</sup>	Average MPA/cm <sup>2</sup>	Average Ton/cm <sup>2</sup>	Strength %	Average Percentage %	Remarks
1	8.365	2.48	2.48	663	300.3	30.0	0.30	0.30	0.30	102	102	
2	8.345	8.369	2.47	686	674.7	310.8	305.6	31.1	30.6	0.31	0.306	
3	8.396	2.49	2.48	675	305.8	30.6	0.31	0.31	0.31			

QC Engineer  
Mohamed Hossien





Gebalco Misr Company  
For Ready Mix Concrete  
Quality Department  
Nagh Hamady plant

### Compressive Strength Report

Project	أعمال معالجة الإسمنت لمساحة الارضي بطول 300 متر طولياً محدثة الأنصار									
Owner	استاذ السعيدية الزراعي - قدا									
Consultant	المهندسة العامة للطرق والجسور - قدا									
Contractor	المهندسة العامة للطرق والجسور - قدا									
Date of Casting	A G R انرسوتال									
Date of testing	13-01-25									
Strength	20-01-25									
Cement Content	300									
Type of Cement	350									
Element	SRC									
Dimension of Mold	الكرة الرابطة للخرازق قطاع 1,2,3									
Serial Number Of Sample	15*15*15									
	24 m <sup>3</sup>									

Cube No	Age Day	Weight Kg	Average T/M3	Average Density KN	Average Loading KN/cm2	Average Strength Kg/cm2	Average Strength Kg/cm2	Average Strength MPa/cm2	Average Strength MPa/cm2	Average Strength Ton/cm2	Average Strength Ton/cm2	Percentage %	Remarks
1	8.412	2.49	666	301.7	30.2	0.30							
2	8.368	2.483	686	674.0	310.8	305.3	31.1	30.5	0.31	0.305	102		
3	8.369	2.48	670	303.5	30.4	0.30							

QC Engineer

Mohamed Hussein



**Gebalco Misr Company**  
**For Ready Mix Concrete**  
**Quality/Department**  
**Nach Hamady plant**

Compressive Strength Benefit

<b>Project</b>	أعمال معالجة الانهيارات لمسافة متقرة من طريق استناد المسابعية الزراعي القديم بطول 300 متر طولي محافظة الإقتصاد
<b>Owner</b>	المديرية العامة للطرق والجسور والنقل البري المنطقة الثالثة - قنا
<b>Consultant</b>	المدينة الثالثة - قنا
<b>Contractor</b>	A G R انترناشونال
<b>Date of Casting</b>	
<b>Date of testing</b>	16-01-25
<b>Strength</b>	23-01-25
<b>Cement Content</b>	300
<b>Type of Cement</b>	350
<b>Element</b>	SRC
<b>Dimension of Mold</b>	12,3 زراعية قطاع المقدمة الرابطة للمواد
<b>Serial Number Of Sample</b>	15*15*15
	<b>25.5 m<sup>3</sup></b>

Cube No	Age Day	Weight Kg	Average Density T/M3	Average Loading KN	Average Strength Kg/cm2	Average Strength Kg/cm2	Average Strength MPa/cm2	Average Strength MPa/cm2	Average Strength Ton/cm2	Average Strength Ton/cm2	Percentage %	Remarks
1		8.396	2.49	673	304.9		30.5		0.30			
2	7-Day	8.349	2.47	678	677.7	307.1	30.7	30.7	0.31	0.307	102	
3		8.423	2.50	682	308.9		30.9		0.31			

Mohamed Hussien

**Mohammed Hussien**  
QC Engineer



Gebalco Misr Company  
For Ready Mix Concrete  
Quality Department  
Nagh Hamady plant

### Compressive Strength Report

Project	أعمال معالجة الإسفلات المسافرات من طريق اسنا السبعية الزراعي الغربي بطول 300 متر طولى محافظة قنا									
Owner	البيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقه الثامنه - قنا									
Consultant	المنطقة الثانة - قنا									
Contractor	الترنشونال A G R									
Date of Casting	31-12-24									
Date of testing	28-01-25									
Strength	300									
Cement Content	350									
Type of Cement	SRC									
Element	الكرة الرابطة لتفريغ قطاع 1,2,3									
Dimension of Mold	15*15*15									
Serial Number Of Sample	29 m <sup>3</sup>									

Cube No	Age Day	Weight Kg	Average T/m3	Average Loading KN	Average Strength KN/cm2	Average Strength Kg /cm2	Average Strength Kg /cm2	Average Strength MPa/cm2	Average Strength MPa/cm2	Average Strength Ton/cm2	Average Percentage %	Remarks
1	8.432		2.50	763	345.6	345.6	34.6	0.35	0.35	117		
2	28-Day	8.419	8.429	2.49	772	349.7	349.6	35.0	35.0	0.35	0.350	
3		8.436		2.50	780	353.3	353.3	35.3	35.3	0.35		

QC Engineer  
Mohamed Hassien





Gebalco Misr Company  
For Ready Mix Concrete  
Quality Department  
Nagh Hamady plant

### Compressive Strength Report

Project	تمرين طوي محفظة قا									
Owner	أعمال ملحة الإلهمارات لمسافرات السباعية الزراعي الغربي بحلول 300 نسـ طـريـ قـا									
Consultant	المهـنـيـةـ العـالـمـةـ للـطـرقـ وـالـكـبـارـيـ وـالـتـاقـ البرـيـ المنـظـقـةـ الـثـامـنـةـ -ـ قـاـ									
Contractor	الـمـنـذـقـةـ الـثـانـيـةـ -ـ قـاـ									
Date of Casting	A G R تـشـوـتـالـ									
Date of testing	13-01-25									
Strength	10-02-25									
Cement Content	300									
Type of Cement	350									
Element	SRC									
Dimension of Mold	الكرة الاباطنة الخرازق قطاع 15*15*15									
Serial Number Of Sample	24 m <sup>3</sup>									

Cube No	Age Day	Weight Kg	Average Density T/m <sup>3</sup>	Average Loading KN	Average Strength Kg/cm <sup>2</sup>	Average Strength Kg/cm <sup>2</sup>	Average Strength MPa/cm <sup>2</sup>	Average Strength MPa/cm <sup>2</sup>	Average Strength Ton/cm <sup>2</sup>	Percentage %	Remarks
1	8.428	2.50	776	351.5	35.2	0.35					
2	8.397	8.404	2.49	789	357.4	354.9	35.7	35.5	0.36	0.355	118
3	8.388	2.49	785	355.6	35.6	0.36					

QC Engineer

Mohammed Hussien



Gebalco Misr Company  
For Ready Mix Concrete  
Quality Department  
Nagh Hamady plant

### Compressive Strength Report

Project	أعمال معالجة الإسفلات مقرقة من طريق استا السبعية الزراعي الغربي بطول 300 متر طولي محافظة قنا									
Owner	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنفذة للشuttle - قنا									
Consultant	المنفذة الشuttle - قنا									
Contractor	A G R الترانشونال									
Date of Casting	16-01-25									
Strength	13-02-25									
Cement Content	300									
Type of Cement	350 SRC									
Element	1,2,3 الكرة الاربطة للخوازيق قطاع 15*15*15									
Dimension of Mold	25.5 m <sup>3</sup>									
Serial Number Of Sample										

Cube No	Age Day	Weight Kg	Average T/M3	Average Loading KN	Average Strength Kg /cm2	Average Strength Kg /cm2	Average Strength MPa/cm2	Average Strength MPa/cm2	Average Strength Ton/cm2	Percentage %	Remarks
1	8.433	2.50	793	359.2	35.9	0.36					
2	28-Day	8.396	2.49	784	355.2	35.5	35.6	0.36	0.356	119	
3		8.389	2.49	786.3	356.2				0.35		
				782	354.2						

QC Engineer  
Mohamed Russien

