

البيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



ادارة المركبة لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
ادارة العقود
ملف رقم : ٢٠١٥

محضر استلام موقع

عملية : صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشافه
(القطاع الأول والثاني) مركز شرين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم
بطول ٢,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية
ضمنمبادرة الرئاسيةحياة كريمة

تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بناء على العقد رقم ٩٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 بالأمر المباشرخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- * المهندس / محمد هاشم على مدير المشروع
- * المهندسة / أسماء صلاح مهندسة المشروع
- * السيد / وليد حمدى محمد عطية مكتب الوليد للمقاولات العامة

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ٢١ / ١ / ٢٠٢٤ والمرور على العملية المذكورة وقد اتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعيق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢١ / ١ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إسلام الموقع وبدء التشغيل .

وغيره لا يضر منا بذلك ،،،

التوقيعات

المهندس / وليد حمدى محمد عطية

المهندس / محمد هاشم على

المهندسة / أسماء صلاح

رئيس الادارة المركزية

مهندس / كمال

سلوى سامي صالح



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٥ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

بالإحالـة إلى المستخلص رقم { ١ } جاري عن عملية صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة
القطاع الأول والثاني مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم " حياد كريمة " .

عقد رقم ٩٦٢ / ٢٠٢٢ . ٢٠٢٤

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بان تجهيزات الموقع والمعلم متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد
عدد (٢٠) كرتونة ورق مركز المعلومات ولا توجد أي محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتهنئوا مباحثتكم بقبول ماذن الاحترام ...

تحرير في : ٢٠٢٤ / ٦ / ٥

رئيس الإدارة المركزية





مقاييس متجدد بعد التفاوض لعملية صيانة ورفع كفالة طريق ابو جلال الفشائش (القطاع الاول والثاني) مركز شرين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الرقم	الكتلة	الرقم	الكتلة	الرقم	الكتلة	الرقم	الكتلة
٣٢٩٧	١	٣٠	٣٥٢٨٩٩,٧	٣١	٦٨	٥٠٥٢٨٩٩,٧	٦٣
١٥٠٠	٢	٣٠	٣٩٨,٥٥	٣٧	٢٦٥	٣٩٨,٥٥	٣٧
١٧٧١	٣	٣٠	١٩-٥٢٤,١٨	٥٨	١٠٧	١٩-٥٢٤,١٨	٥٨
١٠٩٣	٤	٣٠	٥٧٢٥٦٨٠,٥	٨٥	٥٢٣	٥٧٢٥٦٨٠,٥	٨٥
٢٠٠٠	٥	٣٠	٧١٢...	٧٠	٢٠	٧١٢...	٧٠
٢٠٠٠	٦	٣٠	٤١٨...	-	٢٠٩	٤١٨...	-

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مقاييس متجدد بعد التفاوض لعملية صيانة ورفع كفالة طريق ابو جلال الفشاده (القطاع الاول والثانى) مركز شرين محافظة الدقهلية يطول ٤ كم ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رقم فاتورة	المقدمة	الوحدة	القيمة	الوصف
رقم فاتورة	المقدمة	الوحدة	القيمة	الوصف
٢٠٨٠٠	٤٤٠٠	- طن	٧	أعمال توريد وتوصيب ورصف صلب التسلیح (١٠/٤٠) لزوم جمع العناصر الإنسانية و السعر يشمل التنطبع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمدات الازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة بالعلن
٢٠٩٠٠	٥٥٠	- عدد	٣٨	بالعدد اعمال رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفريش الخاصة بالمارافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ما يتراوح لتهو العمل بالعدد .
٧٥٢١٠٠	٣٠٠	- كم	٢٥٠٧	بالكمتر المكمب خرماتة عادي للحوائط السائلة للطريق لزوم اعمال التوسعة او مصالحة اماكن الانهياـت مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط الدهن ميكانيكي وعالي الانقل المقادمة للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٢٥٠ كجم / س٢ بمحظى اسماعي ٣٠٠ كجم / م٢ استنـتـ بـورـتلـانـيـ عـادـيـ وـسـعـرـ يـشـمـلـ تـصـمـيمـ الـخـلـطـةـ وـقـوـمـ الـمـصـوـلـ على سطح اعملـ (fair face) الاسطـنـقـ الطـاهـرـ وـعـلـمـ السـدـوـدـ الـازـمـ (الـدـمـسـ) وـنـزـعـ المـيـاءـ وـسـنـدـ حـوـافـ الـحـقـرـ اذا لـزـمـ الـأـمـرـ وـرـأـةـ لـوـاتـجـ العـفـرـ وـالـدـرـمـ منـ الـمـجـرـيـ الـمـانـيـ (ازالةـ الـدـمـسـ) حـلـ الـمـسـوـبـ الـتـصـمـيـنـ اوـ حـسـبـ طـبـيـعـةـ الـعـلـمـ وـلـلـكـ طـبـقـ الـمـرـوـطـ وـالـمـوـاصـفـاتـ وـتـعـاـيـنـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـالـسـعـرـ لاـ يـشـعـلـ تـورـيدـ وـتـشـفـيلـ حـدـيدـ الـتـسـلـیـحـ .
٧٠٥٠٠	٤٧٠٠	فـلـغـرـ	١٥	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB لدرف الحرف المكشوفه و البند يجمع مشتملاته و الشمير طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف و الفتنة شاملة بالعدد بحمولة ١ طن
١٥٣٠٠	٥١٠٠	فـلـغـرـ	٣	
١٩٦٤٧٢٤٨,٧٥		اجمالي قيمة المقاييس		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مقاييس متجدد بعد التفاوض لعملية صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشائه (القطاع الاول والثاني) مركز شرين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

الاجمال	قيمة الكارت		الوحدة	الكمية	%
فرش	فرش				
١٩٥٠٠	١٢	كاربات توريد وتشغيل اتربة مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ... الخ	٢م	١٥٠٠	٢
٢٧٣٢٥.	٢٥	كاربات توريد و فرش طبقة أساس نسبة تحمل كاليفورنيا عن (٨٠ %) ... الخ	٢م	١٠٩٣٠	٤
٦٠٠٠	٣	كاربات توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسطوانية يسعك ٦ سم ... الخ	٢م	٤٠٠٠	٦
٣٥٢٧٥.		اجمالي قيمة الكارتات			
١٩٩٩٩٩٩٨,٧٥		اجمالي قيمة الكارتات + المقايسة			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

رئيس الادارة المركزية



رئيس الادارة المركزية

دكتور

هشام حسان

سامي صالح

تقرير فنى لتحديد أسلوب العمل ومنهجية التنفيذ

أعمال صيانة ورفع كفاءه طريق أبو جلال الفشاشة (القطاع الأول والثانى) - مركز شرين بمحافظة الدقهلية بطول حوالى ٤ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ، تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

المقدمة

تم إعداد هذا التقرير طبقاً لطلب / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق بخصوص تحديد أسلوب العمل ومنهجية التنفيذ الخاصة بمشروع أعمال صيانة ورفع كفاءه طريق أبو جلال الفشاشة (القطاع الأول والثانى) - مركز شرين بمحافظة الدقهلية بطول حوالى ٤ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة).

الموضوع:

بالمراور والمعاينة للطريق القائم بمعرفة مندوب الهيئة والشركة المنفذة وإستشاريها وجد أن الطريق يعرض متوسط (٦-٥) متر ويوجد بعض القطاعات بها طبقات أسفلتية متراكمة كما يوجد مصرف الصهرية بطول حوالى ٤ كم على يسار الطريق وترعة أبو جلال على يمين الطريق بطول حوالى ١ كم مع وجود إنهيارات بجسم الطريق جهة المصرف بأغلب القطاع نتيجة لأعمال النحر بجسر المصرف (كما هو مبين بالصورة الفوتوغرافية مرفق ٢-١) لذلك فإن القطاع يحتاج إلى أعمال حماية لجسر الطريق جهة المصرف أو أولاً قبل البدأ في الأعمال بجسم الطريق نتيجة لتلك الإنهيارات الشديدة.

الخلاصة والرأى الفني:

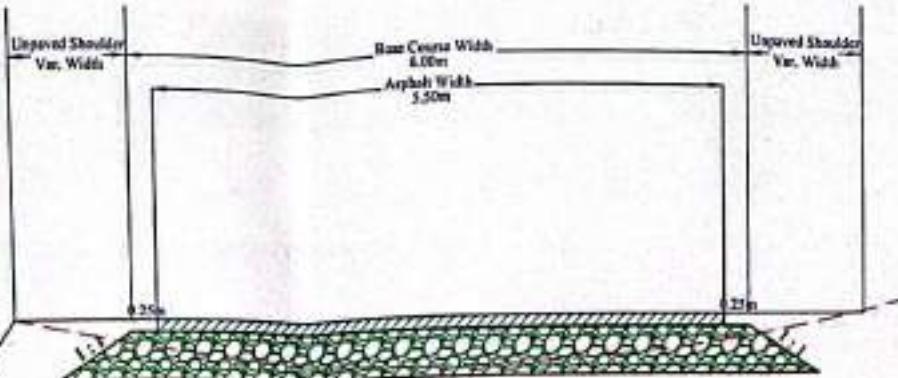
نتيجة للمعاينة على الطبيعة فإنه يمكن التوصية باتباع ما يلى عند تنفيذ الأعمال بجسم الطريق:

- ١- يتم تنفيذ أعمال الحماية اللازمة بجسر مصرف الصهرية مع مراعاه أن عرض الأسفالت المستهدف ٥،٥ متر (واماكن التوسعة المتاحة وفق رؤية جهاز الإشراف) مع مراعاه عمل رفرفة بطبقة الأسفلس بعرض ٢٥ سم من الجانبين مع وجود طبان ترابي بعرض لا يقل عن ١م بجوار الحمايات المطلوب تنفيذها.
- ٢- يتم إزالة طبقات الأسفالت المتبقية من الطريق قور الانتهاء من أعمال الحماية لجسر الطريق.
- ٣- يتم أخذ عينات من طبقة الأسفلس القديم المتبقية وتحديد سمكها وخصائصها وعمل الرفع المساحى لها.
- ٤- يتم موافقتنا بالتقارير المعملية لعمل تقرير بالتصميم الإنشائى المطلوب للطريق.

لوجيك للإستشارات الهندسية
أ/أحمد محمدى عبد الله

سجل المهندسين الاستشاريين
رقم القيد ١٢/١٥٢١ - قيد إستشاري ١/٥٩٥٤





صرف الضهرية

القطاع العرض النموذجي



البيانات المطلوبة
لبيانات التخطيط

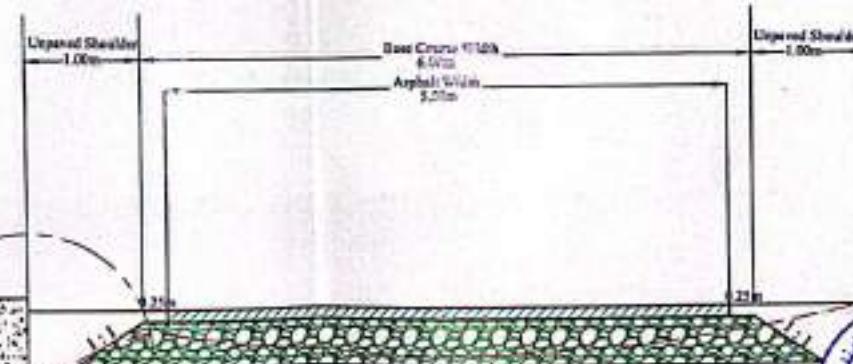
المطالع ١
أهمية مياه ونوع كثافة طبق ابر جبال
الشاطئ (القطاع العريض والضيق) مركز
شرين سمالوط الدلتانية وطول مسالك كم
(ضمن معايرة موافقة كريون)

المطالع ٢
مكتب الوارد للنقلات ورصف الطرق

المطالع ٣
LOGIC
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د. أسماء محمد عبد الله

المطالع ٤
Typical Cross Section
NG-T.C.S رقم الملوحة:
000.2023 التاريخ:

تمهيد: Eng/Mazen Alsaad
مراجعة: Eng/Abd Elrahman
اعتماد: Dr/Ahmed Mohamedy
نطاق: N.T.S
بيانات الكرة: ISO - A3
بيانات القراءة:



منطقة الانهيارات

صرف الضهرية

القطاع العرض النموذجي بمنطقة الانهيارات

حاجط خرسانية عادية



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

ادارة المعامل وضبط الجودة



اسم المشروع صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشائه "حياة كريمه"

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١١٤) لسنة ٢٠٢٤

وردت بتاريخ : ٢٠٢٤/٥/٢

بيانات ادارية : قام بالصب واحتضار العينات : م / اسماء صلاح

بيان العينات : عدد (١٢) مكعب خرسانه والتفاصيل بالجدول المبين :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٧٤ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع المترسنه	تاريخ الصب	رقم النصف	الوزن (كيلو)	الارتفاع (سم)	جودة الكسر (الجودة)	متوسط جوده الكسر	نوع التسر	ملحقات
خرسانه مسلحة خدمات الحاط البلد ك ٠٥٧٠	٢٠٢٤/٥/٢٧	١	٨٧٤٠	١٥٦١٥٤١٥	٢٧٤	٢,٤٤٣	٢٧٧	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨٦٦٥	١٥٦١٥٤١٥	٢٧٥	٢,٤٣٩	٢٧٧	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٣	٨٦٢٥	١٥٦١٥٤١٥	٢٨١	٢,٤٣٧	٢٧٧	جهد الكسر بعد ٧ أيام
خرسانه مسلحة فصيات الحاط البلد ك ٠٥٧٠	٢٠٢٤/٥/٢٨	٤	٨٦٦١	١٥٦١٥٤١٥	٣٠٨	٢,٤٣٨	٣٠٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢
		٥	٨٦٣٣	١٥٦١٥٤١٥	٣٠٧	٢,٤٣٩	٣٠٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢
		٦	٨٦٢٥	١٥٦١٥٤١٥	٣١١	٢,٤٣٧	٣٠٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢
خرسانه مسلحة فصيات الحاط البلد ك ٠٥٧٠	٢٠٢٤/٥/٢٨	٧	٨٣١٠	١٥٦١٥٤١٥	٢٨٣	٢,٤٤٢	٢٨٤	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٨	٨٣٩٩	١٥٦١٥٤١٥	٢٨٤	٢,٤٤٣	٢٨٤	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٩	٨٣٦٦	١٥٦١٥٤١٥	٢٨٥	٢,٤٤١	٢٨٤	جهد الكسر بعد ٧ أيام
خرسانه مسلحة فصيات الحاط البلد ك ٠٥٧٠	٢٠٢٤/٥/٢٧	١٠	٨١٦١	١٥٦١٥٤١٥	٣١١	٢,٤٣٨	٣٠٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢
		١١	٨٢١٠	١٥٦١٥٤١٥	٣١٢	٢,٤٣٣	٣٠٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢
		١٢	٨٣٠٦	١٥٦١٥٤١٥	٣٠٥	٢,٤٤٢	٣٠٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢

يتم الرجوع الى ملف العينة لمقارنة النتائج.

ملحوظة / العينات مسؤلية من احضرها .

قام بالكسر : / / سعيد طه .

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسير مكعب	١٢	١٦٧	٢٠٠٤
خرسانه			١٥١
م. اعداد تقرير			٢١٥٤
قيمة التجارب			٣٢٢,١٠
%١٥ م.			٣٤٦,٨
%١٠ ض.م			٤٨٢٢,٩
الاجمالي			

تحرير في: ٢٠٢٤/٥/٢٧

مهندس العمل / زهاد كر

رئيس الادارة المركزية

مهندس / ناصر ابراهيم

سفيان صالح

مدير العمل

مهندس / حسام

مختار السيد عبد الله

الادارة المركزية
الدقهلية والشرقية

الفحص

جهازه المركبة لمنطقة شرق الدلتا
 (الشرقية - الدقهلية)
 إدارة المعامل وضبط الجودة



رصف طريق ابو جلال / الفشاده القطاع الاول و الثاني (حياة كريمه)

اسم المشروع : الويلد للمقاولات

تنفيذ شركة :

تقرير معتمد رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٩

قام باحضار العينات : / هشام منصور

عدد (٨) عينات دمك طبقة اساس اسفل تكسير من موقع مختلفة .

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م³ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الثافة الجافة طن / م ³	الموقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	٤,٧	٢,٢٠	طبقة الاساس اسفل تكسير
	٩٨	٤,٩	٢,١٨	ك ١ بین
	٩٨	٤,٦	٢,١٧	ك ٢٠٠ شمال
	٩٩	٤,٥	٢,٢١	ك ٣٥٠ بین
	٩٩	٤,٦	٢,٢٠	ك ٣٠٠ شمال
	٩٨	٤,٧	٢,١٨	ك ٣٥٠ بین
	٩٩	٤,٥	٢,٢٠	ك ٤٠٠ شمال
	٩٨	٤,٦	٢,١٨	ك ٤٥٠ شمال

الدمك متقارب بالموقع .

البروكتور المستخدم لطبقة الاساس اسفل تكسير ٢,٢٢ طن / م³ و نسبة المياه الملازمة ٧,٥ %

ملحوظة / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
١٠٤٠	٢٠٥	٨	عينات دمك
١٥٠			م. اعداد تقرير
٤١٩٠			قيمة التجارب
٦٢٨,٥			% ١٠ .١ م
٦٧٤,٦			% ١٤ .٣ نق.م
٥٤٩٣,١			الاجمالي

تحرير في: ٢٠٢٤/٥/٠١

ممثل العمل / زمام محمد سر

مدير العمل

- مهندس / مختار السيد عبد الله

٩٢٩
٢٠٢٤/٥/١٨

رئيس الاداره المركبه
 مهندس / سلوى سامي صالح

مركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
ادارة المعامل وضبط الجودة



المشروع: رفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشائه (القطاع الاول والثان) حياء كريمه
تنفيذ شركة: الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية: قام بالصب واحضار المكعبات : م/ اسماعيل صلاح
بيان العينات: تاريخ : ٢٠٢٤/٤/١٥
عدد (١٢) مكعب خرسانه مسلحه قصبات الحالط السائد والتفاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر	جهد الكسر (كم/سم²)	الكتلة (كم³)	الارتفاع (سم)	اللون (كم)	رقم المكعب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٩٠٠ كجم / سم²	٢٠٢٤/٠٥/١	٢٧٢	٢٧٢	٢,٣٩١	١٥٠١٥٠١٥	٨٠٦٩	١	خرسانه مسلحه قصبات الحالط السائد ٨,١٠٠ ك
			٢٧٠	٢,٣٦٩	١٥٠١٥٠١٥	٧٩٩٥	٢	
			٢٧٧	٢,٤٠٩	١٥٠١٥٠١٥	٨١٣٢	٣	
			٢٧٣	٢,٣٨٣	١٥٠١٥٠١٥	٨٠٤٢	٤	
			٢٧٤	٢,٣٦٦	١٥٠١٥٠١٥	٧٩١١	٥	
			٢٧٦	٢,٣٦٦	١٥٠١٥٠١٥	٨١٢٠	٦	
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٩٠٠ كجم / سم²	٢٠٢٤/٠٥/٢	٢٧٥	٢٧٥	٢,٤٠٤	١٥٠١٥٠١٥	٨١١٢	١	خرسانه مسلحه قصبات الحالط السائد ٨,١٠٠ ك
			٢٨١	٢,٣٥٦	١٥٠١٥٠١٥	٧٩٥٣	٢	
			٢٧٦	٢,٣٣٦	١٥٠١٥٠١٥	٨٢٢٢	٣	
			٢٧٢	٢,٤١٦	١٥٠١٥٠١٥	٨١٥٣	٤	
			٢٧٢	٢,٤٣٢	١٥٠١٥٠١٥	٨٢١١	٥	
			٢٧٤	٢,٤٧٤	١٥٠١٥٠١٥	٨٣٥١	٦	

يتم الرجوع الى ملف العمله لمقارنة النتائج.

ملحوظه / العينات مسؤلية من الحضورها.

قام بالكسر : ا/ محمود صالح.

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
غير متص	١٢	١٦٧	٢٠٠٤
خرسانه			١٥٠
ا. اعداد تقرير			٢١٥٤
قيمة التجارب			٣٢٣,١٠
%١٠ م			٣٤٦,٨
%١٠ ض.م			٢٨٢٤,٩
الاجمالي			

تحرير في: ٢٠٢٤/٠٥/٢



مدير المعمل
مهندس / منذر العسوي

مدير المكتب عبد الله

رئيس الادارة المركزية
مهندس / د. محمد عاصم

ملاوى سالم صالح



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع: حسانه ورفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشاده "حياة كريمه"
تنفيذ شركة: الوليد للمقاولات

تقرير معتمد رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٤

وردت بتاريخ: ٢٠٢٤/٤/٤

قام بالصب واحضار العينات: م/ اسماعيل صلاح

عدد (١٢) مكعب خرسانه والتفاصيل بالجدول المبين:-

الاختبارات التي اجريت عليها:-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٧٤ يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ التصرب	جهد الكسر	متوسط جهد الكسر (كم/سم²)	جهد الكسر (كم/سم²)	الكتلة (كم/سم³)	الارتفاع (سم)	الوزن (كم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد ٧ أيام	٢٠٢٤/٤/٤	٤١٩	٣٢١	٢,٣٢١	١٥٤١٥٤١٥		٧٨٢٣	١	٢٠٢٤/٤/٣٠	خرسانه مسلحه قدمه الحاطن المساند
				٢,٣٢٨	١٥٤١٥٤١٥		٧٦٥٣	٢		
				٢,٣٣٤	١٥٤١٥٤١٥		٧٩٨٠	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم²	٢٠٢٤/٤/٢٨	٤٢٠	٣٢٦	٢,٣٠٧	١٥٤١٥٤١٥		٨١٦٢	٤	٢٠٢٤/٤/٣١	٨١٦٠١
				٢,٣٨١	١٥٤١٥٤١٥		٨٠٣٥	٥		
				٢,٣٦٨	١٥٤١٥٤١٥		٧٩٩٢	٦		
جهد الكسر بعد ٧ أيام	٢٠٢٤/٤/٧	٤٢٢	٣٢٥	٢,٣٠٩	١٥٤١٥٤١٥		٧٧٦٦	١	٢٠٢٤/٤/٣١	٨١٦٠٢
				٢,٣٠٠	١٥٤١٥٤١٥		٧٧٦٤	٢		
				٢,٢٦٧	١٥٤١٥٤١٥		٧٦٥٠	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم²	٢٠٢٤/٤/٢٨	٤٢٠	٣٢٨	٢,٣٢١	١٥٤١٥٤١٥		٧٨٣٢	٤	٢٠٢٤/٤/٣١	٨١٦٠٣
				٢,٣٥٤	١٥٤١٥٤١٥		٧٩٤٥	٥		
				٢,٣٥٩	١٥٤١٥٤١٥		٧٩٦٣	٦		

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقارنة النتائج.

ملحوظه / العينات مسؤلية من احضارها.

قام بالتصرب: م/ محمود صلاح.

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كمب خرسانه	١٢	١٦٧	٢٠٠٤
م. اعداد تقرير			١٠٠
قيمة التجارب			٢١٥٤
%١٥ م			٣٢٣,١٠
%١٠ ض.م			٣٤٦,٨
الاجمالي			٢٨٢٢,٩

تحريرا في: ٢٠٢٤/٤/٢٩



مهندس العمل ١ م/ محمد محمود

مدير العمل

مهندس / منا السيد

مطر السيد عبد الله

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عباس سامي صالح

١٤٢٤١٢٣٢

١٤٢٤١٢٣٢

١٤٢٤١٢٣٢



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع: صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشـاشـه "حياة كريمة"
تنفيذ شركة: الوليد للمقاولات

تقرير معتمد رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٤

وردت بتاريخ: ٢٠٢٤/٤/٤

بيان العينات: م/ اسماء صالح

عدد (١٢) مكعب خرسانه والتفاصيل بالجدول المبين:-

الاختبارات التي اجريت عليها:-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٧٧ يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر (كم/سم²)	جهد الكسر (كم/سم²)	الكتلة (كم³)	الارتفاع (سم)	الوزن (كم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد ٧ أيام	٢٠٢٤/٤/٤	٣١٩	٣٢١	٢,٣٢١	١٥٤١٥٤١٥	٧٨٣٣	٦	٢٠٢٤/٤/٣٠	خرسانه مسلحة قدمة الخلط السائل
			٣١٧	٢,٣٢٨	١٥٤١٥٤١٥	٧٦٥٣	٧		
			٣١٩	٢,٣٦٤	١٥٤١٥٤١٥	٧٩٨٠	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥ كجم/سم²	٢٠٢٤/٤/٢٨	٣٢٠	٣٢١	٢,٤٠٧	١٥٤١٥٤١٥	٨١٢٢	٤	٢٠٢٤/٤/٣١	٨١٢٠١
			٣٢٨	٢,٣٨١	١٥٤١٥٤١٥	٨٠٣٥	٥		
			٣٢٩	٢,٣٦٨	١٥٤١٥٤١٥	٧٩٩٢	٦		
جهد الكسر بعد ٧ أيام	٢٠٢٤/٤/٧	٣٢٣	٣٣٥	٢,٣٠١	١٥٤١٥٤١٥	٧٧٦٦	١	٢٠٢٤/٤/٣١	خرسانه مسلحة قصبات الخلط السائل
			٣٣٠	٢,٣٠٠	١٥٤١٥٤١٥	٧٧٦٤	٢		
			٣٣١	٢,٣٦٧	١٥٤١٥٤١٥	٧٦٥٠	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥ كجم/سم²	٢٠٢٤/٤/٢٨	٣٢٥	٣٣٨	٢,٣٢١	١٥٤١٥٤١٥	٧٨٣٢	٤	٢٠٢٤/٤/٣١	٨١٢٠١
			٣٣٧	٢,٣٥٢	١٥٤١٥٤١٥	٧٩٤٠	٥		
			٣٣٠	٢,٣٥٩	١٥٤١٥٤١٥	٧٩٦٣	٦		

يتم الرجوع الى ملف العمليه لمقارنة النتائج.
ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها.

قام بالكسر: م/ محمود صالح.

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسير مكعب خرسانه	١٢	١٦٧	٢٠٠٤
م. اعداد تقرير			١٠٠
قيمة التجارب			٢١٥٤
%١٥ م.			٢٢٢,١٠
%١٠ ض.م			٣٤٦,٨
الاجمالي			٢٨٢٣,٩

تحريباً في: ٢٠٢٤/٤/٢٩



مدير المعامل

مهندس / معاذ محمد
مدير المعامل
مطر السيد عبد الله

رئيس الادارة المركزية

مهندس / سامي سامي
سلوى سامي صالح

ثانيا :- صلاحية من ٦

المواصفات	ك .٣٠٠،٣٠٠ أساس ابتلأ تكسير	التجارب
١٠٠	١٠٠	مehr سعة " "
١٠٠-٧٠	٩٧	مehr سعة ١١,٥ " "
٨٥-٥٥	٨٣	مehr سعة " "
٨٠-٥٠	٧١	مehr سعة ٤٤/٣ " "
٧٠-٤٠	٥٣	مehr سعة ٨٨/٣ " "
٦٠-٣٠	٣٩	مehr رقم ٤
٥٠-٢٠	٢١	مehr رقم ١٠
٣٠-١٠	١٨	مehr رقم ٤٠
١٥-٥	١٠	مehr رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٩٦,٨	عديمه	مجال اللدونه %
لا يزيد عن ٤٥ %	٢٧	الصلابه %
—	٢,٢٢	القص كثافة جاهه طن/م³
—	٧,٢	نسبة المواد الملامه %
لا يقل عن ٩٦,٨	٨٠	نسبة تحمل كالبليوراتيا %
—	٢,٤٠٦	الانفصال %
—	٢,٤٨١	الوزن النوعي الكلى
—	٢,٦	الوزن النوعي متبوع جاف السطح
لا يزيد عن ١٠ %	٣,١	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ٥ %	٠,٣	الامتصاص %
—	٦	التحلل %
		نسبة السن الطبيعي %

العينات تتلقى مع حدود المواصفات العامة من حيث التدرج والتوزيع،
ملحوظة / العينات مسؤولة من الحضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية أساس	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
عينات دمك	٢	٥٠٠	١٠٠
م . اعداد تقرير			٣١٨٠
قيمة التجارب			٤٧٧,٧٥
% ١٠ . م			٥١٢,٨-
% ١١ . م			٤١٧٥,٥٥
الاجمالي			٢٠٢٤/٤/٢١
تحريرا في:			

مهندس المعمل / رماحه حمزة

رئيس الادارة المركزية

مهندس / حسام حسني
سلوى سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / هنا ناصر
منار السيد عبد الله

١٩٢٤
٤١٩٤/٢
الفحص

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الفيومية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال مستخلص جاري (١)

رقم	البلد	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	الكمية الإجمالية المنفذة
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ... الخ	٢م	7397	7390
2	أعمال توريد وتشغيل آزبة (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٦١٪) ... الخ	٢م	1500	1060
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالي ... الخ	٢م	1771	1770
4	أعمال توريد وقوش طبقة أساس ... الخ	٢م	10930	10929
٧	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسلیح [٥٢/٣٦] لزوم جمع العناصر الأتشائية ... الخ	طن	٧	5.7
٩	أعمال توريد وصب حواطط سائدة من الخرسانة العاديّة... الخ	٢م	2507	1980

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والجسور (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروعات الشرق ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - مدنية دلتاوية.
 عملية / مسيرة ورحلة تفاصيل طريق ابو جالل الشائنة (القطع الاول والثاني) بطول : 4 كم.
 تنفيذ / مكتب الوائد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

اجمالي أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند
3481.44		النطريق FROM ST. 0+000 TO ST 3+250	
1667.14		حفرة مياه FROM ST. 0+000 TO ST 3+250	
1129.94	٢٤	حفرة ماء FROM ST. 0+900 TO ST 3+250	بالعمر المكتعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عذ الاربة الصخرية وتسمية السطح بآلات التسمية وارش بالعمارة الأرضوية لتحصيل في نسبة الرطوبة المطلوبة وتدعم الحيد بالهرسات للوصول الى القمي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة المتصوی) ... الخ
920.13		حفرة صرف FROM ST. 1+175 TO ST 3+250	
192		حفرة اتصالات FROM ST. 0+550 TO ST 1+175	
7390.65		الاجمالي العام	

مهندس البناء


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن العبارة الرئيسية " حياء كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كلاء طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول : كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
12.19	0.15	6.5	12.5	0+000
26.00	0.16	6.5	25	0+025
22.75	0.14	6.5	25	0+050
19.50	0.12	6.5	25	0+075
22.75	0.14	6.5	25	0+100
26.00	0.16	6.5	25	0+125
27.63	0.17	6.5	25	0+150
29.25	0.18	6.5	25	0+175
22.75	0.14	6.5	25	0+200
19.50	0.12	6.5	25	0+225
22.75	0.14	6.5	25	0+250
27.63	0.17	6.5	25	0+275
24.38	0.15	6.5	25	0+300
27.63	0.17	6.5	25	0+325
29.25	0.18	6.5	25	0+350
17.88	0.11	6.5	25	0+375
30.88	0.19	6.5	25	0+400
30.88	0.19	6.5	25	0+425
29.25	0.18	6.5	25	0+450
30.88	0.19	6.5	25	0+475
19.50	0.12	6.5	25	0+500
24.38	0.15	6.5	25	0+525
22.75	0.14	6.5	25	0+550
27.63	0.17	6.5	25	0+575

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا).

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية.


عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول و الثاني) بطول : كم .


تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
24.38	0.15	6.5	25	0+600
26.00	0.16	6.5	25	0+625
22.75	0.14	6.5	25	0+650
19.50	0.12	6.5	25	0+675
30.88	0.19	6.5	25	0+700
27.63	0.17	6.5	25	0+725
27.63	0.17	6.5	25	0+750
29.25	0.18	6.5	25	0+775
22.75	0.14	6.5	25	0+800
21.13	0.13	6.5	25	0+825
30.88	0.19	6.5	25	0+850
27.63	0.17	6.5	25	0+875
24.38	0.15	6.5	25	0+900
26.00	0.16	6.5	25	0+925
22.75	0.14	6.5	25	0+950
19.50	0.12	6.5	25	0+975
30.88	0.19	6.5	25	1+000
24.38	0.15	6.5	25	1+025
26.00	0.16	6.5	25	1+050
29.25	0.18	6.5	25	1+075
30.88	0.19	6.5	25	1+100
17.50	0.10	7	25	1+125
33.25	0.19	7	25	1+150
33.25	0.19	7	25	1+175

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول والثاني) بطول 4 كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندرقم (١)
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
24.50	0.14	7	25	1+200
21.00	0.12	7	25	1+225
24.50	0.14	7	25	1+250
17.50	0.10	7	25	1+275
24.50	0.14	7	25	1+300
29.75	0.17	7	25	1+325
26.25	0.15	7	25	1+350
28.00	0.16	7	25	1+375
33.25	0.19	7	25	1+400
19.25	0.11	7	25	1+425
33.25	0.19	7	25	1+450
31.50	0.18	7	25	1+475
21.00	0.12	7	25	1+500
28.00	0.16	7	25	1+525
24.50	0.14	7	25	1+550
27.63	0.17	6.5	25	1+575
27.63	0.17	6.5	25	1+600
27.63	0.17	6.5	25	1+625
26.25	0.15	7	25	1+650
22.75	0.13	7	25	1+675
33.25	0.19	7	25	1+700
19.25	0.11	7	25	1+725
33.25	0.19	7	25	1+750
31.50	0.18	7	25	1+775


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والجسور (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن الميادير الرئاسية " حياد كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنـة (القطاع الاول و الثاني) بطول : كم .
 تنفيذ / مكتب الواليد للمقاولات العامة .

بنـد رقم (١)
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
22.75	0.13	7	25	1+800
24.50	0.14	7	25	1+825
31.50	0.18	7	25	1+850
22.75	0.14	6.5	25	1+875
30.88	0.19	6.5	25	1+900
26.00	0.16	6.5	25	1+925
22.75	0.14	6.5	25	1+950
21.13	0.13	6.5	25	1+975
30.88	0.19	6.5	25	2+000
28.00	0.16	7	25	2+025
31.50	0.18	7	25	2+050
42.75	0.19	9	25	2+075
27.00	0.12	9	25	2+100
38.25	0.17	9	25	2+125
42.75	0.19	9	25	2+150
29.25	0.13	9	25	2+175
42.75	0.19	9	25	2+200
29.25	0.13	9	25	2+225
27.00	0.12	9	25	2+250
36.00	0.16	9	25	2+275
31.50	0.14	9	25	2+300
31.50	0.14	9	25	2+325
33.25	0.19	7	25	2+350
29.75	0.17	7	25	2+375


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنase (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالى	السمك	العرض	الطول	ST.
26.25	0.15	7	25	2+400
28.00	0.16	7	25	2+425
24.50	0.14	7	25	2+450
24.38	0.15	6.5	25	2+475
30.88	0.19	6.5	25	2+500
22.75	0.14	6.5	25	2+525
24.38	0.15	6.5	25	2+550
24.38	0.15	6.5	25	2+575
30.88	0.19	6.5	25	2+600
16.25	0.10	6.5	25	2+625
30.88	0.19	6.5	25	2+650
17.88	0.11	6.5	25	2+675
29.25	0.18	6.5	25	2+700
27.63	0.17	6.5	25	2+725
30.88	0.19	6.5	25	2+750
21.13	0.13	6.5	25	2+775
26.00	0.16	6.5	25	2+800
30.88	0.19	6.5	25	2+825
24.38	0.15	6.5	25	2+850
19.50	0.12	6.5	25	2+875
30.88	0.19	6.5	25	2+900
27.63	0.17	6.5	25	2+925
30.88	0.19	6.5	25	2+950
21.13	0.13	6.5	25	2+975

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشناسة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
22.75	0.14	6.5	25	3+000
26.00	0.16	6.5	25	3+025
22.75	0.14	6.5	25	3+050
26.00	0.16	6.5	25	3+075
30.88	0.19	6.5	25	3+100
27.63	0.17	6.5	25	3+125
26.00	0.16	6.5	25	3+150
24.38	0.15	6.5	25	3+175
30.88	0.19	6.5	25	3+200
19.50	0.12	6.5	25	3+225
11.38	0.14	6.5	12.5	3+250
3481.44		الاجمالي		

مهندس الهيئة
سالم عبد


مهندس الشركة
مأمور

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنـة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الاوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طربوش - المياه)

الاجمالى	السمك	العرض	الطول	ST.
3.75	0.30	1	12.5	0+000
6.75	0.30	0.9	25	0+025
5.63	0.30	0.75	25	0+050
6.00	0.30	0.8	25	0+075
7.50	0.30	1	25	0+100
10.50	0.35	1.2	25	0+125
12.25	0.35	1.4	25	0+150
12.25	0.35	1.4	25	0+175
7.50	0.30	1	25	0+200
8.25	0.30	1.1	25	0+225
6.00	0.30	0.8	25	0+250
7.50	0.30	1	25	0+275
10.50	0.35	1.2	25	0+300
10.50	0.35	1.2	25	0+325
11.90	0.34	1.4	25	0+350
12.25	0.35	1.4	25	0+375
9.63	0.35	1.1	25	0+400
9.63	0.35	1.1	25	0+425
9.08	0.33	1.1	25	0+450
10.50	0.35	1.2	25	0+475
10.50	0.35	1.2	25	0+500
7.50	0.30	1	25	0+525
7.50	0.30	1	25	0+550
6.75	0.30	0.9	25	0+575

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا).

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية.

عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنase (القطاع الاول والثاني) بطول ٤ كم.

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة.

بند رقم (١)


أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
5.25	0.30	0.7	25	0+600
6.00	0.30	0.8	25	0+625
7.50	0.30	1	25	0+650
10.50	0.35	1.2	25	0+675
12.25	0.35	1.4	25	0+700
7.50	0.30	1	25	0+725
8.80	0.32	1.1	25	0+750
8.80	0.32	1.1	25	0+775
8.25	0.30	1.1	25	0+800
6.00	0.30	0.8	25	0+825
8.31	0.35	0.95	25	0+850
9.00	0.30	1.2	25	0+875
7.50	0.30	1	25	0+900
7.50	0.30	1	25	0+925
8.25	0.30	1.1	25	0+950
12.25	0.35	1.4	25	0+975
13.13	0.35	1.5	25	1+000
14.88	0.35	1.7	25	1+025
14.88	0.35	1.7	25	1+050
14.00	0.35	1.6	25	1+075
14.88	0.35	1.7	25	1+100
12.25	0.35	1.4	25	1+125
12.25	0.35	1.4	25	1+150
11.38	0.35	1.3	25	1+175

مهندس الهيئة




مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنase (القطاع الاول و الثاني) يطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندرقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
11.38	0.35	1.3	25	1+200
10.50	0.35	1.2	25	1+225
8.25	0.30	1.1	25	1+250
9.00	0.30	1.2	25	1+275
10.50	0.30	1.4	25	1+300
7.50	0.30	1	25	1+325
7.50	0.30	1	25	1+350
8.25	0.30	1.1	25	1+375
14.00	0.35	1.6	25	1+400
12.25	0.35	1.4	25	1+425
14.00	0.35	1.6	25	1+450
11.38	0.35	1.3	25	1+475
10.50	0.35	1.2	25	1+500
8.25	0.30	1.1	25	1+525
8.25	0.30	1.1	25	1+550
8.25	0.30	1.1	25	1+575
9.90	0.33	1.2	25	1+600
10.50	0.30	1.4	25	1+625
10.50	0.30	1.4	25	1+650
14.88	0.35	1.7	25	1+675
14.88	0.35	1.7	25	1+700
11.38	0.35	1.3	25	1+725
13.13	0.35	1.5	25	1+750
13.13	0.35	1.5	25	1+775


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول : كم .
 تنفيذ / مكتب الوارد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
14.88	0.35	1.7	25	1+800
16.63	0.35	1.9	25	1+825
18.38	0.35	2.1	25	1+850
17.50	0.35	2	25	1+875
15.75	0.35	1.8	25	1+900
16.63	0.35	1.9	25	1+925
21.00	0.35	2.4	25	1+950
21.00	0.35	2.4	25	1+975
19.25	0.35	2.2	25	2+000
14.85	0.33	1.8	25	2+025
15.30	0.34	1.8	25	2+050
17.50	0.35	2	25	2+075
17.50	0.35	2	25	2+100
19.25	0.35	2.2	25	2+125
19.25	0.35	2.2	25	2+150
19.25	0.35	2.2	25	2+175
21.00	0.35	2.4	25	2+200
21.00	0.35	2.4	25	2+225
21.88	0.35	2.5	25	2+250
11.25	0.30	1.5	25	2+275
13.50	0.30	1.8	25	2+300
12.75	0.30	1.7	25	2+325
19.25	0.35	2.2	25	2+350
26.25	0.35	3	25	2+375

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا)
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طوش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
12.75	0.30	1.7	25	2+400
15.00	0.30	2	25	2+425
11.25	0.30	1.5	25	2+450
14.88	0.35	1.7	25	2+475
14.88	0.35	1.7	25	2+500
16.63	0.35	1.9	25	2+525
19.25	0.35	2.2	25	2+550
19.25	0.35	2.2	25	2+575
17.50	0.35	2	25	2+600
17.50	0.35	2	25	2+625
17.50	0.35	2	25	2+650
17.33	0.33	2.1	25	2+675
18.15	0.33	2.2	25	2+700
19.25	0.35	2.2	25	2+725
15.75	0.35	1.8	25	2+750
9.00	0.30	1.2	25	2+775
9.60	0.32	1.2	25	2+800
9.60	0.32	1.2	25	2+825
9.00	0.30	1.2	25	2+850
19.25	0.35	2.2	25	2+875
19.25	0.35	2.2	25	2+900
15.75	0.35	1.8	25	2+925
17.50	0.35	2	25	2+950
16.15	0.34	1.9	25	2+975


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق النيل) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنase (القطاع الاول و الثاني) بطول : كم .
 تنفيذ / مكتب الواليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
14.00	0.35	1.6	25	3+000
14.88	0.35	1.7	25	3+025
11.25	0.30	1.5	25	3+050
11.25	0.30	1.5	25	3+075
16.63	0.35	1.9	25	3+100
19.25	0.35	2.2	25	3+125
15.75	0.35	1.8	25	3+150
14.00	0.35	1.6	25	3+175
17.50	0.35	2	25	3+200
14.88	0.35	1.7	25	3+225
5.63	0.30	1.5	12.5	3+250
1667.14		الاجمالي		

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والجسور (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .


بند رقم (١١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
3.75	0.30	1	12.5	0+900
9.00	0.30	1.2	25	0+925
7.13	0.30	0.95	25	0+950
8.25	0.30	1.1	25	0+975
17.50	0.35	2	25	1+000
10.50	0.35	1.2	25	1+025
12.75	0.34	1.5	25	1+050
12.25	0.35	1.4	25	1+075
13.13	0.35	1.5	25	1+100
13.13	0.35	1.5	25	1+125
10.73	0.33	1.3	25	1+150
10.50	0.35	1.2	25	1+175
13.13	0.35	1.5	25	1+200
11.25	0.30	1.5	25	1+225
10.50	0.30	1.4	25	1+250
13.50	0.30	1.8	25	1+275
14.25	0.30	1.9	25	1+300
15.00	0.30	2	25	1+325
15.00	0.30	2	25	1+350
14.88	0.35	1.7	25	1+375
14.88	0.35	1.7	25	1+400
11.25	0.30	1.5	25	1+425
11.20	0.32	1.4	25	1+450
8.80	0.32	1.1	25	1+475

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .


عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشلة (القطاع الاول والثاني) بطول ٤ كم .


تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - غاز)

الاجمالى	السمك	العرض	الطول	ST.
8.25	0.30	1.1	25	1+500
9.00	0.30	1.2	25	1+525
12.25	0.35	1.4	25	1+550
11.25	0.30	1.5	25	1+575
11.25	0.30	1.5	25	1+600
8.25	0.30	1.1	25	1+625
8.25	0.30	1.1	25	1+650
8.75	0.35	1	25	1+675
8.75	0.35	1	25	1+700
7.88	0.35	0.9	25	1+725
7.88	0.35	0.9	25	1+750
10.50	0.35	1.2	25	1+775
9.63	0.35	1.1	25	1+800
10.50	0.35	1.2	25	1+825
13.13	0.35	1.5	25	1+850
16.63	0.35	1.9	25	1+875
17.50	0.35	2	25	1+900
17.50	0.35	2	25	1+925
9.00	0.30	1.2	25	1+950
9.00	0.30	1.2	25	1+975
11.25	0.30	1.5	25	2+000
10.50	0.30	1.4	25	2+025
11.25	0.30	1.5	25	2+050
12.75	0.30	1.7	25	2+075


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الواليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
13.13	0.35	1.5	25	2+100
13.13	0.35	1.5	25	2+125
14.88	0.35	1.7	25	2+150
16.63	0.35	1.9	25	2+175
16.63	0.35	1.9	25	2+200
15.00	0.30	2	25	2+225
15.75	0.30	2.1	25	2+250
9.00	0.30	1.2	25	2+275
13.20	0.33	1.6	25	2+300
12.75	0.30	1.7	25	2+325
14.25	0.30	1.9	25	2+350
18.38	0.35	2.1	25	2+375
15.75	0.35	1.8	25	2+400
9.63	0.35	1.1	25	2+425
8.75	0.35	1	25	2+450
15.75	0.35	1.8	25	2+475
26.25	0.35	3	25	2+500
9.63	0.35	1.1	25	2+525
11.38	0.35	1.3	25	2+550
9.63	0.35	1.1	25	2+575
9.63	0.35	1.1	25	2+600
8.75	0.35	1	25	2+625
8.75	0.35	1	25	2+650
9.63	0.35	1.1	25	2+675

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنase (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
10.06	0.35	1.15	25	2+700
10.73	0.33	1.3	25	2+725
18.75	0.30	2.5	25	2+750
18.15	0.33	2.2	25	2+775
8.25	0.30	1.1	25	2+800
8.25	0.30	1.1	25	2+825
10.50	0.35	1.2	25	2+850
10.50	0.35	1.2	25	2+875
13.13	0.35	1.5	25	2+900
10.50	0.35	1.2	25	2+925
12.25	0.35	1.4	25	2+950
11.38	0.35	1.3	25	2+975
11.38	0.35	1.3	25	3+000
10.50	0.35	1.2	25	3+025
10.50	0.35	1.2	25	3+050
10.50	0.35	1.2	25	3+075
12.25	0.35	1.4	25	3+100
10.50	0.35	1.2	25	3+125
10.50	0.35	1.2	25	3+150
10.50	0.35	1.2	25	3+175
12.38	0.33	1.5	25	3+200
18.70	0.34	2.2	25	3+225
10.50	0.35	2.4	12.5	3+250

الاجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنائية (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

(١) بند رقم

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طريش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
1129.94		الاجمالي		



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية ،
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندر رقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
3.00	0.30	0.8	12.5	1+175
7.50	0.30	1	25	1+200
8.31	0.35	0.95	25	1+225
7.88	0.35	0.9	25	1+250
8.75	0.35	1	25	1+275
10.50	0.35	1.2	25	1+300
11.38	0.35	1.3	25	1+325
12.25	0.35	1.4	25	1+350
8.75	0.35	1	25	1+375
7.88	0.35	0.9	25	1+400
9.63	0.35	1.1	25	1+425
9.63	0.35	1.1	25	1+450
8.75	0.35	1	25	1+475
10.50	0.35	1.2	25	1+500
8.75	0.35	1	25	1+525
8.75	0.35	1	25	1+550
9.08	0.33	1.1	25	1+575
10.50	0.30	1.4	25	1+600
12.38	0.33	1.5	25	1+625
10.50	0.30	1.4	25	1+650
10.50	0.30	1.4	25	1+675
10.50	0.35	1.2	25	1+700
8.31	0.35	0.95	25	1+725
7.50	0.30	1	25	1+750

مهندس الهيئة


 كمسن


ممثل الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول 4 كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندرقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنيش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
9.63	0.35	1.1	25	1+775
13.13	0.35	1.5	25	1+800
13.60	0.34	1.6	25	1+825
17.50	0.35	2	25	1+850
17.50	0.35	2	25	1+875
15.75	0.35	1.8	25	1+900
13.20	0.33	1.6	25	1+925
13.13	0.35	1.5	25	1+950
12.25	0.35	1.4	25	1+975
11.25	0.30	1.5	25	2+000
11.25	0.30	1.5	25	2+025
9.00	0.30	1.2	25	2+050
8.25	0.30	1.1	25	2+075
7.50	0.30	1	25	2+100
7.50	0.30	1	25	2+125
12.25	0.35	1.4	25	2+150
14.00	0.35	1.6	25	2+175
12.25	0.35	1.4	25	2+200
12.25	0.35	1.4	25	2+225
13.13	0.35	1.5	25	2+250
9.63	0.35	1.1	25	2+275
10.50	0.35	1.2	25	2+300
9.63	0.35	1.1	25	2+325
7.43	0.33	0.9	25	2+350

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محطة التقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول و الثاني) يطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة .

بنر رقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
7.13	0.30	0.95	25	2+375
6.60	0.33	0.8	25	2+400
7.50	0.30	1	25	2+425
8.25	0.30	1.1	25	2+450
17.50	0.35	2	25	2+475
17.50	0.35	2	25	2+500
10.50	0.30	1.4	25	2+525
13.13	0.35	1.5	25	2+550
12.25	0.35	1.4	25	2+575
13.60	0.34	1.6	25	2+600
12.25	0.35	1.4	25	2+625
9.63	0.35	1.1	25	2+650
8.75	0.35	1	25	2+675
8.25	0.33	1	25	2+700
9.00	0.30	1.2	25	2+725
8.25	0.30	1.1	25	2+750
9.00	0.30	1.2	25	2+775
13.13	0.35	1.5	25	2+800
11.38	0.35	1.3	25	2+825
12.25	0.35	1.4	25	2+850
7.50	0.30	1	25	2+875
7.50	0.30	1	25	2+900
9.00	0.30	1.2	25	2+925
8.25	0.30	1.1	25	2+950

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
مكي عاصي

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
9.00	0.30	1.2	25	2+975
12.25	0.35	1.4	25	3+000
12.25	0.35	1.4	25	3+025
12.25	0.35	1.4	25	3+050
12.25	0.35	1.4	25	3+075
14.00	0.35	1.6	25	3+100
15.75	0.35	1.8	25	3+125
15.75	0.35	1.8	25	3+150
15.75	0.35	1.8	25	3+175
18.38	0.35	2.1	25	3+200
19.25	0.35	2.2	25	3+225
12.25	0.35	2.8	12.5	3+250
920.13	الاجمالي			

مهندس الهيئة


رئيس الشركة


هيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويند للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - الاتصالات الجديد)

الاجمالى	السمك	العرض	الطول	ST.
3.50	0.35	0.8	12.5	0+550
7.00	0.35	0.8	25	0+575
7.00	0.35	0.8	25	0+600
7.00	0.35	0.8	25	0+625
7.00	0.35	0.8	25	0+650
7.00	0.35	0.8	25	0+675
8.00	0.40	0.8	25	0+700
8.00	0.40	0.8	25	0+725
8.00	0.40	0.8	25	0+750
8.00	0.40	0.8	25	0+775
8.00	0.40	0.8	25	0+800
8.00	0.40	0.8	25	0+825
8.00	0.40	0.8	25	0+850
8.00	0.40	0.8	25	0+875
8.00	0.40	0.8	25	0+900
8.00	0.40	0.8	25	0+925
8.00	0.40	0.8	25	0+950
8.00	0.40	0.8	25	0+975
8.00	0.40	0.8	25	1+000
8.00	0.40	0.8	25	1+025
8.00	0.40	0.8	25	1+050
8.00	0.40	0.8	25	1+075
8.00	0.40	0.8	25	1+100
7.00	0.35	0.8	25	1+125


مهندس الهيئة


ممثل رئيس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المياديره الرئاسية " حياء كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال (الشuttle) (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرسن - الاتصالات الجديد)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
7.00	0.35	0.8	25	1+150
3.50	0.35	0.8	12.5	1+175
192.00	الاجمالي			



مهندس الهيئة

محمد

مهندس الشركة

محمد

الهيئة العامة للطرق والجسور (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن العباره الرئيسيه " جيهه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / صيانه ورفع كفاءه طريق ابو جلال الفشنase (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

اجمالى أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٠ %)

الإجمالي	الوحدة	الاعمال	البند
349.6		FROM ST. 0+243 TO ST 0+289	
314.9	٢٣	FROM ST. 0+579 TO ST 0+626	بالعمر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٠ %) ... الخ
261.25		FROM ST. 0+646 TO ST 0+671	
135		FROM ST. 0+950 TO ST 0+977	
1060.75		الاجمالي العام	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
أحمد عز

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الواليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٠%) (FROM ST. 0+243 TO ST 0+289)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
82.80	1.00	1.8	46	القصبة الثالثة
119.60	1.00	2.6	46	القصبة الرابعة
147.20	1.00	3.2	46	القصبة الخامسة
349.60	الاجمالي			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشائة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندرقم (٢)

أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٠%) (FROM ST. 0+579 TO ST 0+626)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
56.40	1.00	1.2	47	القصبة الثالثة
112.80	1.00	2.4	47	القصبة الرابعة
145.70	1.00	3.1	47	القصبة الخامسة
314.90	الاجمالي			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٣ / ابراهيم

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) (FROM ST. 0+646 TO ST 0+671)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
58.75	1.00	2.35	25	القصبة الثالثة
90.00	1.00	3.6	25	القصبة الرابعة
112.50	1.00	4.5	25	القصبة الخامسة
261.25	الاجمالي			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال القشاش (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) (FROM ST. 0+950 TO ST 0+977)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
16.2	1.00	0.6	27	القصبة الثانية
27.00	1.00	1	27	القصبة الثالثة
35.10	1.00	1.3	27	القصبة الرابعة
56.70	1.00	2.1	27	القصبة الخامسة
135.00				الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٢٠١٩٦٧

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفاششه (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٣)

اجمالي أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالي

ال Benson	الوحدة	الاعمال	البند
1770.03	٢م	FROM ST. 0+000 TO ST 3+250	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ... الخ
اجمالي العام			
1770.03			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٣٠١٩٦٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا).
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية.
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشناسة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم.
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة.

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالى

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
9.00	0.12	6	12.5	0+000
15.00	0.12	5	25	0+025
15.60	0.12	5.2	25	0+050
15.60	0.12	5.2	25	0+075
15.00	0.12	5	25	0+100
15.00	0.12	5	25	0+125
18.75	0.15	5	25	0+150
18.75	0.15	5	25	0+175
18.75	0.15	5	25	0+200
18.75	0.15	5	25	0+225
19.50	0.15	5.2	25	0+250
19.50	0.15	5.2	25	0+275
19.50	0.15	5.2	25	0+300
22.10	0.17	5.2	25	0+325
22.10	0.17	5.2	25	0+350
23.40	0.18	5.2	25	0+375
22.50	0.18	5	25	0+400
22.50	0.18	5	25	0+425
21.25	0.17	5	25	0+450
21.25	0.17	5	25	0+475
21.25	0.17	5	25	0+500
21.25	0.17	5	25	0+525
21.25	0.17	5	25	0+550
22.53	0.17	5.3	25	0+575

مهندس الهيئة
كعاصل


مهندس الشركة
مكي ع


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالي

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
23.85	0.18	5.3	25	0+600
23.40	0.18	5.2	25	0+625
22.10	0.17	5.2	25	0+650
21.25	0.17	5	25	0+675
21.25	0.17	5	25	0+700
21.25	0.17	5	25	0+725
21.25	0.17	5	25	0+750
21.25	0.17	5	25	0+775
21.25	0.17	5	25	0+800
22.10	0.17	5.2	25	0+825
22.10	0.17	5.2	25	0+850
20.40	0.17	4.8	25	0+875
19.13	0.17	4.5	25	0+900
19.13	0.17	4.5	25	0+925
19.13	0.17	4.5	25	0+950
17.00	0.17	4	25	0+975
17.00	0.17	4	25	1+000
14.00	0.16	3.5	25	1+025
14.00	0.16	3.5	25	1+050
14.00	0.16	3.5	25	1+075
14.00	0.16	3.5	25	1+100
14.00	0.16	3.5	25	1+125
14.00	0.16	3.5	25	1+150
12.00	0.16	3	25	1+175

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول : Km .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
12.00	0.16	3	25	1+200
12.00	0.16	3	25	1+225
12.00	0.16	3	25	1+250
12.00	0.16	3	25	1+275
10.00	0.16	2.5	25	1+300
9.38	0.15	2.5	25	1+325
9.38	0.15	2.5	25	1+350
9.38	0.15	2.5	25	1+375
9.38	0.15	2.5	25	1+400
10.63	0.17	2.5	25	1+425
10.63	0.17	2.5	25	1+450
10.63	0.17	2.5	25	1+475
9.38	0.15	2.5	25	1+500
12.00	0.16	3	25	1+525
12.00	0.16	3	25	1+550
12.00	0.16	3	25	1+575
11.25	0.15	3	25	1+600
13.50	0.18	3	25	1+625
13.50	0.18	3	25	1+650
11.25	0.18	2.5	25	1+675
11.25	0.18	2.5	25	1+700
11.25	0.18	2.5	25	1+725
11.25	0.18	2.5	25	1+750
11.25	0.18	2.5	25	1+775


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا).
 مشروعات الطرق ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية.
 حلبة / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشناسة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم.
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة.

بندر رقم (٣)
 أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف العالي

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
11.25	0.18	2.5	25	1+800
10.63	0.17	2.5	25	1+825
10.63	0.17	2.5	25	1+850
10.63	0.17	2.5	25	1+875
10.63	0.17	2.5	25	1+900
10.63	0.17	2.5	25	1+925
10.63	0.17	2.5	25	1+950
10.63	0.17	2.5	25	1+975
10.63	0.17	2.5	25	2+000
9.38	0.15	2.5	25	2+025
13.50	0.18	3	25	2+050
13.50	0.18	3	25	2+075
11.25	0.15	3	25	2+100
11.25	0.15	3	25	2+125
12.75	0.17	3	25	2+150
12.75	0.17	3	25	2+175
8.00	0.16	2	25	2+200
8.00	0.16	2	25	2+225
9.38	0.15	2.5	25	2+250
9.38	0.15	2.5	25	2+275
11.25	0.15	3	25	2+300
11.25	0.15	3	25	2+325
11.25	0.15	3	25	2+350
9.38	0.15	2.5	25	2+375

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق النيل).

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية.


عملية / صيانة ورفع غطاء طريق ابو جال الفشلحة (القطاع الاول و الثاني) بطول 4 كم .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بندرقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالى

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
9.38	0.15	2.5	25	2+400
9.38	0.15	2.5	25	2+425
9.38	0.15	2.5	25	2+450
7.50	0.15	2	25	2+475
7.50	0.15	2	25	2+500
8.50	0.17	2	25	2+525
8.50	0.17	2	25	2+550
8.50	0.17	2	25	2+575
10.63	0.17	2.5	25	2+600
10.63	0.17	2.5	25	2+625
10.63	0.17	2.5	25	2+650
10.63	0.17	2.5	25	2+675
10.63	0.17	2.5	25	2+700
8.50	0.17	2	25	2+725
8.50	0.17	2	25	2+750
8.50	0.17	2	25	2+775
10.63	0.17	2.5	25	2+800
10.63	0.17	2.5	25	2+825
10.63	0.17	2.5	25	2+850
10.63	0.17	2.5	25	2+875
10.63	0.17	2.5	25	2+900
10.00	0.16	2.5	25	2+925
10.00	0.16	2.5	25	2+950
10.00	0.16	2.5	25	2+975

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

٣ / ابراهيم

الهيئة العامة للطرق والجسور (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جاليل الشهادة (القطاع الاول والثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة

بنر رقم (٢)
 أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
10.00	0.16	2.5	25	3+000
10.00	0.16	2.5	25	3+025
10.00	0.16	2.5	25	3+050
10.00	0.16	2.5	25	3+075
10.00	0.16	2.5	25	3+100
10.00	0.16	2.5	25	3+125
10.00	0.16	2.5	25	3+150
10.00	0.16	2.5	25	3+175
10.00	0.16	2.5	25	3+200
10.00	0.16	2.5	25	3+225
5.00	0.16	2.5	12.5	3+250
الاجمالي				
1770.03				



مهندس الهيئة
محمود

مهندس الشركة
احمد فتحي

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
عملية / صيانة ورفع مقاومة طريق ابو جالن الشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
تنمية / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)

اجمالي أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الإجمالي	الوحدة	الاعمال	البيان
7020.33	٢	للطريق FROM ST. 0+000 TO ST 3+250	بالعمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدروجة نتائج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة وخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبليورنيا عن ٨٨٪ ... الخ
1667.14		طرش مياه FROM ST. 0+000 TO ST 3+250	
1129.94		طرش خاز FROM ST. 0+900 TO ST 3+250	
920.13		طرش صرف FROM ST. 1+175 TO ST 3+250	
192.00		طرش تحصيلات FROM ST. 0+550 TO ST 1+175	
10929.54		الاجمالي العام	


مهندس الهيئة


مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الأداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفاشلة (القطاع الاول و الثاني) يطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
2.00	0.03	6	12.5	0+000
27.44	0.18	6	25	0+025
42.44	0.28	6	25	0+050
36.19	0.24	6	25	0+075
41.69	0.28	6	25	0+100
50.69	0.34	6	25	0+125
69.19	0.46	6	25	0+150
83.69	0.56	6	25	0+175
73.69	0.49	6	25	0+200
65.19	0.43	6	25	0+225
59.19	0.39	6	25	0+250
60.19	0.40	6	25	0+275
53.19	0.35	6	25	0+300
54.69	0.36	6	25	0+325
41.69	0.28	6	25	0+350
33.69	0.22	6	25	0+375
35.19	0.23	6	25	0+400
36.69	0.24	6	25	0+425
39.69	0.26	6	25	0+450
51.19	0.34	6	25	0+475
63.19	0.42	6	25	0+500
58.19	0.39	6	25	0+525
52.69	0.35	6	25	0+550
45.69	0.30	6	25	0+575

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول : كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندر رقم (٤)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
37.19	0.25	6	25	0+600
30.69	0.20	6	25	0+625
30.69	0.20	6	25	0+650
22.69	0.15	6	25	0+675
29.19	0.19	6	25	0+700
33.69	0.22	6	25	0+725
50.69	0.34	6	25	0+750
68.69	0.46	6	25	0+775
79.69	0.53	6	25	0+800
95.19	0.63	6	25	0+825
104.69	0.70	6	25	0+850
84.19	0.56	6	25	0+875
72.19	0.48	6	25	0+900
64.69	0.43	6	25	0+925
55.69	0.37	6	25	0+950
38.69	0.26	6	25	0+975
36.19	0.24	6	25	1+000
34.19	0.23	6	25	1+025
42.69	0.28	6	25	1+050
46.19	0.31	6	25	1+075
31.19	0.21	6	25	1+100
31.62	0.21	6	25	1+125
28.56	0.19	6	25	1+150
36.00	0.24	6	25	1+175

مهندس الهيئة
كعاصي

مهندس الشركة
دار العز

الهيئة العامة للطرق والجباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفاشنة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
35.61	0.22	6.6	25	1+200
37.27	0.22	6.7	25	1+225
63.89	0.38	6.8	25	1+250
52.68	0.31	6.9	25	1+275
47.58	0.28	6.9	25	1+300
48.16	0.28	6.9	25	1+325
40.09	0.24	6.8	25	1+350
27.78	0.17	6.7	25	1+375
17.74	0.11	6.5	25	1+400
40.49	0.25	6.5	25	1+425
35.43	0.21	6.9	25	1+450
33.47	0.19	7	25	1+475
50.02	0.29	7	25	1+500
42.76	0.24	7	25	1+525
43.87	0.26	6.8	25	1+550
44.29	0.27	6.5	25	1+575
56.27	0.35	6.5	25	1+600
59.73	0.37	6.5	25	1+625
53.29	0.33	6.5	25	1+650
54.29	0.33	6.5	25	1+675
52.11	0.32	6.5	25	1+700
55.28	0.34	6.5	25	1+725
58.42	0.35	6.6	25	1+750
51.89	0.31	6.6	25	1+775


مهندس الهيئة
العنصر


مهندس الشركة
العنصر

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندر رقم (٤)
 اعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
49.11	0.30	6.6	25	1+800
55.18	0.33	6.7	25	1+825
52.36	0.31	6.7	25	1+850
62.93	0.39	6.5	25	1+875
56.27	0.35	6.5	25	1+900
58.11	0.36	6.5	25	1+925
47.17	0.29	6.5	25	1+950
39.20	0.24	6.5	25	1+975
34.86	0.21	6.6	25	2+000
30.25	0.18	6.8	25	2+025
30.96	0.18	7	25	2+050
33.99	0.19	7	25	2+075
37.97	0.21	7.2	25	2+100
62.39	0.35	7.2	25	2+125
66.90	0.37	7.3	25	2+150
85.58	0.43	8	25	2+175
90.25	0.45	8	25	2+200
101.83	0.39	10.5	25	2+225
108.51	0.39	11	25	2+250
28.59	0.12	9.7	25	2+275
31.03	0.14	9	25	2+300
37.03	0.16	9	25	2+325
45.94	0.20	9	25	2+350
62.96	0.27	9.2	25	2+375

مهندس الهيئة


د/هيثم الشركسي


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
أعمال توريد وفريش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
64.67	0.27	9.7	25	2+400
104.90	0.42	10	25	2+425
122.81	0.49	10	25	2+450
95.26	0.44	8.6	25	2+475
79.71	0.41	7.7	25	2+500
74.14	0.41	7.2	25	2+525
64.00	0.37	6.9	25	2+550
77.12	0.46	6.7	25	2+575
63.79	0.38	6.7	25	2+600
60.06	0.37	6.5	25	2+625
59.24	0.36	6.5	25	2+650
64.72	0.40	6.5	25	2+675
61.14	0.38	6.5	25	2+700
67.86	0.42	6.5	25	2+725
66.45	0.41	6.5	25	2+750
42.83	0.26	6.5	25	2+775
53.61	0.33	6.5	25	2+800
46.79	0.29	6.5	25	2+825
56.43	0.35	6.5	25	2+850
50.20	0.31	6.5	25	2+875
56.97	0.35	6.5	25	2+900
57.40	0.35	6.5	25	2+925
51.72	0.32	6.5	25	2+950
62.60	0.39	6.5	25	2+975


مهندس الهيئة


مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والجسور (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشندة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بنر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
54.10	0.33	6.5	25	3+000
44.84	0.28	6.5	25	3+025
47.33	0.29	6.5	25	3+050
44.57	0.27	6.5	25	3+075
46.14	0.28	6.5	25	3+100
51.50	0.32	6.5	25	3+125
54.69	0.34	6.5	25	3+150
74.14	0.46	6.5	25	3+175
90.34	0.56	6.5	25	3+200
99.87	0.61	6.5	25	3+225
34.20	0.42	6.5	12.5	3+250
7020.33				الاجمالي

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية ،
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنase (القطاع الاول و الثاني) يطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بنر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - المياه)

الاجمالى	السمك	العرض	الطول	ST.
3.75	0.30	1	12.5	0+000
6.75	0.30	0.9	25	0+025
5.63	0.30	0.75	25	0+050
6.00	0.30	0.8	25	0+075
7.50	0.30	1	25	0+100
10.50	0.35	1.2	25	0+125
12.25	0.35	1.4	25	0+150
12.25	0.35	1.4	25	0+175
7.50	0.30	1	25	0+200
8.25	0.30	1.1	25	0+225
6.00	0.30	0.8	25	0+250
7.50	0.30	1	25	0+275
10.50	0.35	1.2	25	0+300
10.50	0.35	1.2	25	0+325
11.90	0.34	1.4	25	0+350
12.25	0.35	1.4	25	0+375
9.63	0.35	1.1	25	0+400
9.63	0.35	1.1	25	0+425
9.08	0.33	1.1	25	0+450
10.50	0.35	1.2	25	0+475
10.50	0.35	1.2	25	0+500
7.50	0.30	1	25	0+525
7.50	0.30	1	25	0+550
6.75	0.30	0.9	25	0+575

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشندة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة .

(٤) بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرونش - المياه)

الاجمالى	السمك	العرض	الطول	ST.
5.25	0.30	0.7	25	0+600
6.00	0.30	0.8	25	0+625
7.50	0.30	1	25	0+650
10.50	0.35	1.2	25	0+675
12.25	0.35	1.4	25	0+700
7.50	0.30	1	25	0+725
8.80	0.32	1.1	25	0+750
8.80	0.32	1.1	25	0+775
8.25	0.30	1.1	25	0+800
6.00	0.30	0.8	25	0+825
8.31	0.35	0.95	25	0+850
9.00	0.30	1.2	25	0+875
7.50	0.30	1	25	0+900
7.50	0.30	1	25	0+925
8.25	0.30	1.1	25	0+950
12.25	0.35	1.4	25	0+975
13.13	0.35	1.5	25	1+000
14.88	0.35	1.7	25	1+025
14.88	0.35	1.7	25	1+050
14.00	0.35	1.6	25	1+075
14.88	0.35	1.7	25	1+100
12.25	0.35	1.4	25	1+125
12.25	0.35	1.4	25	1+150
11.38	0.35	1.3	25	1+175

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية ،
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشلة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم ،
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بنر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
11.38	0.35	1.3	25	1+200
10.50	0.35	1.2	25	1+225
8.25	0.30	1.1	25	1+250
9.00	0.30	1.2	25	1+275
10.50	0.30	1.4	25	1+300
7.50	0.30	1	25	1+325
7.50	0.30	1	25	1+350
8.25	0.30	1.1	25	1+375
14.00	0.35	1.6	25	1+400
12.25	0.35	1.4	25	1+425
14.00	0.35	1.6	25	1+450
11.38	0.35	1.3	25	1+475
10.50	0.35	1.2	25	1+500
8.25	0.30	1.1	25	1+525
8.25	0.30	1.1	25	1+550
8.25	0.30	1.1	25	1+575
9.90	0.33	1.2	25	1+600
10.50	0.30	1.4	25	1+625
10.50	0.30	1.4	25	1+650
14.88	0.35	1.7	25	1+675
14.88	0.35	1.7	25	1+700
11.38	0.35	1.3	25	1+725
13.13	0.35	1.5	25	1+750
13.13	0.35	1.5	25	1+775

مهندمو الهيئة

مكي عصام

مهندس الشركة

مكي عصام

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول والثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
14.88	0.35	1.7	25	1+800
16.63	0.35	1.9	25	1+825
18.38	0.35	2.1	25	1+850
17.50	0.35	2	25	1+875
15.75	0.35	1.8	25	1+900
16.63	0.35	1.9	25	1+925
21.00	0.35	2.4	25	1+950
21.00	0.35	2.4	25	1+975
19.25	0.35	2.2	25	2+000
14.85	0.33	1.8	25	2+025
15.30	0.34	1.8	25	2+050
17.50	0.35	2	25	2+075
17.50	0.35	2	25	2+100
19.25	0.35	2.2	25	2+125
19.25	0.35	2.2	25	2+150
19.25	0.35	2.2	25	2+175
21.00	0.35	2.4	25	2+200
21.00	0.35	2.4	25	2+225
21.88	0.35	2.5	25	2+250
11.25	0.30	1.5	25	2+275
13.50	0.30	1.8	25	2+300
12.75	0.30	1.7	25	2+325
19.25	0.35	2.2	25	2+350
26.25	0.35	3	25	2+375

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة القليوبية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندر رقم (٤)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
12.75	0.30	1.7	25	2+400
15.00	0.30	2	25	2+425
11.25	0.30	1.5	25	2+450
14.88	0.35	1.7	25	2+475
14.88	0.35	1.7	25	2+500
16.63	0.35	1.9	25	2+525
19.25	0.35	2.2	25	2+550
19.25	0.35	2.2	25	2+575
17.50	0.35	2	25	2+600
17.50	0.35	2	25	2+625
17.50	0.35	2	25	2+650
17.33	0.33	2.1	25	2+675
18.15	0.33	2.2	25	2+700
19.25	0.35	2.2	25	2+725
15.75	0.35	1.8	25	2+750
9.00	0.30	1.2	25	2+775
9.60	0.32	1.2	25	2+800
9.60	0.32	1.2	25	2+825
9.00	0.30	1.2	25	2+850
19.25	0.35	2.2	25	2+875
19.25	0.35	2.2	25	2+900
15.75	0.35	1.8	25	2+925
17.50	0.35	2	25	2+950
16.15	0.34	1.9	25	2+975

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن العبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشللة (القطاع الاول و الثاني) يطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الواليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
14.00	0.35	1.6	25	3+000
14.88	0.35	1.7	25	3+025
11.25	0.30	1.5	25	3+050
11.25	0.30	1.5	25	3+075
16.63	0.35	1.9	25	3+100
19.25	0.35	2.2	25	3+125
15.75	0.35	1.8	25	3+150
14.00	0.35	1.6	25	3+175
17.50	0.35	2	25	3+200
14.88	0.35	1.7	25	3+225
5.63	0.30	1.5	12.5	3+250
1667.14		الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنية (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الواليد للمقاولات العامة .

بندر رقم (٤)

أعمال توريد وفريش طبقة أساس (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
3.75	0.30	1	12.5	0+900
9.00	0.30	1.2	25	0+925
7.13	0.30	0.95	25	0+950
8.25	0.30	1.1	25	0+975
17.50	0.35	2	25	1+000
10.50	0.35	1.2	25	1+025
12.75	0.34	1.5	25	1+050
12.25	0.35	1.4	25	1+075
13.13	0.35	1.5	25	1+100
13.13	0.35	1.5	25	1+125
10.73	0.33	1.3	25	1+150
10.50	0.35	1.2	25	1+175
13.13	0.35	1.5	25	1+200
11.25	0.30	1.5	25	1+225
10.50	0.30	1.4	25	1+250
13.50	0.30	1.8	25	1+275
14.25	0.30	1.9	25	1+300
15.00	0.30	2	25	1+325
15.00	0.30	2	25	1+350
14.88	0.35	1.7	25	1+375
14.88	0.35	1.7	25	1+400
11.25	0.30	1.5	25	1+425
11.20	0.32	1.4	25	1+450
8.80	0.32	1.1	25	1+475
8.25	0.30	1.1	25	1+500


مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة القليوبية .
 عملية / صيانة ورفع كناءة طريق ابو جلال الفشلة (القطاع الاول و الثاني) بطول : كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بنر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
9.00	0.30	1.2	25	1+525
12.25	0.35	1.4	25	1+550
11.25	0.30	1.5	25	1+575
11.25	0.30	1.5	25	1+600
8.25	0.30	1.1	25	1+625
8.25	0.30	1.1	25	1+650
8.75	0.35	1	25	1+675
8.75	0.35	1	25	1+700
7.88	0.35	0.9	25	1+725
7.88	0.35	0.9	25	1+750
10.50	0.35	1.2	25	1+775
9.63	0.35	1.1	25	1+800
10.50	0.35	1.2	25	1+825
13.13	0.35	1.5	25	1+850
16.63	0.35	1.9	25	1+875
17.50	0.35	2	25	1+900
17.50	0.35	2	25	1+925
9.00	0.30	1.2	25	1+950
9.00	0.30	1.2	25	1+975
11.25	0.30	1.5	25	2+000
10.50	0.30	1.4	25	2+025
11.25	0.30	1.5	25	2+050
12.75	0.30	1.7	25	2+075
13.13	0.35	1.5	25	2+100
13.13	0.35	1.5	25	2+125

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


 ٤/٣/٢٠١٩


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة .

بندر رقم (٤)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
14.88	0.35	1.7	25	2+150
16.63	0.35	1.9	25	2+175
16.63	0.35	1.9	25	2+200
15.00	0.30	2	25	2+225
15.75	0.30	2.1	25	2+250
9.00	0.30	1.2	25	2+275
13.20	0.33	1.6	25	2+300
12.75	0.30	1.7	25	2+325
14.25	0.30	1.9	25	2+350
18.38	0.35	2.1	25	2+375
15.75	0.35	1.8	25	2+400
9.63	0.35	1.1	25	2+425
8.75	0.35	1	25	2+450
15.75	0.35	1.8	25	2+475
26.25	0.35	3	25	2+500
9.63	0.35	1.1	25	2+525
11.38	0.35	1.3	25	2+550
9.63	0.35	1.1	25	2+575
9.63	0.35	1.1	25	2+600
8.75	0.35	1	25	2+625
8.75	0.35	1	25	2+650
9.63	0.35	1.1	25	2+675
10.06	0.35	1.15	25	2+700
10.73	0.33	1.3	25	2+725
18.75	0.30	2.5	25	2+750


مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية ،
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بنر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرينش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
18.15	0.33	2.2	25	2+775
8.25	0.30	1.1	25	2+800
8.25	0.30	1.1	25	2+825
10.50	0.35	1.2	25	2+850
10.50	0.35	1.2	25	2+875
13.13	0.35	1.5	25	2+900
10.50	0.35	1.2	25	2+925
12.25	0.35	1.4	25	2+950
11.38	0.35	1.3	25	2+975
11.38	0.35	1.3	25	3+000
10.50	0.35	1.2	25	3+025
10.50	0.35	1.2	25	3+050
10.50	0.35	1.2	25	3+075
12.25	0.35	1.4	25	3+100
10.50	0.35	1.2	25	3+125
10.50	0.35	1.2	25	3+150
10.50	0.35	1.2	25	3+175
12.38	0.33	1.5	25	3+200
18.70	0.34	2.2	25	3+225
10.50	0.35	2.4	12.5	3+250
1129.94		الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بنر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طربوش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
3.00	0.30	0.8	12.5	1+175
7.50	0.30	1	25	1+200
8.31	0.35	0.95	25	1+225
7.88	0.35	0.9	25	1+250
8.75	0.35	1	25	1+275
10.50	0.35	1.2	25	1+300
11.38	0.35	1.3	25	1+325
12.25	0.35	1.4	25	1+350
8.75	0.35	1	25	1+375
7.88	0.35	0.9	25	1+400
9.63	0.35	1.1	25	1+425
9.63	0.35	1.1	25	1+450
8.75	0.35	1	25	1+475
10.50	0.35	1.2	25	1+500
8.75	0.35	1	25	1+525
8.75	0.35	1	25	1+550
9.08	0.33	1.1	25	1+575
10.50	0.30	1.4	25	1+600
12.38	0.33	1.5	25	1+625
10.50	0.30	1.4	25	1+650
10.50	0.30	1.4	25	1+675
10.50	0.35	1.2	25	1+700
8.31	0.35	0.95	25	1+725
7.50	0.30	1	25	1+750

مهندس الشركة
 حمزة ابراهيم

مهندس الهيئة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا).
 مشروعات الطرق ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية.
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشناسة (القطاع الاول والثاني) بطول 4 كم.
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة.

بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طريش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
9.63	0.35	1.1	25	1+775
13.13	0.35	1.5	25	1+800
13.60	0.34	1.6	25	1+825
17.50	0.35	2	25	1+850
17.50	0.35	2	25	1+875
15.75	0.35	1.8	25	1+900
13.20	0.33	1.6	25	1+925
13.13	0.35	1.5	25	1+950
12.25	0.35	1.4	25	2+000
11.25	0.30	1.5	25	2+025
11.25	0.30	1.5	25	2+050
9.00	0.30	1.2	25	2+075
8.25	0.30	1.1	25	2+100
7.50	0.30	1	25	2+125
7.50	0.30	1	25	2+150
12.25	0.35	1.4	25	2+175
14.00	0.35	1.6	25	2+200
12.25	0.35	1.4	25	2+225
12.25	0.35	1.4	25	2+250
13.13	0.35	1.5	25	2+275
9.63	0.35	1.1	25	2+300
10.50	0.35	1.2	25	2+325
9.63	0.35	1.1	25	2+350
7.43	0.33	0.9	25	


مهندس الشركة
 مارلنجون


مهندس الهيئة
 دعمر

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنائية (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - الصرف)

الاجمالى	السمك	العرض	الطول	ST.
7.13	0.30	0.95	25	2+375
6.60	0.33	0.8	25	2+400
7.50	0.30	1	25	2+425
8.25	0.30	1.1	25	2+450
17.50	0.35	2	25	2+475
17.50	0.35	2	25	2+500
10.50	0.30	1.4	25	2+525
13.13	0.35	1.5	25	2+550
12.25	0.35	1.4	25	2+575
13.60	0.34	1.6	25	2+600
12.25	0.35	1.4	25	2+625
9.63	0.35	1.1	25	2+650
8.75	0.35	1	25	2+675
8.25	0.33	1	25	2+700
9.00	0.30	1.2	25	2+725
8.25	0.30	1.1	25	2+750
9.00	0.30	1.2	25	2+775
13.13	0.35	1.5	25	2+800
11.38	0.35	1.3	25	2+825
12.25	0.35	1.4	25	2+850
7.50	0.30	1	25	2+875
7.50	0.30	1	25	2+900
9.00	0.30	1.2	25	2+925
8.25	0.30	1.1	25	2+950

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم ،
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
9.00	0.30	1.2	25	2+975
12.25	0.35	1.4	25	3+000
12.25	0.35	1.4	25	3+025
12.25	0.35	1.4	25	3+050
12.25	0.35	1.4	25	3+075
14.00	0.35	1.6	25	3+100
15.75	0.35	1.8	25	3+125
15.75	0.35	1.8	25	3+150
15.75	0.35	1.8	25	3+175
18.38	0.35	2.1	25	3+200
19.25	0.35	2.2	25	3+225
12.25	0.35	2.8	12.5	3+250
920.13	الاجمالي			


مهندس الهيئة
 [Signature]

مهندس الشركة
 [Signature]

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنطة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - الاتصالات الجديد)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
3.50	0.35	0.8	12.5	0+550
7.00	0.35	0.8	25	0+575
7.00	0.35	0.8	25	0+600
7.00	0.35	0.8	25	0+625
7.00	0.35	0.8	25	0+650
7.00	0.35	0.8	25	0+675
8.00	0.40	0.8	25	0+700
8.00	0.40	0.8	25	0+725
8.00	0.40	0.8	25	0+750
8.00	0.40	0.8	25	0+775
8.00	0.40	0.8	25	0+800
8.00	0.40	0.8	25	0+825
8.00	0.40	0.8	25	0+850
8.00	0.40	0.8	25	0+875
8.00	0.40	0.8	25	0+900
8.00	0.40	0.8	25	0+925
8.00	0.40	0.8	25	0+950
8.00	0.40	0.8	25	0+975
8.00	0.40	0.8	25	1+000
8.00	0.40	0.8	25	1+025
8.00	0.40	0.8	25	1+050
8.00	0.40	0.8	25	1+075
8.00	0.40	0.8	25	1+100
7.00	0.35	0.8	25	1+125


مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جال الفشائة (القطاع الاول والثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بندر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - الاتصالات الجديد)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
7.00	0.35	0.8	25	1+150
3.50	0.35	0.8	12.5	1+175
192.00	اجمالي			



مهندس الهيئة
حسين

مهندس الشركة
احمد عاصم

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جال الشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة .

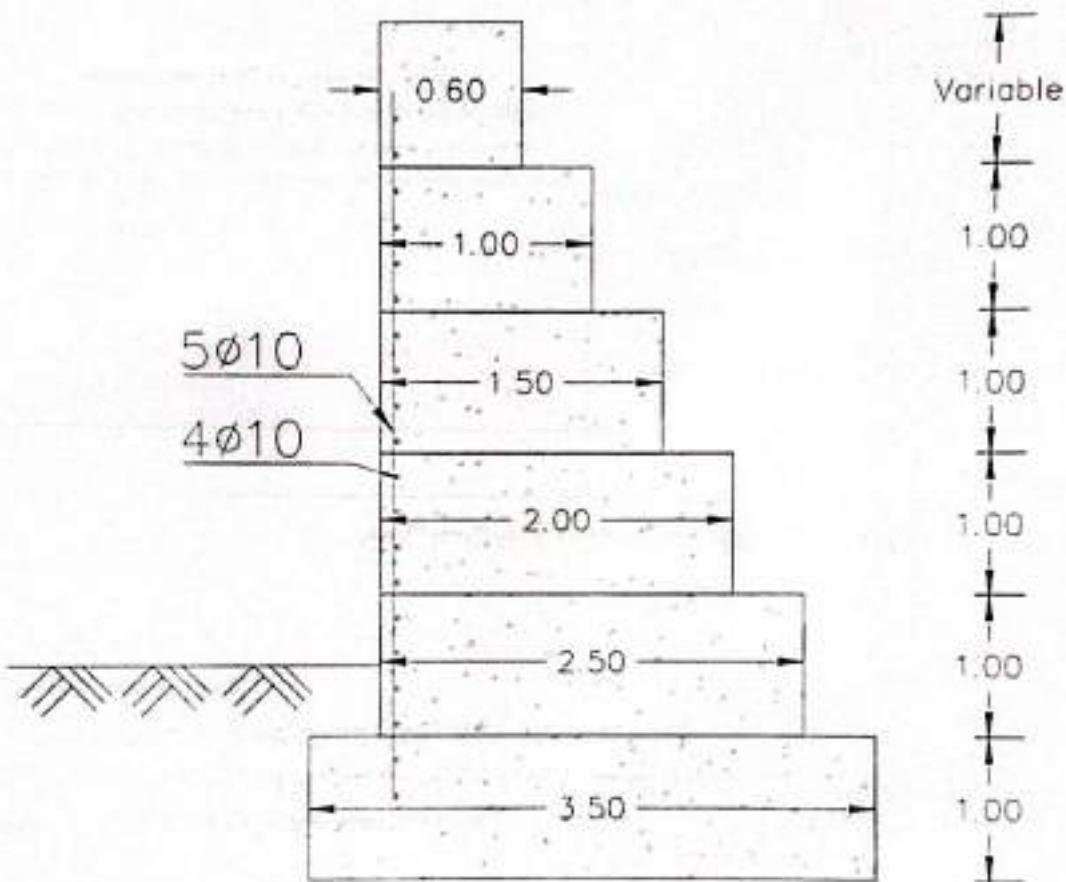
بند رقم (٧)

اجمالي أعمال توريد وتوضيب ورص حلب التسلیح (٥٢/٣٦) لزوم جمع العناصر الانشائية

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	المقدار
5.70	بالطن	FROM ST. 0+243 TO ST 0+289 FROM ST. 0+579 TO ST 0+626 FROM ST. 0+646 TO ST 0+671 FROM ST. 0+950 TO ST 0+977 FROM ST. 1+060 TO ST 1+090	بالطن أعمال توريد وتوضيب ورص حلب التسلیح (٥٢/٣٦) لزوم جمع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد ... الخ
5.70		اجمالي العام	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



Dumas

- 831 -

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال القشasha (القطاع الاول و الثاني) يطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الواليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٦)

اجمالي اعمال توريد وصب حواطن ساند من الخرسانة العادية

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند
518.88	٢م	FROM ST. 0+243 TO ST 0+289	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب حواطن ساند من الخرسانة العادية م على ان تكون الخلط والمixing على الاقل المقاومة المموزة للمكعب القياسي عن ٢٥ - ٣٠ كجم / سم ² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محنوي الاسمنت عن ٣٠٠ كجم / ٣٠ ... الخ
532.98		FROM ST. 0+579 TO ST 0+626	
283.5		FROM ST. 0+646 TO ST 0+671	
305.37		FROM ST. 0+950 TO ST 0+977	
340.2		FROM ST. 1+060 TO ST 1+090	
1980.93		اجمالي العام	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشاشة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٩)

أعمال توريد وصب حواطط ساند من الخرسانة العادية (FROM ST. 0+243 TO ST 0+289)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
161.00	1.00	3.5	46	القدمه
115.00	1.00	2.5	46	القصبة الاولى
92.00	1.00	2	46	القصبة الثانية
69.00	1.00	1.5	46	القصبة الثالثة
46.00	1.00	1	46	القصبة الرابعة
35.88	1.30	0.6	46	القصبة الخامسة
518.88				الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
محمود ابراهيم

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشasha (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

بند رقم (٩)

أعمال توريد وصب حوازيت سانده من الخرسانة العاديه (FROM ST. 0+579 TO ST 0+626)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
164.50	1.00	3.5	47	القدمه
117.50	1.00	2.5	47	القصبيه الاولى
94.00	1.00	2	47	القصبيه الثانية
70.50	1.00	1.5	47	القصبيه الثالثة
47.00	1.00	1	47	القصبيه الرابعة
39.48	1.40	0.6	47	القصبيه الخامسة
532.98				الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق دلتا).
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محطة الدقهلية.
 علبة / سيارة ورفع كثاءة طريق ابو جال الفشasha (القطاع الاول والثاني) بطول ٤ كم.
 تتبيله / مكتب الوليد للمقاولات العامة.

بندرقم (٩)

أعمال توريد وصب حوالنط ساندز من الخرسانة العاديّة (FROM ST. 0+646 TO ST 0+671)

الاعمال	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
الخدمة	25	3.5	1.00	87.50
القصبة الأولى	25	2.5	1.00	62.50
القصبة الثانية	25	2	1.00	50.00
القصبة الثالثة	25	1.5	1.00	37.50
القصبة الرابعة	25	1	1.00	25.00
القصبة الخامسة	25	0.6	1.40	21.00
الاجمالي				283.50

مهندس تتبيله

مهندس شركة
الأخضر

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشنase (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٩)

أعمال توريد وصب حوازيت ساند من الخرسانة العادي (FROM ST. 0+950 TO ST 0+977)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
94.50	1.00	3.5	27	القدمه
67.50	1.00	2.5	27	القصبة الاولى
54.00	1.00	2	27	القصبة الثانية
40.50	1.00	1.5	27	القصبة الثالثة
27.00	1.00	1	27	القصبة الرابعة
21.87	1.35	0.6	27	القصبة الخامسة
305.37				الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال الفشائة (القطاع الاول و الثاني) بطول ٤ كم .
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة .

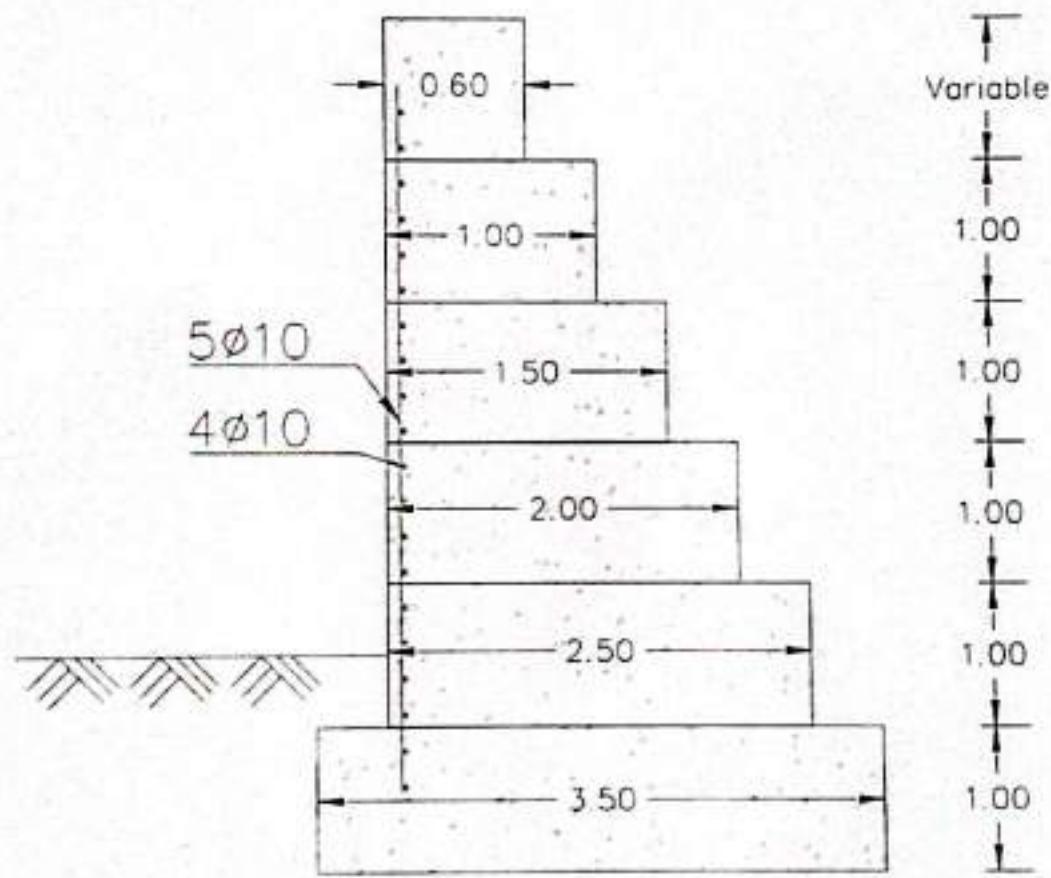
بند رقم (٩)

أعمال توريد وصب حواطن ساند من الخرسانة العادي (FROM ST. 1+060 TO ST 1+090)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
105.00	1.00	3.5	30	القدمة
75.00	1.00	2.5	30	القصبة الاولى
60.00	1.00	2	30	القصبة الثانية
45.00	1.00	1.5	30	القصبة الثالثة
30.00	1.00	1	30	القصبة الرابعة
25.20	1.40	0.6	30	القصبة الخامسة
340.20				الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



ΔSand

38515
