

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

ادارة العقود

ملف رقم : ٥١ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
التنفيذ والمناطق

تبية طيبة وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } ختامي عن عملية استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال /
الشاشة القطاع الأول والثانى بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى رصف مسافة بطول ١ كم ويطول إجمالي ٤ كم
مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
عقد رقم ٤٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعلم متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد
(١) سيارة بالمنطقة .


هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتحمّلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحرير في : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٦

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامي صالح



محضر استلام ابتدائي

لأعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم - مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

عقد رقم ٤٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

اشراف : المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ٠١ / ٣٠ م و بناء على قرار السيد المهندس رئيس الإداره المركزية بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق برقم (٦) لسنة ٢٠٢٤ / ١٣ / ٢٠٢٥ م بشأن تشكيل لجنه الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنه المشكله من كل من السادة :

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

١- المهندس / محمد أمين عبد الكريم

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

٢- المهندسة / أسماء صلاح

عن مديرية الطرق والنقل بالدقهلية

٣- المهندس / سامح محمد خيري

مندوب عن معمل المنطقة

٤- المهندسة / منار السيد عبد الله

مندوب عن الشركة المنفذة

٥- المهندس / وليد حمدي عطية

وقد بدأت اللجنه اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية وكذلك التجارب المعملية التي اجريت اثناء التنفيذ تحت اشراف المنطقة ومن ثم قامت اللجنه بالمرور على الطبيعة على الاعمال المنفذة ومعايتها ظاهريا وقامت اللجنه بأخذ أكواار لقياس سماكت طبقات الرصف وكذلكأخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء التجارب اللازمة عليها .

► الأعمال المنفذة :

- طبقة أساس تكسير كسارات بالمترا المكعب .
- طبقة اسفالية سطحية تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم .

► حالة سطح الطريق :

► الأعمال بصفة عامة مقبولة فيما عدا ما تلاحظ من وجود عدم تجانس وسوء لحامات طولية وعرضية بسطح الاسفلت بقطاعات محدودة وذات شدة منخفضة قدرته اللجنـة بنسبة (٣) % للمسطـحـات ويـسـتحقـ خـصـمـ عـلـيـهاـ بنسبة ٥% بقيمة اجمالية (٣١٩*١٤٧٧٨,١٣*٠,٠٥*٠,٠٣ = ٧٠٧٢ جـنيـهاـ) .

► توصيات اللجنه :

وعليه ترجي اللجنه انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم - مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مع تطبيق الخصومات بمحضر التقىيم المرفق واعتبار يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ٠١ / ٣٠ م هو تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية المذكورة وبدء فترة الضمان وعلى الشركة المنفذة اغلاق أماكن الجسات والبلاطات التي تم اخذها اثناء اعمال اللجنه وتقديم الحصر الخاتمي معتمدا من جهاز الاشراف .

اللجنة :



شهادة

تشهد الإداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب المعملية على الأعمال المنفذة بعمليه استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثانى بطول ١.٤ كم بالإضافة إلى رصف مسافة بطول ١ كم وبطول إجمالي ٢.٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عقد رقم ٤٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمنفذة بمعرفة مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق وووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف

أحمد سليم عبد العزاز

تحرير في: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٦

يعتمد ،



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامي عملية استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثاني بطول ١.٤ كم بالإضافة إلى رصف مسافة بطول ١ كم وبطول إجمالي ٢.٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عقد رقم ٤٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق وووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف

أ. سامي صالح عدوان

٢٠٢٥ / ٢ / ٢٦

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

سامي صالح



شهادة

تشهد الإداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق المنفذة لعملية استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثانى بطول ١.٤ كم بالإضافة إلى رصف مسافة بطول ١ كم وبطول إجمالي ٢.٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم ٤٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعه عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية .

مهندس الإشراف

حسان صالح نصر السماح

٢٠٢٥ / ٢ / ٢٦



شهادة

تشهد الإداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثانى بطول ١.٤ كم بالإضافة إلى رصف مسافة بطول ١ كم وبطول إجمالي ٢.٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عقد رقم ٤٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمنفذة بمعرفة مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٩.٩٩ % بالنسبة للتعاقد

مهندس الإشراف

ساد صبحى عبد الله

٢٠٢٥ / ٢ / ٢٦

يعتمد ،

رئيس الإداره المركزية



المدينة العامة للطرق والجهاز
الإدارية المركزية لمطافة شرق الدلتا
ملف رقم: ٢٥ / ١٥

مذكرة إيضاحية لعملية استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة
القطاع الأول والثاني بطول ٤,١ كم بالإضافة إلى رصف مسافة بطول ١ كم
وبطول إجمالي ٤,٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
مقاولة مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

نظراً لانتهاء الأعمال بعملية استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثاني بطول ٤,١ كم بالإضافة إلى رصف مسافة بطول ١ كم وبطول إجمالي ٤,٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عقد رقم ٤٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقاولة مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق وإعداد الختامي الخاص بها.

فقد صار تجديد المقاييس الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامي الأعمال والتى بلغت قيمتها الإجمالية ١٤٨٧٣٩٥,٦٢ جنيه { فقط أربعة عشر مليون وثمانمائة سبعة وثمانون ألف وثلاثمائة خمسة وتسعون جنيهاً و٦٢ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصر الختامي المعد .

مهندس الإشراف

أ. سامي صالح
مهندس إشراف

٢٠٢٥ / ٢ / ٢٦

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية





أولاً : المقاييس الختامية لأعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٤,٢ كم - مركز شرين - محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئيسية "حياة كريمة"

رقم النحو	بيان الأعمال	الوحدة	الفذة	المقدار	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالماه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة القصوى (وحمل على البند تحمل ونقل الاترية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل حتى ٣٥ كم	٣م	٨١,١٧٥	٥٢٢٣,٨٦	٤٢٤٠٤٦,٨٤
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٤٠ كم	٣م	١٣٨,٥٠	١٠٧٠,٤٩	١٤٨٢٦٢,٨٧
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربة صالحة للرمم وتطابقة للمواصفات والتغليف باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال النسب النموذجية لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالماه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة القصوى (و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الكثيفة والكتافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على مدنات للوصول للموقع وذلك طبقاً لإفادة طاقم الإشراف والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل . مسافة النقل حتى ١٦٣ كم - السعر لا يشمل المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة ب تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر .	٣م	٣٣٧,٥١	٥٦٤,٢٠	١٩٠٤٢٣
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لنقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٪ وألا يزيد الامتصاص عن ١٠٪ لا يقدرها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم ورشها بالماه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة (٩٥٪) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقالية و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢٧٥ كم . السعر يشمل المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة ب تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر .	٣م	٧٠٥	٨٦٢٨,٢٥	٦٠٨٢٩١٦
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشطيب من البيوتين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / ٢م فرق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٦٠	١٤٧٧٨,١٣	٨٨٦٦٨٨
٦	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاستفتية بسمك ٦ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيوتين الصلب ٦٠ / ٧ وارد شركة النصر باسوس أو ما يعادلها والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٣١٩	١٤٧٧٨,١٣	٤٧١٤٢٢٣

مهندس الهيئة

١

مهندس الشركة

٢



المدينة العلوية للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركبة لمصلحة حرق الحلاوة
بنها ، ممتد الوليد المعاوذه العامة وروضه طرق

أولاً : المقايسة الختامية لأعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٤,٤ كم - مركز شرين - محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم البند	البيان	الوحدة	القائمة	المقادير	الاجمالي
٧	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليج (٤٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الأنشائية و السعر يشمل أيضًا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجسر المتشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف و الفنية شاملة بالطن	طن	٦٠٠٠	١,٢٦	٧٥٦٠٠
٨	بالmeter المكعب خرسانة عادي للمحاطط الساندة للطريق لزوم اعمال التوسعة او معالجة اماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط الدمك ميكانيكا وعلى الالقل المقاومة للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٢٥ كجم / س٢ ممحتوي اسمتي ٣٠ كجم / ٣ م اسمنت بوريلاندي عادي و السعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول على سطح املس (fair face) للاسطح الظاهرة و عمل السدود الازمة (الدمسة) و وزن المياه وسند جوانب الخفر اذا لزم الامر و ازالة نوافذ الخفر والرم من المجرى المائي (ازالة الدمسة) حتى النسبة التصميمي او حسب طبيعة العمل وذلك طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر لا يشمل توريد و تشغيل حديد التسليج .	٢م	٢٢٠٠	٦١٨,٨٠	١٩٨٠١٦٠
٩	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصه بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئلياته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفنية شاملة كل ما يلزم لنحو العمل بالعدد .	عدد	٥٥٠	٢٨	١٥٤٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB لغرف الصرف المكشوفه و البند يجمع مسئلياته و الشمير طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفنية شاملة بالعدد بحمولة ٤ طن	قطر	٤٧٠٠	١٢	٥٦٤٠٠
٨٠	قطر	عدد	٥١٠٠	٩	٤٥٩٠٠
اجمالي قيمة المقايسة			١٤٦٢٠٠٢٠,٣٦		

مهندس الشركة

أبراهيم حماد

مهندس الهيئة


أ. حارصان

ثانياً : قيمة الكارتات لأعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٢ كم - مركز شرين - محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم الرتبة	البيان	الوحدة	قيمة الكارتة	المقادير	الاجمالى
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات... الخ	٣م	١٣	٥٦٤,٢	٧٣٣٥
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة .. الخ	٣م	٢٥	٨٦٢٨,٢٥	٢١٥٧٠٦
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم ... الخ	٣م	٣	١٤٧٧٨,١٣	٤٤٣٣٤
اجمالي قيمة الكارتات					٢٦٧٣٧٥
اجمالي قيمة المقايسة + الكارتات					١٤٨٨٧٣٩٥,٦٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



استكمال ورفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشنـه (القطاع الاول والثاني) بمركز شربين-محافظة الـدقـهـلـيـه "جــاهـ كــرـيمـه"

اسم المشروع : الويلد للمقاولات

تنفيذ شركه :

تقرير محلى رقم (٢٥٣) لسنة ٢٠٢٥

الاستلام الابتدائى لمشروع

٢٠٢٥/١٢٠

بتاريخ :

قام باحضار العينات : م/منار & أ/ محمود صالح

بيان العينات :- بيانات ادارية :-

عدد (٨) عينات كور أسفلت من مواقع مختلفة

عدد (٢) عينة بلاطه اسفلت طبقة سطحية (٤ ج)

عدد (١) عينة سن لعمل صلاحية

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اتربرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و السن الطبيعي

الدرج و الاستخلاص و تحديد نسبة الاسفلت و تحديد الثبات و الانسياب بطريقة مارشال

الدرج (ج)	القطاع الثاني		السطحية (٤ ج)		النتائج :-
الدرج (ج)	الدرج التصميمي	ك	ك	المهزات	
100	100	100	100	100	م haze سعة "1"
100	80	96	86	96	3/4"
80	60	71.9	61.9	75	3/8"
65	48	52.6	48	49	#4
50	35	40.9	35.0	38	8#
30	19	24	19.0	21	30#
23	13	16.1	13.0	14	50#
15	7	10.2	7.2	7.9	100#
8	3	7.2	4.2	5	200#
		5.75	5.25	5.49	% نسبة الاسفلت
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم			1080	1620	الثبات بالحجم
2-4			2.9	3.0	الانسياب بالحجم
300-500			5.79	540	الجسامه بالحجم / مم

العينة تتفق مع حدود السماحية للدرج التصميمي، في المهزات ما عدا المهزات المشار إليها

العينة تتفق في نسبة الانسلان مع النسبة التصميمية

الكور الاسفلاتي

رقم الكور	نوع الطبقة	الموقع	السمك بالسم	نسبة الدمك %	المواصفات
القطاع الاول					
1	سطحية	ك ٢,٧٠٠ شمال	6.8	99	
2	سطحية	ك ٣,٠٠٠ يمين	6.5	97	
3	سطحية	ك ٣,٣٠٠ شمال	6.6	99	
4	سطحية	ك ٣,٦٠٠ شمال	6.4	99	
5	سطحية	ك ٣,٩٠٠ يمين	6.5	98	
6	سطحية	ك ٤,٢٠٠ شمال	6.2	99	
7	سطحية	ك ٤,٨٠٠ شمال	6.5	98	
8	سطحية	ك ٤,٨٠٠ شمال	6.4	99	

يتم الرجوع لدفتر الشروط الخصوصية للعملية عاليه لمعرفة المواصفات الخاصة بالمشروع و مقارنتها بالنتائج

علمًا بأن وزن وحدة الحجوم للخاطة الاسفلاتية " الطبقة السطحية " ٢,٣٣٨ طن / م^٣

صلاحية سن ٦

المواصفات (درج ب)	٢,٩٠٠ ك	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	98	1.5"
55-85	82	1"
50-80	65	3/4"
40-70	52	3/8"
30-60	40.56	مهزة رقم ٤
20-50	32	10
10-30	18	40
5-15	10	200
لا يزيد عن ٨%	٤٧.١٤	مجال اللدونة %
لا يزيد عن ٤٥%	32	نسبة السن الطبيعي %
لا يزيد عن ١٠%	2.454	الصلابة %
لا يزيد عن ٥%	2.514	الوزن النوعي الكلي
لا يزيد عن ٨٠%	2.614	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2.8	الوزن النوعي الظاهري
	0.5	الامتصاص %
	2.23	التحلل %
	7.0	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣
		نسبة الماء الاصولية %
		CBR %
		الانفاس %

العينة تتفق مع حدود المواصفات في المهزات

العينات مسئولية من احضرها

		ج / التكاليف	
الاجمالي		سعر الوحدة	عدد الوحدات
2285		2285	1
3960		495	8
1300		650	2
820		205	4
250			
8615			
1407.15			
10022.15			

٢٠٢٥/٠٢/٠٤

تحريراً في :

كم

رئيس الادارة المركبة


دكتور / سلوى سامي صالح

سلوى سامي صالح

مدير المعمل

هندس / منار السيد عبدالله

هندس /

*كم*

استكمال وصيانة لرفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشـاشـه القطاع الاول والثانـي

اسم المشروع :
الوليد للمقاولات

تنفيذ شركـه :
الوليد للمقاولات

تقرير محـمـل رقم (٤٢١) لـسـنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٠

قام باحضار العينات : أ/ سعيد طه

بيان ادارية :-

عدد (٤) عينات دمك لطبقة الاساس الاولى واسفل التكسير واساس طرانتش من موقع مختلفه .

عدد (٣) عينه اساس سن ٦ طبقة اساس اولى ك ٤,٠٠ & ك ٤,٥٠٠ اساس اسفل تكسير & ك ٤,٥٥٠ اساس طرانتش صلاحـيه .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي وثوابـت اثـريـجـ والـصـلـابـهـ والـأـوـزـانـ النـوعـيـهـ وـالـامـتـصـاصـ وـالـتـحـلـلـ وـنـسـبـهـ السـنـ الطـبـيـيـ .

الكشف عن الكثافة الجافه طن / م٣ ونسبة الرطوبـهـ وـالـدـمـكـ النـسـبـيـ .

النتائج :- أولاً : طبقة الاساس سن ٦

المواصفات	ك ٤,٥٥٠ اساس طرانتش	ك ٤,٠٠ اولي اساس	ك ٤,٥٠٠ اساس اسفل تكسير (غيري)	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٧	مـهـزـهـ سـعـهـ ٢"
١٠٠-٧٠	٩٧	٩٩	٨٧	مـهـزـهـ سـعـهـ ١١,٥"
٨٥-٦٥	٧٧	٧٩	٧٩	مـهـزـهـ سـعـهـ ١"
٨٠-٦٠	٦٢	٦٣	٦٦	مـهـزـهـ سـعـهـ ٤/٣"
٧٠-٤٠	٥٠	٥١	٥٠	مـهـزـهـ سـعـهـ ٨/٣"
٦٠-٣٠	٤١	٤١	٣٨	مـهـزـهـ رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٢	٣٢	٢٨	مـهـزـهـ رقم ١٠
٣٠-١٠	١٩	١٩	١٥	مـهـزـهـ رقم ٤٠
١٥-٥	١٠	٩,٧	٦	مـهـزـهـ رقم ٢٠٠
%٨ لا يزيد عن %٤٠	عديمه	عديمه	٨	مـجـالـ اللـدـونـهـ %
لا يزيد عن %٤٠	٣٩%	٣٩%	٥٠%	الـصـلـابـهـ %
—	٢,٤٠٩	٢,٤١١	٢,٣٣٥	الـوزـنـ النـوعـيـ الـكـافـيـ
—	٢,٤٧٤	٢,٤٧٦	٢,٤٨٣	الـوزـنـ النـوعـيـ مـشـبـعـ جـافـ السـطـحـ
—	٢,٥٧٥	٢,٥٧٨	٢,٧٤٢	الـوزـنـ النـوعـيـ الـظـاهـريـ
%١٠ لا يزيد عن %١٠	٢,٧	٢,٧	٦,٤	الـامـتـصـاصـ %
%٥ لا يزيد عن %٥	٠,٤	٠,٥	١,٩	الـتـحـلـلـ %
%٨ لا يزيد عن %٨	٨	٨	٩	نـسـبـهـ السـنـ الطـبـيـيـ %
—	٢,٢٢	٢,٢٤	٢,١٩	اقـصـيـ كـثـافـهـ جـافـهـ طـنـ / مـ٣ـ
—	٧,٣	٦,٨	٧,٩	الـدـمـكـ المـعـدـلـ
				نـسـبـهـ المـيـاهـ المـالـامـهـ %

العينه تتلقـ مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعـيةـ مـاعـداـ المـهـزـهـ المشارـ اليـهاـ وـذـكـ تـخـرـجـ عـيـنةـ اـسـاسـ اـسـفـلـ تـكـسـيرـ عـنـ حدودـ المـواـصـفـاتـ فـيـ اختـيـارـ الصـلـابـهـ :

ثانياً : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكتافة الجافة طن /م³	الموقع
الدمك لا يتأل عن % ٩٨	٩٩	٤,٧	٢,٢١	طبقة اساس اولي ك ٣,٥٠٠
	٩٩	٤,٧	٢,٢٣	ك ٤,٠٠٠
				طبقة اساس طرانش
	٩٨	٤,٧	٢,١٨	ك ٤,٥٠٠
				طبقة اساس اسفل تكسير
	٩٨	٥,١	٢,١٥	ك ٤,٥٠٠

الدمك مقبول بالموقع .

البروكتور المستخدم للأساس ٢,٢٤ طن /م³ ونسبة المياه الملامنة % ٦,٨

البروكتور المستخدم للأساس طرانش ٢,٢٢ طن /م³ ونسبة المياه الملامنة % ٧,٣

البروكتور المستخدم للأساس ١,٩ اسفل تكسير طن /م³ ونسبة المياه الملامنة % ٧,٩

ملحوظة / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحية سن ابدون سبولة	٢	٢٢٨٥	٤٥٧٠
صلاحية من اسيسوله	١	٢٥٣٥	٢٥٣٥
عينات دمك	٤	٦٧٥	٢٧٠٠
م . اعداد تقرير			٢٥٠
قيمة التجارب			١٠,٥٥
% ض.ق.م ١٤%			١٤٠٧,٧
الاجمالي			١١٦٦٢,٧

٢٠٢٤/١١/١٨ تحريرا في:

مهندس المعمل /

رئيس الاداره المركزية

مهندس /


سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

منار السيد عبد الله

العمر



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
ادارة المعامل وضيغط الجودة



اسم المشروع	رفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشاده (القطاع الاول والثاني) بمركز شربين - محافظة الدقهلية "حياة كريمه"
تنفيذ شركة:	الوليد للمقاولات

تقرير معتمد رقم ٤٧٦ لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٢

م / اسماء صلاح

بيان العينات :- عدد (٢) عينة خلطه اسفلتية لطبقة السطحية (٤ج) من موقع مختلفه .

الاختبارات التي اجريت عليها:-

الدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب للخلطه الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المواصفات (٤ج)	الدرج التصميمي	الدرج ٤,٩٠٠ ك	الدرج ٤,٦٠٠ ك	المهزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
٨٠	٨٠	٩٩	٨٦	٢/٤"
٧٠	٧٠	٧١,٩	٦١,٩	٣/٨"
٦٥	٤٨	٥٢,٦	٤٨	٤#
٥٠	٣٥	٤٠,٩	٣٥	٨#
٣٥	٢٩	٢٤	١٩	٣٠#
٢٣	١٣	١٦,١	١٣	٥٠#
١٥	٧	١٠,٢	٧,٢	١٠٠#
٨	٣	٧,٢	٤,٢	٢٠#
		٥,٧٥	٥,٢٥	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم		١٦٣٠	١٥٩٠	الثبات بالجملة
٢٠٤		٣,٢	٣,١	الانسياب بالجملة
٥٠٠-٣٠٠		٥٠٩	٥١٣	الجسامه كجم/م

العينات تتفق مع حدود السماحية للدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المضار فيها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية .

تم مقارنة النتائج بالدرج التصميمي الوارد من كلية الهندسة / جامعة بنها بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ وبناء على موافقة جهاز الاشراف ورئيس الادارة المركزية .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج/ التكاليف

بيان العينات	مخالطه اسفلتي	مارشال	م . اعداد تقرير	قيمه التجارب	ض.ق.م %	اجمالي
الاجمالي						
١٣٠٠	٦٥٠	٢٠١				
٨٢٠	٢٠٥	٤				
٢٥٠						
٢٣٧						
٣٣١,٨						
٢٧٥,١,٨						

تحزير رقم ٢٠٢٤/١٢/١٧

مهندس المعمل

مدير المعمل

مهندس /

منار السيد عبد الله

رئيس الاداره المركزية

مهندس /

سلوي سامي صالح





اسم المشروع :

الوليد للمقاولات

تنفيذ شركة :

تقرير محلى رقم (٤١) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١١/٢٦

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / سعيد طه

بيان العينات :- عدد (٣) عينة دمك مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م³ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكتافة الجافة طن / م ³	الموقع
الدمك لا يقل عن ٩٨%	99	4.7	2.21	طبقه نهائى اساس ك ٤,٣٠٠
	99	4.7	2.20	ك ٤,٦٠٠
	98	4.6	2.20	ك ٤,٩٠٠

الدمك مقبول بالموقع

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٣ طن / م³ و نسبة الماء الملائمة ٧,١%

العينات مسئولية من احضرها

ملحوظة :

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	التجارب
2025	675	3	دمك
250			م. اعداد تقرير
2275			قيمة التجارب
318.50			ض.ق. م ١٤%
2593.50			الاجمالي

٢٠٢٤/١٢/٠١

تحرير في :

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عذر
سلوى سماهى صالح

منار السيد عبد الله

٢١



اسم المشروع :	استكمال و صيانة و رفع كفاءة طريق ابو جلال / الفاشة " القطاع الاول و الثاني "
تنفيذ شركة :	الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٤٠) لسنة ٢٠٢٤

٢٠٢٤/١١/٢١ تاريخ : قام باحضار العينات : أ / هشام

بيانات الارارية :-
 بيان العينات :-

عدد (٦) عينة سن ٦ لعمل صلاحية طبقة نهائية ك ٣٦٠٠

عدد (٧) عينات دمك مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م³ و نسبة الرطوبة و الدمل النسبي

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمل المعدل

صلاحية سن ٦ النتائج :-

المواصفات	٣,٦٠٠ ك	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	98	1.5"
55-85	82	1"
50-80	65	3/4"
40-70	52	3/8"
30-60	42	مهرة رقم ٤
20-50	33	10
10-30	19	40
5-15	11	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
لا يزيد عن ٤٥%	8	نسبة السن الطبيعي %
لا يزيد عن ١٠%	30	الصلابة %
لا يزيد عن ٥%	2.459	الوزن النوعي الكلي
	2.524	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2.624	الوزن النوعي الظاهري
	2.3	الامتصاص %
	0.3	التحلل %
	2.23	اقصى كثافة جافة طن/م ³
	7.1	نسبة المياة الاصولية %
		الدمك المعدل

العينات تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعية

المواصفات	% النسبة المئوية	نسبة الرطوبة %	الكتافة الجافة طن / م³	الموقع
الدمك لا يقل عن ٩٨%	99	4.6	2.21	طبقة اولى اساس ك ٥,٠٠٠
	99	4.9	2.21	ك ٤,٢٥٠
	98	4.4	2.19	ك ٤,٥٠٠
	98	4.3	2.19	ك ٤,٧٥٠
	98	4.4	2.19	طبقة نهائى اساس ك ٣,٢٥٠
	98	4.4	2.19	ك ٣,٥٠٠
	99	4.6	2.21	ك ٣,٧٥٠

الدمك مقبول بالمواصف
البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٣ طن / م³ و نسبة المياه المائية ٧,١%

ملحوظة :

العينات مسئولة من أحضرها و لا تمثل إلا نفسها

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	التجارب صلاحية سن ٦
2285	2285	1	
4725	675	7	دمك
250			م. اعداد تقرير
7260			قيمة التجارب
1016.40			ض. ق. م ١٤%
8276.40			الإجمالي

٢٠٢٤/١٢/٠١

تحرير في :
مهندس المعمل /

مدير المعمل


مهندس /

منار السيد عبد الله

رئيس الادارة المركزية

مهندس / مهندس

سلوى سامي صالح

العمود

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

علية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٤,٤ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .



حضر ختامي لما تم تنفيذه من أعمال

الرقم	البلد	الوحدة	كمية المقايسة المعدلة	ما سبق صرفه	الكمية الإجمالية المنفذة
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ... الخ	٢م	5230	5200	5223.86
2	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ... الخ	٢م	1080	1050	1070.49
3	أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ... الخ	٢م	570	550	564.20
4	أعمال توريد وفرش طبقة أساس ... الخ	٢م	8630	8550	8628.25
5	أعمال توريد ورش طبقة تشيرب (MC30) ... الخ	٢م	14785	14680	14778.13
6	أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (ج) بسمك ٦ سم ... الخ	٢م	14785	14680	14778.13
7	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليج (٥٢/٣٦) لزوم جمع العناصر الأشاشة ... الخ	طن	1	1	1.26
8	أعمال توريد وصب حوائط سانده من الخرسانة العادية... الخ	٢م	620	614	618.80
9	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش الخاصه بالمرافق (مياه - صرف) ... الخ	عدد	30	26	28.00
10	أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشببر لغرف الصرف المكشوفة ... الخ	عدد			
	قطر ٧٠ سم				
	قطر ٨٠ سم				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / المشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم ويطول اجمالي ٢,٤ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطريق .

بند رقم (١)

اجمالي أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية

الإجمالي	الوحدة	الاعمال	البند
2507.86	٣٩	للطريق FROM ST. 2+625 TO ST 4+900	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالألات التسوية والرش بالمياه الأصلعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ... الخ
1089.35		طرنش مياه FROM ST. 2+625 TO ST 4+500	
1048.80		طرنش غاز FROM ST. 2+625 TO ST 4+900	
577.85		طرنش صرف FROM ST. 2+625 TO ST 3+810	
5223.86		اجمالي العام	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف

مسافة ١ كم ويطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
8.13	0.10	6.5	12.5	2+625
22.75	0.14	6.5	25	2+650
30.88	0.19	6.5	25	2+675
27.63	0.17	6.5	25	2+700
24.38	0.15	6.5	25	2+725
26.00	0.16	6.5	25	2+750
22.75	0.14	6.5	25	2+775
24.38	0.15	6.5	25	2+800
30.88	0.19	6.5	25	2+825
35.75	0.22	6.5	25	2+850
32.50	0.20	6.5	25	2+875
34.13	0.21	6.5	25	2+900
30.88	0.19	6.5	25	2+925
16.25	0.10	6.5	25	2+950
30.88	0.19	6.5	25	2+975
32.50	0.20	6.5	25	3+000
29.25	0.18	6.5	25	3+025
34.13	0.21	6.5	25	3+050
30.88	0.19	6.5	25	3+075
21.13	0.13	6.5	25	3+100
26.00	0.16	6.5	25	3+125
30.88	0.19	6.5	25	3+150
24.38	0.15	6.5	25	3+175
34.13	0.21	6.5	25	3+200

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والنقلوي (الأدارء المركبة لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروع على الطريق ضمن المعاشرة المرئية "خواص مكرورة" (مركز شرقي) - ملاحظة المقاومة
 عصلية / أعمال استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو قير / المعاشرة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,٤ كم وبمسافة التي أصل رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٢ كم
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة ورصف الطريق .

بنذر رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانية (لطرق التطهير)

الإجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
30.88	0.19	6.5	25	3+225
21.13	0.13	6.5	25	3+250
26.00	0.16	6.5	25	3+275
30.88	0.19	6.5	25	3+300
24.38	0.15	6.5	25	3+325
34.13	0.21	6.5	25	3+350
30.88	0.19	6.5	25	3+375
27.63	0.17	6.5	25	3+400
30.88	0.19	6.5	25	3+425
34.13	0.21	6.5	25	3+450
32.50	0.20	6.5	25	3+475
34.13	0.21	6.5	25	3+500
22.75	0.14	6.5	25	3+525
26.00	0.16	6.5	25	3+550
30.88	0.19	6.5	25	3+575
35.75	0.22	6.5	25	3+600
32.50	0.20	6.5	25	3+625
34.13	0.21	6.5	25	3+650
30.88	0.19	6.5	25	3+675
19.50	0.12	6.5	25	3+700
22.75	0.14	6.5	25	3+725
27.63	0.17	6.5	25	3+750
24.38	0.15	6.5	25	3+775
20.80	0.16	6.5	20	3+800

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم ويطول اجمالي كم ٢,٤
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
15.44	0.19	6.5	12.5	3+825
21.13	0.13	6.5	25	3+850
30.88	0.19	6.5	25	3+875
35.75	0.22	6.5	25	3+900
32.50	0.20	6.5	25	3+925
34.13	0.21	6.5	25	3+950
22.75	0.14	6.5	25	3+975
29.25	0.18	6.5	25	4+000
30.88	0.19	6.5	25	4+025
32.50	0.20	6.5	25	4+050
34.13	0.21	6.5	25	4+075
22.75	0.14	6.5	25	4+100
7.31	0.05	6.5	25	4+125
22.75	0.14	6.5	25	4+150
27.63	0.17	6.5	25	4+175
32.50	0.20	6.5	25	4+200
27.63	0.17	6.5	25	4+225
29.25	0.18	6.5	25	4+250
17.88	0.11	6.5	25	4+275
30.88	0.19	6.5	25	4+300
30.88	0.19	6.5	25	4+325
29.25	0.18	6.5	25	4+350
22.75	0.14	6.5	25	4+375
19.50	0.12	6.5	25	4+400

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاعة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف

مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطريق للتطهير)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
30.88	0.19	6.5	25	4+425
27.63	0.17	6.5	25	4+450
27.63	0.17	6.5	25	4+475
29.25	0.18	6.5	25	4+500
22.75	0.14	6.5	25	4+525
21.13	0.13	6.5	25	4+550
30.88	0.19	6.5	25	4+575
27.63	0.17	6.5	25	4+600
24.38	0.15	6.5	25	4+625
26.00	0.16	6.5	25	4+650
22.75	0.14	6.5	25	4+675
19.50	0.12	6.5	25	4+700
30.88	0.19	6.5	25	4+725
24.38	0.15	6.5	25	4+750
32.50	0.20	6.5	25	4+775
32.50	0.20	6.5	25	4+800
27.63	0.17	6.5	25	4+825
29.25	0.18	6.5	25	4+850
17.88	0.11	6.5	25	4+875
15.44	0.19	6.5	12.5	4+900
2507.86		الاجمالي		


مهندس الهيئة
Nms

مهندس الشركة
٢٠١٦

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٤ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
8.75	0.35	2	12.5	2+625
17.50	0.35	2	25	2+650
17.33	0.33	2.1	25	2+675
18.15	0.33	2.2	25	2+700
19.25	0.35	2.2	25	2+725
15.75	0.35	1.8	25	2+750
9.00	0.30	1.2	25	2+775
9.60	0.32	1.2	25	2+800
9.60	0.32	1.2	25	2+825
9.00	0.30	1.2	25	2+850
19.25	0.35	2.2	25	2+875
19.25	0.35	2.2	25	2+900
15.75	0.35	1.8	25	2+925
17.50	0.35	2	25	2+950
16.15	0.34	1.9	25	2+975
14.00	0.35	1.6	25	3+000
14.88	0.35	1.7	25	3+025
11.25	0.30	1.5	25	3+050
11.25	0.30	1.5	25	3+075
16.63	0.35	1.9	25	3+100
19.25	0.35	2.2	25	3+125
15.75	0.35	1.8	25	3+150
14.00	0.35	1.6	25	3+175


مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كلاء طريق أبو جلال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٤ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

(١) بند رقم
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرونش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
17.50	0.35	2	25	3+200
14.88	0.35	1.7	25	3+225
11.25	0.30	1.5	25	3+250
11.25	0.30	1.5	25	3+275
11.25	0.30	1.5	25	3+300
11.25	0.30	1.5	25	3+325
13.13	0.35	1.5	25	3+350
14.88	0.35	1.7	25	3+375
14.00	0.35	1.6	25	3+400
13.13	0.35	1.5	25	3+425
14.88	0.35	1.7	25	3+450
14.88	0.35	1.7	25	3+475
12.00	0.30	1.6	25	3+500
12.75	0.30	1.7	25	3+525
13.13	0.35	1.5	25	3+550
13.13	0.35	1.5	25	3+575
16.63	0.35	1.9	25	3+600
19.25	0.35	2.2	25	3+625
15.75	0.35	1.8	25	3+650
14.00	0.35	1.6	25	3+675
15.00	0.30	2	25	3+700
12.75	0.30	1.7	25	3+725
11.25	0.30	1.5	25	3+750


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاعة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف
 مسافة ٢,٤ كم وبطول إجمالي ٦,٥ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بندر رقم (١)
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
12.00	0.32	1.5	25	3+775
9.90	0.33	1.5	20	3+800
8.25	0.33	2	12.5	3+825
12.38	0.33	1.5	25	3+850
9.00	0.30	1.2	25	3+875
8.33	0.37	0.9	25	3+900
7.50	0.30	1	25	3+925
9.00	0.30	1.2	25	3+950
18.75	0.30	2.5	25	3+975
14.85	0.33	1.8	25	4+000
12.75	0.30	1.7	25	4+025
12.75	0.30	1.7	25	4+050
11.38	0.35	1.3	25	4+075
13.13	0.35	1.5	25	4+100
13.13	0.35	1.5	25	4+125
14.88	0.35	1.7	25	4+150
16.63	0.35	1.9	25	4+175
18.38	0.35	2.1	25	4+200
17.50	0.35	2	25	4+225
15.75	0.35	1.8	25	4+250
16.63	0.35	1.9	25	4+275
21.00	0.35	2.4	25	4+300
21.00	0.35	2.4	25	4+325

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / اعمال إستكمال صيانة ورفع كلاء طريق أبو جلال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة الى اعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٢ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطريق .

بندرقم (١)
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
19.25	0.35	2.2	25	4+350
17.50	0.35	2	25	4+375
15.75	0.35	1.8	25	4+400
15.68	0.33	1.9	25	4+425
20.40	0.34	2.4	25	4+450
21.00	0.35	2.4	25	4+475
8.25	0.30	2.2	12.5	4+500
1089.35			الاجمالي	



مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشasha (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف

مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم


تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بندرقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
4.38	0.35	1	12.5	2+625
8.75	0.35	1	25	2+650
9.63	0.35	1.1	25	2+675
10.06	0.35	1.15	25	2+700
10.73	0.33	1.3	25	2+725
18.75	0.30	2.5	25	2+750
18.15	0.33	2.2	25	2+775
8.25	0.30	1.1	25	2+800
8.25	0.30	1.1	25	2+825
10.50	0.35	1.2	25	2+850
10.50	0.35	1.2	25	2+875
13.13	0.35	1.5	25	2+900
10.50	0.35	1.2	25	2+925
12.25	0.35	1.4	25	2+950
11.38	0.35	1.3	25	2+975
11.38	0.35	1.3	25	3+000
10.50	0.35	1.2	25	3+025
10.50	0.35	1.2	25	3+050
10.50	0.35	1.2	25	3+075
12.25	0.35	1.4	25	3+100
10.50	0.35	1.2	25	3+125
10.50	0.35	1.2	25	3+150
10.50	0.35	1.2	25	3+175
12.38	0.33	1.5	25	3+200

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا)

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف

مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
18.70	0.34	2.2	25	3+225
21.00	0.35	2.4	25	3+250
14.00	0.35	1.6	25	3+275
12.25	0.35	1.4	25	3+300
12.25	0.35	1.4	25	3+325
13.13	0.35	1.5	25	3+350
13.13	0.35	1.5	25	3+375
13.13	0.35	1.5	25	3+400
13.13	0.35	1.5	25	3+425
11.25	0.30	1.5	25	3+450
11.25	0.30	1.5	25	3+475
10.50	0.30	1.4	25	3+500
12.25	0.35	1.4	25	3+525
12.25	0.35	1.4	25	3+550
10.50	0.30	1.4	25	3+575
10.50	0.30	1.4	25	3+600
10.50	0.30	1.4	25	3+625
13.13	0.35	1.5	25	3+650
13.13	0.35	1.5	25	3+675
12.25	0.35	1.4	25	3+700
12.25	0.35	1.4	25	3+725
13.13	0.35	1.5	25	3+750
13.13	0.35	1.5	25	3+775
10.50	0.35	1.5	20	3+800

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤، ١ كم بالإضافة الى أعمال رصف


مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤، ٤ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
6.13	0.35	1.4	12.5	3+825
12.25	0.35	1.4	25	3+850
10.50	0.35	1.2	25	3+875
9.63	0.35	1.1	25	3+900
10.50	0.35	1.2	25	3+925
11.38	0.35	1.3	25	3+950
8.25	0.30	1.1	25	3+975
7.50	0.30	1	25	4+000
8.25	0.30	1.1	25	4+025
17.50	0.35	2	25	4+050
10.50	0.35	1.2	25	4+075
12.75	0.34	1.5	25	4+100
12.25	0.35	1.4	25	4+125
13.13	0.35	1.5	25	4+150
13.13	0.35	1.5	25	4+175
10.73	0.33	1.3	25	4+200
10.50	0.35	1.2	25	4+225
13.13	0.35	1.5	25	4+250
11.25	0.30	1.5	25	4+275
10.50	0.30	1.4	25	4+300
13.50	0.30	1.8	25	4+325
14.25	0.30	1.9	25	4+350
15.00	0.30	2	25	4+375
15.00	0.30	2	25	4+400

مهندس الهيئة


مهندس الشركة
دار العاد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا)

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف

مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنيش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
14.88	0.35	1.7	25	4+425
14.88	0.35	1.7	25	4+450
11.25	0.30	1.5	25	4+475
11.20	0.32	1.4	25	4+500
8.80	0.32	1.1	25	4+525
8.25	0.30	1.1	25	4+550
9.00	0.30	1.2	25	4+575
12.25	0.35	1.4	25	4+600
11.25	0.30	1.5	25	4+625
11.25	0.30	1.5	25	4+650
8.25	0.30	1.1	25	4+675
8.25	0.30	1.1	25	4+700
8.75	0.35	1	25	4+725
8.75	0.35	1	25	4+750
7.88	0.35	0.9	25	4+775
7.88	0.35	0.9	25	4+800
10.50	0.35	1.2	25	4+825
9.63	0.35	1.1	25	4+850
10.50	0.35	1.2	25	4+875
6.56	0.35	1.5	12.5	4+900
1048.80		الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .


عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ٤,٢ كم وبطول اجمالي ٤,٤ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
6.13	0.35	1.4	12.5	2+625
9.63	0.35	1.1	25	2+650
8.75	0.35	1	25	2+675
8.25	0.33	1	25	2+700
9.00	0.30	1.2	25	2+725
8.25	0.30	1.1	25	2+750
9.00	0.30	1.2	25	2+775
13.13	0.35	1.5	25	2+800
11.38	0.35	1.3	25	2+825
12.25	0.35	1.4	25	2+850
7.50	0.30	1	25	2+875
7.50	0.30	1	25	2+900
9.00	0.30	1.2	25	2+925
8.25	0.30	1.1	25	2+950
9.00	0.30	1.2	25	2+975
12.25	0.35	1.4	25	3+000
12.25	0.35	1.4	25	3+025
12.25	0.35	1.4	25	3+050
12.25	0.35	1.4	25	3+075
14.00	0.35	1.6	25	3+100
15.75	0.35	1.8	25	3+125
15.75	0.35	1.8	25	3+150
15.75	0.35	1.8	25	3+175
18.38	0.35	2.1	25	3+200
19.25	0.35	2.2	25	3+225

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤ كم ٢,٤ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
24.50	0.35	2.8	25	3+250
15.00	0.30	2	25	3+275
15.75	0.35	1.8	25	3+300
16.63	0.35	1.9	25	3+325
9.00	0.30	1.2	25	3+350
11.25	0.30	1.5	25	3+375
13.50	0.30	1.8	25	3+400
15.00	0.30	2	25	3+425
15.00	0.30	2	25	3+450
16.50	0.30	2.2	25	3+475
16.50	0.30	2.2	25	3+500
12.75	0.30	1.7	25	3+525
12.00	0.30	1.6	25	3+550
11.25	0.30	1.5	25	3+575
12.00	0.30	1.6	25	3+600
13.50	0.30	1.8	25	3+625
10.50	0.30	1.4	25	3+650
11.25	0.30	1.5	25	3+675
7.50	0.30	1	25	3+700
9.00	0.30	1.2	25	3+725
8.25	0.30	1.1	25	3+750
8.25	0.30	1.1	25	3+775
8.10	0.30	1.2	22.5	3+810
577.85			الاجمالي	

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

الهيئة العامة للطرق والجسور (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا).

مشروعات الطرق ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربون) - محافظة الدقهلية.

عنوان / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفرشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٢,٤ كم
تنفيذ / مكتب التوريد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٢)

اجمالي أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالي

الإجمالي	الوحدة	الاعمال	البند (٢)
1070.49	٢م	FROM ST. 2+625 TO ST 4+900	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ... الخ
1070.49	اجمالي العام		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطريق .

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
5.31	0.17	2.5	12.5	2+625
10.63	0.17	2.5	25	2+650
10.63	0.17	2.5	25	2+675
10.63	0.17	2.5	25	2+700
8.50	0.17	2	25	2+725
8.50	0.17	2	25	2+750
8.50	0.17	2	25	2+775
10.63	0.17	2.5	25	2+800
10.63	0.17	2.5	25	2+825
10.63	0.17	2.5	25	2+850
10.63	0.17	2.5	25	2+875
10.63	0.17	2.5	25	2+900
8.00	0.16	2	25	2+925
8.00	0.16	2	25	2+950
8.00	0.16	2	25	2+975
10.00	0.16	2.5	25	3+000
10.00	0.16	2.5	25	3+025
10.00	0.16	2.5	25	3+050
8.00	0.16	2	25	3+075
8.00	0.16	2	25	3+100
8.00	0.16	2	25	3+125
8.00	0.16	2	25	3+150
8.00	0.16	2	25	3+175
8.00	0.16	2	25	3+200

مهندس الهيئة


مهندس الشركة
١٥٢١٦


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤، ١ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤، ٢ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بندر رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
8.00	0.16	2	25	3+225
8.00	0.16	2	25	3+250
10.00	0.16	2.5	25	3+275
10.00	0.16	2.5	25	3+300
8.13	0.13	2.5	25	3+325
7.15	0.13	2.2	25	3+350
7.15	0.13	2.2	25	3+375
8.13	0.13	2.5	25	3+400
6.50	0.13	2	25	3+425
6.50	0.13	2	25	3+450
8.13	0.13	2.5	25	3+475
8.13	0.13	2.5	25	3+500
9.38	0.15	2.5	25	3+525
8.25	0.15	2.2	25	3+550
8.25	0.15	2.2	25	3+575
8.25	0.15	2.2	25	3+600
9.38	0.15	2.5	25	3+625
9.38	0.15	2.5	25	3+650
9.38	0.15	2.5	25	3+675
9.38	0.15	2.5	25	3+700
11.25	0.15	3	25	3+725
13.13	0.15	3.5	25	3+750
10.50	0.12	3.5	25	3+775
18.00	0.12	6	25	3+800

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا)
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢،٤ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالى

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
18.00	0.12	6	25	3+825
14.88	0.17	3.5	25	3+850
17.00	0.17	4	25	3+875
17.00	0.17	4	25	3+900
17.00	0.17	4	25	3+925
17.00	0.17	4	25	3+950
14.88	0.17	3.5	25	3+975
14.88	0.17	3.5	25	4+000
19.60	0.16	4.9	25	4+025
19.60	0.16	4.9	25	4+050
19.60	0.16	4.9	25	4+075
20.80	0.16	5.2	25	4+100
20.40	0.16	5.1	25	4+125
19.20	0.16	4.8	25	4+150
16.00	0.16	4	25	4+175
15.20	0.16	3.8	25	4+200
16.00	0.16	4	25	4+225
14.00	0.16	3.5	25	4+250
12.00	0.16	3	25	4+275
11.25	0.15	3	25	4+300
11.25	0.15	3	25	4+325
11.25	0.15	3	25	4+350
11.25	0.15	3	25	4+375
11.63	0.15	3.1	25	4+400

مهندس الهيئة


مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٢ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٢)


أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
11.63	0.15	3.1	25	4+425
10.50	0.15	2.8	25	4+450
9.38	0.15	2.5	25	4+475
9.38	0.15	2.5	25	4+500
9.38	0.15	2.5	25	4+525
22.50	0.15	6	25	4+550
13.13	0.15	3.5	25	4+575
18.00	0.18	4	25	4+600
18.00	0.18	4	25	4+625
18.00	0.18	4	25	4+650
18.00	0.18	4	25	4+675
15.75	0.18	3.5	25	4+700
9.00	0.18	2	25	4+725
11.25	0.18	2.5	25	4+750
11.25	0.18	2.5	25	4+775
10.63	0.17	2.5	25	4+800
11.48	0.17	2.7	25	4+825
10.63	0.17	2.5	25	4+850
10.63	0.17	2.5	25	4+875
4.25	0.17	2	12.5	4+900
1070.49		الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
جعفر عمار



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جبل / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم ويطول اجمالي ٤,٤ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٣)

اجمالي أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند (٣)
564.20	٢م	FROM ST. 8+370 TO ST 8+416	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ... الخ
564.20	اجمالي العام		

مهندس الهيئة

سامير هادي
كمس

مهندس الشركة

كاظم رضا

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم ويطول اجمالي ٢,٤ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٣)

أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) (FROM ST. 8+370 TO ST 8+416)

الاعمال	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
القصبة الاولى	45.5	1.7	1.00	77.35
القصبة الثانية	45.5	2.45	1.00	111.48
القصبة الثالثة	45.5	3.75	1.00	170.63
القصبة الرابعة	45.5	4.5	1.00	204.75
الاجمالي				564.20

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه مكراة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثانى) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٤ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)

اجمالي أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند
5912.25	٢م	للطريق FROM ST. 2+625 TO ST 4+900	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨٠ ... الخ
1089.35		طرنش مياه FROM ST. 2+625 TO ST 4+500	
1048.8		طرنش غاز FROM ST. 2+625 TO ST 4+900	
577.85		طرنش صرف FROM ST. 2+625 TO ST 3+810	
8628.25		الاجمالي العام	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والجسور (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 حصنه / أحصل إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفاشasha (القطاع الأول والثاني) بطول ٤ ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم .
 تنفيذ / مكتب المؤيد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بندر رقم (٤)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
30.95	0.37	6.7	12.5	2+625
61.98	0.36	6.8	25	2+650
67.70	0.40	6.8	25	2+675
63.96	0.38	6.8	25	2+700
70.99	0.42	6.8	25	2+725
69.52	0.41	6.8	25	2+750
44.15	0.26	6.7	25	2+775
56.09	0.33	6.8	25	2+800
48.95	0.29	6.8	25	2+825
58.16	0.35	6.7	25	2+850
52.52	0.31	6.8	25	2+875
59.60	0.35	6.8	25	2+900
60.05	0.35	6.8	25	2+925
54.90	0.32	6.9	25	2+950
65.49	0.39	6.8	25	2+975
63.25	0.33	7.6	25	3+000
49.67	0.28	7.2	25	3+025
50.24	0.29	6.9	25	3+050
49.71	0.27	7.25	25	3+075
51.11	0.28	7.2	25	3+100
57.05	0.32	7.2	25	3+125
61.43	0.34	7.3	25	3+150
81.55	0.46	7.15	25	3+175
97.98	0.56	7.05	25	3+200


مهندس الهيئة


مهندس الشركة
 ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٢ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
109.86	0.61	7.15	25	3+225
76.82	0.42	7.3	25	3+250
78.70	0.44	7.2	25	3+275
62.58	0.37	6.7	25	3+300
47.65	0.29	6.5	25	3+325
43.00	0.25	6.8	25	3+350
51.57	0.29	7.05	25	3+375
42.32	0.25	6.8	25	3+400
42.71	0.25	6.9	25	3+425
39.70	0.24	6.6	25	3+450
30.06	0.18	6.55	25	3+475
38.67	0.24	6.55	25	3+500
66.39	0.41	6.55	25	3+525
72.80	0.45	6.5	25	3+550
80.69	0.52	6.2	25	3+575
78.20	0.49	6.35	25	3+600
101.63	0.60	6.75	25	3+625
105.11	0.64	6.55	25	3+650
114.17	0.68	6.7	25	3+675
104.21	0.66	6.3	25	3+700
116.89	0.71	6.6	25	3+725
90.98	0.54	6.8	25	3+750
90.15	0.53	6.75	25	3+775
68.09	0.45	7.5	20	3+800


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
25.33	0.23	8.8	12.5	3+825
47.11	0.26	7.25	25	3+850
51.88	0.29	7.25	25	3+875
51.11	0.27	7.5	25	3+900
64.80	0.35	7.5	25	3+925
79.72	0.43	7.4	25	3+950
67.17	0.37	7.25	25	3+975
71.34	0.41	6.95	25	4+000
78.63	0.43	7.35	25	4+025
72.94	0.41	7.2	25	4+050
87.28	0.48	7.3	25	4+075
97.56	0.53	7.3	25	4+100
79.90	0.47	6.85	25	4+125
80.90	0.45	7.15	25	4+150
72.71	0.42	6.85	25	4+175
63.58	0.37	6.85	25	4+200
68.64	0.40	6.9	25	4+225
82.57	0.40	8.3	25	4+250
64.43	0.36	7.2	25	4+275
53.30	0.31	6.85	25	4+300
45.64	0.26	6.9	25	4+325
51.39	0.30	6.9	25	4+350
62.19	0.35	7.15	25	4+375
57.19	0.31	7.35	25	4+400

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٢ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطريق)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
58.83	0.35	6.7	25	4+425
53.83	0.33	6.5	25	4+450
65.25	0.39	6.75	25	4+475
65.53	0.37	7.1	25	4+500
67.11	0.38	7.15	25	4+525
69.78	0.40	7	25	4+550
75.51	0.41	7.45	25	4+575
69.49	0.38	7.25	25	4+600
55.78	0.32	7	25	4+625
56.18	0.32	7.05	25	4+650
70.19	0.40	7.1	25	4+675
60.30	0.33	7.3	25	4+700
50.08	0.29	6.85	25	4+725
43.53	0.26	6.8	25	4+750
56.77	0.32	7.2	25	4+775
57.84	0.32	7.3	25	4+800
52.93	0.29	7.3	25	4+825
53.93	0.31	7	25	4+850
48.38	0.27	7.05	25	4+875
23.79	0.27	7.05	12.5	4+900
5912.25			الاجمالي	


مهندس الهيئة


مهندس الشركة
١٢٦

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفاششه (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
8.75	0.35	2	12.5	2+625
17.50	0.35	2	25	2+650
17.33	0.33	2.1	25	2+675
18.15	0.33	2.2	25	2+700
19.25	0.35	2.2	25	2+725
15.75	0.35	1.8	25	2+750
9.00	0.30	1.2	25	2+775
9.60	0.32	1.2	25	2+800
9.60	0.32	1.2	25	2+825
9.00	0.30	1.2	25	2+850
19.25	0.35	2.2	25	2+875
19.25	0.35	2.2	25	2+900
15.75	0.35	1.8	25	2+925
17.50	0.35	2	25	2+950
16.15	0.34	1.9	25	2+975
14.00	0.35	1.6	25	3+000
14.88	0.35	1.7	25	3+025
11.25	0.30	1.5	25	3+050
11.25	0.30	1.5	25	3+075
16.63	0.35	1.9	25	3+100
19.25	0.35	2.2	25	3+125
15.75	0.35	1.8	25	3+150
14.00	0.35	1.6	25	3+175


مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٢ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
17.50	0.35	2	25	3+200
14.88	0.35	1.7	25	3+225
11.25	0.30	1.5	25	3+250
11.25	0.30	1.5	25	3+275
11.25	0.30	1.5	25	3+300
11.25	0.30	1.5	25	3+325
13.13	0.35	1.5	25	3+350
14.88	0.35	1.7	25	3+375
14.00	0.35	1.6	25	3+400
13.13	0.35	1.5	25	3+425
14.88	0.35	1.7	25	3+450
14.88	0.35	1.7	25	3+475
12.00	0.30	1.6	25	3+500
12.75	0.30	1.7	25	3+525
13.13	0.35	1.5	25	3+550
13.13	0.35	1.5	25	3+575
16.63	0.35	1.9	25	3+600
19.25	0.35	2.2	25	3+625
15.75	0.35	1.8	25	3+650
14.00	0.35	1.6	25	3+675
15.00	0.30	2	25	3+700
12.75	0.30	1.7	25	3+725
11.25	0.30	1.5	25	3+750

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق ابو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،٤ كم بالإضافة الى اعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٥،٤ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بندر رقم (٤)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
12.00	0.32	1.5	25	3+775
9.90	0.33	1.5	20	3+800
8.25	0.33	2	12.5	3+825
12.38	0.33	1.5	25	3+850
9.00	0.30	1.2	25	3+875
8.33	0.37	0.9	25	3+900
7.50	0.30	1	25	3+925
9.00	0.30	1.2	25	3+950
18.75	0.30	2.5	25	3+975
14.85	0.33	1.8	25	4+000
12.75	0.30	1.7	25	4+025
12.75	0.30	1.7	25	4+050
11.38	0.35	1.3	25	4+075
13.13	0.35	1.5	25	4+100
13.13	0.35	1.5	25	4+125
14.88	0.35	1.7	25	4+150
16.63	0.35	1.9	25	4+175
18.38	0.35	2.1	25	4+200
17.50	0.35	2	25	4+225
15.75	0.35	1.8	25	4+250
16.63	0.35	1.9	25	4+275
21.00	0.35	2.4	25	4+300
21.00	0.35	2.4	25	4+325

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٢٠١٩

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف

مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٤ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - المياه)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
19.25	0.35	2.2	25	4+350
17.50	0.35	2	25	4+375
15.75	0.35	1.8	25	4+400
15.68	0.33	1.9	25	4+425
20.40	0.34	2.4	25	4+450
21.00	0.35	2.4	25	4+475
8.25	0.30	2.2	12.5	4+500
1089.35				الاجمالي



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادره الرئاسيه " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كلاء طريق أبو جال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف


مسافة ٤،٢ كم وبطول اجمالي ٤،٤ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
4.38	0.35	1	12.5	2+625
8.75	0.35	1	25	2+650
9.63	0.35	1.1	25	2+675
10.06	0.35	1.15	25	2+700
10.73	0.33	1.3	25	2+725
18.75	0.30	2.5	25	2+750
18.15	0.33	2.2	25	2+775
8.25	0.30	1.1	25	2+800
8.25	0.30	1.1	25	2+825
10.50	0.35	1.2	25	2+850
10.50	0.35	1.2	25	2+875
13.13	0.35	1.5	25	2+900
10.50	0.35	1.2	25	2+925
12.25	0.35	1.4	25	2+950
11.38	0.35	1.3	25	2+975
11.38	0.35	1.3	25	3+000
10.50	0.35	1.2	25	3+025
10.50	0.35	1.2	25	3+050
10.50	0.35	1.2	25	3+075
12.25	0.35	1.4	25	3+100
10.50	0.35	1.2	25	3+125
10.50	0.35	1.2	25	3+150
10.50	0.35	1.2	25	3+175
12.38	0.33	1.5	25	3+200
18.70	0.34	2.2	25	3+225
21.00	0.35	2.4	25	3+250
14.00	0.35	1.6	25	3+275
12.25	0.35	1.4	25	3+300


مهندس الهيئة



مهندس الشركة
١٢٦٤٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ٢،٤ كم وبطول اجمالي ٦،٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بندر رقم (٤)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
12.25	0.35	1.4	25	3+325
13.13	0.35	1.5	25	3+350
13.13	0.35	1.5	25	3+375
13.13	0.35	1.5	25	3+400
13.13	0.35	1.5	25	3+425
11.25	0.30	1.5	25	3+450
11.25	0.30	1.5	25	3+475
10.50	0.30	1.4	25	3+500
12.25	0.35	1.4	25	3+525
12.25	0.35	1.4	25	3+550
10.50	0.30	1.4	25	3+575
10.50	0.30	1.4	25	3+600
10.50	0.30	1.4	25	3+625
13.13	0.35	1.5	25	3+650
13.13	0.35	1.5	25	3+675
12.25	0.35	1.4	25	3+700
12.25	0.35	1.4	25	3+725
13.13	0.35	1.5	25	3+750
13.13	0.35	1.5	25	3+775
10.50	0.35	1.5	20	3+800
6.13	0.35	1.4	12.5	3+825
12.25	0.35	1.4	25	3+850
10.50	0.35	1.2	25	3+875
9.63	0.35	1.1	25	3+900
10.50	0.35	1.2	25	3+925
11.38	0.35	1.3	25	3+950
8.25	0.30	1.1	25	3+975
7.50	0.30	1	25	4+000

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٤ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
8.25	0.30	1.1	25	4+025
17.50	0.35	2	25	4+050
10.50	0.35	1.2	25	4+075
12.75	0.34	1.5	25	4+100
12.25	0.35	1.4	25	4+125
13.13	0.35	1.5	25	4+150
13.13	0.35	1.5	25	4+175
10.73	0.33	1.3	25	4+200
10.50	0.35	1.2	25	4+225
13.13	0.35	1.5	25	4+250
11.25	0.30	1.5	25	4+275
10.50	0.30	1.4	25	4+300
13.50	0.30	1.8	25	4+325
14.25	0.30	1.9	25	4+350
15.00	0.30	2	25	4+375
15.00	0.30	2	25	4+400
14.88	0.35	1.7	25	4+425
14.88	0.35	1.7	25	4+450
11.25	0.30	1.5	25	4+475
11.20	0.32	1.4	25	4+500
8.80	0.32	1.1	25	4+525
8.25	0.30	1.1	25	4+550
9.00	0.30	1.2	25	4+575
12.25	0.35	1.4	25	4+600
11.25	0.30	1.5	25	4+625
11.25	0.30	1.5	25	4+650
8.25	0.30	1.1	25	4+675
8.25	0.30	1.1	25	4+700

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠١٩/٦/٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف

مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٤ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - غاز)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
8.75	0.35	1	25	4+725
8.75	0.35	1	25	4+750
7.88	0.35	0.9	25	4+775
7.88	0.35	0.9	25	4+800
10.50	0.35	1.2	25	4+825
9.63	0.35	1.1	25	4+850
10.50	0.35	1.2	25	4+875
6.56	0.35	1.5	12.5	4+900
1048.80			الاجمالي	



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف


مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
6.13	0.35	1.4	12.5	2+625
9.63	0.35	1.1	25	2+650
8.75	0.35	1	25	2+675
8.25	0.33	1	25	2+700
9.00	0.30	1.2	25	2+725
8.25	0.30	1.1	25	2+750
9.00	0.30	1.2	25	2+775
13.13	0.35	1.5	25	2+800
11.38	0.35	1.3	25	2+825
12.25	0.35	1.4	25	2+850
7.50	0.30	1	25	2+875
7.50	0.30	1	25	2+900
9.00	0.30	1.2	25	2+925
8.25	0.30	1.1	25	2+950
9.00	0.30	1.2	25	2+975
12.25	0.35	1.4	25	3+000
12.25	0.35	1.4	25	3+025
12.25	0.35	1.4	25	3+050
12.25	0.35	1.4	25	3+075
14.00	0.35	1.6	25	3+100
15.75	0.35	1.8	25	3+125
15.75	0.35	1.8	25	3+150
15.75	0.35	1.8	25	3+175
18.38	0.35	2.1	25	3+200
19.25	0.35	2.2	25	3+225

مهندس الهيئة


مهندس الشركة
٣٠٢١٢٦٩

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الي أعمال رصف

مسافة ٢،٤ كم وبطول اجمالي ٤،٤ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش - الصرف)

الاجمالي	السمك	العرض	الطول	ST.
24.50	0.35	2.8	25	3+250
15.00	0.30	2	25	3+275
15.75	0.35	1.8	25	3+300
16.63	0.35	1.9	25	3+325
9.00	0.30	1.2	25	3+350
11.25	0.30	1.5	25	3+375
13.50	0.30	1.8	25	3+400
15.00	0.30	2	25	3+425
15.00	0.30	2	25	3+450
16.50	0.30	2.2	25	3+475
16.50	0.30	2.2	25	3+500
12.75	0.30	1.7	25	3+525
12.00	0.30	1.6	25	3+550
11.25	0.30	1.5	25	3+575
12.00	0.30	1.6	25	3+600
13.50	0.30	1.8	25	3+625
10.50	0.30	1.4	25	3+650
11.25	0.30	1.5	25	3+675
7.50	0.30	1	25	3+700
9.00	0.30	1.2	25	3+725
8.25	0.30	1.1	25	3+750
8.25	0.30	1.1	25	3+775
8.10	0.30	1.2	22.5	3+810
577.85			الاجمالي	

مهندس الهيئة
A/mas

مهندس الشركة
Z.Z.Z

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤ كم تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٥)

اجمالي أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطوير (MC30)

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند
14778.13	٢م	للطريق FROM ST. 2+625 TO 4+900	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطوير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الاساس ... الخ
14778.13		اجمالي العام	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف

مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

(٥) بند

أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
77.50	6.2	12.5	2+625
157.50	6.3	25	2+650
157.50	6.3	25	2+675
157.50	6.3	25	2+700
157.50	6.3	25	2+725
157.50	6.3	25	2+750
155.00	6.2	25	2+775
157.50	6.3	25	2+800
157.50	6.3	25	2+825
155.00	6.2	25	2+850
157.50	6.3	25	2+875
157.50	6.3	25	2+900
157.50	6.3	25	2+925
160.00	6.4	25	2+950
157.50	6.3	25	2+975
177.50	7.1	25	3+000
167.50	6.7	25	3+025
160.00	6.4	25	3+050
168.75	6.75	25	3+075
167.50	6.7	25	3+100
167.50	6.7	25	3+125
170.00	6.8	25	3+150
166.25	6.65	25	3+175
163.75	6.55	25	3+200
166.25	6.65	25	3+225
170.00	6.8	25	3+250

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٥٢٠١٩

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٥)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
167.50	6.7	25	3+275
155.00	6.2	25	3+300
150.00	6	25	3+325
157.50	6.3	25	3+350
163.75	6.55	25	3+375
157.50	6.3	25	3+400
160.00	6.4	25	3+425
152.50	6.1	25	3+450
151.25	6.05	25	3+475
151.25	6.05	25	3+500
151.25	6.05	25	3+525
150.00	6	25	3+550
142.50	5.7	25	3+575
146.25	5.85	25	3+600
156.25	6.25	25	3+625
151.25	6.05	25	3+650
155.00	6.2	25	3+675
145.00	5.8	25	3+700
152.50	6.1	25	3+725
157.50	6.3	25	3+750
156.25	6.25	25	3+775
175.00	7	25	3+800
207.50	8.3	25	3+825
168.75	6.75	25	3+850
168.75	6.75	25	3+875
175.00	7	25	3+900

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٢ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

(٥) بند

أعمال توريد ورش طبقة تширیب (MC30)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
175.00	7	25	3+925
172.50	6.9	25	3+950
168.75	6.75	25	3+975
161.25	6.45	25	4+000
171.25	6.85	25	4+025
167.50	6.7	25	4+050
170.00	6.8	25	4+075
170.00	6.8	25	4+100
158.75	6.35	25	4+125
166.25	6.65	25	4+150
158.75	6.35	25	4+175
158.75	6.35	25	4+200
160.00	6.4	25	4+225
195.00	7.8	25	4+250
167.50	6.7	25	4+275
158.75	6.35	25	4+300
160.00	6.4	25	4+325
160.00	6.4	25	4+350
166.25	6.65	25	4+375
171.25	6.85	25	4+400
155.00	6.2	25	4+425
150.00	6	25	4+450
156.25	6.25	25	4+475
165.00	6.6	25	4+500
166.25	6.65	25	4+525
162.50	6.5	25	4+550

مهندس الهيئة

حسام

مهندس الشركة

١٤٣٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف


مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٢ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٥)

أعمال توريد ورش طبقة تширیب (MC30)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
173.75	6.95	25	4+575
168.75	6.75	25	4+600
162.50	6.5	25	4+625
163.75	6.55	25	4+650
165.00	6.6	25	4+675
170.00	6.8	25	4+700
158.75	6.35	25	4+725
157.50	6.3	25	4+750
167.50	6.7	25	4+775
170.00	6.8	25	4+800
170.00	6.8	25	4+825
162.50	6.5	25	4+850
163.75	6.55	25	4+875
81.88	6.55	12.5	4+900
14778.13		الاجمالي	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٦)

اجمالي أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند
14778.13	٢م	للطريق FROM ST. 2+625 TO 4+900	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (4ج) بسمك ٦ سم ... الخ
14778.13	اجمالي العام		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف

مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٦)

اجمالي أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (٤ج) بسمك ٦ سم

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
77.50	6.2	12.5	2+625
157.50	6.3	25	2+650
157.50	6.3	25	2+675
157.50	6.3	25	2+700
157.50	6.3	25	2+725
157.50	6.3	25	2+750
155.00	6.2	25	2+775
157.50	6.3	25	2+800
157.50	6.3	25	2+825
155.00	6.2	25	2+850
157.50	6.3	25	2+875
157.50	6.3	25	2+900
157.50	6.3	25	2+925
160.00	6.4	25	2+950
157.50	6.3	25	2+975
177.50	7.1	25	3+000
167.50	6.7	25	3+025
160.00	6.4	25	3+050
168.75	6.75	25	3+075
167.50	6.7	25	3+100
167.50	6.7	25	3+125
170.00	6.8	25	3+150
166.25	6.65	25	3+175
163.75	6.55	25	3+200
166.25	6.65	25	3+225
170.00	6.8	25	3+250

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٦)

اجمالي أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
167.50	6.7	25	3+275
155.00	6.2	25	3+300
150.00	6	25	3+325
157.50	6.3	25	3+350
163.75	6.55	25	3+375
157.50	6.3	25	3+400
160.00	6.4	25	3+425
152.50	6.1	25	3+450
151.25	6.05	25	3+475
151.25	6.05	25	3+500
151.25	6.05	25	3+525
150.00	6	25	3+550
142.50	5.7	25	3+575
146.25	5.85	25	3+600
156.25	6.25	25	3+625
151.25	6.05	25	3+650
155.00	6.2	25	3+675
145.00	5.8	25	3+700
152.50	6.1	25	3+725
157.50	6.3	25	3+750
156.25	6.25	25	3+775
175.00	7	25	3+800
207.50	8.3	25	3+825
168.75	6.75	25	3+850
168.75	6.75	25	3+875
175.00	7	25	3+900

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والجسور (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروع على الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عمليه / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف
 مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم
 تنفيذ / مكتب الوزير للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٦)

اجمالي أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (٤ج) بسمك ٦ سم

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
175.00	7	25	3+925
172.50	6.9	25	3+950
168.75	6.75	25	3+975
161.25	6.45	25	4+000
171.25	6.85	25	4+025
167.50	6.7	25	4+050
170.00	6.8	25	4+075
170.00	6.8	25	4+100
158.75	6.35	25	4+125
166.25	6.65	25	4+150
158.75	6.35	25	4+175
158.75	6.35	25	4+200
160.00	6.4	25	4+225
195.00	7.8	25	4+250
167.50	6.7	25	4+275
158.75	6.35	25	4+300
160.00	6.4	25	4+325
160.00	6.4	25	4+350
166.25	6.65	25	4+375
171.25	6.85	25	4+400
155.00	6.2	25	4+425
150.00	6	25	4+450
156.25	6.25	25	4+475
165.00	6.6	25	4+500
166.25	6.65	25	4+525
162.50	6.5	25	4+550

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
داروغات



CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف


مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٦)

اجمالي أعمال انشاء طبقه سطحية تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
173.75	6.95	25	4+575
168.75	6.75	25	4+600
162.50	6.5	25	4+625
163.75	6.55	25	4+650
165.00	6.6	25	4+675
170.00	6.8	25	4+700
158.75	6.35	25	4+725
157.50	6.3	25	4+750
167.50	6.7	25	4+775
170.00	6.8	25	4+800
170.00	6.8	25	4+825
162.50	6.5	25	4+850
163.75	6.55	25	4+875
81.88	6.55	12.5	4+900
14778.13	الاجمالي		



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٢٠١٢


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عربية / أصل إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٢,٤ كم
 تنفيذ / مكتب التوريد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٧)

اجمالي أعمال توريد وتوضيب ورصف صلب التسلیح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الأنشائية

ال Benson	الوحدة	الاعمال	ال Benson
1.26	بالطن	FROM ST. 8+370 TO ST 8+416	بالطن أعمال توريد وتوضيب ورصف صلب التسلیح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الأنشائية والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد ... الخ
1.26		اجمالي العام	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال استكمال صيانة ورفع كلاء طريق أبو جلال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢٤ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

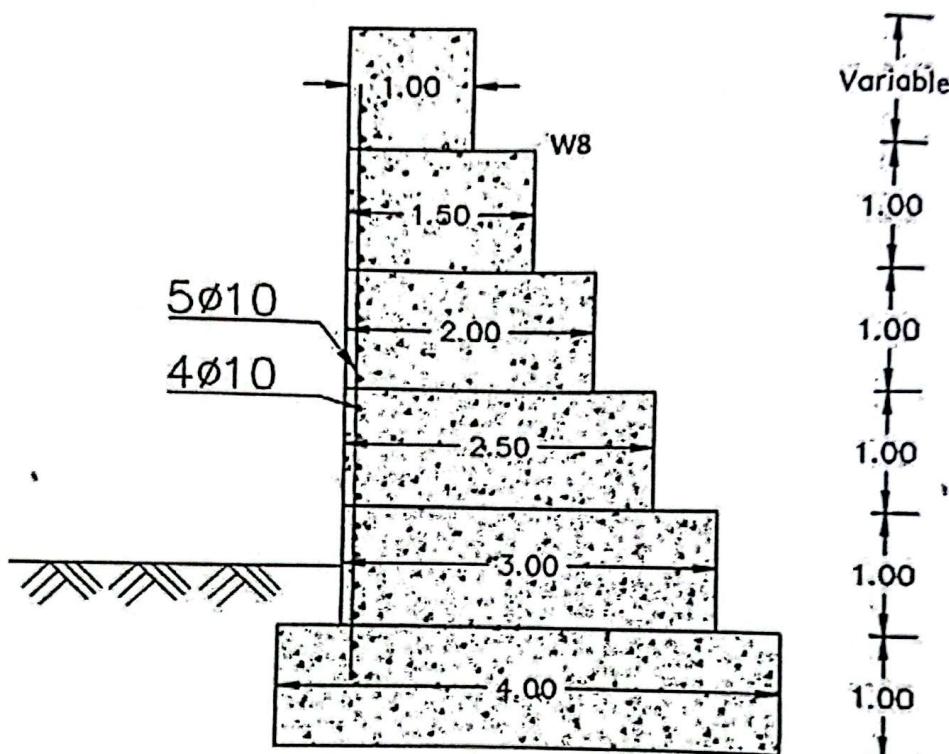
بند رقم (٧)

أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسلیح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الأنثانية

الاجمالي	الوزن بالكجم للمتر الطولي	قطر السيخ	عدد الاسياخ	طول السيخ	طول القطاع	الاعمال
حديد الحائط						
701.84	0.617	Φ 10	5	5	45.5	FROM ST. 8+370 TO ST 8+416
561.47			4			
1263.31	الاجمالي العام (بالكجم)					
1.26	الاجمالي العام (بالطن)					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٤٢٠٢١



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Personal: 01005262334 برج طيبة - شارع الشام - الزقازيق

Personal: dr_amohamady@yahoo.com

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال استكمال صيانة ورفع كلاء طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١٠,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٢,٤ كم تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

(٨) بند رقم

اجمالي أعمال توريد وصب حواطط ساند من الخرسانة العادية

البند (٨)	الاعمال	الوحدة	الاجمالي
بالمتر المكعب أعمال توريد وصب حواطط ساند من الخرسانة العادية م على ان تكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل مقاومته المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم / ٣ م ... الخ	FROM ST. 8+370 TO ST 8+416	٣م	618.80
الاجمالي العام			618.80

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم ويطول اجمالي ٤،٢ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

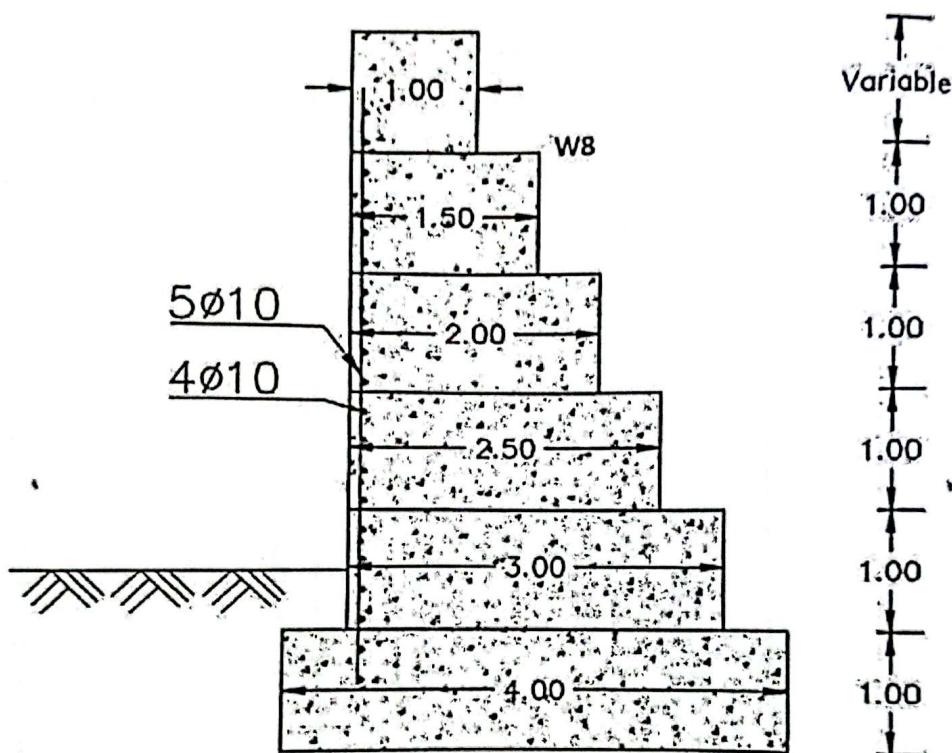
بند رقم (٨)

أعمال توريد وصب حواطط سانده من الخرسانة العادية (FROM ST. 8+370 TO ST 8+416)


الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
182.00	1.00	4	45.5	القدمة
136.50	1.00	3	45.5	القصبة الاولى
113.75	1.00	2.5	45.5	القصبة الثانية
91.00	1.00	2	45.5	القصبة الثالثة
68.25	1.00	1.5	45.5	القصبة الرابعة
27.30	0.60	1	45.5	القصبة الخامسة
618.80				الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



١٦٦٦٦٦٦



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم
 تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٩)

اجمالي أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند (٩)
28	عدد	للطريق FROM ST. 2+625 TO 4+900	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش الخاصه بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ... الخ
28		اجمالي العام	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤,١ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٤,٤ كم

تنفيذ / مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (١٠)

اجمالي أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة قطر ٧٠ سم

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند (١٠)
12	عدد	للطريق FROM ST. 2+625 TO 4+900	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة ... الخ
12	اجمالي العام		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهليه .
 عملية / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (١٠)

اجمالي أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة قطر ٨٠ سم

الاجمالي	الوحدة	الاعمال	البند (١٠)
٩	عدد	للطريق FROM ST. 2+625 TO 4+900	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة ... الخ
٩		اجمالي العام	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٤،٢ كم مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

تقرير عن تقييم أعمال الرصف لعملية

أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ٤،١ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٤،٢ كم مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الهيئة العامة للطرق والكباري - منطقة شرق الدلتا

تنفيذ

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق



١ مشروع / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١
كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

بناءً على الأمر الإداري رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ م بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٣ م والخاص بتشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي لعملية / مشروعات الطرق ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مركز شربين بمحافظة الدقهلية والخاصه بأعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم ، تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطريق.

وبعد أن قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية ، وتحليل نتائج التقارير المعملية لنتائج الإختبارات الخاصة بأعمال لجنة الإستلام الإبتدائي ونتائج الإختبارات الحقلية ، تم رصد بعض الخروج عن الموصفات الخاصة للمشروع ، تقع ضمن الحدود التي تقبل الخصم وذلك حسب أسس الكود المصري .

أولاً: الإختبارات التي تمت للأعمال المنفذة:

وجد بملف العمليه الإختبارات التي تمت للأعمال المنفذة وهي على النحو التالي :

- تقرير معملي رقم (٤٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٨ م من معمل الهيئة العامة للطرق والكباري منطقة شرق الدلتا - إدارة المعامل وضبط الجوده .

خاص .
- عدد (٤) عينات دمك لطبقة الأساس الاولى واسفل التكسير واساس طرانش من

موقع مختلف .

- عدد (٣) عينة أساس سن ٦ طبقة أساس اولي ك ٤,٠٠ & ك ٤,٥٠٠ أساس اسفل تكسير & ك ٥,٥٠ أساس طرانش صلاحية .

- تقرير معملي رقم (٤٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ م من معمل الهيئة العامة للطرق والكباري منطقة شرق الدلتا - إدارة المعامل وضبط الجوده .
خاص .

- عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية طبقة نهائية ك ٣,٦٠٠ .
- عدد ٧ عينات دمك مواقع مختلفة .

- تقرير معملي رقم (٤١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ م من معمل الهيئة العامة للطرق والكباري منطقة شرق الدلتا - إدارة المعامل وضبط الجوده .
خاص .

٣) عينات دمك مواقع مختلفة .



- تقرير معملي رقم (٤٥٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠ م من معمل الهيئة العامة للطرق والكباري منطقة شرق الدلتا - إدارة المعامل وضبط الجودة.

خاص.

- عدد (٣) عينة مخلوط أسفلتي طبقة سطحية (٤ ج).

• تقرير معملي رقم (٤٧٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ م من معمل الهيئة العامة للطرق والكباري منطقة شرق الدلتا - إدارة المعامل وضبط الجودة.

خاص.

- عدد (٢) عينة خلطة اسفالية لطبقة السطحية (٤ ج) من موقع مختلفة.

• تقرير معملي رقم (٦٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٤ م من معمل الهيئة العامة للطرق والكباري منطقة شرق الدلتا - إدارة المعامل وضبط الجودة .

خاص (بالاستلام الابتدائي للمشروع)

- عدد (٨) عينات كور أسفلتي من موقع مختلفة .

- عدد (٢) عينة بلاطة أسفلت طبقة سطحية (٤ ج) .

- عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية .



Al-Sherbini



مشروع / أعمال استكمال صيانة ورفع كفاءة طرية، أبو جال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) يطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ٠,٤ كم وبطول إجمالي ٢,٤ كم مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ثانياً : تقييم أعمال طبقة الأساس سن ٦

• التدرج:

المواصفات	عينه ٤ ك ٤+٥٥٠	عينه ٣ ك ٤+٠٠٠	عينه ٢ ك ٣+٩٠٠	عينه ١ ك ٣+٦٠٠	المدخل
تدرج بـ ١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	مehr سعة ١١٢
١٠٠-٧٠	٩٧	٩٩	٩٨	٩٨	١١٥
٨٥-٥٥	٧٧	٧٩	٨٢	٨٢	١١
٨٠-٥٠	٦٢	٦٣	٦٥	٦٥	١١ ٣/٤
٧٠-٤٠	٥٠	٥١	٥٢	٥٢	١١ ٣/٨
٦٠-٣٠	٤١	٤١	٤٠,٥٦	٤٢	مehr رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٢	٣٢	٣٢	٣٣	١٠
٣٠-١٠	١٩	١٩	١٨	١٩	٤٠
١٥-٥	١٠	٩,٧	١٠	١١	٢٠٠

كما هو واضح من القيم المبينة بالجدول لا يوجد خروج في العينات على النحو التالي :

- الخروج في الخشن: لا يوجد خروج بالعينات.
- الخروج في الناعم: لا يوجد خروج بالعينات.
- الخروج في البدرة: لا يوجد خروج بالعينات.

وعليه لا يوجد خصم على طبقة الأساس سن ٦ .



Al-Sherbini

Al-Sherbini



ثالثاً: أعمال تقييم طبقة الأسفلت السطحية (٤ ج).

• التدرج:

المواصفات ج ٤	الدرج التصميمي	عينة (٧) ك ٤+٩٠٠	عينة (٦) ك ٤+٦٠٠	عينة (٥) ك ٤+٥٠٠	عينة (٤) ك ٤+٣٠٠	عينة (٣) ك ٣+٨٠٠	عينة (٢) ك ٣+٥٠٠	عينة (١) ك ٣+٣٠٠	المدخل
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠-٨٠	٩٦-٨٦	١٠٠	٩٩	٩٦	١٠٠	١٠٠	٩٨	٩٨	"٣/٤
٨٠-٦٠	٧١,٩-٦١,٩	٧٢	٧٥	٧٥	٧٤	٧٣	٧٣	٧٤	"٣/٨
٦٥-٤٨	٥٢,٦-٤٨,٠	٤٩	٥٠	٤٩	٥١	٥١	٥٠	٥١	رقم ٤
٥٠-٣٥	٤٠,٩-٣٥,٠	٣٩	٣٧	٣٨	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	رقم ٨
٣٠-١٩	٢٤-١٩	٢٣	٢٢	٢١	٢٣	٢٢	٢٢	٢٣	رقم ٣٠
٢٣-١٣	١٦,١-١٣,٠	١٤	١٤	١٤	١٥	١٤	١٥	١٦	رقم ٥٠
١٥-٧	١٠,٢-٧,٢	٨	٨	٧,٩	٨,١	٧,٨	٨,٩	٨,١	رقم ١٠٠
٨-٣	٧,٢-٤,٢	٤,٦٨	٥,٠٧	٥	٤,٩	٤,٧	٤,٨	٤,٨	رقم ٢٠٠
± ٥,٢٠ ٠,٢٥	٥,٧٥-٥,٢٥	٥,٣٨	٥,٣٩	٥,٤٩	٥,٥٢	٥,٥٦	٥,٤٨	٥,٤٠	نسبة الأسفلات

كما هو واضح من القيم المبينة بالجدول يوجد خروج في المناخل على النحو التالي :

- الزوج في الخشن : يوجد خروج بالعينات مناخي (٣/٤) & رقم (٣/٨) :

قيمة الخصم في الخشن = قيمة الخروج * نسبة الخصم * المسطح * سعر الطبقة.

- قيمة الخروج للعينات منخل $\frac{3}{4}$ =

$$\text{عينة (1)} = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * ٠,٠٣ * ٢ = ٤٠٤١ \text{ جنية}$$

$$\underline{\text{عينة}} \underline{\text{٤٠٤١}} = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * . . . ٣ * ٢ = (٢)$$

$$\underline{\text{عينة } ٨٠٨٢} = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * ٠,٠٠٣ * ٤ = (٣)$$

$$\underline{\text{عينة } ٨٠٨٢} = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * ٠,٠٠٣ * ٤ = (٤)$$

$$\underline{\text{عينة } ٦} = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * \dots, ٠,٠٣ * ٣ =$$

$$\underline{\underline{جنيه ٨٠٨٢}} = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * \dots ٣ * ٤ = (٧) \underline{\underline{\text{عينة}}}$$

قيمة الخروج للعينات من خل = ٣/٨

عنـة (١) = ٢,١ * ٠,٠٣ *

$$\text{عينة (1)} = \frac{٢٤٣}{٣١٩ * ٢١١١,١٦ * ٠,٠٠٣ * ٢,١} = ٤٢٤٣ \text{ جنية}$$

$$\underline{\text{عينة } ٢٤٤٢} = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * ٠,٠٠٣ * ١,١ = (٢)$$

$$\text{عنة } (٣) = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * ٠,٠٠٣ * ١,١ = ٢٢٢٢ \text{ جنية}$$

$$\underline{\underline{4243}} = 319 * 2111,16 * \dots ,003 * 2,1 = \underline{\underline{4}} \text{ جنية}$$



مشروع / أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١
كم وبطول إجمالي ٢,٤ كم مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

$$\text{عينة } (٧) = ٦٤٠٤٧ \text{ جنيه} = ٣١٩ * ٢١١١,١٦ * ٠,٠٠٣ * ٠,١ = ٢٠٢ \text{ جنيه}$$

قيمة الخصم في الخشن = ٦٤٠٤٧ جنيه

- الخروج في الناعم : لا يوجد خروج بالعينات.

- الخروج في البدرة : لا يوجد خروج بالعينات.

نسبة الأسفلت : لا يوجد خروج في نسبة الأسفلت بالعينات.

- وعليه يوجد خصم على الطبقة السطحية (٤ ج) = ٦٤٠٤٧ جنيه.



لـ عـاصـمـةـ الـعـدـدـ



مشروع / أعمال استكمال صيانة ورفع كلاء طريق أبو جال / الفاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم ويطل على كيلو ٤،٢ كم مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمنمبادرة الرئيسية "حياة كريمة"

• قياسات السمك ونسبة الدمك:

قامت لجنة الإسلام بقياس سمك الأكوراد المستخرجه لعدد (٨) كور وفق التقرير المعملي رقم (٦٨) بالإضافة إلى نسبة الدمك وكانت النتائج (لا يوجد خروج في السمك أو الدمك) كما هو موضح بالجدول التالي:

النوع كم م	الطبقة	سمك الكور	سمك الأسفالت المطلوب	السمك السمك	نسبة الدمك %	النقص في نسبة الدمك %
١	سطحية شمال	٦,٨	٦	لا يوجد	٩٩	لا يوجد
٢	سطحية يمين	٦,٥	٦	لا يوجد	٩٧	لا يوجد
٣	سطحية شمال	٦,٦	٦	لا يوجد	٩٩	لا يوجد
٤	سطحية شمال	٦,٤	٦	لا يوجد	٩٩	لا يوجد
٥	سطحية يمين	٦,٥	٦	لا يوجد	٩٨	لا يوجد
٦	سطحية شمال	٦,٢	٦	لا يوجد	٩٩	لا يوجد
٧	سطحية شمال	٦,٥	٦	لا يوجد	٩٨	لا يوجد
٨	سطحية شمال	٦,٩	٦	لا يوجد	٩٩	لا يوجد

• من القيم الموجودة بالجدول :

- لا يوجد نقص في السمك للطبقة الرابطة و طبقة الأسفالت السطحية .
- لا يوجد نقص في نسبة الدمك .

وعليه لا يوجد خصم على الدمك و السمك لطبقات الأسفالت .



مس



مشروع / أعمال استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جال / الشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة إلى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول إجمالي ٢,٤ كم مركز شربين - محافظة الدقهلية ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رابعاً : تقييم إستواء السطح والتجانس الطبقه السطحيه (ج ٤)

تجانس الخلطة:

بناء على الفحص البصري للأعمال رأت اللجنة أن يتم خصم ٣% من مسطح ٥% للطبقة نتيجة عدم تجانس الخلطة وسوء لحامات طولية وعرضية بسطح الاسفلت بقطاعات محدودة وذات شدة منخفضة وعلىه فإن :

قيمة الخصم نتيجة عدم تجانس الخلطة = نسبة الخصم * المسطح * السعر .

$$\text{قيمة الخصم نتيجة عدم تجانس الخلطة} = \left(\frac{٣}{١٩} \right) * \left(١٠٠ / ٣ \right) * ١٤٧٧٨,٩١ \% = ٧٣٨,٩١ \% * ١٤٧٧٨,٩١ = ٧٠٧٢ \text{ جنية .}$$

سادساً : الخلاصه ونتيجة التقييم:

من خلال التقييم المعملي والمعاينه ومتقدم من أعمال تقييم فإن إجمالي قيمة الخصم بالعملية هو :

• الخصم في طبقات أساس سن ٦ = لا يوجد خصم .

• الخصم نتيجة الخروج في التدرج والبودره والبيتمين لطبقه الأسفالت السطحية (ج ٤)

• الخصم في طبقة الأسفالت السطحية نتيجة عدم تجانس الخلطة وعدم إستواء السطح = ٦٤٠٤٧ جنية .

وبذلك يكون إجمالي الخصم = ٧١١٩ جنية (واحد وسبعون الفا ومانة وتسعة عشر جنيها لغير).

اللجنة:



١ - مترس
٢ - مترس



- ٤



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

محضر تقييم

اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار الاداري المحلي رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ الصادر من الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا لتقييم عملية أعمال إستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة (القطاع الأول والثاني) بطول ١,٤ كم بالإضافة الى أعمال رصف مسافة ١ كم وبطول اجمالي ٢,٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تنفيذ مكتب الويلد للمقاولات العامة ورصف الطرق وقامت باعتماد التقييم واعتماده واللجنة مكونة من :-

١ - المهندس / محمد أمين عبد الكريم

٢ - المهندس / أسماء صلاح

٣ - المهندس / منار السيد عبدالله

٤ - المهندس / وليد حمدي محمد عطية

❖ وكان الخصم الظاهري كالتالي :

- تقييم إستواء السطح والتجانس الطبقية السطحية (٤ج) :

• تجانس الخلطة و إستواء السطح :

- يتم خصم ٣ % من ٥ % من اجمالي الكميات بمبلغ وقدره ٧٠٧٢ جنيه.

❖ وكان الخصم نتيجة المعامل :

الطبقة السطحية :

• تم خصم مبلغ ٦٤٠٤٧ جنيهًا .

❖ وكان اجمالي الخصم :

• ٧١١٩ جنيهًا (واحد وسبعون الفا ومائة وتسعة عشر جنيها لا غير).

» اللجنة :



١ - منسق
٢ - كشاف
٣ - معاشر

