

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر
بيان الأعمال بالمستخلص ختامي، ٤ (اتجاه الضيعة)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع المقطار الكهربائي السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات المنسوبة بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم (أعلى منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفترة شاملة بالمتر المكعب.
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
- والبدء ليشمل القيمة المحجورة.

رقم البند وبيلته: (١)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات والتجارة

٧٧٣,١٠٠	مقدار العمل السابق	٧٧٨٤,٦٠	الكمية بالمقايسة
---------	--------------------	---------	------------------

الاجمالي ٢م	مكعب ٣م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	من	
٧٧٨٤,٦٠	٢٢٤,٥٥	١٤٠+٢٧١	٠٤٠+٢٧١	أعمال الردم (الجسر الترابي)
	٦٩٥٣,٦٠	٨٤٠+٢٧٢	٦٤٠+٢٧٢	
	٢٣٨٥,٤١	٥٤٠+٢٧٤	٣٠٠+٢٧٤	
	١٦٦٦,٢٩	٨٠٠+٢٧٤	٥٦٠+٢٧٤	
	٢٥٠٧٤,٤٢	٩٨٠+٢٧٤	٨٢٠+٢٧٤	
	٤١٦١,٣٣	٧٦٠+٢٧٠	٧٤٠+٢٧٠	
٩١٥,٣٧		٣٢٠+٢٧٣	٣٢٠+٢٧٣	
الاجمالي				
٧٧٨٤,٦٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٧٧٣,١٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
٥٣٩,٦٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٧٧٨٤,٦٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص النهائي			

يتمتع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م/ أحمد ابو ذقبة

مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

XYZ

ك.ك

المرحلة

عن الشركة

بالتصميم

عملية: أعمال الجسر الزاوي والأعمال الصانعية لمشروع القطر الكوراني السريع

أعمال تحميل وتوزيع ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيير بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (2 متر) لسطح ملسوب القوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى ملسوب (2 متر) من ملسوب القوية لاستكمال الملسوب التصميمي لتشكل الجسم الزاوي والكتاف (على الأقل نسبة تحمل ٩٥٪) أو الأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالرماد الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصدة النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وقوانين الهندس المشرف، والنفقة شاملة بالمرمى المكعب.

مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم.

والبيد لا يشمل النفقة المحجورة.

رقم البيد وبيانه (١)

تنفيذ شركة المسنين للمقاولات والتجارة

الكمية بالمقاييس

مقدار العمل السابق

٧٥٥.١,٠٠

الاجمالي ٣م

مكعب ٣م

الموقع الكيلو مترى

بيان الأعمال بالمقاييس

إلى	من	الاجمالي
١٤٠+٢٧١	٠٤٠+٢٧١	١٢٤,٥٥
٨٤٠+٢٧٢	٧٤٠+٢٧٢	١٩٥٢,٦٠
٥٤٠+٢٧٤	٣٠٠+٢٧٤	٢٣٨٥,٤١
٨٠٠+٢٧٤	٥٦٠+٢٧٤	١٦٦٦,٢٩
٩٨٠+٢٧٤	٨٢٠+٢٧٤	٢٥٠٧٤,٤٢
٧٦٠+٢٧٠	٧٤٠+٢٧٠	٤١٦١,٢٣
٣٤٠+٢٧٢	٣٢٠+٢٧٢	٩١٥,٣٧
الاجمالي		
٧٧٨٤,٩٧		

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

من الاستشاري

مختص
عن الهيئة
عبد الوهاب
عبد الوهاب

K.K

٧٧٢

عبد الوهاب
عبد الوهاب

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Station		previous total		15744.63	9081.01	14396.94	6999.40	14860.98	905.15	61988.110
Layer	قوى	Qty(m3)	15744.63	0	0	755.83	247.74	0	0	1003.56
	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	326.87	0	0	0	1082.7
Forma	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	382.04	0	0	0	1137.86
	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	386.54	0	0	0	1142.37
Forma	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	396.16	0	0	0	1081.99
	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	262.4	0	0	0	1018.22
Forma	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	199.82	0	0	0	955.65
	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	165.18	0	0	0	921.01
Forma	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	145.55	0	0	0	901.37
	قوى	Qty(m3)	0	0	755.83	107.06	0	0	0	862.89
Forma	قوى	Qty(m3)	0	0	744.88	54.16	0	0	0	799.04
	قوى	Qty(m3)	593.15	491.13	0	0	0	0	0	1084.28
Forma	قوى	Qty(m3)	657.98	491.12	0	0	0	0	0	1149.1
	قوى	Qty(m3)	701.08	491.12	0	0	0	0	0	1192.2
Forma	قوى	Qty(m3)	684.97	491.12	0	0	0	0	0	1176.09
	قوى	Qty(m3)	686.25	491.13	0	0	0	0	0	1177.98
Forma	قوى	Qty(m3)	725.88	0	0	0	0	0	0	725.88
	قوى	Qty(m3)	216.03	0	0	0	0	0	0	216.03
Forma	قوى	Qty(m3)	222.86	0	0	0	0	0	0	222.86
	قوى	Qty(m3)	214.71	0	0	0	0	0	0	214.71
Forma	قوى	Qty(m3)	229.59	0	0	0	0	0	0	229.59
	قوى	Qty(m3)	246.64	0	0	0	0	0	0	246.64
Forma	قوى	Qty(m3)	233.54	0	0	0	0	0	0	233.54
	قوى	Qty(m3)	213.83	0	0	0	0	0	0	213.83
Forma	قوى	Qty(m3)	208.73	0	0	0	0	0	0	208.73
	قوى	Qty(m3)	238.63	0	0	0	0	0	0	238.63
Forma	قوى	Qty(m3)	250.93	0	0	0	0	0	0	250.93
	قوى	Qty(m3)	198.85	0	0	0	0	0	0	198.85
Forma	قوى	Qty(m3)	136.97	0	0	0	0	0	0	136.97
	قوى	Qty(m3)	126.35	0	0	0	0	0	0	126.35
Forma	قوى	Qty(m3)	393.86	0	0	0	0	0	0	393.86
	قوى	Qty(m3)	399.35	200.27	0	0	0	0	0	599.62
Forma	قوى	Qty(m3)	353.96	208.09	0	0	0	0	0	561.45
	قوى	Qty(m3)	295.87	210.68	0	0	0	0	0	506.55
Forma	قوى	Qty(m3)	258.77	228.33	0	0	0	0	0	487.08
	قوى	Qty(m3)	174.63	247.83	0	0	0	0	0	422.46
Forma	قوى	Qty(m3)	47.33	205.04	0	0	0	0	0	252.37
	قوى	Qty(m3)	0	81.21	0	0	0	0	0	81.21
Forma	قوى	Qty(m3)	0	3.56	0	0	0	0	0	3.56
	قوى	Qty(m3)	7034.5	5240.60	6093.8	4385.9	14861.0	905.2	38520.9	
Total Qty		Qty(m3)	38520.9							



Ministry of Transport and Public Works
Kingdom of Saudi Arabia

Electric Express Trains - HSR From El Ain El Soheina City To El Alamein

Electron - 8 From Wadi El Marouti
To Borg El Arab



Engineering Consulting Service

AS Built vol. III (جداول الكميات والكميات) جداول الكميات والكميات (جداول الكميات والكميات) جداول الكميات والكميات

~~Handwritten signature~~

	Section - 4 From Weel El Minshur To Borg El Arab *	
	Electric Express Train - MSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Station		Layer	previous total								Total	
Station	Layer		36187.79	11794.33	38178.68	54087.46	75142.85	3,851.74	219242.86			
Total Qty	الطبقة	QTY(m3)	36187.79	11794.33	38178.68	54087.46	75142.85	3,851.74	219242.86			
	الطبقة	QTY(m3)	36187.79	11794.33	38178.68	54087.46	75142.85	3,851.74	219242.86			
2989.29	2088.68	الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	120.86		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	127.16		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	125.36		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	130.3		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	135.89		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	137.69		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	142.66		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	142.54		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	146.33		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	149.85		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	142.85		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	143.05		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	149.2		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	150.66		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	144.28		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	76.47		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	158.42		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	168		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	160.15		
		الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	143.93		
الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	131.74				
الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	61.9				
الطبقة	0	0	0	0	0	0	0	0				

As Built vol. fill

Electric Express Train - MSR from El Ain El Sahne City To El Alaminah

Section - 4 From Weid El Moutoush To Bing Elarab

Employer Consultant: SHAKEN

AL-HUSSEIN CO. Engineering & Construction

Engineering Consulting Service

	Electric Express Train - HSA From El Adu El Sublime City To El Almatari Sectors - 4 From West El Moutarah To Bagh Marsh "	Customer From Station 270+000 To Station 275+000
Employer Contract	RT Consultant	

Handwritten signature and text at the bottom of the page.

Customer	From Station 275+000 To Station 275+000 To Bag Station " "	RK Corrosion
----------	--	--------------

	Electric Express Train - HSH from El Ain El Sahine City To El Mahmoud	Employer's Statement
---	---	----------------------

→ ১৫৬৬

Q. 11. c

Station	Unit	Price	Quantity	Amount	Previous total	22079.84	5706.00	0.00	3559.70	0.00	1604.88	51278.66
221+740	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+750	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+760	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+770	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+780	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+790	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+800	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+810	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+820	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+830	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+840	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+850	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+860	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+870	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+880	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+890	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+900	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+910	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+920	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+930	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+940	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+950	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+960	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+970	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+980	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
221+990	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+000	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+010	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+020	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+030	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+040	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
2												
222+050	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+060	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+070	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+080	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+090	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+100	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+110	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+120	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+130	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+140	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+150	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+160	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+170	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+180	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+190	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+200	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+210	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+220	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+230	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+240	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+250	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+260	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+270	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+280	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+290	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+300	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+310	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+320	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+330	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+340	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+350	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+360	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+370	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+380	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+390	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+400	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+410	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+420	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+430	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+440	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+450	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+460	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+470	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+480	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+490	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+500	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+510	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+520	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+530	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+540	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+550	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+560	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+570	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+580	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+590	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+600	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+610	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+620	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+630	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+640	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+650	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+660	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+670	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+680	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+690	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+700	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+710	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+720	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+730	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+740	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+750	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+760	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+770	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+780	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+790	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+800	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+810	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+820	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				
222+830	متر	24.97	24.19	24.58	24.58	245.80	245.80	0.500				

	Electric Express Train - HS& From El Ain El Sokhna City To El Matruh	Section - 6 From Wadi El Matruh To Borg El Arab " From Station 275+000 To Station 275+000	KK Consultant
---	---	---	----------------------

[Handwritten signature]

 Ministry of Transport and Public Works General Directorate of Urban Mass Transportation	Electric Express Train - H54 From El Ain El Solhina City To El Alamein	Section - 4 From Wadi El Natrun To Borg El Arab - From Station 270+000 To Station 275+000	RE CONSULTING
--	---	--	----------------------

[Handwritten signature]

[illegible]

	Electric Express Trains - HSR From El Ain El Sahbia City To El Alamein	
Employee/Contractor	Section - 2 From West of Mediterranean To Borg El Arab "	From Station 270+000 To Station 275+000
Employer	EE Consultant	EE Consultant



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

المسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد...

الموضوع بخصوص :

عن عملية : إسناد الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين الجديدة - مطروح) قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥ كم (اتجاه الضبعة).

الشركة المنفذة : شركة الحسين للمقاولات و التجارة .

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامي ٤ .


برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه باللازم .

مرفقات عدد ()

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر البحيرة و كفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام عامر



وقد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف ومستندات العملية وفقر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة
بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعالجة الاصل المنفذة ظاهريا على الطبيعة

وبناء على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

أولا : الخصومات على الاختبارات المعملية

- الخصم على بند ردم الجسر الترابي :

لا يوجد خصومات على بند ردم الجسر الترابي.

- الخصم على بند سن الفلتر :

لا يوجد خصومات على بند سن الفلتر.

- نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والمرسلة من المنطقة لانهاء اجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف
و المنطقة المشرفة دون ادنى مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم .

ثانيا : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي :

مدير إدارة المشروعات للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)

مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مدير استشاري المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

استشاري المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

شركة الحسين للمقاولات و التجارة (الشركة المنفذة)

١- مدير المنطقة الثالثة عشر

٢- مدير المشروع

٣- مهندس تنفيذ العملية

٤- مهندس تنفيذ العملية

٥- مدير استشاري المشروع

٦- مدير الجودة للمشروع

٧- مدير التنفيذ للمشروع

٨- استشاري المساحة للمشروع

٩- شركة الحسين للمقاولات و التجارة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر البحيرة و كفر الشيخ

عبد السلام عامر



مقايضة ختامية

اسم العملية	استكمال إسناد أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) اتجاه الضبعة
الشركة المنفذة	شركة الحسين للمقاولات و التجارة
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	٢٣,٠٠٠,٠٠٠ م.ج
رقم التعاقد	٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١١٥٦
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٨ أشهر
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣ / ٠١ / ٠٩
قيمة المقايضة الختامية	٢٣,٠٠٠,٠٠٠ م.ج
قيمة الزيادة عن العقد الاصيلي	صفر م.ج
قيمة النقصان عن العقد الاصيلي	صفر م.ج
نسبة الزيادة عن العقد الاصيلي	صفر %
نسبة النقصان عن العقد الاصيلي	صفر %

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الحسين للمقاولات

مهندس المشروع مدير المشروع مدير إدارة المشروعات

م / بهجت مصطفى صدقي

م / احمد الشاعر م / احمد ابودقيقة م / كارم إمام

ب. بهجت مصطفى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

عبد السلام عامر



أعمال الجسر القري لمشروع مطار الكويت السريع
قطاع غرب النيل
 في المسافة من كم ٢٧.٠٠٠ إلى كم ٢٧.٤٠٠ بطول ٤٠٠ م (تجاه الضبعة)
 مكالمة ختامية

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	المبلغ	المبلغ (دينار)
١	أعمال تحميل وبنود ونقل التربة متطابقة المواصفات وتشجيرها باستخدام آلات التسوية بسعة لا تزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب القربة وبسكة لا تزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب القربة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر القري والكتلة (عمل التلال) نسبة تحمل كالميلينا من ٩٧٪ والأرض الطرية حاديرة يربطها بالمادة الأسبكية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنك الحديد والكورسات للوصول إلى النسب الكافة بحدود ٩٧٪ من الكتلة الجاهزة (التسوية) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والملاحظات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المستندة وألبيد يجمع مستلزمات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، وألبيد شاملة بالمتر المكعب - مسافة النقل حتى ١ كم ويتم احتساب حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو التخصيص - السعر يشمل عمل الشويرات والحلابة والحشرات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم وألبيد لا يشمل القيمة المضافة	٧٧٨٤٠,٦٠	م ^٣	٥٧,٠٠	٤٤٣٦٩٤,٤٨
٢	حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المستندة ٨٧ كم (إجمالي للتفاوتات)	٢٢٢,٠٠	م ^٣	١١٩,٠٠	٤٠٧٩٨,٠٠
٣	حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المستندة ٩٢ كم (السوي مشكور ٢)	١٧٩٦١,٩٩	م ^٣	١٢٦,٠٠	٢٢٣١٠,٦١٦
٤	حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المستندة ٩٠ كم (الفرش)	٣٣١٠,٤٦	م ^٣	١٢٢,٠٠	٤٠٧٨٢٩,٤٧
٥	حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المستندة ٩٢ كم (الكتلات)	١١١٤٦,١٨	م ^٣	١٢٦,٠٠	١٤٢٠٠٩,٥١
٦	حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المستندة ١١٠ كم (السلام)	١٢٢٠,٨٢	م ^٣	١٥٦,٠٠	١٨٤٥٩٧,٨٥
٧	رسم المواد الحجرية طبقاً لنموذج العقد (إطلس)	٣٤٢,٠٠	م ^٣	٤٨,٠٤٨	١٦٦٣٨,١٦
٨	رسم المواد الحجرية طبقاً لنموذج العقد (إسبول)	١٧٩٦١,١٦	م ^٣	٤٨,٠٤٨	٨٦٦٩٧,٨٢
٩	رسم المواد الحجرية طبقاً لنموذج العقد (إسكات)	١١١٤٦,١٨	م ^٣	٤٨,٠٤٨	٥٢٥٥٥,٢٢
١٠	رسم المواد الحجرية طبقاً لنموذج العقد (الفرش)	٣٣١٠,٤٦	م ^٣	٤٨,٠٤٨	١٥٩٠٦,٣٠٩
١١	رسم المواد الحجرية طبقاً لنموذج العقد (السلام)	١٢٢٠,٨٢	م ^٣	٤٨,٠٤٨	٥٨٦٦١,٠١
١٢	رسم الكرات والموافقات طبقاً للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لإسمار الطرق	٧٧٨٤٠,٦٠	م ^٣	١٢,٠٠	٩٠٦٩٧,٨٢
١٣	بالمتر المكعب أعمال حفر واستبدال (البيتون) وذلك بناء على توجيه المصلحة لمرحلة نهو الأعمال (أبجوع أنواع التربة هذا التربة الصخرية والسياسة السطح وألبيد التسوية والريش والمياه الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنك الحديد والكورسات للوصول إلى النسب الكافة (٩٧٪) من كتلة المادة التسوية) وشمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٤٠٠ متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والكتلات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المستندة وألبيد يجمع مستلزمات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، ويتم احتساب حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم في حالة الزائدة أو التخصيص	٦١٢٥٩,١٢	م ^٣	٢,٠٠	١٢٢٢٣٨,٥١
١٤	حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المستندة ١٠٠ - ٩٠ - ٨٠ - ٧٠ متر كم	٨٨٢٥٧,١٢	م ^٣	٧,٠٠	٦١٧٧٩٤,١٩
١٥	بالمتر المكعب لوريد وتنظيف وزرع من ١ و٢ و٣ متر متخرج كتلات خشبية ١:١ بنسبة اختصار لا تزيد عن ٣٪ ولا تحتوي على أي مواد التامعة أو الزيتية (إبرام من مخطط ٢٠٠) لها أو مواد طفافية أو زيت التلجول ولا يزيد نسبة الماء لجهاز لوس لجلوس عن ٩٢٪ يتم تنفيذها كمشقة تجميعي بأصناف أسفل سطح المزارع ومع ١٠٠ سم من الماء من أعلى منسوب المنسوب الإضافية يعادل ٥٠ سم ويتم المنك الحديد لتنظيف بمراس ٢٥ متر حتى التربة، المشقة أسفل الهياكل على أن لا يتم التفرقة لا بعد اعتماد الإسفل وأعمال الحفر والخراب العملية عليها والماء يشمل أعمال التحضير العملية والحقارة (اختيار الواج التجميعي قشر ٣٠ سم) على أن لا تزيد نسبة ٢٧٢/٢٧٢ عن ٢,٨ باستخدام حمل مقداره ٢٥٨٨ طناً بما في ذلك وألبيد المواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح الحثوي ويتم العمل طبقاً لأصول الصناعة المستندة - مسافة النقل لكل ١ كم - يتم احتساب حلاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو التخصيص - السعر لا يشمل قيمة المواد المضافة	٢٠٠٠,٠٠	م ^٣	١٠,٥٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠
١٦	رسم المواد الحجرية طبقاً لنموذج العقد (إسكات التلال)	٣٢١,٠٠	م ^٣	١٦٨,٠٠	٣٧١٢٨,٠٠
١٧	رسم الكرات والموافقات طبقاً للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لإسمار الطرق	٢٠٠٠,٠٠	م ^٣	٢٥,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
١٨	حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المستندة (إسكات التلال) ١٥١ - ٢٥ - ٨٢ كم	٢٠٠٠,٠٠	م ^٣	٩٧,٠٠	١٩٤٤٠٠,٠٠
١٩	أعمال حفر واستبدال المعادن الميكانيكية (الزوارق والحفارات ذات الدوارق الخفيفة) لتنظيف حفر المنابر الدبابة طريقاً للزوارق التصميمي المتمثل من هيئة الصرف ومعمل على بند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٤٠٠ متر من محور السكة ويتم تنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والملاحظات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المستندة وألبيد يجمع مستلزمات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وألبيد شاملة الجهة المستفيدة من هيئة الصرف	٢٢٢٢,١١	م ^٣	٢٢,٠٠	٧٥٧٧٩٧,٥٢
٢٠	حلاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المستندة ٨٠ - ٧٠ - ٦٠ متر كم)	٢٢٢٢,١١	م ^٣	٩,٥٠٠	٢١٠٩٢٦,٠٥
٢١	إجمالي قيمة المكالمة الختامية				٢٢٠٠٠٠٠,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب إدم حاتم فنديل

عن الشركة المتفردة

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير المكتب الفني

مدير المشروع

م / طارق إمام

م / أحمد أبو عتيقة

م / أحمد الشاذلي

م / رشاد مرس

م / محمد طارق

م / بهجت مصطفى حنفي

تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمد طارق

م / محمد طارق

م / محمد طارق

م / محمد طارق

م / محمد طارق

م / محمد طارق

م / محمد طارق

م / محمد طارق

م / محمد طارق



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

محضر استلام ابتدائي

لعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين للسفنة - العاصمة الادارية - العامين - مطروح) قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٠٠٠٠ الى الكم ٢٧٥٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه محور الضبعة (بالأمر المباشر).

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٥٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩.

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة.

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ و بناءً على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة اسلام ابتدائي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم ٢٠٠ حتى كم ٣٠٠ ترقيم القطار قرار رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٠٢٢/١١/٢٨) و بناءً على الطلب المقدم من شركة الحسين للمقاولات و التجارة بتسليم الاعمال ابتدائياً.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد و هم :-

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

١- السيد المهندس / كارم إمام

٢- السيد مهندس / احمد ابو دقيقة

٣- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

٤- السيد المهندس / حسن حاتم

عن الاستشارى

٥- السيد المهندس / رشاد محمد مرسى

٦- السيد المهندس / أحمد السعيد

٧- السيد المهندس / أحمد السيد

٨- السيد المهندس / ايمن عاطف

عن الشركة المنفذة

٩- السيد المهندس / بهجت مصطفى صدقي

مدير إدارة المشروعات للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)

مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العمالية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مدير استشاري المشروع (مكتب أ.د. / خالد قنديل)

مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د. / خالد قنديل)

مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د. / خالد قنديل)

استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

شركة الحسين للمقاولات و التجارة (الشركة المنفذة)

سما

و قد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف و مستندات العملية و دفتر الشروط و المواصفات و ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهرياً على الطبيعة.

و قد اسفرت المعاينة الظاهرية للاعمال على الاتي :-

(أ) اصال ردم الجسر الترابي :

تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ و التأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

تم اخذ عدد (١) عينة طبقاً للكشف المرفق و المعتمد بواسطة اللجنة بالامكان و المحطات المرفقة و سيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع.

(ب) اعمال توريد و فرش سن فلتر متدرج :

تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ و التأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

تم اخذ عدد (١) عينة طبقاً للكشف المرفق و المعتمد بواسطة اللجنة بالامكان و المحطات المرفقة و سيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع.

التوصيات:

- على الجهة المالكة للمشروع و استشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة و تكليف الشركة بعمل اى اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان.

- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات و تسليمها مرة اخرى لاستكمال الاعمال.

- تم اخذ العينات طبقاً للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة و تم ارسالها الى الجهات المرفقة في الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة و فور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتى تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيوذ في نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد.

- مرفق عدد (١) كشف بامكان و محطات و سمك العينات و الاختبارات الموقعية التي تم استلامها و موقع من اعضاء اللجنة.

- مرفق كشف بالتجارب التي تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ و نتائج هذه التجارب التي اطلعت عليها اللجنة.

و عليه ترى اللجنة:-

- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً و يعتبر تاريخ ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣ هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال و بداية فترة الضمان طبقاً لخطاب الشركة المنفذة بنهـو الاعمال.

- سرعة متابعة نتائج الاختبارات و موافاة اللجنة باصل نتائج الاختبارات حتى يتم نهـو اجراءات محضر التقييم.

- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ اعمال الجسر الترابي حتى يتسنى نهـو المشروع في مواعيدة المقررة.

توقيع اعضاء اللجنة:

مدير إدارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)




مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

شركة الحسين للمقاولات و التجارة (الشركة المنفذة)

- ١- 
- ٢- 
- ٣- 
- ٤- 
- ٥- 
- ٦- 
- ٧- 
- ٨- 
- ٩- 

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

البحيرة و كفر الشيخ

م/ محمد عبد السلام عامر



مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٥+٠٠٠

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

كشف باماكن و محطات العينات و الاختبارات الموقعية التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لأعمال ردم
الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع:

مسلسل	STATION	منسوب الطبقة	نوع الصلاحية	الجهة المرسل اليها العينة
١	من ٢٧٤+٣٢٠ وحتى ٢٧٤+٣٤٠	منسوب طبقة ١,٥٠ م	تربة	معامل جامعة الإسكندرية - كلية الهندسة
٢	من ٢٧٠+٥٨٠ وحتى ٢٧٠+٦٢٠	منسوب سطح المياه ٠,٢٥ م	سن فلتر متدرج	معامل جامعة الإسكندرية - كلية الهندسة

سيتم اجراء باقي الاختبارات الخاصة بمواصفات المشروع بالجهات المرفقة و موافاة اللجنة
بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسليم:-

- ١- مدير إدارة المشروعات للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- ٢- مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٣- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٤- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٥- مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٦- مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٧- مدير التنفيذ المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٨- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
- ٩- شركة الحسين للمقاولات و التجارة (الشركة المنفذة)

شهادة (١)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاصال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اصال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٥٠+٠٠٠ بطول ٥,٠٠ كم اتجاه الضبعة (بالمر المباشر) عقد رقم ١١٥٦-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩.

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة.

يشهد الاستشاري مكتب ا.د خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بالآتي:

- ١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العملية عالية طبقا للشروط والمواصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للشروط والمواصفات.
- ٢- يتم مراعاة خصم ما جاء بمحضر التقييم الابتدائي واية خصومات مستحقة.
- ٣- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ونفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

مدير إدارة المشروعات

م / كارم إمام

مدير المشروع

م / احمد ابونقيطة

مهندس المشروع

م / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م / محمد عبد السلام عامر



شهادة (٢)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسحاة العاصمة الإدارية العلمين الجديدة- مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠٠٠٠ الى الكم ٢٧٥٠٠٠ بطول ٥,٠٠ كم اتجاه الضبعة (بالأمر المباشر) عقد رقم ١١٥٦-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩.

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة.

يشهد الاستشاري مكتب ا.د خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامي للعملية وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط والمواصفات وطبقا للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

م/ كارم إمام

م / احمد ابودقيقة

م/ أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبدالسلام عامر



شهادة (٣)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكك الحاصلة الإدارية العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥,٠٠ كم اتجاه الضبعة (بالأمر المباشر) عقد رقم ١١٥٦-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة.

يشهد الاستشاري مكتب ا.د خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

م / كارم امام

م / احمد ابوبقيّة

م / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام عامر



جمهورية مصر العربية

(1)

استمارة لاعتماد الصحف

مادة الاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للعلوم والمباراة

قسم : الشؤون الإدارية

المبلغ المستحق إلى : شركة ك.ج.د. لخدمات المقاولات والتجارة

موجب : { الطلاب بطيه ، أو : مختلف خصائص (٤) حصر رقم (٥) ١١/٢٠٠٤

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد، إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : { شركة ك.ج.د. لخدمات المقاولات والتجارة

شيك على البنك المركزي في : { شركة ك.ج.د. لخدمات المقاولات والتجارة

شيك على الخارج : { صاحب الحق أو : شركة ك.ج.د. لخدمات المقاولات والتجارة

يسحب باسم : { شركة ك.ج.د. لخدمات المقاولات والتجارة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم : _____

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) انکاتب المنوط

تأيد في السجل برقم

عدد		الاعتقاد الإداري ونوع الخصم				
المرقات		بيانات		نوع الخصم		
		نقد	فرض	قسط	جنيه	قرش
محتله خصم قديم					١٨٠٦٧	
الحس الترابي						
صفر						
بيانات الاستقطاعات		إجمالي الأصل				
					١٨٠٦٧	
دعوى توقيع						
قرش		قرش	جنيه	جنيه		

الحزم دار الفاروق

2-29

علامہ

(١) إقرار كاتب سجل المحررات والتنازلات : _____ الإيمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإيمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيمضاء _____
 جاري بتاريخ الازدادات

المحتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

۲۰. روجع فی ————— سنه

باعتد صاحب
ششیک
اذن صرفه

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ م يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ط ح ا) ————— إضاء الكاتب المتوط

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

أعضاء مؤلفي الشذلي

الحتم ذو التاريخ (٢) سحب قبيل رقم إضاء الكاتب المخطوط : أذن صرف

(٤) قيد في سجل الشهادت تحت رقم إعضاء الكاتب الموقوف :

(٥) أدرج في كشف الشخصيات رقم إعضاء الكاتب المنوط :

وتوزيع صبرات الذميات على العلو

بہت مستطی

لاکھ پور

مدير المشروع
مهندس الجودة

مدير الجودة

مدير المشروع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع بخصوص: المستخلص الختامي لمشروع استكمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وأدى النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٧٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه الضبعة.

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٥٦) بتاريخ: ٢٠٢٣/٠١/٠٩

الشركة المنفذة: شركة الحسين للمقاولات والتجارة

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه صورة من محاضر مراجعة البونات الخاصة بالمواد المحجزة للمشروع وذلك بعد التقديم بواسطة الشركة والمراجعة بواسطة استشاري الهيئة للمشروع والاعتماد بواسطة الهيئة.

حيث كانت الكميات المحجزة الموردة بالمتر المكعب للعملية عالية وذلك من تاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ وحتى تاريخ نهو العملية وبياناتها كالاتي:-

إجمالي الاترية: ٧٧٨٤٠,٦٠ م^٣

إجمالي سن الفلتر : ٢٠٠٠,٠٠ م^٣

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الشركة

عن الاستشاري

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ بهجت مصطفى صدقي

مدير المكتب الفني

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير إدارة المشروعات

م/ محمد طارق

م/ رشيد مرسى

م/ احمد الشاعر

م/ احمد أبو دقيفة

م/ كادوم إمام

م/ كادوم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبدالسلام عامر



نموذج رقم ٢

بشأن: حصر المواد المحجرية الواردة
بالمستخلص

القيّد: ... / ... / ٢٠٢٣ / المنطقة /
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٠٠٠ / ٠٠٠

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين
السفنة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه الضبعة.

تنفيذ / شركة الحسين للمقاولات و التجارة عقد رقم / ٢٠٢٣-٢٠٢٢-١١٥٦

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة ببياتها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
	ترية	م ^٣	٣٤٢٠,٠٠٠	اطلس (تصريح)
	ترية	م ^٣	١٧٩٦١,١٦٠	السيوي (بون)
	ترية	م ^٣	١١١٤٦,١٥٠	السادات (تصريح)
	ترية	م ^٣	٣٣١٠٤,٤٦٠	الفيروز (تصريح)
	ترية	م ^٣	١٢٢٠٨,٨٣٥	السلام (تصريح)
	سن الفلتر	م ^٣	٢٠٠٠,٠٠	كسارة النيل (تصريح)

هذا وقد تمت مراجعة (اليونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة
للكميات الواردة بالمستخلص.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية صورة من محاضر مراجعة اليونات الخاصة بالمواد المحجرية للمشروع و ذلك بعد تقديمها بواسطة الشركة
و المراجعة بواسطة استشاري الهيئة و الاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مهندس المشروع مدير المشروع مدير إدارة المشروعات

مدير المكتب الفني مدير المشروع

م/ بهجت مصطفى صدقي

م/ احمد الشاعر م/ احمد أبو دقيقة م/ كارم إمام

م/ رشاد مرسي م/ محمد طارق

بصحة مصطفى

يعتَمَد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة حشر البصرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبد السلام عامر



نموذج رقم ٢

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة
بالمستخلص

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٠٠٠ / ٠٠٠
الفيد: ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢٠٢٣ / المنطقة /

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين
السفنة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه الضبعة.

عقد رقم / ٢٠٢٣-٢٠٢٢-١١٥٦

تنفيذ / شركة الحسين للمقاولات و التجارة

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببيتها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
	تربة	م ^٣	٣٤٢٠,٠٠٠	اطلس (تصريح)
	تربة	م ^٣	١٧٩٦١,١٦٠	السيوي (بون)
	تربة	م ^٣	١١١٤٦,١٥٠	السادات (تصريح)
	تربة	م ^٣	٣٣١٠٤,٤٦٠	الفيروز (تصريح)
	تربة	م ^٣	١٢٢٠٨,٨٣٥	السلام (تصريح)
	سن الفلتر	م ^٣	٢٠٠٠,٠٠	كسارة النيل (تصريح)

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة
للكميات الواردة بالمستخلص.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية صورة من محاضر مراجعة البونات الخاصة بالمواد المحجّرة للمشروع و ذلك بعد تقديمها بواسطة الشركة
و المراجعة بواسطة استشاري الهيئة و الاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مهندس المشروع / م / احمد الشاعر

مدير المشروع / م / رشاد مرسي

مدير المكتب الفني / م / محمد طارق

م / بهجت مصطفى صدقي

م / كرم امام

م / احمد ابو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / رشاد مرسي

م / محمد طارق

م / بهجت مصطفى صدقي

يعتَمَد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

القائمة: مدير البحيرة وكفر الشيخ

م / محمدي عبدالسلام عامر



نموذج رقم ٢

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة
بالمستخلص

القيد: ... / ... / ٢٠٢٣ / المنطقة /
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٠٠ / ٠٠

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين
السخنة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٠٠٠٠ الى الكم ٢٧٥٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه الضبعة.

تنفيذ / شركة الحسين للمقاولات والتجارة عقد رقم / ٢٠٢٣-٢٠٢٢-١١٥٦

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببياتها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
	ترية	م ^٢	٣٤٢٠,٠٠٠	اطلس (تصريح)
	ترية	م ^٢	١٧٩٦١,١٦٠	السيوي (بون)
	ترية	م ^٢	١١١٤٦,١٥٠	السادات (تصريح)
	ترية	م ^٢	٣٣١٠٤,٤٦٠	الفيروز (تصريح)
	ترية	م ^٢	١٢٢٠٨,٨٣٥	السلام (تصريح)
	سن القلتر	م ^٣	٢٠٠٠,٠٠	كسارة النيل (تصريح)

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المالية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة
للكميات الواردة بالمستخلص.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية صورة من محاضر مراجعة البونات الخاصة بالمواد المحجّرة للمشروع و ذلك بعد تقديمها بواسطة الشركة
و المراجعة بواسطة استشاري الهيئة و الاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

م/ بهجت مصطفى صدقي مدير المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير إدارة المشروعات

م/ محمد طارق م/ رشاد مرسي م/ احمد الشاعري م/ احمد أبو دقيقة م/ كرام إمام

م/ محمد طارق م/ رشاد مرسي م/ احمد الشاعري م/ احمد أبو دقيقة م/ كرام إمام

يُعْتَمَد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

القائمه بحسب البحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبد السلام عامر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص ختامي ٤ (اتجاه الضبعة)

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الدراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقاً للأورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على بند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتساويها للجهة المستولة من هيئة الصرف .
- يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم في حالة الزيادة أو النقصان :

رقم البند وبيانه: (١٠)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات والتجارة

٣٢٥٤٨,٠٠	مقدار العمل السابق	٣٢٧٣٠,١١	الكمية بالمقايسة
----------	--------------------	----------	------------------

الاجمالي م٣	مربع م٣	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
		الى	من	
٣٢٧٣٠,١١	٨٥٣١,١١	٢٧٥٠+٠٠	٢٧٤١+٠٠	أعمال حفر المصرف البديل
	٢٤١٩٩,٠٠	٢٧٠+٨٠٠	٢٧٠+٥٦٠	
الاجمالي				
٣٢٧٣٠,١١	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٣٢٥٤٨,٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
١٨٢,١١	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٣٢٧٣٠,١١	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الختامي			

مدير المشروع
م/ أحمد ابو دقيرة

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

عن الشركة

أحمد دقيرة

KK
محمد كاظم

XYZ
أ. م. عامر

ب. ه. ع. م. ط. ن. ي.

بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٣ (اتجاه الضريبة)

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الدراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقاً للأورينك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف و محمل على بند تحميل و نقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية الاموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشملاته طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و تسليمها للحجة المستولة من هيئة الصرف .
رقم البند وبيانه: (١٠)
- يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم في حالة الريادة أو التقصان .

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق	٣١٧٤٨,٠٠
------------------	--------------------	----------

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		مربع م ^٢	الاجمالى م ^٢
	من	الى		
اعمال حفر المصرف البديل	٢٧٤+١٠٠	٢٧٥+٠٠٠	٨٥٣١,١١	٣٢٧٣٠,١١
	٢٧٠+٥٦٠	٢٧٠+٨٠٠	٢٤١٩٩,٠٠	
	الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
٣٢٧٣٠,١١				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
٣١٧٤٨,٠٠				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
٨٠٠,٠٠				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				
٣٢٥٤٨,٠٠				

عن الاستشارى

يعتمد
عن الهيئة
١٢١/٥/٢٠٢٥


KK
عن الشركة

XVZ
ازمن عاصم

عن الشركة
ازمن عاصم



مدير المشروع / أحمد أبو قاطونا



مهندس المشروع / أحمد الشاهر

من الهيئة العامة للطرق والكباري

بشأن

- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / مكتب د - مكتب د - مدير المشروع
- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / د - د - مدير المشروع
- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / د - د - مدير المشروع
- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / مكتب د - مكتب د - مدير المشروع
- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / مكتب د - مكتب د - مدير المشروع


م / أحمد الشاهر
م / محمد طارق
م / أحمد السعد
م / نهج مصطفى

وحي : في وقت لاحق

الهيئة العامة للطرق والكباري في

الهيئة العامة للطرق والكباري في وقت لاحق في

- (٣٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠)
- (٣٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠)
- (٣٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠)
- (٣٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠)
- (٣٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠)
- (٣٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠) (١٠٠٠٠٠٠)

وحي : في وقت لاحق

الهيئة العامة للطرق والكباري في وقت لاحق في

- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / مكتب د - مكتب د - مدير المشروع
- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / د - د - مدير المشروع
- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / مكتب د - مكتب د - مدير المشروع
- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / مكتب د - مكتب د - مدير المشروع
- (المستشاري) (١٤٢٨) جلد قديم / مكتب د - مكتب د - مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري في وقت لاحق في

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري

॥ गणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Eğilimler /
Tarihler

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

- [illegible]

[illegible]

॥ ललिते ॥ ललिते / ललिते सुखे ॥ ललिते ॥ ललिते

11/11/11

(Date of Birth)



(Name)



(Name)

(Address)

(City)

(State)

(Country)

(Phone Number)

(Email Address)

(Occupation)

(Education)

(Experience)

(Skills)

(References)

(Recommendations)

(Testimonials)

(Feedback)

(Comments)

(Notes)

(Remarks)

(Observations)

(Conclusions)

(Summary)

(Final Remarks)

(Closing Statement)

(Signature)

(Date)

(Location)

(Time)

(Page Number)

محمّد

محمّد

محمّد

السيد المهدي / نهج مصطفى صديقي

السيد المهدي / أحمد السعيد

السيد المهدي / أحمد محمود أبو دقوقة

التوقيع:

وحتى هذا تم التوقيع

حتى

٢٠٢٢/٧/١٩ تاريخ من تاريخ (ابتداء) غير (ثلاثة وثلاثون جنية فقط لا غير)

سعر قيمة المادة المحجزة (تراب) وقد تبين الآتي:

حيث تمت زيارة محجر (اطلال المقاولات) على طريق اسكنديرية الصحراوية للوقوف على

٣- السيد المهدي / نهج مصطفى صديقي

عن شركة الحسين للمقاولات والتجارة

٢- السيد المهدي / أحمد السعيد

عن مكتب د/ خالد قنديل استشاري المشروع

١- السيد المهدي / أحمد محمود أبو دقوقة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/١٩ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

الموضوع إثبات سعر المادة المحجزة

محمّد



Handwritten signature at the top right.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

٣- م/ نهج صديقي

٢- م/ أحمد السعيد

١- م/ أحمد محمود أبو دقوقة

التوقيع:

الاسم:

#التوقيعات :-

... ذلك على المحضر وأقل

- ٣- م/ نهج صديقي
مثال ٥٥ شارع الحسين للمقاولات والتجارة
(أ.د. خالد خليل إسماعيل المشورع)
مكتب مكاتب الاستشاري الهندسي
مثال الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- م/ أحمد السعيد
- ١- م/ أحمد محمود أبو دقوقة

- : من أجل

٢٠٢٢ / ٨ / ١ الموافق الموعود الموعود

(٥٥ كم بطول ٧٧٥٠٠٠ إلى ٧٧٠٠٠٠ في مسافة من ٥ كم)

(العيون السخنة - مرسى مطروح)

للإشارة إلى التكاليف وأمر الإستاذ الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسين
للإشارة إلى التكاليف وأمر الإستاذ الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسين

(توريد تربة صالحة) محضر معاينة مسافة نقل

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة الحسين
AL-HUSSEIN CO.
للمقاولات والتجارة





الموضوع إثبات سعر المادة المحجزة

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٦/١١ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

١- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقوقة عن الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب د/ خالد قنديل استشاري المشيروع

٣- السيد المهندس / بهجت مصطفى صدقي عن شركة الحسين للمقاولات والتجارة

حيث تمت زيارة محجر (الصر اوية) على طريق اسكندرية الصحراوي - السالكات للوقوف على حيث تمت زيارة محجر (الصر اوية) على طريق اسكندرية الصحراوي - السالكات للوقوف على

سعر قيمة المادة المحجزة (تراب) وقد تبين الاتي:

سعر المادة المحجزة ٣٣ ج (ثلاثة وثلاثون جنية فقط لا غير) ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦

حتى ١٧/٦

و على هذا تم التوقيع :،،،،، التوقيع:

السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقوقة

السيد المهندس / أحمد السعيد

بهجت مصطفى صدقي

السيد المهندس / بهجت مصطفى صدقي

محضر
إثبات حالة

Handwritten signature and name in Arabic.

Handwritten signature in Arabic.

Handwritten signature in Arabic.

السيد المهندس / بهجت مصطفى صديقي

السيد المهندس / أحمد السعيد

السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقوقة

وعلى هذا تم التوقيع

التوقيع:

حتى الآن .

سعر المادة المحجزة ٣٣ ج (ثلاثة وثلاثون جنية فقط لا غير) ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢

المادة المحجزة (تراب) وقد تبين الآتي:

حيث تمت زيارة محجر (القيروز) على طريق الاسكندرية الصحراوية للوقوف على سعر قيمة

٣- السيد المهندس / بهجت مصطفى صديقي

عن شركة الحسين للمقاولات والتجارة

٢- السيد المهندس / أحمد السعيد

عن مكتب د/ خالد قنديل استشاري المشروع

١- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقوقة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

الموضوع إثبات سعر المادة المحجزة

محضر إثبات حالة

مؤسسة الحسين
AL-HUSSEIN CO.
للمقاولات والتجارة



مجلس إدارة الشركة العامة للطرق والكباري



جی. پی. جی.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

8/11/2018

1920/21 / 1921/22

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

॥३॥

... التوفيق لهذا على

450.

٢٠٢٢/١/١٧ تاريخ من انشاء (غير) خطة جنية خزانة (٢٢٢) ج ٢٢٢ للمالية المخرجة للمالية العامة

قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

اسماء بنت ابی بکر - بنو النضر - ابي بكر وعمر

مكتبة دار الحديث و الأثر

۱- صلی علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین

(ع) المشرق والمغرب

2- 2/10/2021

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

4- قوتی و ابو محمد محمد / 2 - 1

م. ٢٠٨٣ / ١ / ١٧٧١ الموافق ١١ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



AL-HUSSEIN CO.
DISTRIBUTION

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

- بسم الله الرحمن الرحيم
- بسم الله الرحمن الرحيم
- بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم



Handwritten signature at the top right.

Handwritten signature below the top right.

Handwritten signature below the middle right.

السيد المهندس / نهجيت مصطفى صدقي

السيد المهندس / احمد السعيد

السيد المهندس / احمد محمود ابو دقوة

التوقيع:

و على هذا تم التوقيع

حتى الان .

٢٠٢٢/٢/٨ تاريخ من تاريخ (ابتداءً من) لا غير) ثلاثة وثلاثون جنية فقط لا غير

سعر قيمة المادة المحجوزة للمال وقد تبين الاتي:

حيث تمت زيارة محجر (السوي / ش / ٢٤١) على طريق وادي النطرون - العلمين للوقوف على

عن شركة الحسين للمقاولات والتجارة

(ان.ج.د. خالد قنديل استشاري المشروع) عن مكتب الاستشاري

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

٣- م / نهجيت مصطفى صدقي

٢- م / احمد السعيد

١- م / احمد محمود ابو دقوة

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

الموضوع اثبات سعر المادة المحجوزة

محضر اثبات حالة

مؤسسة الحسين
AL-HUSSEIN CO.
للإدارة والتجارة



مؤسسة الحسين للتجارة والتجارة



Handwritten signature at the top right.

Handwritten signature below the first one.

Handwritten signature below the second one.

السيد المهندس / نهجيت مصطفى صديقي

السيد المهندس / أحمد السعيد

السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقوقة

وطى هذا تم التوقيع

التوقيع:

حتى الآن .

سعر المادة المحجزة ١٥٠ ج (مئة و خمسون جنية فقط لا غير) ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١/١٧

المحجزة حيث تمت زيادة كساره (النيل) على طريق استكدرية الصحر اوى للوقوف على سعر قيمة المادة

حيث تمت زيادة كساره (النيل) على طريق استكدرية الصحر اوى للوقوف على سعر قيمة المادة

٣- السيد المهندس / نهجيت مصطفى صديقي

عن شركة الحسين الحسني للطاقات و التخزين

٢- السيد المهندس / أحمد السعيد

عن مكتب ا/د/ خالد فهدل المشتري للمشروع

١- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقوقة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٧ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

الموضوع إثبات سعر المادة المحجزة

محضر إثبات حالة



٣٠٠٠٠٠٠٠٠ كم. قطاع البحيرة من كم. القطار الكبير إلى السريع. البوابة بالاشتراكات الخاصة لمشروع الضخمة التقييد هذا التقييد. جميع الاموال والاموال المأداة في هذا التقييد.

Used Standard

1. Grain Size Distribution Test:	ASTM D6913 - Standard Test Methods for Particle Size Distribution (Grading) of Soils Using Sieve Analysis
2. Loss Angeles Abrasion Test:	ASTM C131 - Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

3. Water Absorption: ASTM C127-Standard Test Method for Solative Density and Absorption of Coarse Aggregates

Dr. Wael Bekheer

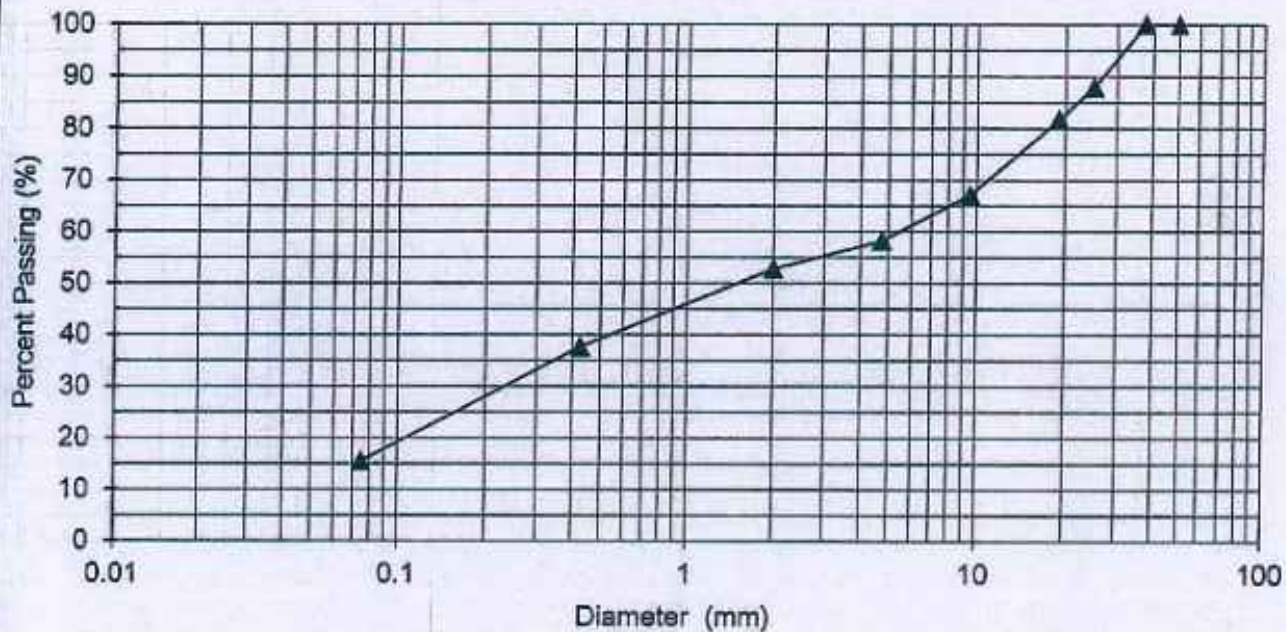
The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

رقم: ٢٠١٥/١٧٢٠٣ - تاريخ: ٢٠١٥/١٧٢٠٣

**Grain Size Distribution Curve**

CLIENT	شركة الحسين للمقاولات والتجارة
PROJECT	القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل من كم ٢٧٠+٠٠٠ إلى ٢٧٥+٠٠٠
LOCATION	من ٢٧٤+٣٢٠ إلى ٢٧٤+٣٤٠ عند متسوب (١.٥٠ م)
LAYER TYPE	التربة عينة ١ / ١

Receiving Date	22/08/2023
Cheque Date	24/08/2023
Receipt Number	831186
Report Date	28/08/2023
Lab. Ref.	G 22/03

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE

Sieve No.	PERCENT PASSING							
	No. 200	No. 40	No. 10	No. 4	3/8"	3/4"	1"	1 1/2"
Test Results	14.2	37.6	52.7	58.1	67.1	81.7	87.9	100.0

A-1-b : تصنيف التربة

حد اللدونة: ٢٠% حد السيولة: ٢٥%

وردت العينة التي اجري عليها الاختبار الى المعمل بمعرفة مندوب الاستشاري ا.د / خالد قنديل



Laboratory Director

Dr. Wael Bekheet

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كراهية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مشابهة على ذلك.

رقم بريدي ٢١٥٤٤ الإسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)


P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب الدمك - بروكتور معدل

٢٠٢٣/٠٨/٢٢	تاريخ توريد العينة	ب ٠٣/٢٠	تقرير رقم
٢٠٢٣/٠٨/٢٤	تاريخ الايصال	بروكتور	الاختبارات
٨٣١١٨٦	رقم الايصال	شركة الحسين للمقاولات والتجارة	العميل
٢٠٢٣/٠٨/٢٨	تاريخ التقرير	القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل من كم ٢٧٠+٠٠٠ الى كم ٢٧٥+٠٠٠	المشروع
التربة	العينة	من ٢٧٤+٣٢٠ الى ٢٧٤+٣٤٠ عند منسوب (١.٥٠-) عقد ١١٥٦ اتجاه محور الضبعة	الموقع

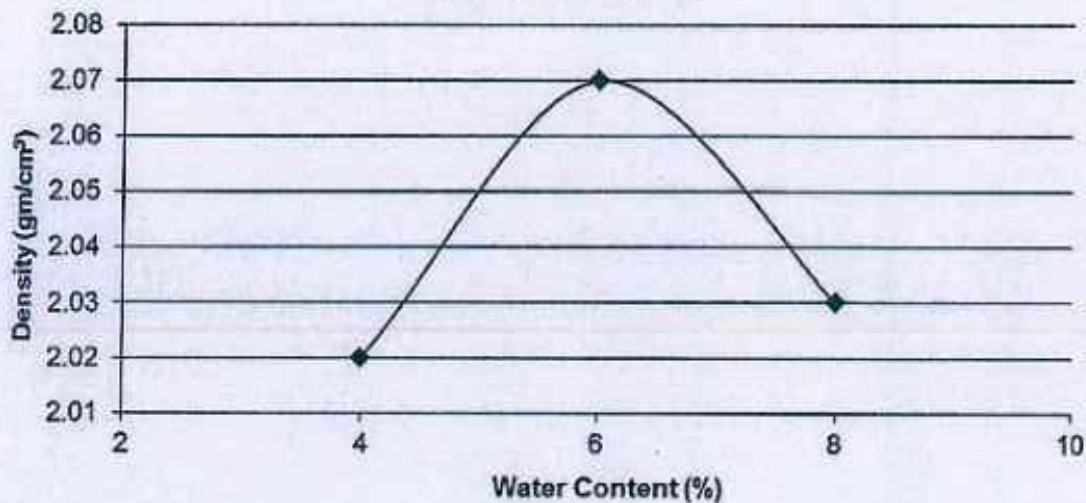Proctor Test Results



أقصى كثافة معملية جافة	: ٢,٠٧ جم/سم³
نسبة المياه الأصولية	: ٦%

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشاري ا.د / خالد قنديل

في المعمل

مدير المعمل



د. / وائل بخت

/ / أحمد عادل

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك


رقم بريد ٢١٥٤٤ الإسكندرية - شفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203

**Grain Size Distribution Curve**

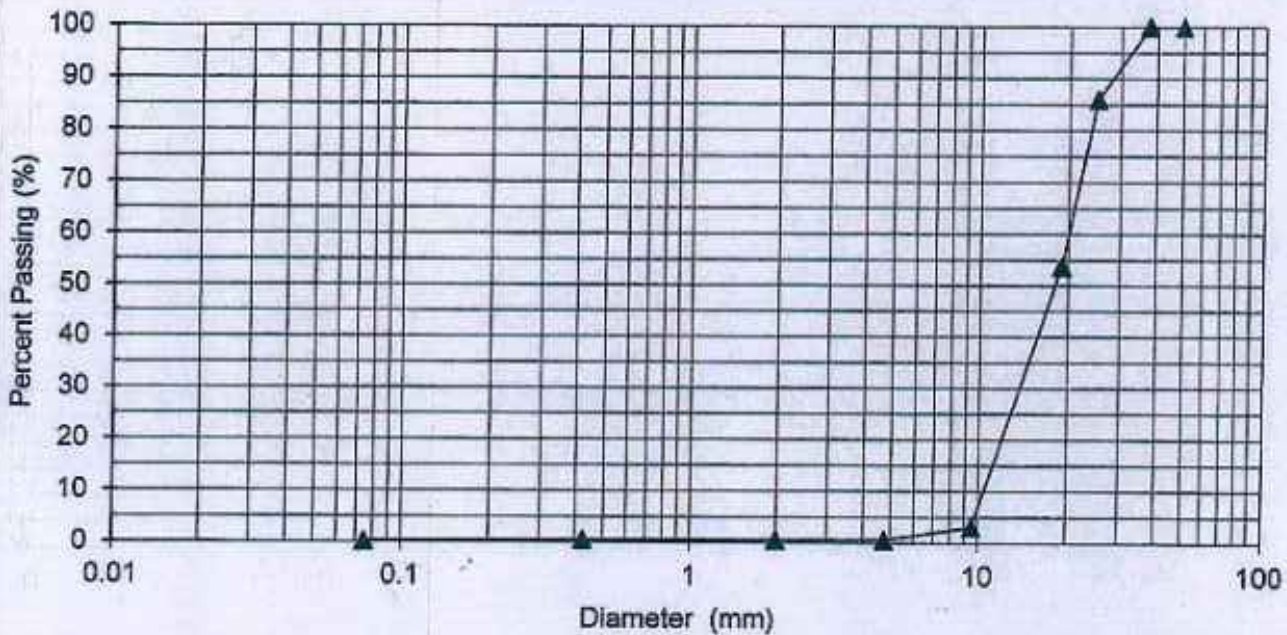CLIENT	شركة الحسين للمقاولات والتجارة
PROJECT	القطار الكهربائي السريع (العين السفلى- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح) قطاع غرب النيل من كم ٢٧٠+٠٠٠ الى كم ٢٧٥+٠٠٠
LOCATION	من ٢٧٠+٥٨٠ الى ٢٧٠+٦٢٠ عند متسوب (-٠٢٥+متسوب النيلة)
LAYER TYPE	من فلتر ١ & ٢ عينة ١ / ١

Receiving Date	22/08/2023
Cheque Date	24/08/2023
Reciept Number	831186
Report Date	28/08/2023
Lab. Ref.	G 21/03

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE

Sieve No.	PERCENT PASSING								
	No. 200	No. 40	No. 10	No. 4	3/8"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Test Results	0.1	0.5	0.5	0.6	3.1	53.7	85.9	100.0	100.0

وردت العينة التي اجري عليها الاختبار الى المعمل بمعرفة مندوب الاستشاري ا.د / خالد قنديل



Laboratory Director

Dr. Wael Bekheet

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسؤل فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤل عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اي نتائج مبنية على ذلك


رقم بريد ٢١٥٤٤ الاسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣) +

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب نسبة تحمل كاليفورنيا

٢٠٢٣/٠٨/٢٢	تاريخ توريد العينة	٠٣/٢٠	تقرير رقم
٢٠٢٣/٠٨/٢٤	تاريخ الايصال	نسبة تحمل كاليفورنيا	الاختبارات
٨٣١١٨٦	رقم الايصال	شركة الحسین للمقاولات والتجارة	المصير
٢٠٢٣/٠٨/٢٨	تاريخ التقرير	القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل من كم ٢٧٠+٠٠٠ الى ٢٧٥+٠٠٠	المشروع
التربة	العينة	من ٢٧٤+٣٢٠ الى ٢٧٤+٣٤٠ عند منسوب (-١.٥٠ م) عقد ١١٥٦ اتجاه محور الضبعة	الموقع

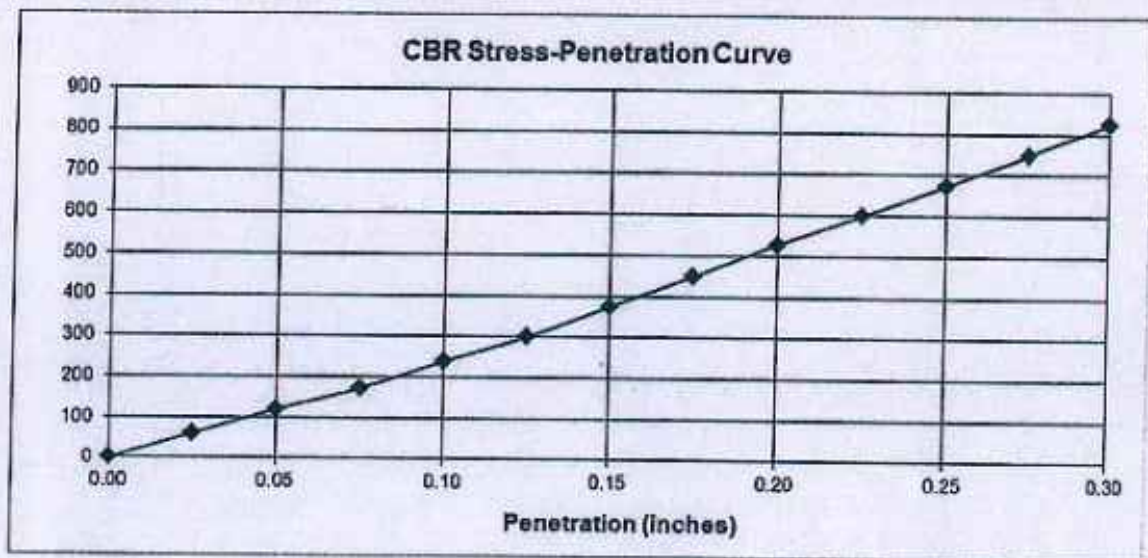

نسبة تحمل كاليفورنيا بعد المعالجة في الماء لمدة ٤ أيام : ٣٥ %

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشارة ا.د / خالد قلندل

فني المعمل

أحمد عادل / ١

مدير المعمل

أحمد عادل / ١



The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك

رقم بريد ٢١٥٤٤ الإسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب لوس أنجلوس و الامتصاص

٢٠٢٣/٠٨/٢٢	تاريخ توريد العينة	٠٢/٠٨/٢٠٢٣	تقرير رقم
٢٠٢٣/٠٨/٢٤	أمر دفع	لوس أنجلوس و الامتصاص	الاختبارات
٨٣١١٨٦	أمر دفع	شركة الحسين للمقاولات والتجارة	المقاول
٢٠٢٣/٠٨/٢٨	تاريخ التقرير	القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل من كم ٢٧٠+٠٠٠ الى كم ٢٧٥+٠٠٠	المشروع
٢٨٤١	من فلتير	من ٢٧٠+٥٨٠ الى ٢٧٠+٦٢٠ عند منسوب (+٠.٢٥) منسوب المياه عقد ١١٥٦ اتجاه محور الضبعة	الموقع

نتائج اختبار لوس أنجلوس و الامتصاص

٥٠٠ لفة	لوس أنجلوس
١٢ كورة	عدد كرات الاختبار
٥٠٠٠ جم	وزن العينة قبل التجربة
٤٠٠٨ جم	وزن العينة بعد التجربة
١٩,٨٤ %	نسبة التآكل
١,٣٨ %	نسبة الامتصاص بعد ٢٤ ساعة غمر
٢٠,٦٣ جم/سم ٣	الوزن النوعي

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشارة ا.د / خالد قنديل

مدير المعمل

فنى المعمل



أحمد عادل

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اى نتائج مبنيه على ذلك

رقم بريدى ٢١٥٤٤ الاسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203

بالمتر المكعب اعمال حفر (استخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهب الاعمال) لجميع انواع التربة عند التربة الصخرية ونسوية السطح بالأت التسمية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمسك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (96%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (المسافة ٥٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمطامات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

يتم حساب علاوة ٨٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان .
يتم حساب ٣,١٠ جنية في حالة عدم استخدام البلدوزر .

رقم البند وبيلته: (٣)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

مقدار العمل السابق	١١٣٥٩,١٣	الكمية بالمقاييس	٦١٠١٨,٠٠
--------------------	----------	------------------	----------

الاجمالى م ^٣	مربع م ^٣	الموقع الكيلو مترى		بيان الاعمال بالمقاييس
		الى	من	
٦١٣٥٩,١٣	٦١٣٥٩,١٣	٢٧٢+٦٠٠	٢٧٢+٤٦٠	اعمال الحفر
		٢٧٢+٨٢٠	٢٧٢+٦٤٠	
		٢٧٢+٨٦٠	٢٧٢+٨٢٠	
		٢٧١+٥٤٠	٢٧١+٢٦٠	
		٢٧٢+٢٠٠	٢٧٢+٨٦٠	
		٢٧٢+٥٨٠	٢٧٢+٢٠٠	
		٢٧٤+٤٠٠	٢٧٤+٢٠٠	
		٢٧٤+٥٦٠	٢٧٤+٤٠٠	
		٢٧٤+٧٨٠	٢٧٤+٥٨٠	
		٢٧٤+٨٨٠	٢٧٤+٨٠٠	
الاجمالى		٢٧٤+٩٨٠	٢٧٤+٨٨٠	
٦١٣٥٩,١٣		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
٦١٠١٨,٠٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٣٤١,١٣		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٦١٣٥٩,١٣		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص النهائي		

يتمتع
عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيرة

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد الشاعر

بيان الاعمال بالمنشآت جاري ٣ (اتحاد الضبعة)
عملية: اعمال الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمنز المكعب اعمال حفر (واستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نمو الاعمال) لجميع انواع التربة عند التربة الصخرية ونسوية السطح بالآلة المنسوية والرش بالسيارة الاسطوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والسمك الجديد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (مسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التمثيل طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصدة للمواصفات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقا لاصول الصيانة ومواصفات الهيئة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.
- يتم حساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ١ كم بالزيادة وللصهار.
- يتم حساب ٢,١٠ جنية في حالة عدم استخدام البلدوزر.

رقم البند وبيانه: (٣)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات والتجارة

الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق	٥٩٥١٨,٠٠
------------------	--------------------	----------

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		٢م مربع	٣م الاجمال
	من	الى		
اعمال الحفر	٢٧٢+٤٦٠	٢٧٢+٦٠٠	١١٣٥٩,١٣	١١٣٥٩,١٣
	٢٧٢+٦٤٠	٢٧٢+٨٢٠		
	٢٧٢+٨٢٠	٢٧٢+٨٦٠		
	٢٧١+٣٦٠	٢٧١+٥٤٠		
	٢٧٢+٨٦٠	٢٧٢+٩٠٠		
	٢٧٣+٩٠٠	٢٧٣+٩٥٠		
	٢٧٤+٩٠٠	٢٧٤+٩٥٠		
	٢٧٤+٩٥٠	٢٧٤+٩٨٠		
	٢٧٤+٩٨٠	٢٧٤+٩٨٠		
	٢٧٤+٩٨٠	٢٧٤+٩٨٠		
الاجمال			١١٣٥٩,١٣	١١٣٥٩,١٣
اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٥٩٥١٨,٠٠	٥٩٥١٨,٠٠
اجمال الكمية المدرجة بالمنشآت السابق			١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمنشآت خلال مدة			١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠
اجمال الكمية المدرجة بالمنشآت الحالي			١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠

عن الاستشاري

K.K

X72

ابن عامر

عن الهيئة

٢٠٢٠

١٢/١٠/٢٠٢٠

عن الهيئة

7. $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

Handwritten signature and date: 20/11/20

[illegible]

بيان الأعمال بالمستخلص ختامي (اتجاه الضبعة)

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا يحتوي علي أي المواد الناعمة أو البودرة (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا أو مواد طافية أو بيت النمل ولا يزيد نسبة الانقاص بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي أعلا من أعلا منسوب المياه الأرضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بمراس رنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة أسفل الهراسات علي أن لا يتم التنفيذ إلا بعد اعتماد الإحجار واعتماد التجارب العملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواج التحميل قطر ٣٠ سم) علي أن لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقا لما هو وارد بالموصفات الخاصة بالمعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.

رقم البند وبيانه: (١٣)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ٢,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالمقاييسه	٢٠٠,٠٠٠	مقدار العمل السابق	١٩٨٠,٠٠٠
-------------------	---------	--------------------	----------

بيان الأعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلو مترى		مربع م ^٣	الاجمالى م ^٣
	من	الى		
أعمال سن الفلتر	٢٧٠.٠٥٦٠	٢٧٠.٠٧٢٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
	٢٧٠.٠٧٢٠	٢٧٠.٠٨٠٠		
	الاجمالى			
	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
			٢٠٠,٠٠٠	١٩٨٠,٠٠٠
			٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
			٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

عن الاستشارى

عن الشركة

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقة

مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر

XYZ

أحمد عاصم

بعضب مهندس

بيان الأعمال بالمستخلصين جاري ٣ (اتجاه الضبعة)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع التقاطر الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وتثبيت وردم سن ١ وسن ٢ مدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (ماره من منخل ٢٠٠) نهالاً أو مواد طافية أو بيت الدمل ولا يزيد نسبة الطافد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى أعلا من أعلا منسوب المياه الأرضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ من حقي الثبات للطبقة أسفل الدراسات على أن لا يتم التنفيذ إلا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه (اختبار الواح التضميل قطر ٣٠ سم) على أن لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ونحو العمل طبقا لاصول الصناعات المماثلة.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ اجنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المخزنية

تدقيق شركة المحاسبين للمقاولات والتجارة

الكمية بالمقاييس	٥٠٠,٠٠٠	مقدار العمل السابق	١٩٤٠,٠٠٠
------------------	---------	--------------------	----------

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		مربع م ^٣	الاجمالى م ^٣
	من	الى		
اعمال سن الفتر	٢٧٠+٥٦٠	٢٧٠+٧٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
	٢٧٠+٧٢٠	٢٧٠+٨٠٠		
	الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٢٠٠٠,٠٠٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		١٩٤٠,٠٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٤٠,٠٠٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		١٩٨٠,٠٠٠	

عن الاستشاري

يعتمد
عن الهيئة

١٩٨٠,٠٠٠

١٩٨٠,٠٠٠

عن الشركة

