

مستخلص رقم (١) جارى

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من
نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الاولى
عن مشروع :-

شامله المده من ٢٠٢٤/٨/١٣ الى ٢٠٢٤/٩/٥

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

تنفيذ شركه:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	.	٧٩٠٠,٠٠	٧٩٠٠,٠٠	١٩١٩٧٠,٠٠		١٩١٩٧٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	.	٧٩٠٠,٠٠	٧٩٠٠,٠٠	٨٢٩٥٠,٠٠		٨٢٩٥٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	.	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	١٧١٦٠,٠٠		١٧١٦٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	.	٦٤٨,٠٠	٦٤٨,٠٠	١٨١٤٤٠,٠٠		١٨١٤٤٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	.	.	.	.		.	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	.	.	.	.		.	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	.	.	.	.		.	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٣م		٢٥	.	٧٩٠٠,٠٠	٧٩٠٠,٠٠	١٩٧٥٠,٠٠		١٩٧٥٠,٠٠	
الاجمالى											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالى بعد الخصم											
						٦٤٤٤٧١٤,٥٠	٦٤٤٤٧١٤,٥٠	٦٤٧٧١٠,٠٠		٦٤٧٧١٠,٠٠	

سبق صرفها الى المقاول
مهندس /
عبد الرحيم محمد حسين
رئيس الادارة المركزية
عماد حسين
مهندس /
يستخدم
مهندس /
مهندس /

المحاسب
على حساب
نهايا
غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظات الفئات
تحريرا فى

تحريرا فى : ٢٠٢٤ / /
الشركة المنفذه
مهندس /
مهندس الاستشاري
مهندس /

مستخلص رقم (٢) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الاولى
عن مشروع :-

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٩/٦ الى ٢٠٢٤/٩/٢٤

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمقايضة	السعر بعد المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه		جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٧٩٠٠	١٠٠٠	٨٩٠٠	جاري	٢١٦٢٧٠,٠٠		٢١٦٢٧٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	٧٩٠٠	١٠٠٠	٨٩٠٠	جاري	٩٣٤٥٠,٠٠		٩٣٤٥٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	٢٢٠٠٠	٢١٤٠٠	٤٣٤٠٠	جاري	٣٣٨٥٢٠,٠٠		٣٣٨٥٢٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واطفائه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	٦٤٨	٦٣٢	١٢٨٠	جاري	٣٥٨٤٠٠,٠٠		٣٥٨٤٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	.	٤١٦٠٠	٤١٦٠٠	جاري	٢٠٠٩٢٨٠,٠٠		٢٠٠٩٢٨٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	.	٤١٦٠٠	٤١٦٠٠	جاري	١١٣١٥٢٠,٠٠		١١٣١٥٢٠,٠٠	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	.	٤١٦٠٠	٤١٦٠٠	جاري	١٢٤٨٠٠,٠٠		١٢٤٨٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٣م		٢٥	٧٩٠٠	١٠٠٠	٨٩٠٠	جاري	٢٢٢٥٠,٠٠		٢٢٢٥٠,٠٠	
الاجمالي												
									٢٣٧٣٨١٨٠,٠٠		٢٣٧٣٨١٨٠,٠٠	
									١١٨٦٩٠,٩٠		١١٨٦٩٠,٩٠	خصم ٠,٥ % طبقا للمقايضة
									٢٣٦١٩٤٨٩,١٠		٢٣٦١٩٤٨٩,١٠	الاجمالي بعد الخصم

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

مهندس المشروع

مهندس الشركة المنفذه

م / محمود محمد عبدالسلام

م / هشام حامد

تحريرا في

المحاسب

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الصيانة

مهندس /

على حساب

نهائيا

يدفع الى المقاول مبلغ

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظات الفئات

تحريرا في

مدير مشروع الاستشاري

م / على عبدالجهد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مستخلص رقم (٣) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع
الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عن مشروع :-

المقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٩/٢٥ إلى ٢٠٢٤/١٠/٣١

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٨٩٠٠	١٠٤٠٠	١٩٣٠٠	٤٦٨٩٩٠,٠٠٠		٤٦٨٩٩٠,٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	٨٩٠٠	١٠٤٠٠	١٩٣٠٠	٢٠٢٦٥٠,٠٠٠		٢٠٢٦٥٠,٠٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	٤٣٤٠٠	٢٣٦٠٠	٦٧٠٠٠	٥٢٢٦٠,٠٠٠		٥٢٢٦٠,٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	١٢٨٠	٦٩٦	١٩٧٦	٥٥٣٢٨٠,٠٠٠		٥٥٣٢٨٠,٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٤١٦٠٠	٩٠٠	٤٢٥٠٠	٢٠٥٢٧٥٠,٠٠٠		٢٠٥٢٧٥٠,٠٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	٤١٦٠٠	٩٠٠	٤٢٥٠٠	١١٥٦٠,٠٠٠		١١٥٦٠,٠٠٠	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارطة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٤١٦٠٠	٩٠٠	٤٢٥٠٠	١٢٧٥٠,٠٠٠		١٢٧٥٠,٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	٨٩٠٠	١٠٤٠٠	١٩٣٠٠	٤٨٢٥٠,٠٠٠		٤٨٢٥٠,٠٠٠	
الاجمالى											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالى بعد الخصم											
								٣١٥٣٩٤٦٠,٢٥		٣١٥٣٩٤٦٠,٢٥	



مهندس/

عماد حسين

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الصيانة

مهندس/ عبد الرحيم محمد حسين

المحاسب
على حساب
نهاديا
غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
تحريريا في


الجهة المالكة

مهندس المشروع

م / محمود محمد عبد السلام

تحريريا في
يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات

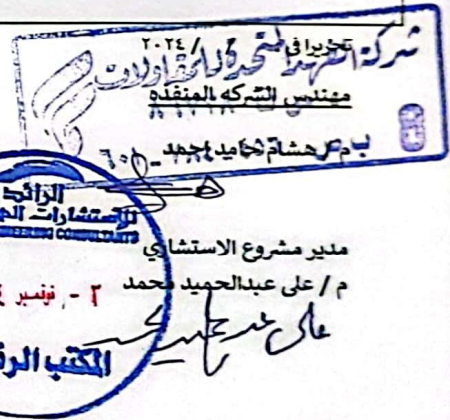


مشروع :- اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير		
		بيتومين	سولار	اسمنت
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات		%١٥	
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		%١٥ ١٠	
٣	بالطن أعمال توريد وازفافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات		%١٠	%٦٥
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	%٦٠	%١٠	

مست المراجعة



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من نجع الجامع / فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة بتاريخ // على تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من من نجع الجامع فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " الي شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المذكرة المعروضة المؤرخة في // ٢٠٢٤ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / امل حمدي	الادارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٤ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	٣م ٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٦١٢٧٤٣٩,٤٠
	مسافة النقل ٩٠ كم	٣م ٢٥٢١٥,٨	١٠٥	٢٦٤٧٦٥٩
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٢١٠٠٠	٧٨	٩٤٣٨٠٠٠
٣	بالطن اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٣٥٦٩,٥٠ بالطن	٢٨٠٠	٩٩٩٤٦٠٠

٣٠/٧/٢٠٢٤

٥

شركة العهد المتحدة للمقاولات
٨٦٧٣٨
٦٠١-٧٨٤-٤٥٦

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من نجع الجامع /
فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٥٨٤٤٣٠٠
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م ١٢١٠٠٠	٢٧٢	٣٢٩١٢٠٠٠
الاجمالي (فقط وقدره ستة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً و٤٠/١٠٠ لا غير) ٦٦٩٦٣٩٩٨,٤٠				

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاسعار السوق وقت التفاوض ، اما اسعار بنود الرصف فهي طبقاً للمذكرة المعتمدة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة طبقاً لآخر زيادة في اسعار البيتومين بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ وزيادة السولار بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ .
- يراعي احتساب فروق معاملات المواد حديد - اسمنت) بالزيادة او النقصان طبقاً لدقتر الشروط والمواصفات يراعي احتساب صرف اسعار معاملات المواد (البيتومين - السولار) بالزيادة او النقصان من بندي (٤ ، ٥) وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ .
- مسافة النقل طبقاً لاقادة المنطقة المشرفة .
- مدة التنفيذ ٦ أشهر .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير/ ٢٠٢٤ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة على السداد .
- خصم نسبة ٠,٥ % على كل البنود .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل الشركة	السيد المهندس	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس
السيد المحاسب	السيد المحاسب	السيد المحاسب	السيد المحاسب
السيد الأستاذ	السيد الأستاذ	السيد الأستاذ	السيد الأستاذ

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

طرق ج ب
