

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

بيان اعمال (٣)

رقم البند	بيان الاعمال	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف %
الاعمال الاعتيادية				
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجى وعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٤٩,٠٩	٧٤٥,٠٠	٩٩,٤٥%
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلى وعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م٣ والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠٠,٣٣	٨٩٠,٠٠	٩٨,٩%
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بيوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .	٧٦١,٠٩	٧٥٠,٠٠	٩٨,٥%
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (ساييس او ما يماثلها) او ما يماثلة والفئة تشمل (التجهيز + وجه برايمر ماني + سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشبكات للمواصفات تعليمات المهندس المشرف .	٨٤٠,٠٢	٦٥٠,٠٠	٧٧%
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنشيط و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	٣٣٢,٢٣	٣٣٠,٠٠	٩٩,٣%
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	٩٠,٦٤	٧٨,٠٠	٨٦,٠٥%
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى وسؤاسات من الخشب الموسكى مقاس ١,٥"×٢٠" وحلق مقاس حتى ٢"×٧" وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقا للعيونة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الصناعة .	٦٥,١٢	٦٥,٠٠	٩٩,٨%
٣٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار ولفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقا للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٣,٤١	٤٣,٠٠	٩٩,١%
٣٧	بالعدد توريد و تركيب مراحض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلها فرز اول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٥,٠٠	٥,٠٠	١٠٠,٠%
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة .	٤,٠٠	٤,٠٠	١٠٠%
عمال الكهرباء				
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليا ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	١٠٠%
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليا ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	١٠٠%
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧,٠٠	٢٦,٠٠	٩٦%
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز ٦ × ٠,٦ نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٩,٠٠	٢٨,٠٠	٩٧%
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٦,٠٠	١٥,٠٠	٩٤%
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢٦×٢٦ امبير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم للتنشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٠٠	٢٩,٠٠	٩٧%
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٦,٠٠	١٥,٠٠	٩٤%

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر - السويس
بيان اعمال (٣)

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية			
١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرايتش (فيوتك ١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٢٢١,٤٥	٢٢٠,٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم سمك ٥ سم وحمل على البند عمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم للحماية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢,٢٦	١٢,٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درج جيرانيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) و البند يشمل التلايس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٢٤,٠٠	٢٣,٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) عرض (15 سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١١,٣٠	١١,٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام جيرانيت فيردي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) سمك ٢ سم والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٩,٦٩	١٩,٠٠
٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى اقرب جالينز او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	١,٠٠	١,٠٠
٩	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	٤,٠٠
البنود المستجدة للأعمال الكهربائية			
	توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت إنتاج (الجراند - جيوس-بتشينو - شيندر) بركب بالأماكن الداخلية داخل الخائن والسعر يشمل الشاسية واللجمة والوجه ولون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلي :		
٣	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد .	١,٠٠	١,٠٠
٤	مفتاح إنارة سكتين (two gang).	١٠,٠٠	٩,٠٠
٥	كالبندي السابق مضادة للمياة .	٥,٠٠	٤,٠٠
٦	توريد وتركيب واختبار بريرة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت إنتاج (الجراند - جيوس-بتشينو) والسعر واللجمة والوجه ولون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب	٩٣,٠٠	٩١,٠٠
٧	توريد وتركيب واختبار بريرة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت مضادة للصق إنتاج (الجراند - جيوس-بتشينو) والسعر واللجمة والوجه ولون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب	١٥,٠٠	١٥,٠٠
٨	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ١٢٠ × ٢ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٤,٠٠	٤,٠٠
٩	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ٦٠ × ١ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٤,٠٠	٤,٠٠
١٠	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ليد بابل ٦٠ سم × ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65 - و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٧٠,٠٠	٦٩,٠٠
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١١,٠٠	١٠,٠٠

٢٠٢٤ /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

محمد سامي

مهندس الشركة

مهندس /

نادر مصطفى



المالك : الهيئة العامة للطرق و الكباري

الاعمال الاعتيادية

[illegible]




المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


الاعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الاسفلت و الحوائط الداخلية							
	الدور الثاني علوي							
	مكتب فني							
	سقف	١	٧,٥٩	٤,٤٥			٣٣,٧٨	
		١	٢,٨٤	٠,٤٥			١,٢٨	
	حوائط	٢	٤,٩٣		٢,٥٨		٢٥,٤٤	الارتفاع=٢,٨ ٢,٥٨=٠,٢٢
		٢	٧,٥٩		٢,٥٨		٣٩,١٦	
	تاميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥		١,٩٤	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شبك	١	١,٥٠		١,١		١,٦٥	الشبك = ١,١ * ١,٥
	مدير المكتب الفني							
	سقف	١	٤,٢٣	٤,٩٣			٢٠,٨٥	
	حوائط	٢	٤,٢٣		٢,٥٨		٢١,٨٣	
		٢	٤,٩٣		٢,٥٨		٢٥,٤٤	
	تاميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥		١,٩٤	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	مكتب موظفين							
	سقف	١	٧,٣١	٤,٣٧			٣١,٩٤	
	حوائط	٢	٧,٣١		٢,٥٨		٣٧,٧٢	
		٢	٤,٣٧		٢,٥٨		٢٢,٥٥	
	تاميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥		١,٩٤	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شبك	٢	١,٥٠		١,١		٣,٣٠	الشبك = ١,١ * ١,٥
	الاجمالي						٢٦٢,٢٣	٢٥١,٥٧

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





المقاول العام: شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويش

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الاسقف و الحوائط الداخلية							
	اجمالي ماسبق							
	مدبر اداري							٢٥١,٥٧
	سقف	١	٤,٣٠	٤,٠٣			١٧,٣٣	
	حوائط	٢	٤,٣٠		٢,٥٨		٢٢,١٩	
		٢	٤,٠٣		٢,٥٨		٢٠,٧٩	
	تأمين باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شبك	١	١,٥٠		١,١	١,٦٥		الشبك = ١,١ * ١,٥
	قاعة المؤتمرات							
	سقف	١	٤,٥٥	٥,٩٨			٢٧,٢١	
		١	٧,٨٣	٤,٠٢			٣١,٤٨	
	خصم	١	٥,٣٧	٢,٧٠		١٤,٥٠		
	كمره مقلوبة	١	٧,٨٣	٠,٧٧			٦,٠٣	
	حوائط	١	٥,٩٨		٢,٥٨		١٥,٤٣	
		١	٤,٥٥		٢,٥٨		١١,٧٤	
		١	١,٦٠		٢,٥٨		٤,١٣	
		١	٣,٧٧		٣,٣٥		١٢,٦٣	الارتفاع=٢,٥٨+٠,٧ ٣,٣٥=٧
		١	٧,٣٣		٠,٥٥		٤,٠٣	الارتفاع=٠,٣+٢,٥٥ ٠,٥٥=
		١	٣,٧٢		٠,٥٥		٢,٠٥	
		١	٤,٥٥		٢,٥٨		١١,٧٤	
	اعمده	٢	٠,٣		٣,٠٥		١,٨٣	
		١	٠,٢		٣,٠٥		٠,٦١	
		١	٠,٢٥		٣,٠٥		٠,٧٦	
	تأمين باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	الاجمالي					٣٠,٧٧	٤٥٣,٨٦	٤٢٣,٠٩
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الأعمال الاعتبارية

[illegible]



المقاول العام: شركة تبارك للمقاولات المعمارية



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

إنشاء الدور الثاني لمنبى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات الكميات والأوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٥	بالمتر المسطح توريد و عمل دهقات لزوم الواجهات الخارجيه ببويه اسمنتية							
	اجمالي ملسوق							
	دروة							
		٢	٣,٧٢		١,٢٠		١٨٩,٩٦	٦٧٤,٩٥
		١	٧,٧٣		١,٢٠		٩,٢٨	
		١	٧,٧٣		٠,٥٠		٣,٨٧	
		٢	٥,٦١		٠,٥٠		٥,٦١	
		٢	٦,٩٤		٠,٥٠		٦,٩٤	
	السلح المرقي للمباني (شهر المباني)							
		٢	٤,٠٢	٠,٢٥			٢,٠٢	
		١	٧,٢٣	٠,٢٥			١,٨٣	
		١	٧,٧٣	٠,٢٥			١,٩٣	
		٢	٥,٦١	٠,١٢			١,٣٥	
		٢	٦,٧	٠,١٢			٠,٦٥	
	الواجهة الاساسية							
		١	٠,٤٥		١٢,٩٣		٥,٨٢	
		١	٧,٧٨		١,٤٠		١٠,٨٩	
		٢	٧,٣٣		٠,٥٥		٨,٠٦	
		٢	٠,٣		٧,٣٧		٤,٤٢	
		٢	٠,١٥		٠,٢٢		٠,٠٧	
		١	٠,٤		٠,٧٨		٠,٣١	
		١	٠,٢٥		٣,٩٣		٠,٩٨	
		١	٤,٠٣		١,٤٠		٥,٦٤	
		١	٠,٣		٣,٠٢		٠,٩١	
		١	٠,٣		٣,٢٦		٠,٩٨	
		١	٤,٠٣		٠,٧٨		٣,١٤	
		٢	٤,٠٣		٠,٣٠		٢,٤٢	
		٢	٣,٧٣		٠,٥٥		٤,١٠	
	الاجمالي							
							٧٧٦,٠٩	٧٦١,٠٩
			مهندس الشركة			مهندس الهيئة		



المقاول العام: شركة تبترك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السوبس

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السوس

الاصصال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٦	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات بوبرية البلاستيك على سطح اسمنتي							
	اجمالي سابق							
	مدير اداري							٢٤٤,٩٠
	سقف	١	٤,٣٠	٤,٠٣			١٧,٢٢	
	حوائط	٢	٤,٣٠		٢,٤٨		٢١,٢٢	
		٢	٤,٠٣		٢,٤٨		١٩,٩٩	
	محيط باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شباك	١	١,٥٠		١,١	١,٦٥		الشباك = ١,١ * ١,٥
	قاعة المؤتمرات							
	سقف	١	٤,٥٥	٥,٩٨			٢٧,٢١	
		١	٧,٨٣	٤,٠٢			٣١,٤٨	
	خضم	١	٥,٣٧	٢,٧٠		١٤,٥٠		
	كمره مقنونه	١	٧,٨٣	٠,٧٧			٦,٠٣	
	حوائط	١	٥,٩٨		٢,٤٨		١٤,٨٣	
		١	٤,٥٥		٢,٤٨		١١,٢٨	
		١	١,١٠		٢,٤٨		٢,٩٧	
		١	٣,٧٧		٣,٢٥		١٢,٢٥	الارتفاع=٢,٥٨*٠,٧٤
		١	٧,٢٢		٠,٥٥		٤,٠٣	الارتفاع=٠,٣٣*٠,٢٥٤
		١	٣,٧٢		٠,٥٥		٢,٠٥	
		١	٤,٥٥		٢,٤٨		١١,٢٨	
	اعداد	٢	٠,٣		٣,٠٥		١,٨٣	
		١	٠,٢		٣,٠٥		٠,٦١	
		١	٠,٢٥		٣,٠٥		٠,٧٦	
	محيط باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	الاجمالي					٣٠,٧٧	٤٤٣,٤٨	٤١٢,٧٠
			مهندس الشركة			مهندس الهيئة		



اتنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكبارى المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

الاجماع

مهندس الشركة



General Contractor



المالك : الهيئة العامة للطرق و الكباري

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

[illegible]

المقاول العام: شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

إنشاء الدور الثاني لمنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

[illegible]




الذاتك : الهيبة العامة للطرق و الكباري

انشاء الدور الثاني لمنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الاعمال الاعتيادية

[illegible]




المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مبنى الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر

الاعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاعمال الاعتيادية

[illegible]

حصص بنود الكهرباء (تشطيب)

الاجملى	الاسم	البيوفيه	حمام السيدات	حمام الرجال	الاستقبال	مكتب موظفين ٢	غرفة أدوات مكتبية	قاعة مؤتمرات	مدير اداري	مكتب موظفين ١	مدير مكتب فنى	مكتب فنى	البنء
24	0	0	0	0	1	4	3	3	2	4	2	5	بريزة علوية (عدى)
69	3	0	0	0	13	7	9	9	6	8	5	9	بريزة قولى (عدى)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	بريزة علوية (روكتر برووف)
15	0	6	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	بريزة قولى (روكتر برووف)
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مفتاح اعدى (عدى)
10	1	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	مفتاح ثنائى (عدى)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مفتاح اعدى (روكتر برووف)
5	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	مفتاح ثنائى (روكتر برووف)
70	0	2	0	0	14	8	6	13	4	8	5	10	مفتاح ١٠٠٠٠
4	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	مفتاح ١٢٠٠٠
4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	مفتاح ١٠٠١
11	6	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	مفتاح دائري
10	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	1	1	تكيف
16	0	0	0	0	0	3	2	2	1	3	1	4	نت
17	0	1	0	0	0	3	2	2	1	3	1	4	تيلون
8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	نفس
6	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	شلاط
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	جرس
7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	لقمة جرس
9	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	مرجه
2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	سنان

يوجد موجه فى مكتب فى الدور الاول و عليه اجملى عدد المروح = ١٠٠





المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

الاعمال الكهربائية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

الاعمال الكهربيه

[illegible]



العالمك : الهينه العامه للطرق و الكباري

الاعمال الكهربيه

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

الاعمال الكهربائية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خضم	جزئي	
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون							
	الدور الاول علوي							
	مكتب مدير المنطقة	١					١,٠٠	
	مكتب السكرتاريه	١					١,٠٠	
	مكتب مدير الشئون الماليه	٢					٢,٠٠	
	الارشيف	٣					٣,٠٠	
	مكتب مدير عام المشروعات	١					١,٠٠	
	مكتب مدير التنفيذ و الصيانه	١					١,٠٠	
	بوفيه	١					١,٠٠	
	مخزن الدور الارضي	٢					٢,٠٠	
	الدور الثاني علوي							
	مكتب فني	٤					٤,٠٠	
	مدير مكتب فني	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ١	٣					٣,٠٠	
	مدير اداري	١					١,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	٢					٢,٠٠	
	غرفة ادوات مكتبية	٢					٢,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	٣					٣,٠٠	
	البوفيه	١					١,٠٠	
	الاجمالي						٢٩,٠٠	٢٩,٠٠
مهندس الهياكل  مهندس الشركة 								



المالك : الهينه العامه للطرق و الكبارى

الاعمال الكهربائية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح باتشينو							
	الدور الاول علوي							
تكييفات	مكتب مدير المنطقة	٢					٢,٠٠٠	
	مكتب السكرتاريه	١					١,٠٠٠	
	مكتب مدير الشئون الماليه	١					١,٠٠٠	
	غرفة الاجتماعات	١					١,٠٠٠	
	الارشيف	١					١,٠٠٠	
	مكتب مدير عام المشروعات	١					١,٠٠٠	
	مكتب مدير التنفيذ و الصيانه	١					١,٠٠٠	
	الاستقبال	٥					٥,٠٠٠	
	مخزن الدور الارضي	١					١,٠٠٠	
سخانات	حمام ملحق بمكتب مدير المنطقة	١					١,٠٠٠	
	حمام الرجال	١					١,٠٠٠	
	حمام السيدات	١					١,٠٠٠	
	المعمل المؤقت بالمثلث	١					١,٠٠٠	
	الدور التاني علوي							
تكييفات	مكتب فني	١					١,٠٠٠	
	مدير مكتب فني	١					١,٠٠٠	
	مكتب موظفين ١	١					١,٠٠٠	
	مدير اداري	١					١,٠٠٠	
	قاعة مؤتمرات	٢					٢,٠٠٠	
	غرفة ادوات مكتبية	١					١,٠٠٠	
	مكتب موظفين ٢	١					١,٠٠٠	
	الاستقبال	٢					٢,٠٠٠	
سخانات	حمام الرجال	١					١,٠٠٠	
	حمام السيدات	١					١,٠٠٠	
	الاجمالي						٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
مهندس الهيئة								
مهندس الشركة								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الاعمال الكهربائية

مهندس الشركة



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

اتشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرائيش فيوتك ١٠ سم							
	الدور الثاني علوي							
	المكتب الفني							
		٢	٧,٥٩				١٥,١٨	
		٢	٤,٩٣				٩,٨٦	
	مدير المكتب الفني							
		٢	٤,٢٣				٨,٤٦	
		٢	٤,٩٣				٩,٨٦	
	مكتب موظفين ١							
		٢	٧,٣١				١٤,٦٢	
		٢	٤,٣٧				٨,٧٤	
		٢	٠,١٥				٠,٣٠	
	مدير اداري							
		٢	٤,٣٠				٨,٦٠	
		٢	٤,٠٣				٨,٠٦	
	قاعة مؤتمرات							
		١	٥,٩٨				٥,٩٨	
		٢	٤,٥٥				٩,١٠	
		١	٠,١٥				٠,١٥	
	غرفة ابوات مكتبيه							
		٢	٥,٠٦				١٠,١٢	
		٢	٥,٣١				١٠,٦٢	
		٢	٠,١٥				٠,٣٠	
	الاجمالي						١١٩,٩٥	١١٩,٩٥

مهندس الشركة

مهندس الهياكل

مهندس الشركة

مهندس الهياكل



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

الاجمالي

مهندس الشركة

محمد



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

[illegible]



العالمك : الهينه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب جبرائيت فيردى							
	الدور الثانى علوي							
	اول بسطه							
		١	١,٤٧	١,٠٠			١,٤٧	
	تاني بسطه							
		١	١,٢٠	١,١٤			١,٣٧	
	امام الباب الرئيسي و الاسامير							
		١	٢,١٥	١,٢٠			٢,٥٨	
		١	٢,٠٥	١,٠٨			٢,٢١	
		١	٢,٣٠	١,٢٠			٢,٧٦	
		١	١,١٠	٠,٧٠			٠,٧٧	
		١	١,١٠	٠,٦٥			٠,٧٢	
	ضهر الكوبسته							
		٢	٠,٥٠	٠,٣١			٠,٣١	
		٢	٣,٣٥	٠,٣١			٢,٠٨	
		٢	١,٤٥	٠,٣١			٠,٩٠	
	فاصل بين المباول							
		٢	٠,٤٠	٠,٦٠			٠,٤٨	
	حوض حمام الرجال و السيدات							
		٢	٠,٩٥	١,٨٥			٣,٥٢	
	حوض البوفيه							
		١	٠,٤١	١,٣٠			٠,٥٣	
	الاجمالي					٠,٠٠	١٩,٦٩	١٩,٦٩
مهندس الشركة		مهندس الهينة						



المالك : الهيئة العامة للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

[illegible]



المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الكهربائية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الكهربائية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الكهربائية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الكهربائية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الكهربائية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الكهربائية

[illegible]



المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري

البنود المستجدة للأعمال الكهربائية

[illegible]




المالك : الهينه العامه للطرق و الكباري


البنود المستجدة للأعمال الكهربائية

[illegible]

All dimensions are in meters
All dimensions should be checked with site
planning and structural drawings.
Do not measure from drawings. All dimension should
be read or computed.

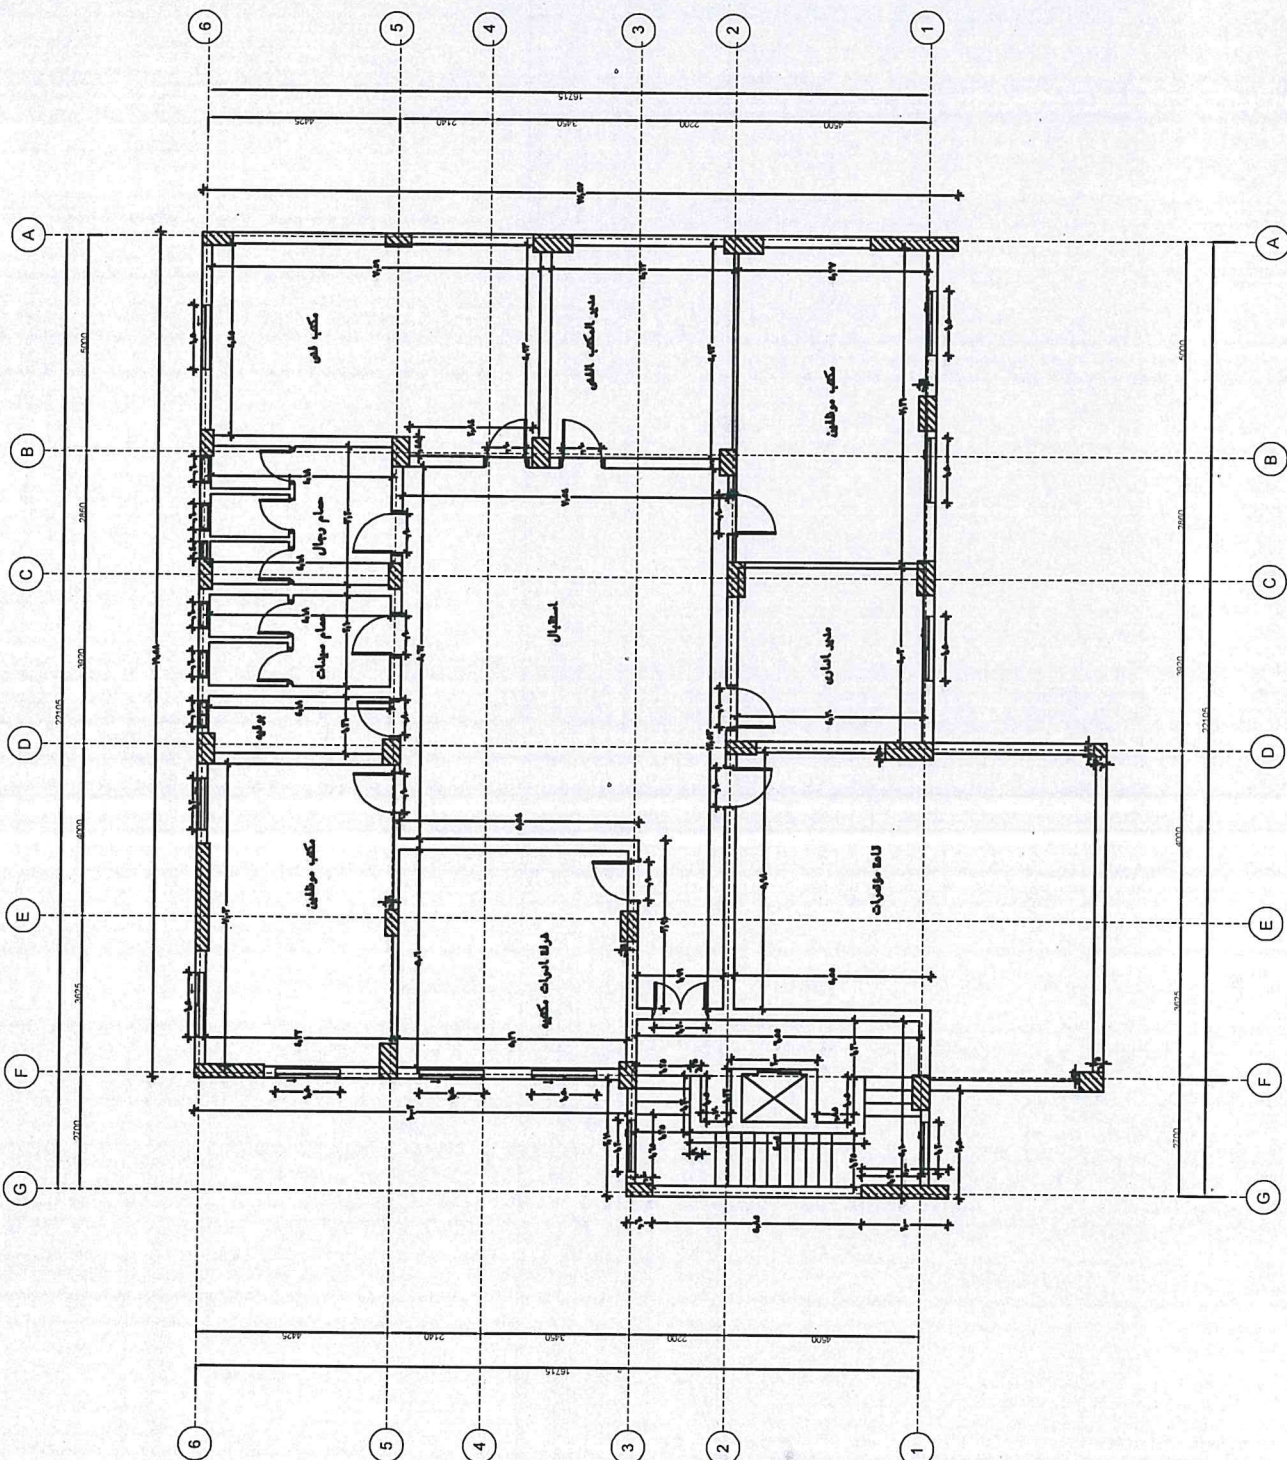
[illegible]

- All dimensions are in meters
- All dimensions should be checked with site planning and structural drawings.
- Do not measure from drawings. All dimension should be read or computed.

[illegible]

NOTES:

- All dimensions are in meters
- All dimensions should be checked with site
- Do not measure from drawings.
- Do not measure from drawings. All dimension should be read or computed.

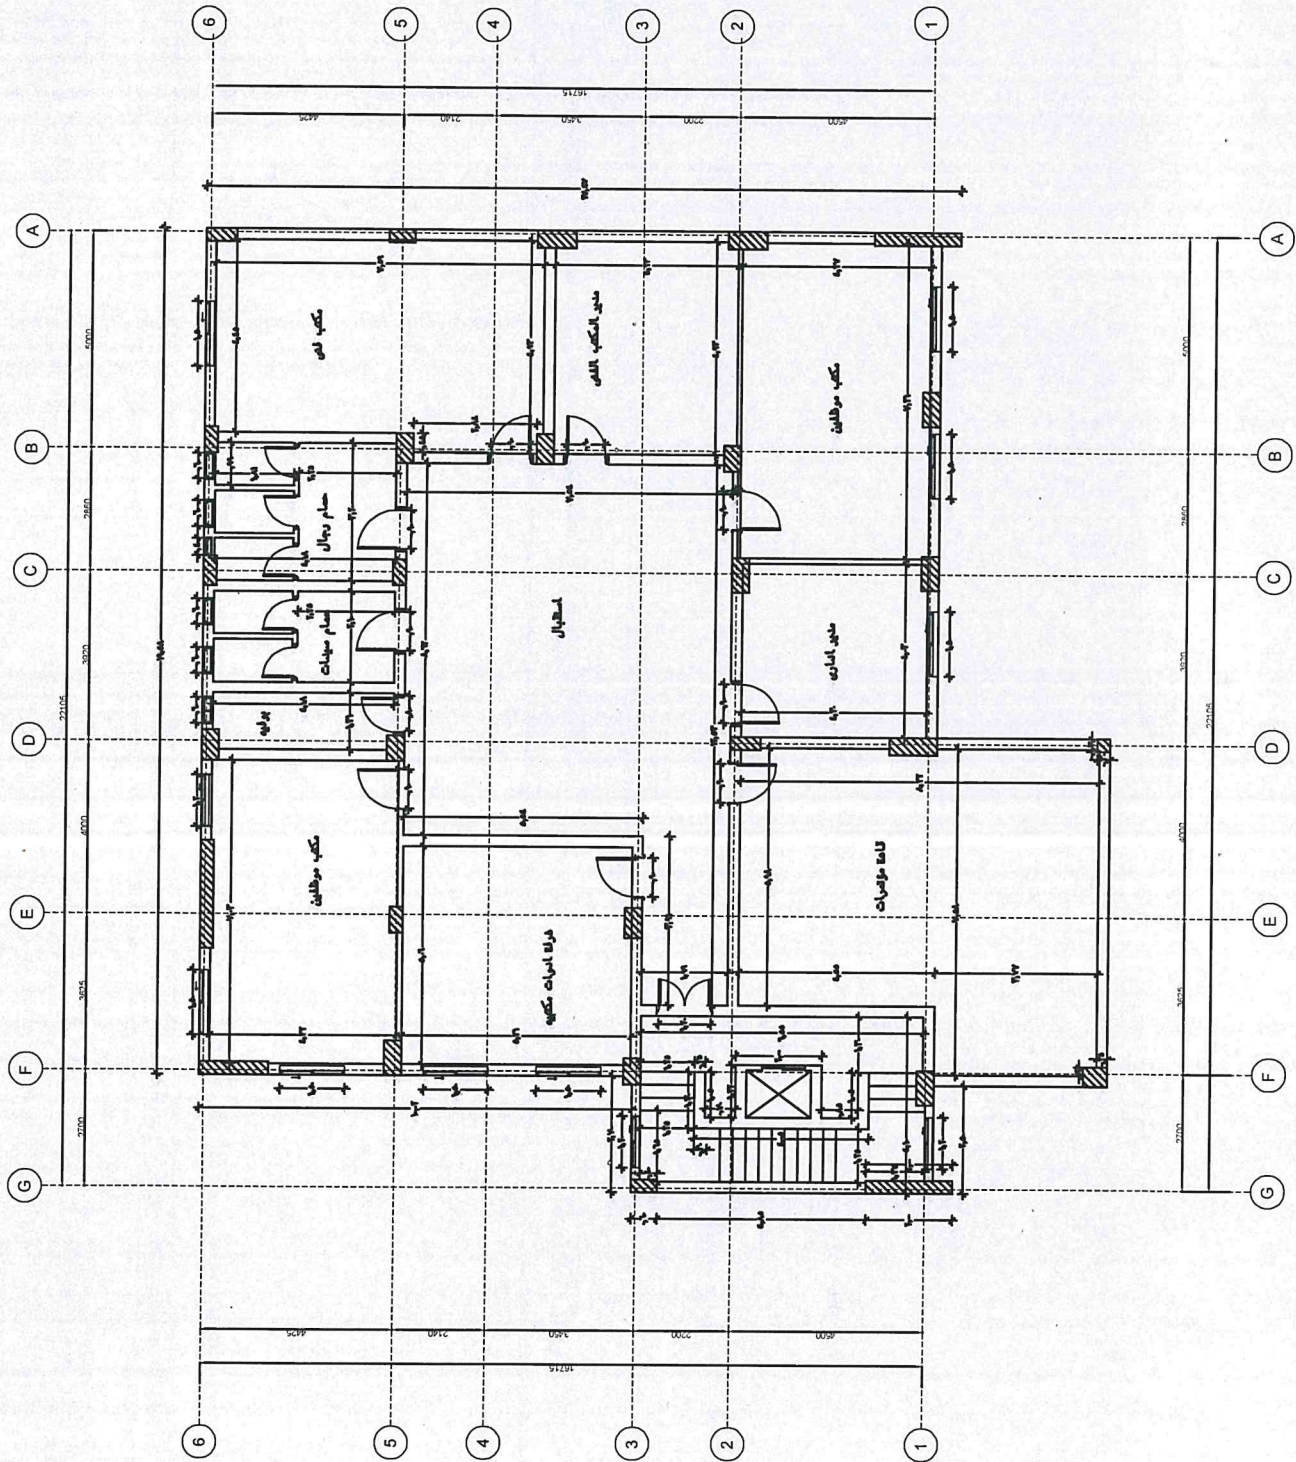

OWNER		PERMANENT LAYOUT	
NO.	DATE	NO.	DATE
1	2022	1	2022
OWNER		OWNER'S CONSULTANT AND SUPERVISOR	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT MINISTRY OF TRANSPORT GENERAL AUTHORITY OF ROAD AND TRANSPORT GENERAL AUTHORITY OF ROAD AND TRANSPORT		Arab House of Engineering شركة بيت الهندسة	
NAME OF PROJECT		NAME OF PROJECT	
بنيو البنية التحتية والكهرباء		بنيو البنية التحتية والكهرباء	
OWNER'S CONSULTANT AND SUPERVISOR		OWNER'S CONSULTANT AND SUPERVISOR	
Arab House of Engineering شركة بيت الهندسة		Arab House of Engineering شركة بيت الهندسة	
MAIN CONTRACTOR		MAIN CONTRACTOR	
شركة مارك		شركة مارك	
DWG TITLE		DWG TITLE	
مبنى البنية التحتية والكهرباء		مبنى البنية التحتية والكهرباء	
DWG NO.		DWG NO.	
03/0222		03/0222	
DATE		DATE	
03/0222		03/0222	
DESIGNED		DESIGNED	
CHECKED		CHECKED	
APPROVED		APPROVED	
SCALE		SCALE	
AS SHOWN		AS SHOWN	

مقايضة معدلة (٣)

اسم العملية انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس	
اسم الشركة المنفذه قيمة العملية طبقاً للعقد رقم عقد العملية مدة المشروع طبقاً للتعاقد تاريخ بدء العملية تاريخ النھو الفعلى طبقاً لآخر مد مده معتمد المقايضة واردة من قيمة المقايضة المعدلة	شركة تبارك للمقاولات العمومية ٤٩٧٧٠٤٨ جنيه (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) ٦ أشهر ٢٠٢٤/٩/١٧ ٢٠٢٥/٠٣/١٦ المنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء ٤٩٧٧٠٤٨ جنيه
مبررات المقايضة كميات الأعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ودفاتر الحصر	
مدير المشروع	م / محمد سامى عياد
مدير عام صيانة المباني	مهندسة / مروة بدرت محمود
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباطه
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية	محاسب/ شكرى فؤاد شكرى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	مهندس / أحمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مهندس / أيمن محمد متولى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

التوقيع "



مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (٢)	كمية المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي معمله (٢)	اجمالي معمله (٣)
الاعمال الانشائية							
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٧	٨٦	٣,٣٩٠	٢٩٤٩٣,٠٠٠	٢٩١٥٤,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٣م ^٣ ٠,٨ زلط نظيف و ٣م ^٣ ٠,٤ رمل نظيف حرش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٥	١	١,٩٧٥	٢٩٦٢٥,٠٠٠	١٩٧٥,٠٠٠
٣	بالمتر مسطح توريد و عمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمه طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤٤	١	١٥٠	٦٦٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٤	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفئة تشمل الرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١	١	٥٥,٧٠٠	٥٥٧,٠٠٠	٥٥٧,٠٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكويتير و حديد التسليح ٥ ١٢٥ مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوي اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الفاير بمعدل ٩٠٠ م/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٢	١	١	٩٥٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠
أعمال مباتي							
٦	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ ٣م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٣	٣٢	٢٩٠	٩٥٧,٠٠٠	٩٢٨,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب عمل مباتي سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ ٣م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٤٣	٤٣	٢,٤٥٠	١٠٥٣٥,٠٠٠	١٠٥٣٥,٠٠٠
٨	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ ٣م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٥	٣٤	٣٦٠	١٢٦٠,٠٠٠	١٢٢٤,٠٠٠
٩	بالمتر مكعب عمل مباتي سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ ٣م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٧	٢٦	٢,٨٥٠	٧٦٩٥,٠٠٠	٧٤١٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد والتركيب وطبقه رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٢	١٥٠	١	٢٦٠	٣٩٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠
١٠-١	(أ) سمك ٦ سم	م ^٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠
١٠-٢	(ب) سمك ٨ سم	م ^٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برذرة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم * ٣٠ سم) والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان والكحل وعمل فرش عادية اسفل البرذرة و الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط.	٥٠	١	٢٥٠	١٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (٢)	كمية المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي معدل (٢)	اجمالي معدل (٣)
أعمال العزل							
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من مائه اسمنتية سبكا ١٠٧ سيل او ما يمثله و جهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤٠	٣٩	٣٥٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠
أعمال البياض							
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجى ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م أسمنت بورتلاند عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٦٤	٧٥٠	٢٣٠	١٧٥٧٢,٠٠	١٧٢٥٠,٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلى ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م والفئة تشمل الشبك في أماكن الاتصال بالفاصل الاسمنتية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣٠٠٠,٠٠	١٥٣٠٠٠,٠٠
أعمال دهانات							
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفيتو او ما يمثله و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٧١٥	٧٦١	٢٠٠	١٤٣٠٠٠,٠٠	١٥٢٢٠,٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (ساييس او ما يمثله) او ما يمثله والفئة تشمل (التجهيز + وجه برايمر ماتي + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٩٠٠	٦٥١	١٧٠	١٥٣٠٠٠,٠٠	١١٠٦٧٠,٠٠
أعمال الارضيات							
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا قرز اول او ما يمثلهما والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م٢	٣٣٣	٣٣٣	٤٤٠	١٤٦٥٢٠,٠٠	١٤٦٥٢٠,٠٠
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا او ما يمثلهما والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة	م٢	١٣٠	١٢٧	٤٦٥	٦٠٤٥٠,٠٠	٥٩٠٥٥,٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٢٠٠	١٩٤	٥٥	١١٠٠٠,٠٠	١٠٦٧٠,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٣٠	٢٣	٢٥٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٥٧٥٠٠,٠٠
الاعمال المعدنية							
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكواكين والتثبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	كجم	١٢٥٠	١٢٤٧	١٠٥	١٣١٢٥٠,٠٠	١٣٠٩٣٥,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح الكومات سمك ٤ مم سعودي بوند او ما يمثلهما والفئة تشمل الشاسيه الحديد والاكسسوارات والسقالات و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٨٥	١	٣,٢٥٠	٢٧٦٢٥٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدھونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة	م٢	١١١	٩٣	٩,٢٥٠	١٠٢٦٧٥٠,٠٠	٨٦٠٢٥٠,٠٠
أعمال ابواب و الشبابيك							
٢٤	بالمتر المنطج توريد وتركيب ابواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي . وسواسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥×٢٠" وحلق مقاس حتى ٢×٧" وكبس قشرة ارو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويقا طبقا للعينة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوارات اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	م٢	٦٦	٦٦	٧٠٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠



البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (٢)	كمية المعدله (٣)	الفئة	اجمالي معدله (٢)	اجمالي معدله (٣)
٢٥	بالمتر المصطح توريد وتركيب أبواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والسعر يشمل الأكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكنة باب إيطالي ومقبض استاتلس والسففره و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٣	٣	٦,٥٠٠	١٩٥٠٠,٠٠٠	١٩٥٠٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المصطح توريد وتركيب شبابيك و أبواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الأكسسوار وضلفه سنك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٤٤	٤٤	٥,٤٠٠	٢٣٧٦٠٠,٠٠٠	٢٣٧٦٠٠,٠٠٠
أعمال المسبقة							
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاتدر او ديوررافيت) او ما يماثلها فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٥	٧,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥ سم علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاتدر او ديوررافيت) او ما يماثلها والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و غير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	٤	٤,٤٠٠	١٧٦٠٠,٠٠٠	١٧٦٠٠,٠٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب مبوله فخار المطلي صيني فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاتدر او ديوررافيت) او ما يماثلها والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢	٦,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استاتلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١	٤,٥٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ٣٢ مم من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	١٧	٢٧٠	٥٤٠٠,٠٠٠	٤٥٩٠,٠٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٢٥	٢٢٤	١٧٠	٣٨٢٥٠,٠٠٠	٣٨٠٨٠,٠٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٩	١٨	٤٠٠	٧٦٠٠,٠٠٠	٧٢٠٠,٠٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠	٣٨	٥٥٠	٢٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٩٠٠,٠٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٣	٥٥٥	١٦٦٥,٠٠٠	١٦٦٥,٠٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	١	١	٢,٧٥٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	٤	٤	٢,٧٥٠	١١٠٠٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش جولد بالسماعة او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	١	١	٣,٣٠٠	٣٣٠٠,٠٠٠	٣٣٠٠,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (٢)	كمية المعدل (٣)	الفئة	اجمالي معدل (٢)	اجمالي معدل (٣)
اجمالي الاعمال الاعتيادية							
الاعمال الكهربائية							
١	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A و عدد ٢٤ مفتاح (٣٢ امبير - ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاج تخاته ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٤٨٢٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A و عدد ١٨ مفتاح (32 امبير - ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاج تخاته ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٢٢٦٥,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل قاطع (٢٥٠+٥٠*٣) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٦٤٠	٦٤٠,٠٠	٦٤٠,٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختيار كابل قطاع (٣٥*٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٥٦٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختيار كابل قطاع (٢٥*٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٥١٢	٥١٢,٠٠	٥١٢,٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختيار كابل قطاع (١٦*٤) مم ٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٤١٦	٤١٦,٠٠	٤١٦,٠٠
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره اثاره شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٩٥	٩٥	١,٣٠٠	١٢٣٥٠٠,٠٠٠	١١٧٠٠٠,٠٠٠
٨	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح ديفياتير شامل سلك سويدي اصلي (٢*٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١	١	١,٥٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٤	٢٤	١,٧٥٠	٤٢٠٠٠,٠٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠٠
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨٩	٨٩	٢,٣٠٠	٢٠٤٧٠٠,٠٠٠	٢٠٤٧٠٠,٠٠٠
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧	٧	١,٣٥٠	٩٤٥٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠	١٠	٤,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	٢	٢,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (٢)	كمية المعدل (٣)	الفئة	اجمالي معدل (٢)	اجمالي معدل (٣)
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٧	١٧	١,٤٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٦	١٦	٤,٥٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٨	٨	٢,٨٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهؤ العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	٢٧	٥٥٠	١٤٨٥٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهؤ العمل و مقطع السلك ١ جوز ٦ × ٠,٦ نحاس مقصود و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٩	٢٩	٣٥٠	١٠١٥٠,٠٠	١٠١٥٠,٠٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهؤ العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٦	١٦	٤٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بتشينو ٢٦×٢٠ امبير من أجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	٣٠	٧٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد و عمل غرف تقيش ٦٠ × ٦٠ × ٥٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحاره من الداخل وغطاء سمات وكل ما يلزم لنهؤ العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٢	٢	٤,١٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠
٢٢	بالعدد توريد و تركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهؤ العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	عدد	١٦	١٦	٥٢٠	٨٣٢٠,٠٠	٨٣٢٠,٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الفريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٤٦	١٤٦,٠٠	٣,٠٠٠	٤٣٨٠٠٠,٠٠	٤٣٨٠٠٠,٠٠
اجمالي الاعمال الكهربائية							١١٤٧٨٩٨,٠٠

البند المستجده للأعمال الاعتيادية

١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرايش (فيوتك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهؤ الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	م.ط	٠	٢٥٠	١٥٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم سمك ٥ سم و يحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم للحماية و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٠	١٢	٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درج جيرانيت محلي (فيريدي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) و البند يشمل التلايس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهؤ الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	م.ط	٠	٢٤	١,٢٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠



محرر

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (٢)	كمية المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي معدلة (٢)	اجمالي معدلة (٣)
٤	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) عرض (15 سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصلاص الصناعة.	م.ط	٠	١١	٤٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر المسطح لتوريد وتركيب رخام جيرانيت فيردي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) سمك ٢ سم والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	م.م	٠	٢٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠
٦	بالمتر المسطح لتوريد وتركيب مريات طبقا للتصميم و البند يشمل التنشيت و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.م	٠	٣	٨٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٠٠٠
٧	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣٢ مم ١ بوصة من اجود الاتواع (B.R او الشريفة او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنشيت بالحائط والرفاقع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠	١	٢٧٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠
٨	بالعدد لتوريد وتركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى اقرب جالتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠	١	٩٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
٩	بالعدد لتوريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الاتواع و الفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٥	١٥٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
البند المستجدة للأعمال الكهربائية							
١	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٥٠×٣) مم ٢ المونوم مسلح و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	م.ط	٠	١	١,٣٥٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠
٢	بالعدد لتوريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت إنتاج (الجراند - جيوس-بتشينو - شنيذر) يركب بالأسلاك الداخلية داخل الحائط والسعر يشمل الشاسية واللحمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنشيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلي :	عدد	٠	٣	٣٢٠	٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠
٣	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد .	عدد	٠	١	٥٥٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
٤	كالبند السابق ولكن مضادة المياه.	عدد	٠	١٠	٥٢٠	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠
٥	مفتاح أنارة سكتين (two gang).	عدد	٠	٥	٧٢٠	٠,٠٠٠	٣٦٠٠,٠٠٠
٦	كالبند السابق مضادة للمياه .	عدد	٠	٩١	٣٢٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٠,٠٠٠
٧	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير- ٢٥٠ فولت إنتاج (الجراند - جيوس-بتشينو) والسعر واللحمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنشيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	عدد	٠	١٥	٧٢٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠٠
٨	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عيارة عن كشف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٤	٢,١٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠٠,٠٠٠
٩	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عيارة عن كشف ١ × ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٤	١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠
١٠	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عيارة عن كشف ليد باتل ٦٠ × ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65- و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٧١	٤,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩٥٠٠,٠٠٠



مقاييسه معدل ٣
أعمال انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث
ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

الهيئة العامة
للشرق و البحار
(GARB)



البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (٢)	كمية المعدل (٣)	الفئة	اجمالى معدل (٢)	اجمالى معدل (٣)
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهاى الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	١١	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهاى الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	١٠	٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب شفاط ٢٥*٢٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهاى الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٦	٢,١٥٠	٠,٠٠٠	١٢٩٠٠,٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر اوليميك او ما يماثل البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهاى العمل طبقا لاقول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٠	٢	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠
اجمالى البنود المستجدة							٥٨٠٩٥٠,٠٠٠
اجمالى كلى							٤٩٧٧٠٤٨,٠٠٠

مهندس الهيئة
مهندس /
محمد سامي

مهندس الشركة
مهندس /
محمد خالد

