

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (٣) جارى عن
عملية : اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب
الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (٣) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع . ح بقيمة المستخلص وبيان كالاتى :-

جملة الأعمال	١١٨٠٠٦٠٠,٠٠	
سابق صرفة	١٠٥١٥٠٠٠,٠٠	
	١٢٨٥٦٠٠,٠٠	
الاستقطاعات		
قرش	جنية	
٠٠	٦٤٢٨٠	٥٪ لحسن سير العمل
٢٠	٣١٢٥٣	عادي و اضافى
٤٠	—	توقيع وموارد
٢٠	٥٧٨٥	نسبة ٠,٤٥ ٪ قيمة العمالة غير المنتظمة
٢٠	٥٧٨٥	نسبة ٠,٤٥ ٪ قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد
١٠٧١٠٤,٠٠	جملة الاستقطاعات	
١١٧٨٤٩٦,٠٠	صافى المبلغ	

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "



(علاء عبدالعال حسين)



الاستثمار في اعتماد الصرف

المصلحة العامة للطرفين والكماليات
المستصلحة الثانية عشر - الوافي كبد
المبلغ المستحق إلى شركة خمر على الحد محمود
الطلبات فيه ، أو :
موجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على
 { شيك على البنك المركزي في
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قروش جنيهه
		١٢٨٥٦٧٠ —
		
	الجملة	١٢٨٥٦٧٠ —

رقم _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
الملاحظات		نوع الخصم	
قرش	جنيته	قسم	نوع
		نصل	بند
مخططه جاری رقم (۲) عن عمله ۱۶۱ له كتابه رقبه رقبه كماره / تارس محرر ۱۸ رجبه كماره ۱۶۶ اله ۲۶ حه المخطه			
قرش		إجمالي الأصل	
جنيته		بيانات الاستقطاعات	
عادي	إضافي	دمغة توقيع	
قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	
رسم الدمغة		صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ



 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 14/10/2019

علامة

ففى ————— سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الامضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري تاريخ الإمضاء
الامدادات

الهيئة العامة لتسويق الطماطم الأميرية ٢٦٠٧٩ من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٥

الختم ذو التاريخ (٢٠٢٠) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في — سنة ٢٠٠

يعتمد سحاب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٠٠ ميلادي

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المخطوط

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم إمضاء الكاتب الموقوف :

اعمال ازالة الكتيان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة الوادى الجديد)

بيان بكميات بند رقم (1) ازالة الكتيان الرملية المستخلص رقم (3) جارى لشركة محمد على احمد محمود


م	البند	الى		الكمية	ملاحظات
		تية رقم	تية رقم		
1	أزالة الكتيان الرملية	تية رقم 7-8-9-10	52995.05		
2	أزالة الكتيان الرملية	تية رقم 1	4717.45		
3	أزالة الكتيان الرملية	تية رقم 3	7517.33		
4	أزالة الكتيان الرملية	تية رقم 4	13085.11		
5	أزالة الكتيان الرملية	تية رقم 5	14236.59		
6	أزالة الكتيان الرملية	تية رقم 6	8001.3		
7	أزالة الكتيان الرملية	تية رقم 11	11073.52		
8	أزالة الكتيان الرملية	تية رقم 12	3800.025		
الاجمــــــــالى					115426.375

مهندس الهيئة
التوقيع /

مهندس الشركة
التوقيع /



٢٠١٩/٠٨/٢٢



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 7&8&9&10)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
158+436.00	0.130	0.000	0.000
158+450.00	8.510	62.460	62.460
158+475.00	9.530	234.410	296.870
158+500.00	60.420	864.760	1161.640
158+525.00	96.580	1962.550	3124.180
158+550.00	127.880	2805.740	5929.930
158+575.00	180.870	3957.200	9887.130
158+600.00	217.680	4981.860	14868.980
158+625.00	13.650	2891.660	17760.640
158+650.00	6.030	252.520	18013.170
158+675.00	4.970	131.210	18144.380
158+700.00	11.060	205.870	18350.240
158+725.00	11.740	281.580	18631.820
158+750.00	8.470	257.500	18889.320
158+775.00	3.740	149.870	19039.190
158+800.00	4.270	102.250	19141.440
158+825.00	12.190	202.970	19344.410
158+850.00	7.440	245.370	19589.780
158+875.00	15.710	296.370	19886.160
158+900.00	32.340	600.520	20486.680
158+925.00	19.610	641.620	21128.300
158+950.00	23.200	535.110	21663.410
158+975.00	39.260	780.820	22444.230
159+000.00	48.470	1116.310	23560.540
159+025.00	83.910	1654.720	25215.260
159+050.00	91.540	2320.690	27535.960
159+075.00	74.420	2143.160	29679.110
159+100.00	48.320	1589.740	31268.860
159+125.00	70.520	1485.520	32754.380
159+150.00	60.590	1685.090	34439.470
159+175.00	24.410	1062.480	35501.950
159+200.00	1.020	317.920	35819.870



٢٠٢٣

مهندس الشركة
شركة محمد علي أحمد
المقاولات الهندسية
٢٠٢٣

مهندس الهيئة
م.ع.ع.

اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 7&8&9&10)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
159+225.00	0.000	12.880	35832.750
159+250.00	0.020	0.240	35832.990
159+275.00	0.010	0.390	35833.380
159+300.00	0.000	0.170	35833.550
159+325.00	0.010	0.090	35833.640
159+350.00	0.050	0.740	35834.380
159+375.00	0.010	0.780	35835.160
159+400.00	0.040	0.640	35835.800
159+425.00	0.000	0.520	35836.320
159+450.00	0.010	0.110	35836.430
159+475.00	0.000	0.120	35836.550
159+500.00	0.000	0.020	35836.570
159+525.00	12.030	152.500	35989.070
159+550.00	14.320	329.480	36318.560
159+575.00	17.640	404.010	36722.570
159+600.00	66.100	1059.800	37782.370
159+625.00	160.290	2718.970	40501.340
159+650.00	98.820	3285.200	43786.540
159+675.00	23.340	1526.990	45313.520
159+700.00	0.000	291.780	45605.300
159+725.00	0.000	0.000	45605.300
159+750.00	0.000	0.000	45605.300
159+775.00	0.000	0.000	45605.300
159+800.00	0.000	0.000	45605.310
159+825.00	0.000	0.010	45605.320
159+850.00	0.000	0.010	45605.330
159+875.00	0.000	0.030	45605.360
159+900.00	70.940	903.180	46508.540
159+925.00	163.320	2928.270	49436.820
159+950.00	0.000	2041.510	51478.320
159+975.00	52.540	649.400	52127.720
159+999.50	18.260	867.330	52995.050





اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبنية رقم 1)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	5.220	0.000	0.000
0+025.00	43.790	612.530	612.530
0+050.00	59.420	1305.050	1917.580
0+075.00	74.840	1678.210	3595.790
0+100.00	14.080	1111.460	4707.240
0+101.19	3.050	10.200	4717.450


مهندس الهيئة

[Signature]



٣٧٦١٣

مهندس الشركة





اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)


حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 3)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	5.130	0.000	0.000
0+025.00	36.480	520.120	520.120
0+050.00	62.790	1240.780	1760.900
0+075.00	118.500	2266.140	4027.040
0+100.00	67.820	2329.030	6356.080
0+125.00	14.380	1003.090	7359.160
0+140.40	6.160	158.170	7517.330

مهندس الهيئة
[Signature]



مهندس الشركة
[Signature]

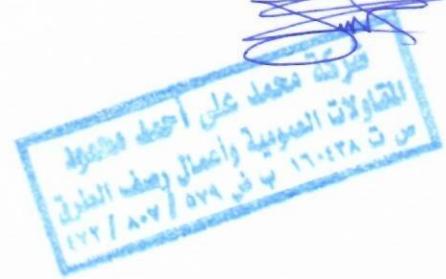



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 4)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	4.500	0.000	0.000
0+025.00	45.150	612.200	612.200
0+050.00	48.710	1191.520	1803.720
0+075.00	59.190	1335.990	3139.720
0+100.00	70.610	1622.500	4762.210
0+125.00	68.360	1714.270	6476.490
0+150.00	65.440	1712.500	8188.990
0+175.00	96.630	1993.990	10182.980
0+200.00	71.570	2102.470	12285.440
0+222.35	0.000	799.670	13085.110

مهندس الهيئة

[Signature]



مهندس الشركة





اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/ درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 5)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.000	0.000	0.000
0+025.00	23.040	288.020	288.020
0+050.00	50.060	883.100	1171.120
0+075.00	43.510	1207.100	2378.220
0+100.00	69.820	1446.030	3824.250
0+125.00	70.670	1737.920	5562.180
0+150.00	79.140	1899.420	7461.600
0+175.00	69.810	1861.870	9323.470
0+200.00	81.090	1953.980	11277.440
0+225.00	85.920	2087.700	13365.140
0+245.23	0.240	871.460	14236.590

مهندس الهيئة

Signature



مهندس الشركة





اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 6)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	6.760	0.000	0.000
0+025.00	47.790	681.930	681.930
0+050.00	95.320	1903.020	2584.950
0+075.00	22.570	1455.630	4040.580
0+100.00	16.000	477.640	4518.210
0+125.00	61.150	977.980	5496.190
0+150.00	55.370	1434.350	6930.540
0+175.00	18.310	934.900	7865.440
0+185.09	8.610	135.860	8001.300

مهندس الهيئة

م.ع.ع.



مهندس الشركة



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 11)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	5.220	0.000	0.000
0+025.00	43.790	612.530	612.530
0+050.00	59.420	1305.050	1917.580
0+075.00	74.840	1678.210	3595.790
0+100.00	14.080	1111.460	4707.250
0+125.00	3.050	10.200	4717.450
0+150.00	36.480	520.120	5237.570
0+175.00	62.790	1240.780	6478.350
0+200.00	118.500	2266.140	8744.490
0+225.00	67.820	2329.030	11073.520

مهندس الهيئة

Cine



مهندس الشركة



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 12)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	2.586	0.000	0.000
0+025.00	29.360	399.325	399.325
0+050.00	45.965	941.563	1340.888
0+075.00	49.600	1194.563	2535.450
0+100.00	11.253	760.663	3296.113
0+125.00	2.200	168.163	3464.275
0+150.00	24.660	335.750	3800.025

مهندس الهيئة

Signature



مهندس الشركة



اعمال ازالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

بيان كميات بند رقم (2) توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية المستخلص رقم (3) جارى لشركة محمد على احمد محمود

ملاحظات	الكمية	القطاع		البند	م
		الى	من		
	350000	11&9&7&6&5&3&2	تربة رقم	توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية	1
	350000			الاجمـــــالى	

مهندس الهيئة

التوقيع /



مهندس الشركة

التوقيع /

محمود احمد محمود



اعمال التطفيل بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

حصر مسطح التطفيل تبة 9&7 & 6&5&3&2&11

المسطح	العرض	الطول	رقم التبة
125000.000	250.000	500.000	9
5000.000	50.000	100.000	7
70000.000	200.000	350.000	6
37500.000	150.000	250.000	5
49500.000	180.000	275.000	3
28000.000	140.000	200.000	2
35000.000	140.000	250.000	11

مهندس الهيئة


Handwritten signature

مهندس الشركة

Handwritten signature



٣٦٠٨٣



البرنامج الزمني المقترح لنهـو الأعمال في فترة من شهر 2024-12-25 حتى 2025-4-25

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكدكان الرملية بطريق الخارجة / باريس غرب الأرمين المسألة من كم (١٤٦) إلى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد))



البنـد	الوحدـة	اجمالي الكمية	Dec-2024				Jan-2025				Feb-2025				Mar-2025				Apr-2025		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	
ازالة لتفكيان الرملية الموجودة اعلى الطريق	3٠	115500																			
توريد وقوف زرية ذات كثافة عالية لزود تثبيت التفكيان الرملية	2٠	350000																			
مهندس الشركة																					
مهندس الهيئة																					





بيان المعدات

التاريخ : 2025-2-9

اسم المشروع : عن عملية اعمال إزالة الكتبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة محمد علي احمد محمود
رقم (2025/2024/603)
لتتفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

المعدة	العدد
لودر	2
عربية قلاب	6
تانك مياه	1
سيارات خدمة	2
هراس	2

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





مشروع :- اعمال إزالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة /
باريس /درب الاربعين من الكم 146+000 الى الكم 160+000 حد منطقة
محافظة الوادي الجديد
تنفيذ : شركة محمد علي أحمد محمود
التقرير الأسبوعي

City

[illegible]

الشركة المفتوحة

۱۱۷


قوله

كتاب فتح باب العمل

卷一

6. 6. 6.

مكونات المشروع

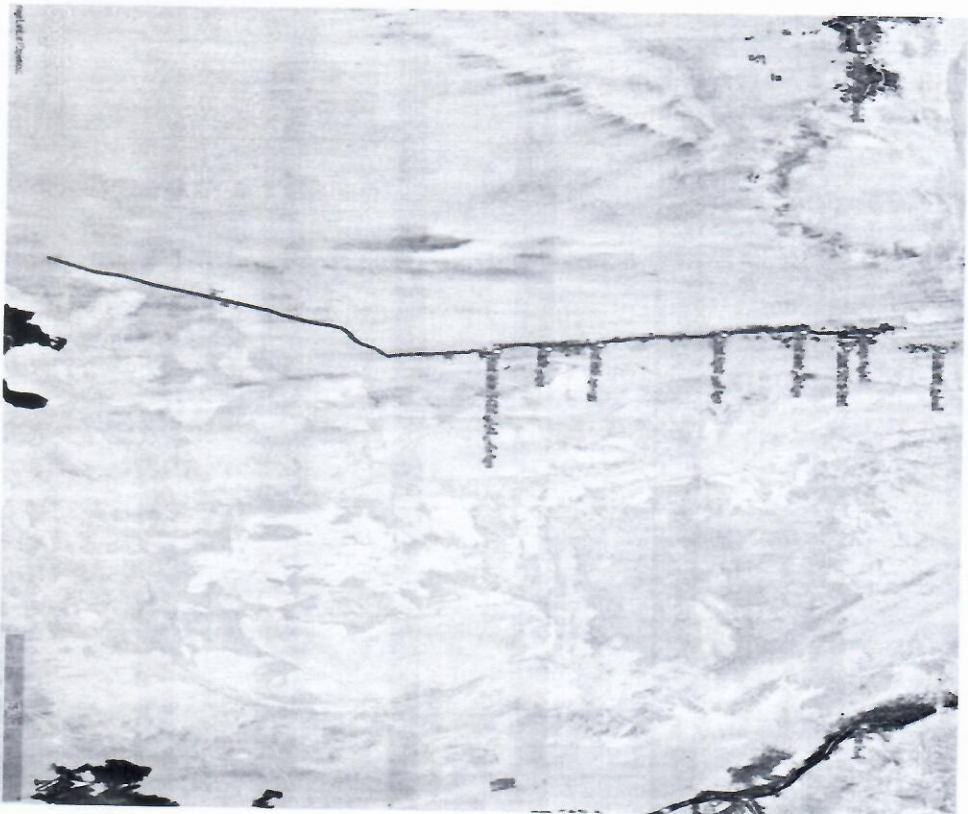


*- أعمال إزالة الكلبان الرملية أعلى الطريق والتي تعيق حركة المرور وتؤثر على تربية الزوم تليد الكلبان الرملية



مشروع:- اعمال ازالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس / ارب الاربعين من الكم
الى الكم 146+000 حد منطقة محافظة الوادي الجديد



صور المشروع ازالة الرمال وتوريد وفرش تربة


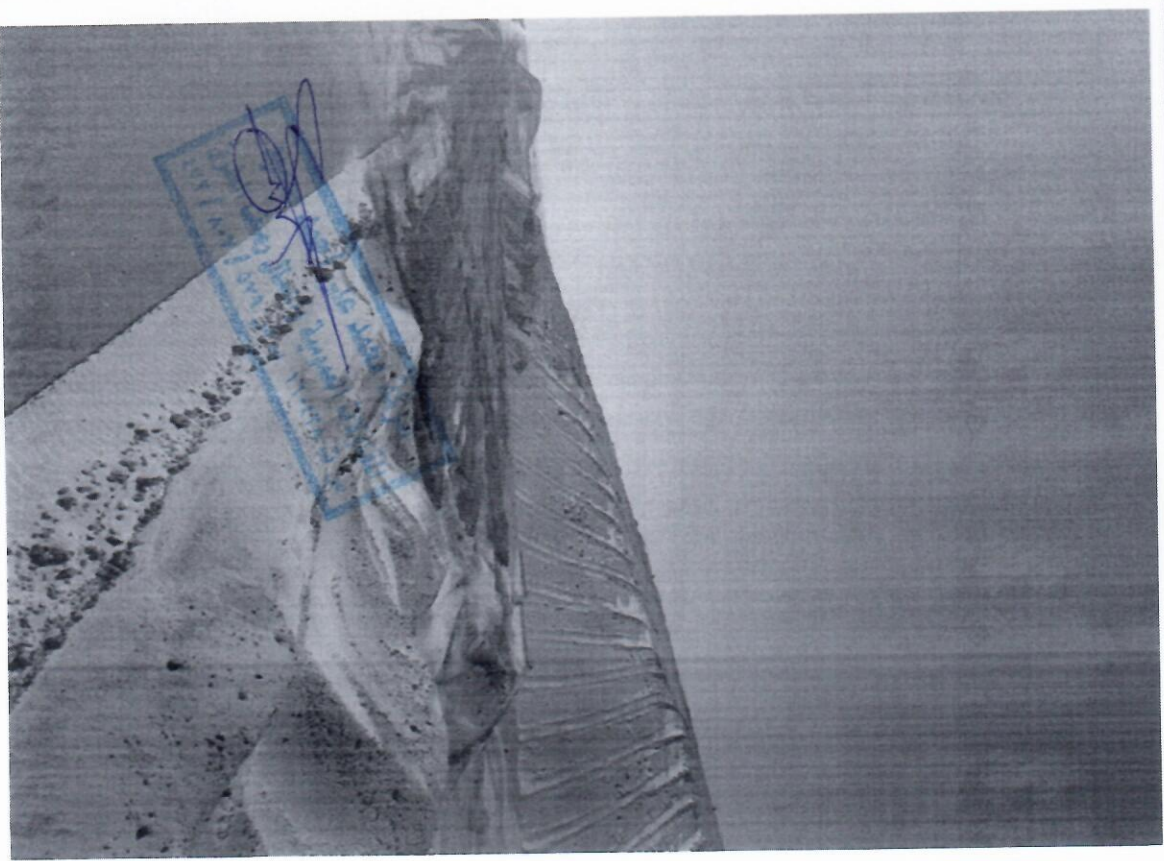




مشروع:- اعمار ازالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس / ارب الاربعين من الكم
146+000 الى الكم 160+000 حد منطقة محافظة الوادي الجديد



صور المشروع ازالة الرمال وتوريد وفرش تربة

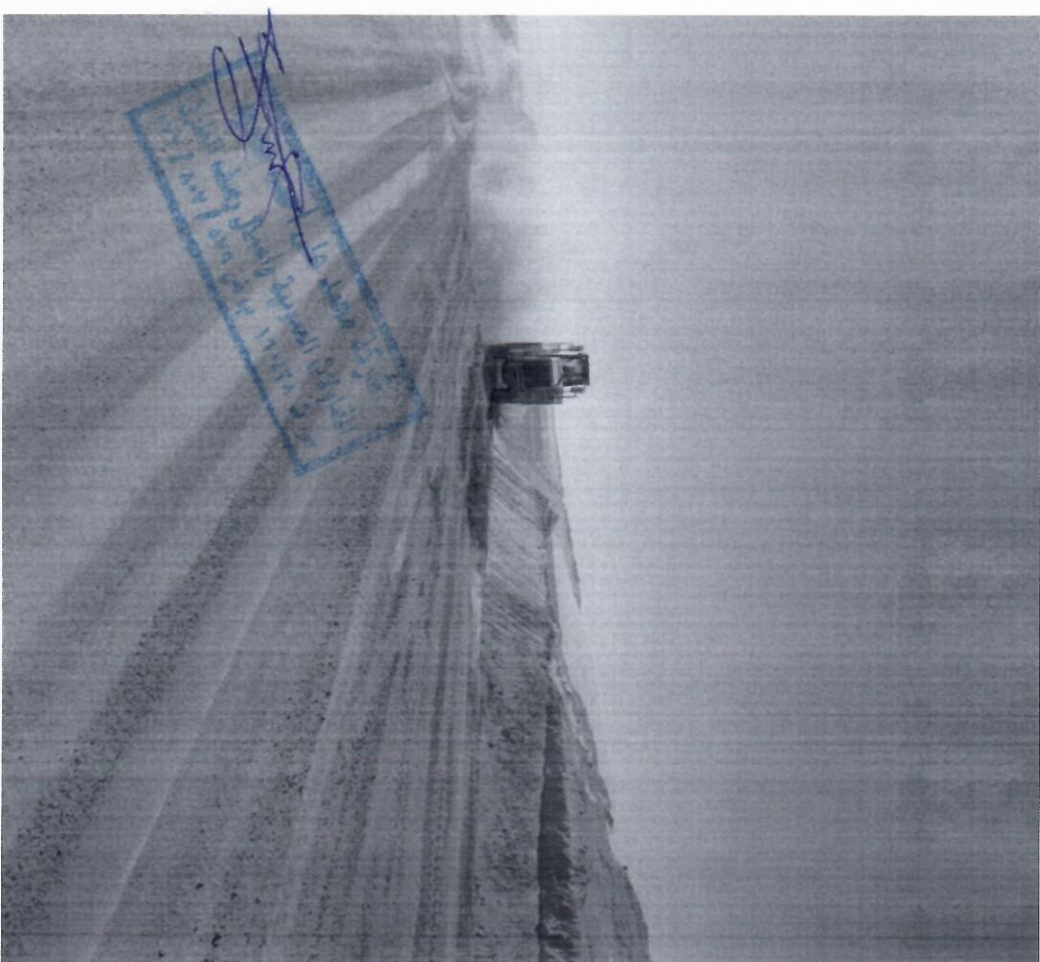
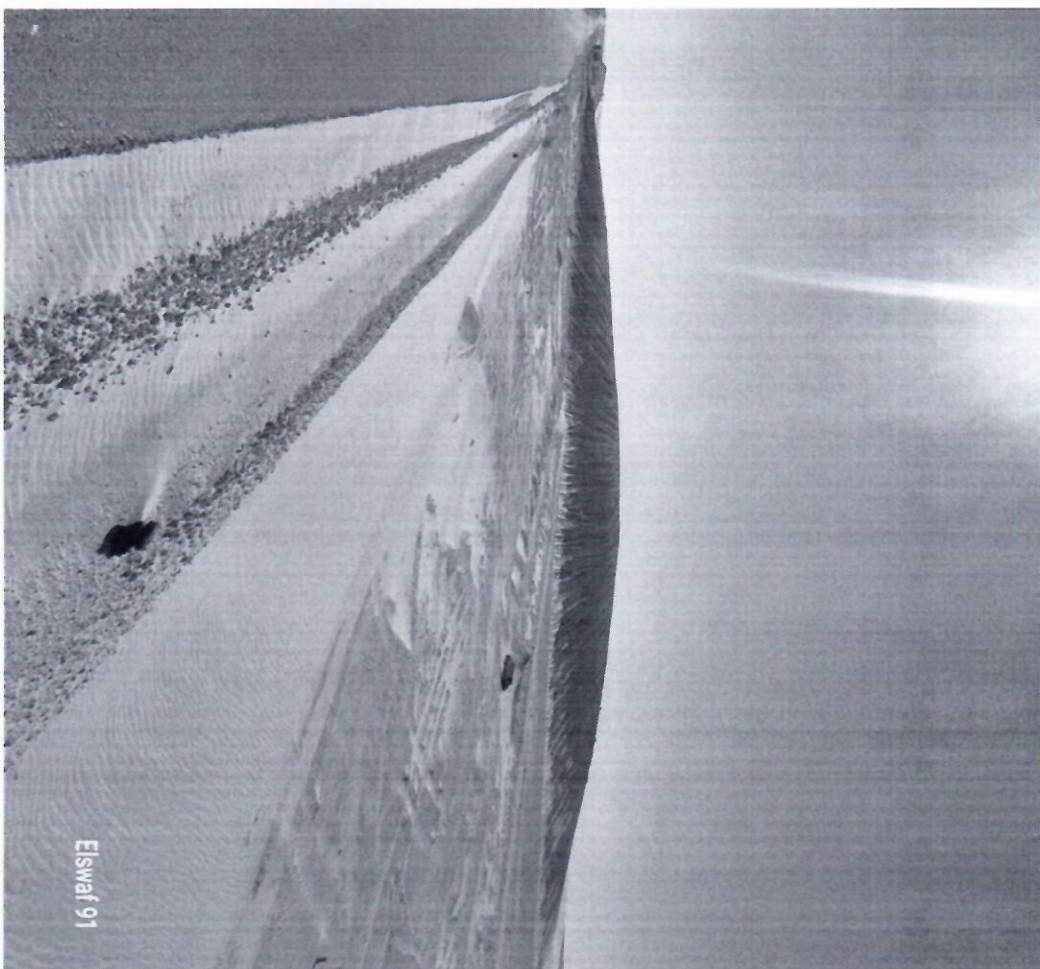




مشروع:- اعمال ازالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس / ارب الربيعين من الكم
الى الكم 146+000 حد منطقة محافظة الوادي الجديد



صور المشروع ازالة الرمال وتوريد وفرش تربة

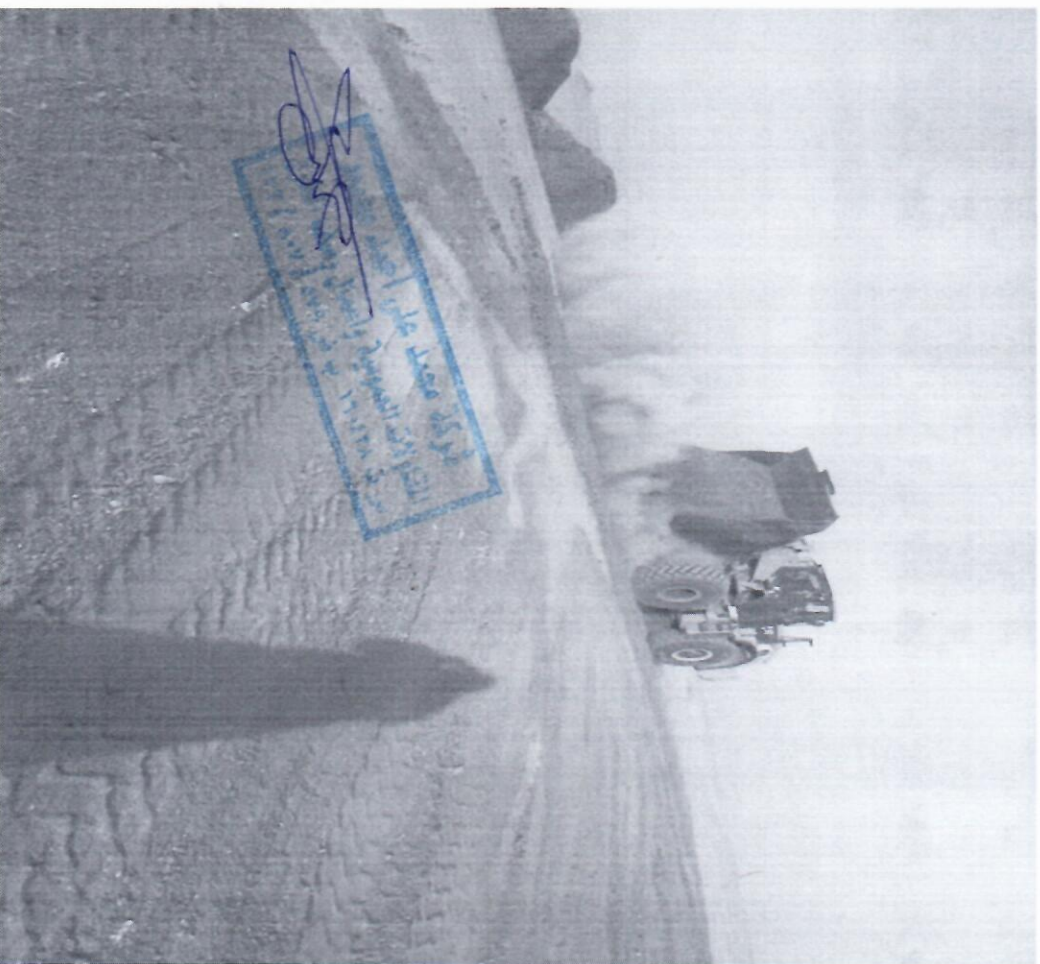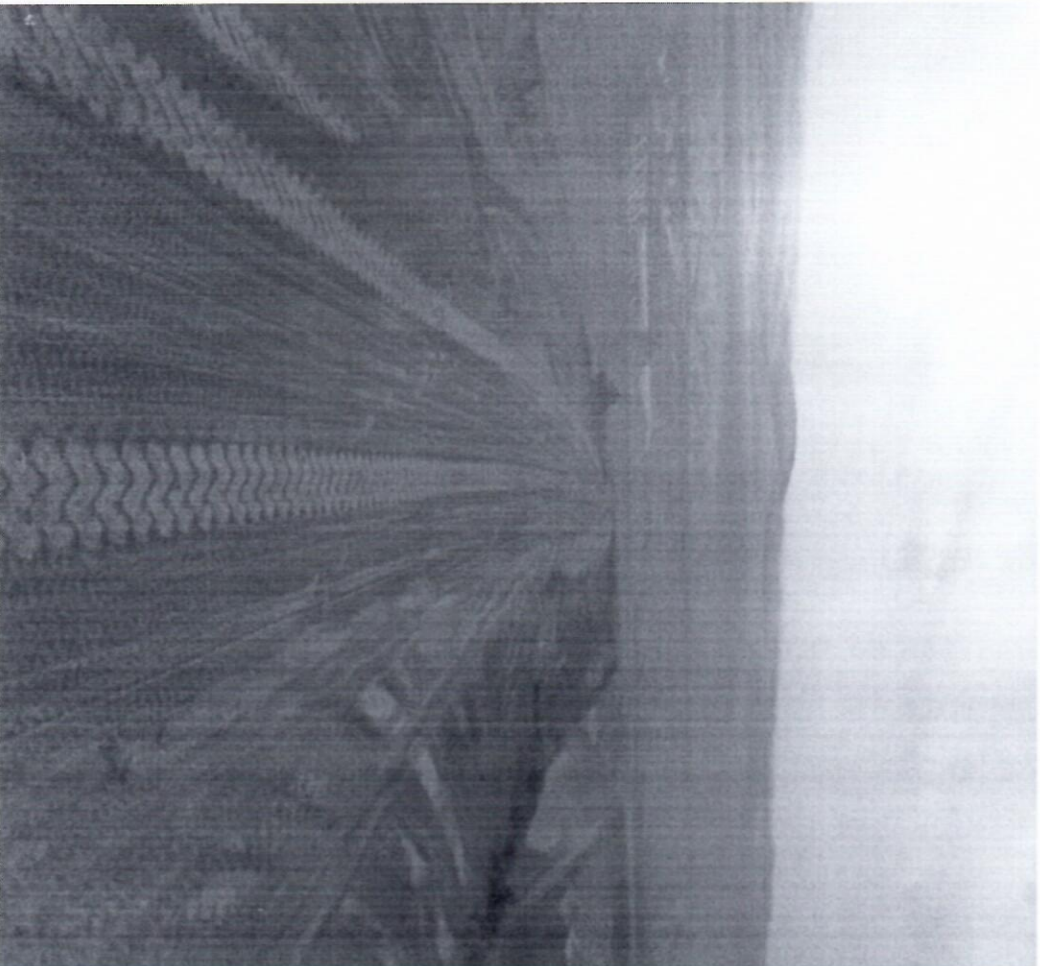



مشروع:- اتصال إزالة الكثبان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس /أرب الاربعين من الكم
الى الكم 146+000 حد منطقة محافظة الوادي الجديد



صور المشروع إزالة الرمال وتوريد وفرش تربة

