

شهادة

تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري
بخصوص عملية : استعمال اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
التي قامت بتنفيذها : شركة مصرية للمستلزمات الطرق
١. تم اجراء الاختبارات العملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط
والمواصفات المحددة بهذا الشأن .

٢. تم نهو جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١ .
٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و اية خصومات أخرى مستحقة .
٤. المهندسين و الفنيون متواجدون بسلوك جيد .

وهذه شهادة منا بذلك

تحرير آفى : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥



مهندس /

أحمد الطحان

بخصوص عملية: اعمال تامين سلامة المرور علي طريق
نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
بالامر المباشر
تنفيذ: شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مذكرة إضافية

اسم العملية : اعمال تامين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
بالامر المباشر

- اشراف :- المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.
قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٨٩٧٥٠ جنيها

مدة تنفيذ العملية : ١ أشهر

تاريخ البدء:- ٢٠٢٤/٠٧/١٥

تاريخ النهو التعاقدي:- ٢٠٢٤/٠٨/١٥

تاريخ النهو الفعلي :- ٢٠٢٤/٠٧/٢١.

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٤٩٤٨٨٠٠ جنيها مصري لانتهاء الاعمال بنسبة
اقل من العقد ٨٢,٠ % بعد الحصر علي الطبيعة.

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في: ٢٠٢١ / ١ /


والامر مفوض لسيادتك

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزام
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٤ / ٨



مهندس /



الهيئة العامة
للتنسيق والإداري
(P.E.D)

عملية : استكمال أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
مقايضة ختامية

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة		الكمية		الجملة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	بالمنقر المسطح اعمال تخطيط باللويزه المرورية البيضاء المسافه بنظام البق بسمسك لإزقل عن ٢,٥ م بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المنقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندسين المشرف .	٠	٤٥٠	١٠٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠٠	٠
٢	نقل و تركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) و البند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير و طبقا للشروط و المواصفات	٠	٨٠٠	٥٦١	٠	٤٤٨٨٠٠	٠
الاجمالي							
					٠	٤٩٤٨٨٠٠	٠

رئيس الإدارة المركزية



مدير عام المشروعات

حنا

م / محمد شحات

مدير المشروع

عبدالله

م / اسمه عادل عز الدين

مهندس العملية

عبدالله

م /

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink over a blue rectangular stamp.

1	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.
2	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.
3	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.	Handwritten text in Arabic script.

Handwritten text in Arabic script.

Handwritten text in Arabic script.

Handwritten text in Arabic script.

Handwritten text in Arabic script.



محضر استلام وتقدير ابتدائي

لعملية استكمال اعمال تامين سلامة المرور على طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم

(مرحلة ثالثة)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٣ ويناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٢١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ بخصوص الاستلام الابتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

- المهندس / محمود حمدي محمد الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
 - المهندس / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
 - المهندس / محمد حسنى ادارة المعامل المركزية - عضوا
 - المهندس / اسامة عادل عز الدين المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) - عضوا
 - المهندس / هشام على العجرودى شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا
- وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها بصريا تبين الاتي :-

١- تخطيط بالبيانات المرورية العاكسة البيضاء على الساخن (اكستروذر) سمك ٢,٥ مم:-
الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية واتساح بالخطوط باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ٤٠٠٠ جنية. فقط وقدره اربعة الاف جنية لا غير).

- ٢- اعمال نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) :-
- الاعمال مقبولة بصفة عامة
 - الحصر مسئولية المنطقة المشرفة.
 - اجمالي الخصم = ٤٠٠٠ جنية (فقط وقدره اربعة الاف جنية لا غير).
 - الحصر مسئولية المنطقة المشرفة.

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي للاعمال عالية ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة هو تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ هو بداية فترة الضمان مع خصم المبلغ عالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة.

التوقيعات

-٥-

-٤-

-٣-

-٢-

-١- ٢٠٢٥/٠٥/٠٩

عملية اعمال تأمين وسلامه مرور علي طريق طابا نوبيع
تنفيذ شركة مصر به لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق باليوبات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م ^٢	٣٦١٣٨
٢	اعمال تهشير باليوبية المرورية علي البارد	م ^٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

مهندس الشركة : ايمن منصور ابراهيم

الاسم /
التوقيع /

الاسم / ايمن منصور ابراهيم
مهندس شركة مصر به
مستندات التوقيع م/ ايمن منصور ابراهيم
٢٠١٨ - ١٨٧ - ١٦٥٠


القطاع - نوبيع - ذهب (عمليه تطوير طريق ذهب نوبيع بطول ٢٧ كم)

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
71.822	74.224	2402	ساخن	محور	2	0.146	233.8		اتجاه ذهب نوبيع
71.822	74.224	2402	ساخن	مستمر جنب	2	0.145	696.6		اتجاه ذهب نوبيع
75.217	75.217	3.5	بارد	مطب	1	7.2		25.2	قبل الله اكبر اتجاه نوبيع
75.315	75.315		صوتي	15 شريحه صوتي	15	0.2			قبل الله اكبر اتجاه نوبيع
72.639	77.473	4834	ساخن	محور	1	0.142	228.8		اتجاه نوبيع ذهب
72.639	77.473	4834	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1421.2		اتجاه نوبيع ذهب
72.857	72.857	4.5	بارد	مطب	1	10.1		45.5	اتجاه ذهب نوبيع
72.977	72.977		صوتي	15 شريحه صوتي	15	0.2			اتجاه ذهب نوبيع
81.774	83.185	1411	ساخن	محور	1	0.143	67.3		اتجاه نوبيع ذهب
81.774	83.185	1411	ساخن	مستمر جنب	2	0.144	406.4		اتجاه نوبيع ذهب
82.291	82.291		صوتي	15 شريحه صوتي	15	0.2			قبل الغاز اتجاه نوبيع
82.291	82.291	3.5	بارد	مطب	1	6.8		23.8	امام الغاز اتجاه نوبيع
84.763	84.763	4.4	بارد	مطب	1	6.8		29.9	اتجاه ذهب
84.985	85.758	773	ساخن	محور	1	0.141	36.3		اتجاه نوبيع ذهب
84.985	85.758	773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	227.3		اتجاه نوبيع ذهب
85.838	85.838	344	ساخن	مستمر جنب	2	0.146	100.4		مدخل ابو جالوم
85.838	85.838	160	ساخن	مستمر جنب	2	0.145	46.4		مخرج ابو جالوم
85.838	85.838	445	ساخن	50/50	1	0.143	31.8		ابو جالوم
84.151	86.624	2473	ساخن	محور	1	0.146	361.1		اتجاه ذهب نوبيع
84.151	86.624	2473	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	727.1		اتجاه ذهب نوبيع
86.199	86.199	486	ساخن	مستمر	1	0.145	70.5		عند ut الصاعده
86.624	86.624	2.2	بارد	اسهم 6				13.2	نهايه الازدواج
86.624	86.624	4	بارد	نوزه		38		76.0	
							4654.9	213.6	

~~مجلس~~
 ٥٣٠
 ٥٣٠

Handwritten signature: *Dr. [illegible]*
 Stamp: *Dr. [illegible]*
 Handwritten signature: *Dr. [illegible]*

تفصيلي مساحة السطح

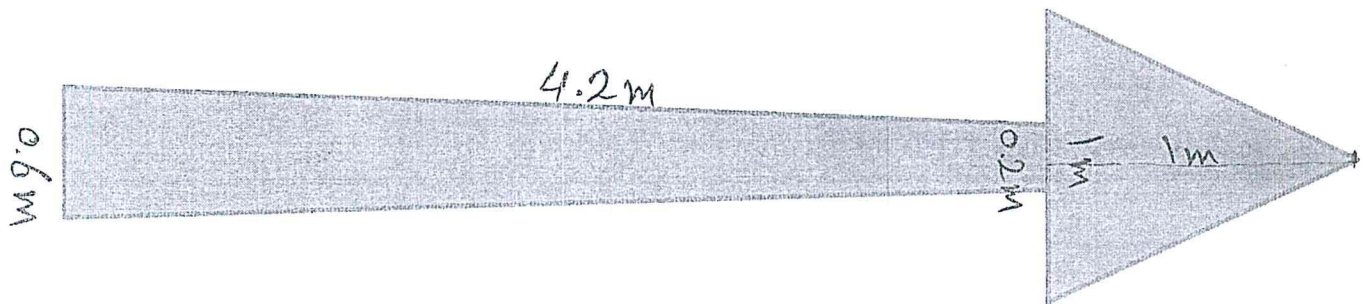

حصر أعمال التخطيط من المنفذ حتى كمين طابا

البيان	المسطح ب	المسطح س	عرض الخط	عدد الخطوط	نوع الخط	نوع التخطيط	طول القطاع	الى الكم	من الكم
البوابه	60.0		12		تأشير	بارد	5	0.000	0.000
عند الصينيه		14.5	0.145	1	محور	ساخن	300	0.040	0.040
عند الصينيه	14.4				عدد ٤ سهم	بارد		0.040	0.040
عند الصينيه	14.4				عدد ٤ سهم	بارد		0.100	0.100
		16.0	0.145	1	50/50	ساخن	110	0.190	0.080
تفتيش	23.8		6.8		مطب	بارد	3.5	0.300	0.300
مستشفى	23.8		6.8		مطب	بارد	3.5	0.365	0.365
مستشفى	4.4				عدد ٢ سهم	بارد	2.2	0.365	0.365
سوق طابا	24.2		6.9		مطب	بارد	3.5	0.723	0.723
سوق طابا	15.4		8.1		مطب	بارد	1.9	0.765	0.765
الجوازات	32.2		8.7		مطب	بارد	3.7	0.880	0.880
		116.2	0.144	2	محور	ساخن	1210	1.210	0.000
		711.5	0.147	4	مستقر جنب	ساخن	1210	1.210	0.000
نوزة العروسة	47.3		21	1	نوزة	بارد	4.5	1.210	1.210
قبل وبعد العروسة	13.6				عدد ١ سهم	بارد	2.2	1.210	1.210
بعد العروسة	33.6		8.4		مطب	بارد	4	1.210	1.210
		18.1	0.146	1	50/50	ساخن	248	1.210	1.210
		391.3	0.147	2	مستقر جنب	ساخن	1331	2.541	1.210
		190.3	0.143	1	مستقر سنتر	ساخن	1331	2.541	1.210
المخبرات	29.8		12.4		مطب	بارد	2.4	1.720	1.720
المخبرات	26.4		11		مطب	بارد	2.4	1.762	1.762
		391.6	0.147	4	مستقر جنب	ساخن	666	3.207	2.541
		62.6	0.141	2	محور	ساخن	666	3.207	2.541
			0.15	2	مستقر	بارد	666	3.207	2.541
ازالة اصفر	199.8				مطب	بارد	4.4	5.925	5.925
صلاح الدين	38.3		8.7		مطب	بارد	4.4	5.925	5.925
صلاح الدين	35.3		8.4		مطب	بارد	4.2	6.359	6.359
		1727.0	0.147	2	مستقر جنب	ساخن	5874	9.081	3.207
		59.1	0.141	1	محور	ساخن	1258	9.081	3.207
		684.3	0.146	1	مستقر سنتر	ساخن	4687	9.081	3.207
القرية البدويه	20.7		7.4	1	مطب	بارد	2.8	8.252	8.252
القرية البدويه	18.5		7.4	1	مطب	بارد	2.5	8.356	8.356
كمين طابا	45.0		10	1	مطب	بارد	4.5	9.152	9.152
كمين طابا	21.3		8.5	1	مطب	بارد	2.5	9.152	9.152
كمين طابا	50.0		11.1	1	مطب	بارد	4.5	9.152	9.152
كمين طابا	39.2		11.2	1	مطب	بارد	3.5	9.152	9.152
كمين طابا	38.9		11.1	1	مطب	بارد	3.5	9.152	9.152
كمين طابا	15.6		5.2	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	15.9		5.3	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	35.5		7.1	1	مطب	بارد	5	9.152	9.152
كمين طابا	28.8		9.6	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	29.4		9.8	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	29.1		9.7	1	مطب	بارد	3	9.152	9.152
كمين طابا	103.2		0.15	1	مستقر	بارد	688	9.152	9.152
	1136.3	4382.4			الاجمالي				

مضى
عبد الوهاب

مضى
عبد الوهاب

البيان	المسطح ب	المسطح س	عرض الخط	عدد الخطوط	نوع الخط	نوع التخطيط	طول القطاع	الى الكم	من الكم
وادي	81.0	32.2	0.145	1	مستقر جنب	ساخن	222	9.303	9.081
			0.15	3	محور	بارد	180	9.483	9.303
		139.0	0.145	1	مستقر جنب	ساخن	2875	18.854	9.081
		2873.3	0.147	2	مستقر جنب	ساخن	9773	18.854	9.081
		1007.1	0.146	1	مستقر جنب	ساخن	6898	18.854	9.081
		79.8	0.143	1	مستقر جنب اضافي	ساخن	558	18.854	9.081
طابا هاتيس	15.3		7.3	1	مطبخ	بارد	2.1	18.854	18.854
طابا هاتيس	28.4		8.6	1	مطبخ	بارد	3.3	18.854	18.854
طابا هاتيس	20.4		7.3	1	مطبخ	بارد	2.8	18.854	18.854
		29.9	0.142	1	محور	ساخن	632	23.215	18.854
		1282.1	0.147	2	مستقر جنب	ساخن	4361	23.215	18.854
		544.6	0.146	1	مستقر جنب	ساخن	3730	23.215	18.854
وادي	109.4		0.15	3	مستقر	بارد	243	23.458	23.215
		30.2	0.135	1	محور	ساخن	672	24.130	23.458
		279.0	0.138	2	مستقر جنب	ساخن	1011	24.469	23.458
		45.4	0.134	1	مستقر جنب	ساخن	339	24.469	24.130
وادي	99.0		0.15	3	مستقر	بارد	220	24.689	24.469
		52.3	0.138	1	محور	ساخن	1136	35.676	24.689
		3230.2	0.147	2	مستقر جنب	ساخن	10987	35.676	24.689
		1428.4	0.145	1	مستقر جنب	ساخن	9851	35.676	24.689
الاستعاف	33.8		7.5		مطبخ	بارد	4.5	35.676	35.676
		33.8			مطبخ	بارد	4.5	35.786	35.786
		108.4	0.143	1	محور	ساخن	2275	57.418	35.676
		6392.1	0.147	2	مستقر جنب	ساخن	21742	57.418	35.676
		2822.7	0.145	1	مستقر جنب	ساخن	19467	57.418	35.676
كمين الدين	42		10.5	1	مطبخ	بارد	4	57.418	57.418
كمين الدين	42		10.5	1	مطبخ	بارد	4	57.714	57.714
كمين الدين	42		10.5	1	مطبخ	بارد	4	57.800	57.800
كمين الدين	47.25		10.5	1	مطبخ	بارد	4.5	57.831	57.831
كمين الدين	34.65		7.7	1	مطبخ	بارد	4.5	57.896	57.896
كمين الدين	23.56		7.6	1	مطبخ	بارد	3.1	58.024	58.024
		28.8	0.131	1	محور	ساخن	659	72.639	57.418
		4475.0	0.147	2	مستقر جنب	ساخن	15221	72.639	57.418
		2126.1	0.146	1	مستقر جنب	ساخن	14562	72.639	57.418
وادي ٣ قرابين	19.71		7.3	1	مطبخ	بارد	2.7	61.892	61.892
وادي ٣ قرابين	19.71		7.3	1	مطبخ	بارد	2.7	62.063	62.063
مدخل نوبيع	76		38	1	نور	بارد	4	63.110	63.110
مدخل نوبيع	13.2		6		عداد ١٦ سهم	بارد	2.2	63.110	63.110
بنزلة مصر	29.2		7.3	1	مطبخ	بارد	4	64.658	64.658
الجامع	44.4		11.1	1	مطبخ	بارد	4	65.490	65.490
نوبيع ut ¹	154		44	1	توشير	بارد	3.5	63.578	63.578
نوبيع ut ²	81.2		23.2	1	توشير	بارد	3.5	66.557	66.557
وادي وقير	61.2		8.5	2	مطبخ	بارد	3.6	67.487	67.487
وادي وقير	8.8		4		سهم 4	بارد	2.2		
وادي وقير	213.6		0.15	4	مستقر	بارد	356	67.961	67.605
وادي وقير	53.4		0.15	1	50/50	بارد	356	67.961	67.605
وادي وقير	71.2		0.15	4	محور	بارد	356	67.961	67.605
وادي وقير	13.2		6		6 سهم	بارد	2.2	67.961	67.605
وادي وقير	8.8		4		١٦ سهم	بارد	2.2	67.961	67.961
وادي وقير	38.25		8.5	1	مطبخ	بارد	4.5	67.961	67.961
وادي وقير	30.6		8.5	1	مطبخ	بارد	3.6	67.961	67.961
بنزلة وطنية	48.15		10.7	1	مطبخ	بارد	4.5	70.870	70.870
	35.2				١6 سهم	بارد	2.2	70.870	70.870
اتجاه ذهب نوبيع	51.3		11.4	1	مطبخ	بارد	4.5	71.137	71.137
ut		57.6	0.144	1	50/50	ساخن	800	72.639	71.137
القرية		36.5	0.146	1	مستقر	ساخن	250	72.639	72.639
مدخل نوبيع	200.0		40	1	نور	بارد	10	72.639	72.639
	1923.6	27100.7			الاجمالي				

11.1.1

11.1.1
