

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص ختامي رقم (٢).

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية) بالامر المباشر

تنفيذ: شركة مصرية للمستلزمات الطرق

بإجمالي مبلغ: ٣٩٢٠١٠٥,٠٠ جنيها

(فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة جنيهاً مصرية لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٨ / ٤ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ ختامي.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- مقايضة ختامية .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- محضر استلام الابتدائي .
- محضر التقييم .



مهندس /



ملاحظة: الكتب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	مجموعه	قرش
		١٠٥٠٧٧	
	الجملة		



تَقِيَّةُ الْأَمَلِ

Handwritten signature: *[Signature]*

(بسم الله الرحمن الرحيم) الكاتبة المنوط

المختتم ذو التاريخ

رئيس الجامعة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الجحوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القسمة مرتبطة بها علمي الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

جاری _____
الایرادات _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الحقبة ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد، في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شهادة

- تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري
بخصوص عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية) بالامر المباشر
التي قامت بتنفيذها : شركة مصرية للمستلزمات الطرق
١. تم إجراء الاختبارات العملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط
والمواصفات المحددة بهذا الشأن .
٢. تم نهو جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١ .
٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و أية خصومات أخرى مستحقة .
٤. المهندسين و الفنيون متواجدون بسلوك جيد.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً فى : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

بخصوص عملية: اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق
نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية)
بالامر المباشر
تنفيذ: شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مذكرة إيضاحية

اسم العملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية)
بالامر المباشر

- اشراف :- المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٩٠٥٠ جنيها

مدة تنفيذ العملية : ١ أشهر

تاريخ البدء:- ٢٠٢٤/٠٨/١٥

تاريخ النهو التعاقدى:- ٢٠٢٤/٠٩/١٥

تاريخ النهو الفعلي :- ٢٠٢٤/٠٩/٠١.

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٣٩٢٠١٠٥ جنيها مصري لانتهاء الاعمال بنسبة
اقل من العقد ٢١,٥٩ % بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في: / / ٢٠٢٤

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية



احمد الطحان

مهندس /

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)

اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية) بالامر المباشر
مقاييسه ختاميه



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الكمية	الجملة	
		قرش	جنيه		قرش	جنيه
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبويا المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٥٠	٧١٣٨	٠	٣٢١٢١٠٠
٢	اعمال تنفيذ تخطيط و تهشير نوز بالبويا المرورية البيضاء العاكسه علي البارد الصنف رقم ١ سريع الجفاف طبقا للشروط و المواصفات.	٠	١٩٠	٧٣,٥	٠	٦٢١٩٦٥,٠
٣	توريد و تركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة ٥ مجموعات كل مجموعة ٥ خطوط علي ان يكون الخط ٢٠ سم و سمك ٨ مم و بعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق و ذلك وفقا للشروط و المواصفات	٠	٢٤٠	٨,٥	٠	٨٦٠٤٠,٠٠
٤	بالعدد توريد و تركيب عواكس أرضية (عين القط) من مادة الاكليرك بخابور و المضاف عليها مادة (U.V.S) سح العاكس مقاس ١٠*١٠ و الخابور بطول ٥ سم و قطره عند القاعده ١٧ مم و قطره عند النهايه ١٥ مم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل راسي (٦طن) دون كسر او تغير في الشكل طبقا لاختبار القياسي و حمل ادني (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠كجم) مزود بشريحتين عدسات بلورية ٣١ عدسة علي شكل مستطيل ١٥*٧٥ مم من اتجاه واحد فقط و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات و الرسومات التفصيلية المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٩	٠	٠	٠
الاجمالي		٠	٠	٠	٠	٣٩٢٠١٠٥



مدير عام المشروعات

م / محمد شحات

مدير المشروع

م / اسامه عادل عز الدين

مهندس العملية

م /

**عملية : اعمال تأمين سلامة المرور على طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية) بإدارة الجاشر
إيالك : الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ : شركة مصرية للمستزجات الطرق
بيان كميات العصر الختامي**

م	بيان الاعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الختامية	الفرق بين الكمية الختامية و كمية التعاقد	نسبة الزيادة او النقص	ملاحظات
١	بالممر المسطح اعمال تخطيط باليوبه المرورية البيضاء الساخنة بنظام البق بسبك لا يقل عن ٢,٥ سم يعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٧٣٤٩	٧١٣٨,٠	٢١١,٠-	% ٢,٩-	طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة
٢	اعمال تنفيذ تخطيط و تهيئ نوز باليوبه المرورية البيضاء الساخنة على البراد الصنف رقم ١ سريع الجفاف طبقا للشروط و المواصفات.	م ^٢	٦٠٠٠	٣٧٧٣,٥٠	٢٧٢٦,٥-	% ٤٥,٤-	طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة
٣	توريد و تركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة ه مجموعات ك مجموعة ه خطوط على ان يكون الخط ٢٠ سم و سمك ٨ مم و يعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق و ذلك وفقا للشروط و المواصفات	م ^٢	١٠٠٠	٣٥٨,٥٠	٦٤١,٥-	% ٦٤,٢-	طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة
٤	بالعقد توريد و تركيب عواكس أرضية (عين القط) من مادة الاكبريك باخاوير و المضاف عليها مادة (U.V.S) سح العاكس مقاس ١٠*١٠ و الخاوير بطول ٥ سم و قطر ٥ مم و القاعد ١٧ مم و قطر ٥ مم و التجهيز ١٥ مم و سطح العاكس مستوي يكمل حمل راسي (٦طن) دون كسر او تغير في الشكل طبقا لاختبار القياسي و حمل اذني (قصر) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحتين عدسات بلورية ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥*٧٥ مم من الجاه واحد فقط و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٨٠٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠-	% ١٠٠,٠-	طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



المنطقة الحادية / عشر جنوب سيناء

عملية اعمال تامين وسلامه مرور علي طريق طابا نوبيع

تنفيذ شركه مصريه لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م٢	٣٦١٣٨
٢	اعمال تهشير بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

مهندس الشركة : ايمن منصور ابراهيم

الاسم /
التوقيع /

الاسم / ايمن منصور ابراهيم
مهندس شركة
سنة التوقيع / ٢٠١٨
٥٠٧٢٠٤٣٠
٢٠١٨

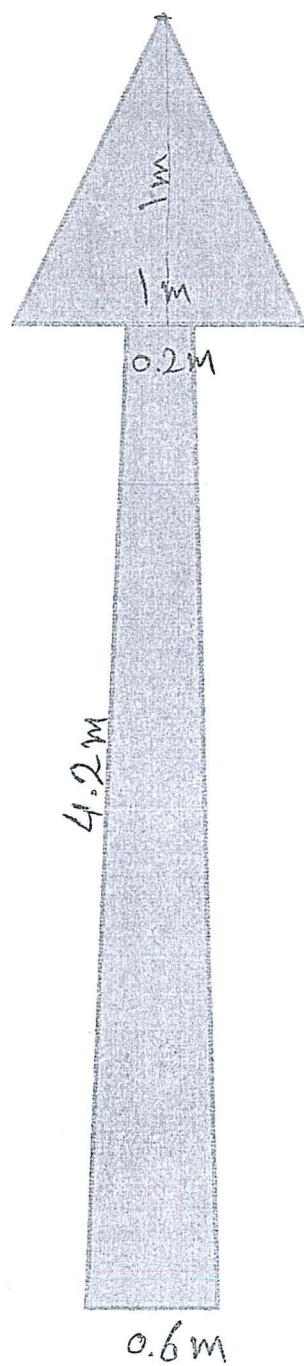
حصر اعمال التخطيط من المنفذ حتي كمين طابا

من الكم	الى الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
0.000	0.000	5	بارد	تهشير		12		60.0	البوابه
0.040	0.040	300	ساخن	محور	1	0.145	14.5		
0.040	0.040		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.100	0.100		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.080	0.190	110	ساخن	50/50	1	0.145	16.0		
0.300	0.300	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	تفتيش
0.365	0.365	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	مستشفى
0.365	0.365	2.2	بارد	عدد ٢ سهم				4.4	مستشفى
0.723	0.723	3.5	بارد	مطب		6.9		24.2	سوق طابا
0.765	0.765	1.9	بارد	مطب		8.1		15.4	سوق طابا
0.880	0.880	3.7	بارد	مطب		8.7		32.2	الجوازات
0.000	1.210	1210	ساخن	محور	2	0.144	116.2		
0.000	1.210	1210	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	711.5		
1.210	1.210	4.5	بارد	نوزه	1	21		47.3	نوزه العروسه
1.210	1.210	2.2	بارد	عدد ٦ سهم				13.6	قبل وبعد العروسه
1.210	1.210	4	بارد	مطب		8.4		33.6	بعد العروسه
1.210	1.210	248	ساخن	50/50	1	0.146	18.1		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	391.3		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر سنتر	1	0.143	190.3		
1.720	1.720	2.2	بارد	عدد ٤ سهم				8.8	المخبريات
1.720	1.720	2.4	بارد	مطب		12.4		29.8	المخبريات
1.762	1.762	2.4	بارد	مطب		11		26.4	المخبريات
2.541	3.207	666	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	391.6		
2.541	3.207	666	ساخن	محور	2	0.141	62.6		
2.541	3.207	666	بارد	مستمر	2	0.15		199.8	ازاله اصفر
5.925	5.925	4.4	بارد	مطب		8.7		38.3	صلاح الدين
6.359	6.359	4.2	بارد	مطب		8.4		35.3	صلاح الدين
3.207	9.081	5874	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1727.0		
3.207	9.081	1258	ساخن	محور	1	0.141	59.1		
3.207	9.081	4687	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	684.3		
8.252	8.252	2.8	بارد	مطب	1	7.4		20.7	القرية البدويه
8.356	8.356	2.5	بارد	مطب	1	7.4		18.5	القرية البدويه
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	10		45.0	كمين طابا
9.152	9.152	2.5	بارد	مطب	1	8.5		21.3	كمين طابا
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	11.1		50.0	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.2		39.2	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.1		38.9	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.2		15.6	كنين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.3		15.9	كنين طابا
9.152	9.152	5	بارد	مطب	1	7.1		35.5	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.6		28.8	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.8		29.4	كنين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.7		29.1	كمين طابا
9.152	9.152	688	بارد	مستمر	1	0.15		103.2	كمين طابا
		الاجمالي							
		1136.3	4382.4						

محرر
طابا

محرر
طابا

تفصيلي مساحة السهم



القطاع كمين طابا - طابا هايتس - نوبيع حتي بداية الازدواج

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
9.081	9.303	222	ساخن	مستمر جنب	1	0.145	32.2		
9.303	9.483	180	بارد	مستمر	3	0.15		81.0	وادي
9.081	18.854	2875	ساخن	محور	1	0.145	139.0		
9.081	18.854	9773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	2873.3		
9.081	18.854	6898	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	1007.1		
9.081	18.854	558	ساخن	مستمر سنتر اضافي	1	0.143	79.8		
18.854	18.854	2.1	بارد	مطب	1	7.3		15.3	طابا هايتس
18.854	18.854	3.3	بارد	مطب	1	8.6		28.4	طابا هايتس
18.854	18.854	2.8	بارد	مطب	1	7.3		20.4	طابا هايتس
18.854	23.215	632	ساخن	محور	1	0.142	29.9		
18.854	23.215	4361	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1282.1		
18.854	23.215	3730	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	544.6		
23.215	23.458	243	بارد	مستمر	3	0.15		109.4	وادي
23.458	24.130	672	ساخن	محور	1	0.135	30.2		
23.458	24.469	1011	ساخن	مستمر جنب	2	0.138	279.0		
24.130	24.469	339	ساخن	مستمر سنتر	1	0.134	45.4		
24.469	24.689	220	بارد	مستمر	3	0.15		99.0	وادي
24.689	35.676	1136	ساخن	محور	1	0.138	52.3		
24.689	35.676	10987	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	3230.2		
24.689	35.676	9851	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	1428.4		
35.676	35.676	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.786	35.786	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	57.418	2275	ساخن	محور	1	0.143	108.4		
35.676	57.418	21742	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	6392.1		
35.676	57.418	19467	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	2822.7		
57.418	57.418	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.714	57.714	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.800	57.800	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.831	57.831	4.5	بارد	مطب	1	10.5		47.25	كمين البدن
57.896	57.896	4.5	بارد	مطب	1	7.7		34.65	كمين البدن
58.024	58.024	3.1	بارد	مطب	1	7.6		23.56	كمين البدن
57.418	72.639	659	ساخن	محور	1	0.131	28.8		
57.418	72.639	15221	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	4475.0		
57.418	72.639	14562	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	2126.1		
61.892	61.892	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
62.063	62.063	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	4	بارد	نوز	1	38		76	مدخل نوبيع
63.110	63.110	2.2	بارد	عدد ٦ سهم		6		13.2	مدخل نوبيع
64.658	64.658	4	بارد	مطب	1	7.3		29.2	بنزينة مصر
65.490	65.490	4	بارد	مطب	1	11.1		44.4	الجامع
63.578	63.578	3.5	بارد	تهشير	1	44		154	نوبيع ١ ut1
66.557	66.557	3.5	بارد	تهشير	1	23.2		81.2	نوبيع ٢ ut2
67.487	67.487	3.6	بارد	مطب	2	8.5		61.2	وادي وتير
		2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	مستمر	4	0.15		213.6	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	50/50	1	0.15		53.4	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	محور	4	0.15		71.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	6 سهم		6		13.2	وادي وتير
67.961	67.961	2.2	بارد	4 سهم		4		8.8	وادي وتير
67.961	67.961	4.5	بارد	مطب	1	8.5		38.25	وادي وتير
67.961	67.961	3.6	بارد	مطب	1	8.5		30.6	وادي وتير
70.870	70.870	4.5	بارد	مطب	1	10.7		48.15	بنزينة وطنية
70.870	70.870	2.2	بارد	16 سهم				35.2	
71.137	71.137	4.5	بارد	مطب	1	11.4		51.3	اتجاه ذهب نوبيع
71.137	72.639	800	ساخن	50/50	1	0.144	57.6		ut
72.639	72.639	250	ساخن	مستمر	1	0.146	36.5		النوزة
72.639	72.639	10	بارد	نوز	1	40		200.0	مدخل نوبيع
							27100.7	1923.6	الاجمالي

مدير المنطقة
١٥

مدير المنطقة
١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٦)

تنفيذ : الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعلية

- يوجد بكراسة الشروط (توريد بوية مرورية على البارد محاور للطرق بيضاء اللون بقيمة (٣٥ ألف جنية) (خمسة وثلاثون ألف جنية) الى مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها ٧٠ ألف جنية (سبعون ألف جنية).

بأهل التفخل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد: ()



مهندس /

أحمد الطر

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (١٠٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤ بمبلغ ٤,٩٩٩,٠٥٠ جنيه (فقط وقدرة أربعة مليون وتسعمائة تسعة وتسعون ألف وخمسون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية) " (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) بالأمر المباشر
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى ((المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف


رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

- ٤ - يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة فى التشغيل تحت اشراف المشرفة ولا يتم البدء فى سحب العينات للاختبار.
- ٥ - يلتزم المقاول بتوريد بوية مرورية على البارد محاور للطرق صفراء اللون بقيمة (٣٥ الف جنية) (خمسون وثلاثون الف جنية) الى مصنع علامات الهيئة وفى حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها الف جنية (سبعون الف جنية).

بند (٤١) : الضمان : يضاف الاتى :-

١. على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لانتهاء جميع اجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ ورود قرار التقييم .


مديرية مستلزمات الطرق
مساهمة مصرية
م. ق. ٧٥٨٥ ض. ٤٢٠ - ٧٤ - ٥
ب. ق. ١٨٧ - ١٥٠ - ٣٠٥

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية اعمال تامين سلامة المرور على طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (مرحلة ثانية)


تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٣ وبناءا على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ بخصوص الاستلام الابتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

- المهندس / محمود حمدي محمد الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
 - المهندس / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
 - المهندس / محمد حسني ادارة المعامل المركزية - عضوا
 - المهندس / اسامة عادل عز الدين المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) - عضوا
 - المهندس / هشام على العجرودى شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا
- وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها بصريا تبين الاتي :-
- ١- تخطيط بالبيويات المرورية العاكسة البيضاء على الساخن (اكسترودر) سمك ٢,٥ مم:-
الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية واتساخ بالخطوط باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ٥٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة خمسة الاف جنية لا غير).
 - ٢- اعمال تخطيط وتهشير النوز بالبيوية على البارد:-
الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ٢٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة الفان جنية لا غير).
الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.
 - ٣- توريد وتركيب شرائح صوتية (مهدئات سرعة):-
الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ١٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة الف جنية لا غير).
اجمالى الخصم = ٥٠٠٠ + ٢٠٠٠ + ١٠٠٠ = ٨٠٠٠ جنية (فقط وقدرة ثمانية الاف جنية لا غير).
الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.
- وعليه ترى اللجنة انة لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي للاعمال عالية ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة هو تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ هو بداية فترة الضمان مع خصم المبلغ عالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة.

التوقيعات

٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

تنفيذ شركة مصرية للمستلزمات الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠١
مستخلص رقم (٢) ختامي
عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نويبع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية) بالامر المباشر
العقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٠٦) في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنه بنظام البقي بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	م٣	٧٠٠٠	١٣٨,٥٠	٧١٣٨	ختامي	٣٢١٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٢١٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٦) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٧) بوليصة التأمين سارية حتي ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤ . (٨) يراعي الخصومات الواردة بمحضر الاستلام و التقييم الابتدائي.
٢	اعمال تنفيذ تخطيط و تهشير نوز بالبوية المرورية البيضاء العاكس علي البارد الصنف رقم ١ سريع الجفاف طبقا للشروط و المواصفات.	١٩٠	م٣	٣٢٠٠,٠٠	٧٣,٥٠	٣٢٧٣,٥٠	ختامي	٦٢١٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢١٩٦٥,٠٠	
٣	توريد و تركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة ٥ مجموعات كل مجموعة ٥ خطوط علي ان يكون الخط ٢٠ سم و سمك ٨ مم و بعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق و ذلك وفقا للشروط و المواصفات	٢٤٠	م.م	٣٥٠	٨,٥٠	٣٥٨,٥	ختامي	٨٦٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٠٤٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد و تركيب عواكس أرضية (عين القط) من مادة الاكليرك بخابور و المضاف عليها مادة (U.V.S) سح العاكس مقاس ١٠*١٠ و الخابور بطول ٥ سم و قطره عند القاعده ١٧ مم و قطره عند النهاية ١٥ مم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل راسي (٦طن) دون كسر او تغير في الشكل طبقا لاختبار القياسي و حمل ادني (٦طن) للخابور لا يقل عن (٦٠٠كجم) مزود بشريحتين عدسات بلورية ٣١ عدسة علي شكل مستطيل ١٥*٧٥ مم من اتجاه واحد فقط و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٣٩	م.م	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة جنيهاً مصرية لا غير											٣٩٢٠١٠٥,٠٠

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع

اقر بصحة ذلك/ المفاوض
م/ هشام علي المجرودي
التوقيع



م /

روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ٩ /
