

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص ختامي رقم (٢).

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نوبيع / شرم الشيخ بالامر المباشر

تنفيذ: شركة مصرية للمستلزمات الطرق

بإجمالي مبلغ: ٤٥٦٧٥٠٠,٠٠ جنيها

(فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ .

**برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.**

تحريرا في: ٨ / ٤ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ ختامي.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- مقايضة ختامية .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- محضر استلام الابتدائي .
- محضر التقييم .



مهندس /

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____



شهادة

- تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري
- بخصوص عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر
- التي قامت بتنفيذها : شركة مصرية للمستلزمات الطرق
١. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لينود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن .
 ٢. تم نهو جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١ .
 ٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و أية خصومات أخرى مستحقة .
 ٤. المهندسين و الفنيون متواجدون بسلوك جيد.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٩ / ٨



مهندس /

بخصوص عملية: اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق
طابا/ نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر
تنفيذ: شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مذكرة إيضاحية

اسم العملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر

- اشراف :- المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٥٠٠٠٠٠ جنيها

مدة تنفيذ العملية : ١ أشهر

تاريخ البدء:- ٢٠٢٤/٠٨/١٥

تاريخ النھو التعاقدى:- ٢٠٢٤/٠٩/١٥

تاريخ النھو الفعلي :- ٢٠٢٤/٠٩/٠١.

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٤٥٦٧٥٠٠ جنيها مصري لانتهاء الاعمال بنسبة
اقل من العقد ٧,٧٣ % بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في: / / ٢٠٢٢

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



مهندس /



تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٤ / ٨

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر
مقايسة ختامييه



رقم البند	بيان الأعمال		الفئة		الكمية	الجملة	
			قرش	جنيه		قرش	جنيه
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبويه المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .		٠	٤٥٠	١٠١٥٠	٠	٤٥٦٧٥٠٠
الاجمالي						٠	٤٥٦٧٥٠٠

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / محمد شحات

مدير المشروع

م / اسامه عادل عز الدين

مهندس العملية

م /

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالإمر المباشر
الملك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ : شركة مصرية للمستلزمات الطرق

بيان كميات الحصر الختامي

م	بيان الاعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الختامية	الفرق بين الكمية الختامية و كمية التعاقد	نسبة الزيادة او النقص	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط باليوبه المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ سم يعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١١٠٠٠	١٠١٥٠,٠	٨٥٠,٠-	%٧,٧-	طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

٥٠٧٤ - ٤٢٠ - ٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٥ - ١٥٠ - ١٨٧٠ - ٠٠٠



محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية اعمال تامين سلامة المرور على طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٤ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٢٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ بخصوص الاستلام الابتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

- المهندس / محمود حمدي محمد الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
 - المهندس / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
 - المهندس / محمد حسنى ادارة المعامل المركزية - عضوا
 - المهندس / اسامة عادل عز الدين المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) - عضوا
 - المهندس / هشام على العجرودى شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا
- وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها بصريا تبين الاتى :-

١- تخطيط البوابات المرورية العاكسة البيضاء على الساخن (اكسترودر) سمك ٢,٥ مم:-

- الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية واتساخ بالخطوط باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ٥٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة خمسة الاف جنية لا غير).
- اجمالى الخصم = ٥٠٠٠ جنية (فقط وقدرة خمسة الاف جنية لا غير).
- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.

وعليه ترى اللجنة انة لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي للاعمال عالية ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة هو تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ هو بداية فترة الضمان مع خصم المبلغ عالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة.

التوقيعات

٥- 

٤- 

٣- 

٢- 

١- 



المنطقة الحادية / عشر جنوب سيناء

عملية اعمال تامين وسلامه مرور علي طريق طابا نوبيع

تنفيذ شركه مصريه لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م٢	٣٦١٣٨ + ١٥٠ = ٣٦٢٨٨
٢	اعمال تهشير بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

مهندس الشركة : ايمن منصور ابراهيم

الاسم /
التوقيع /

الاسم / ايمن منصور ابراهيم
مهندس شركة
توقيع /
٥٠٧٢-٤٣٠
١٨٧

القطاع نوبيع - ذهب (عملية تطوير طريق ذهب نوبيع بطول ٢٧ كم)

البيان	المسطح ب	المسطح س	عرض الخط	عدد الخطوط	نوع الخط	نوع التخطيط	طول القطاع	الى الكم	من الكم
اتجاه ذهب نوبيع		233.8	0.146	2	محور	ساخن	2402	74.224	71.822
اتجاه ذهب نوبيع		696.6	0.145	2	مستمر جنب	ساخن	2402	74.224	71.822
قبل الله اكبر اتجاه نوبيع	25.2		7.2	1	مطب	بارد	3.5	75.217	75.217
قبل الله اكبر اتجاه نوبيع			0.2	15	15 شريحة صوتي	صوتي		75.315	75.315
اتجاه نوبيع ذهب		228.8	0.142	1	محور	ساخن	4834	77.473	72.639
اتجاه نوبيع ذهب		1421.2	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	4834	77.473	72.639
اتجاه ذهب نوبيع	45.5		10.1	1	مطب	بارد	4.5	72.857	72.857
اتجاه ذهب نوبيع			0.2	15	15 شريحة صوتي	صوتي		72.977	72.977
اتجاه نوبيع ذهب		67.3	0.143	1	محور	ساخن	1411	83.185	81.774
اتجاه نوبيع ذهب		406.4	0.144	2	مستمر جنب	ساخن	1411	83.185	81.774
قبل الغاز اتجاه نوبيع			0.2	15	15 شريحة صوتي	صوتي		82.291	82.291
امام الغاز اتجاه نوبيع	23.8		6.8	1	مطب	بارد	3.5	82.291	82.291
اتجاه ذهب	29.9		6.8	1	مطب	بارد	4.4	84.763	84.763
اتجاه نوبيع ذهب		36.3	0.141	1	محور	ساخن	773	85.758	84.985
اتجاه نوبيع ذهب		227.3	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	773	85.758	84.985
مدخل ابو جالوم		100.4	0.146	2	مستمر جنب	ساخن	344	85.838	85.838
مخرج ابو جالوم		46.4	0.145	2	مستمر جنب	ساخن	160	85.838	85.838
ابو جالوم		31.8	0.143	1	50/50	ساخن	445	85.838	85.838
اتجاه ذهب نوبيع		361.1	0.146	1	محور	ساخن	2473	86.624	84.151
اتجاه ذهب نوبيع		727.1	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	2473	86.624	84.151
عند ut الصاعده		70.5	0.145	1	مستمر	ساخن	486	86.199	86.199
نهاية الازدواج	13.2				اسهم 6	بارد	2.2	86.624	86.624
	76.0				نوزة	بارد	4	86.624	86.624
	213.6	4654.9			الاجمالي				

Handwritten signature and text in the top left corner.

Handwritten signature and text in the bottom left corner.

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
9.081	9.303	222	ساخن	مستمر جنب	1	0.145	32.2		
9.303	9.483	180	بارد	مستمر	3	0.15		81.0	وادي
9.081	18.854	2875	ساخن	محور	1	0.145	139.0		
9.081	18.854	9773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	2873.3		
9.081	18.854	6898	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	1007.1		
9.081	18.854	558	ساخن	مستمر سنتر اضافي	1	0.143	79.8		
18.854	18.854	2.1	بارد	مطب	1	7.3		15.3	طابا هاييتس
18.854	18.854	3.3	بارد	مطب	1	8.6		28.4	طابا هاييتس
18.854	18.854	2.8	بارد	مطب	1	7.3		20.4	طابا هاييتس
18.854	23.215	632	ساخن	محور	1	0.142	29.9		
18.854	23.215	4361	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1282.1		
18.854	23.215	3730	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	544.6		
23.215	23.458	243	بارد	مستمر	3	0.15		109.4	وادي
23.458	24.130	672	ساخن	محور	1	0.135	30.2		
23.458	24.469	1011	ساخن	مستمر جنب	2	0.138	279.0		
24.130	24.469	339	ساخن	مستمر سنتر	1	0.134	45.4		
24.469	24.689	220	بارد	مستمر	3	0.15		99.0	وادي
24.689	35.676	1136	ساخن	محور	1	0.138	52.3		
24.689	35.676	10987	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	3230.2		
24.689	35.676	9851	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	1428.4		
35.676	35.676	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.786	35.786	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	57.418	2275	ساخن	محور	1	0.143	108.4		
35.676	57.418	21742	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	6392.1		
35.676	57.418	19467	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	2822.7		
57.418	57.418	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.714	57.714	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.800	57.800	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.831	57.831	4.5	بارد	مطب	1	10.5		47.25	كمين البدن
57.896	57.896	4.5	بارد	مطب	1	7.7		34.65	كمين البدن
58.024	58.024	3.1	بارد	مطب	1	7.6		23.56	كمين البدن
57.418	72.639	659	ساخن	محور	1	0.131	28.8		
57.418	72.639	15221	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	4475.0		
57.418	72.639	14562	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	2126.1		
61.892	61.892	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
62.063	62.063	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	4	بارد	نوز	1	38		76	مدخل نوبيع
63.110	63.110	2.2	بارد	عدد ٦ سهم		6		13.2	مدخل نوبيع
64.658	64.658	4	بارد	مطب	1	7.3		29.2	بنزينة مصر
65.490	65.490	4	بارد	مطب	1	11.1		44.4	الجامع
63.578	63.578	3.5	بارد	تهشير	1	44		154	نوبيع ١ ut
66.557	66.557	3.5	بارد	تهشير	1	23.2		81.2	نوبيع ٢ ut
67.487	67.487	3.6	بارد	مطب	2	8.5		61.2	وادي وتير
		2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	مستمر	4	0.15		213.6	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	50/50	1	0.15		53.4	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	محور	4	0.15		71.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	6 سهم		6		13.2	وادي وتير
67.961	67.961	2.2	بارد	4 سهم		4		8.8	وادي وتير
67.961	67.961	4.5	بارد	مطب	1	8.5		38.25	وادي وتير
67.961	67.961	3.6	بارد	مطب	1	8.5		30.6	وادي وتير
70.870	70.870	4.5	بارد	مطب	1	10.7		48.15	بنزينة وطنية
70.870	70.870	2.2	بارد	16 سهم				35.2	
71.137	71.137	4.5	بارد	مطب	1	11.4		51.3	اتجاه ذهب نوبيع
71.137	72.639	800	ساخن	50/50	1	0.144	57.6		ut
72.639	72.639	250	ساخن	مستمر	1	0.146	36.5		النوز
72.639	72.639	10	بارد	نوز	1	40		200.0	مدخل نوبيع

1923.6 27100.7

الإجمالي

الدخالي تخطيط لقطاع ١٩٤٣٦

مدير المنطقة

مدير المنطقة

مدير المنطقة


حصر اعمال التخطيط من المنفذ حتي كمين طابا

من الكم	الى الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
0.000	0.000	5	بارد	تهشير		12		60.0	النوابه
0.040	0.040	300	ساخن	محور	1	0.145	14.5		
0.040	0.040		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.100	0.100		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.080	0.190	110	ساخن	50/50	1	0.145	16.0		
0.300	0.300	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	تفتيش
0.365	0.365	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	مستشفى
0.365	0.365	2.2	بارد	عدد ٢ سهم				4.4	مستشفى
0.723	0.723	3.5	بارد	مطب		6.9		24.2	شوق طابا
0.765	0.765	1.9	بارد	مطب		8.1		15.4	شوق طابا
0.880	0.880	3.7	بارد	مطب		8.7		32.2	الجوازات
0.000	1.210	1210	ساخن	محور	2	0.144	116.2		
0.000	1.210	1210	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	711.5		
1.210	1.210	4.5	بارد	نوزه	1	21		47.3	نوزه العروسه
1.210	1.210	2.2	بارد	عدد ٦ سهم				13.6	قبل وبعد العروسه
1.210	1.210	4	بارد	مطب		8.4		33.6	بعد العروسه
1.210	1.210	248	ساخن	50/50	1	0.146	18.1		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	391.3		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر سنتر	1	0.143	190.3		
1.720	1.720	2.2	بارد	عدد ٤ سهم				8.4	عند الصينيه
1.720	1.720	2.4	بارد	مطب		12.4		29.8	المخابرات
1.762	1.762	2.4	بارد	مطب		11		26.4	المخابرات
2.541	3.207	666	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	391.6		
2.541	3.207	666	ساخن	محور	2	0.141	62.6		
2.541	3.207	666	بارد	مستمر	2	0.15		199.8	ازاله اصفر
5.925	5.925	4.4	بارد	مطب		8.7		38.3	صلاح الدين
6.359	6.359	4.2	بارد	مطب		8.4		35.3	صلاح الدين
3.207	9.081	5874	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1727.0		
3.207	9.081	1258	ساخن	محور	1	0.141	59.1		
3.207	9.081	4687	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	684.3		
8.252	8.252	2.8	بارد	مطب	1	7.4		20.7	القرية البدويه
8.356	8.356	2.5	بارد	مطب	1	7.4		18.5	القرية البدويه
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	10		45.0	كمين طابا
9.152	9.152	2.5	بارد	مطب	1	8.5		21.3	كمين طابا
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	11.1		50.0	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.2		39.2	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.1		38.9	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.2		15.6	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.3		15.9	كمين طابا
9.152	9.152	5	بارد	مطب	1	7.1		35.5	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.6		28.8	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.8		29.4	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.7		29.1	كمين طابا
9.152	9.152	688	بارد	مستمر	1	0.15		103.2	كمين طابا
				الاحمال			4382.4	1136.3	

حصر اعماله
طابا

حصر اعماله
طابا

تفصيلي مساحة السهم

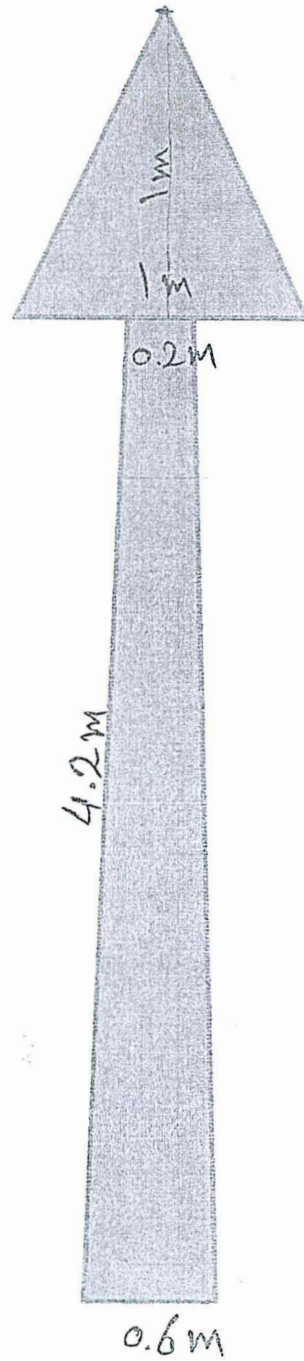

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ عقد

رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٨)

تنفيذ : الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية

- يوجد بكراسة الشروط (توريد بوية مرورية على البارد محاور للطرق بيضاء اللون بقيمة (٣٥ ألف جنية) (خمسة وثلاثون ألف جنية) الى مصنع علامات الهيئة وفى حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها ٧٠ ألف جنية (سبعون ألف جنية).

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد: ()



مهندس /

أحمد الطم

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (١٠٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤ بمبلغ ٤,٩٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة أربعة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نوبيع / شرم الشيخ بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى ((المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل وفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


التوقيع ()

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

- ٣ - على المقاول تعيين أحد الفنيين مسئولاً عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسميته من قبل المقاول خيرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة قدرها ٥٠ جنيه (خمسون جنيهاً) عن كل يوم فيه مسئول تأمين سلامة المرور بالموقع .
- ٤ - يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في التشغيل تحت اشراف المشرفة ولا يتم البدء في العمل الا بعد سحب العينات للاختبار.
- ٥ - يلتزم المقاول بتوريد بوية مرورية على البارد محاور للطرق بيضاء اللون بقيمة (٣٥ الف جنيه) (خمسة وثلاثون الف جنيه) الى مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها الف جنيه (سبعون الف جنيه).

بند (٤١) : الضمان : يضاف الاتي :-

- ١ . على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لانتهاء جميع اجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر الاجابة عن شهرين من تاريخ ورود قرار التقييم .



تنفيذ شركة مصرية للمستلزمات الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠١
مستخلص رقم (٢) ختامي
عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر
العقد رقم (٢٠٢٤ / ١٠٨ / ٢٥ / ٢٩) في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبيوية المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	م ٢	١٠٠٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٠١٥٠	ختامي	٤٥٦٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦٧٥٠٠,٠٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٦) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٧) بوليصة التأمين سارية حتي ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤ . (٨) يراعي الخصومات الواردة بمحضر الاستلام و التقييم الابتدائي.
فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير											٤٥٦٧٥٠٠,٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية
احمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع

اقر بصحة ذلك/ المفاوض
م/ هشام علي العجروني
التوقيع

روجح فوجد علي صحة
تحرير في ٨ / ٤ / ٢٠٢٥
