

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص ختامي رقم (٢).

عملية : عملية : استكمال اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

تنفيذ: شركة مصرية للمستلزمات الطرق

بإجمالي مبلغ: ٤٩٤٨٨٠٠,٠٠ جنيها

(فقط أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٢١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٨ / ٤ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ ختامي.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- مقايضة ختامية .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- محضر استلام الابتدائي .
- محضر التقييم .



مهندس /

مساحة: البحر

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيشة
		١٢/٥/٧٣ ٣٤٦٣
	الجملة	

المستقيم ذو التاريخ

(أشيد)

2.4

(بسم الله الرحمن الرحيم) الكاتب المنوط

رئيس الجامعة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ الإحصاء :

اسمیتان بنام اسرار (۱۳۵۷) / فیدائی سبب (۱۳۵۷) «ع ح» بوسم / توضیح: کتاب المنیر باب السبب /

روجم فی ————— سنة ۲۰۲

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

وكيل المبيعات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) صاحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنيوط : _____

الشكايات: _____
تحت رقم: _____
امضاء الكاتب المنوط: _____

(2)

المختتم ذو التاريخ

(٤) قيد، في سجل

شهادة

- تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري
بخصوص عملية : استكمال اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نويبع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
التي قامت بتنفيذها : شركة مصرية للمستلزمات الطرق
١. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط
والمواصفات المحددة بهذا الشأن .
٢. تم نهو جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ .
٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و أية خصومات أخرى مستحقة .
٤. المهندسين و الفنيون متواجدون بسلوك جيد.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً فى : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية



أحمد الطحان

مهندس /



بخصوص عملية: اعمال تامين سلامة المرور علي طريق
نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
بالامر المباشر
تنفيذ: شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مذكرة إيضاحية

اسم العملية : اعمال تامين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
بالامر المباشر

- اشراف :- المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٨٩٧٥٠ جنيها

مدة تنفيذ العملية : ١ أشهر

تاريخ البدء:- ٢٠٢٤/٠٧/١٥

تاريخ النهو التعاقدى:- ٢٠٢٤/٠٨/١٥

تاريخ النهو الفعلي :- ٢٠٢٤/٠٧/٢١.

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٤٩٤٨٨٠٠ جنيها مصري لانتهاء الاعمال بنسبة
اقل من العقد ٠,٨٢ % بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في: / / ٢٠٢٢

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٥/٤/٨



مهندس /

عملية : استكمال اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
مقايسة ختامية



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الكمية	الجملة	
		قرش	جنيه		قرش	جنيه
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبويه المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٥٠	١٠٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠٠
٢	نقل و تركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) و البند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير و طبقا للشروط و المواصفات	٠	٨٠٠	٥٦١	٠	٤٤٨٨٠٠
الاجمالي					٠	٤٩٤٨٨٠٠



مدير عام المشروعات

م / محمد شحات

مدير المشروع

م / اسامه عادل عز الدين

مهندس العملية

م /

عملية : استعمال اعمال سلامة المرور علي طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ : شركة مصرية للمستلزمات الطرق


بيان كميات الحصر الختامي

م	بيان الاعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الختامية	الفرق بين الكمية الختامية و كمية التعاقد	نسبة الزيادة او النقص	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط باليوبه المروية البيضاء الساخنه بنظام الذى يسمك لا يقل عن ٢,٥ سم يعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المنقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٠٥٥٥	١٠٠٠٠,٠	٥٥٥,٠٠	%٥,٣-	طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة
٢	نقل و تركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) و البند يشمل جميع الاعمال الارزمية من مسامير و طبقا للشروط و المواصفات	عدد	٣٠٠	٥٦١,٠٠	٢٦١,٠	%٨٧,٠	طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة

مهندس الهيئة



مهندسين الشركة



محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية استكمال اعمال تامين سلامة المرور على طريق نوبع / دهب بطول ٢٧ كم

(مرحلة ثالثة)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انة فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٣ وبناءا على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٢١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ بخصوص الاستلام الابتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

- المهندس / محمود حمدي محمد الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
 - المهندس / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
 - المهندس / محمد حسنى ادارة المعامل المركزية - عضوا
 - المهندس / اسامة عادل عز الدين المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) - عضوا
 - المهندس / هشام على العجرودى شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا
- وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها بصريا تبين الاتي :-

- ١- تخطيط بالبويات المرورية العاكسة البيضاء على الساخن (اكسترودر) سمك ٢,٥ مم:-
الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية واتساخ بالخطوط باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ٤٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة اربعة الاف جنية لا غير).
- ٢- اعمال نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) :-
- الاعمال مقبولة بصفة عامة
- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.
- اجمالى الخصم = ٤٠٠٠ جنية (فقط وقدرة اربعة الاف جنية لا غير).
- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.

وعليه ترى اللجنة انة لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي للاعمال عالية ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة هو تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ هو بداية فترة الضمان مع خصم المبلغ عالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة.

التوقيعات

٥- 

٤- 

٣- 

٢- 

١- 



المنطقة الحادية / عشر جنوب سيناء

عملية اعمال تامين وسلامه مرور علي طريق طابا نوبيع
تنفيذ شركه مصريه لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م٢	٣٦١٣٨
٢	اعمال تهشير بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

مهندس الشركة : ايمن منصور ابراهيم

الاسم /
التوقيع /

الاسم / ايمن منصور ابراهيم
مهندس شركة
م/ التوقيع /
٥٠٧٢-٢٣٠
٣٠٠٠-١٨٧


القطاع نوبيع - ذهب (عملية تطوير طريق نوبيع بطول ٢٧ كم)

البيان	المسطح ب	المسطح س	عرض الخط	عدد الخطوط	نوع الخط	نوع التخطيط	طول القطاع	الي الكم	من الكم
اتجاه ذهب نوبيع		233.8	0.146	2	محور	ساخن	2402	74.224	71.822
اتجاه ذهب نوبيع		696.6	0.145	2	مستمر جنب	ساخن	2402	74.224	71.822
قبل الله اكبر اتجاه نوبيع	25.2		7.2	1	مطب	بارد	3.5	75.217	75.217
قبل الله اكبر اتجاه نوبيع			0.2	15	15 شريحه صوتي	صوتي		75.315	75.315
اتجاه نوبيع ذهب		228.8	0.142	1	محور	ساخن	4834	77.473	72.639
اتجاه نوبيع ذهب		1421.2	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	4834	77.473	72.639
اتجاه ذهب نوبيع	45.5		10.1	1	مطب	بارد	4.5	72.857	72.857
اتجاه ذهب نوبيع			0.2	15	15 شريحه صوتي	صوتي		72.977	72.977
اتجاه نوبيع ذهب		67.3	0.143	1	محور	ساخن	1411	83.185	81.774
اتجاه نوبيع ذهب		406.4	0.144	2	مستمر جنب	ساخن	1411	83.185	81.774
قبل الغاز اتجاه نوبيع			0.2	15	15 شريحه صوتي	صوتي		82.291	82.291
اسام الغاز اتجاه نوبيع	23.8		6.8	1	مطب	بارد	3.5	82.291	82.291
اتجاه ذهب	29.9		6.8	1	مطب	بارد	4.4	84.763	84.763
اتجاه نوبيع ذهب		36.3	0.141	1	محور	ساخن	773	85.758	84.985
اتجاه نوبيع ذهب		227.3	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	773	85.758	84.985
مدخل ابو جالوم		100.4	0.146	2	مستمر جنب	ساخن	344	85.838	85.838
مخرج ابو جالوم		46.4	0.145	2	مستمر جنب	ساخن	160	85.838	85.838
ابو جالوم		31.8	0.143	1	50/50	ساخن	445	85.838	85.838
اتجاه ذهب نوبيع		361.1	0.146	1	محور	ساخن	2473	86.624	84.151
اتجاه ذهب نوبيع		727.1	0.147	2	مستمر جنب	ساخن	2473	86.624	84.151
عند ut الصاعده		70.5	0.145	1	مستمر	ساخن	486	86.199	86.199
نهاية الازدواج	13.2				اسهم 6	بارد	2.2	86.624	86.624
	76.0		38		نوزه	بارد	4	86.624	86.624
	213.6	4654.9							

مصدق
مصدق
هناك
هناك

مصدق
مصدق
مصدق
مصدق

تفصيلي مساحة السهم

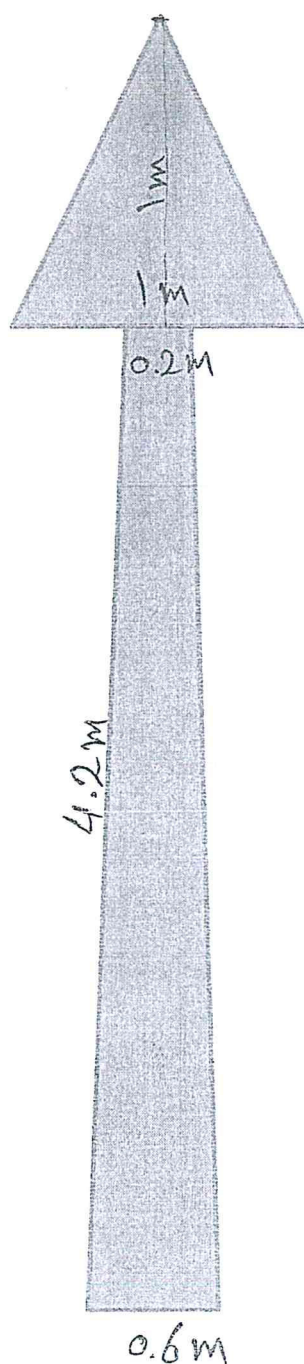

حصر اعمال التخطيط من المنفذ حتى كمين طابا

من الكم	الى الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
0.000	0.000	5	بارد	تهشير		12		60.0	البوابه
0.040	0.040	300	ساخن	محور	1	0.145	14.5		
0.040	0.040		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.100	0.100		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.080	0.190	110	ساخن	50/50	1	0.145	16.0		
0.300	0.300	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	تفتيش
0.365	0.365	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	مستشفى
0.365	0.365	2.2	بارد	عدد ٢ سهم				4.4	مستشفى
0.723	0.723	3.5	بارد	مطب		6.9		24.2	شوق طابا
0.765	0.765	1.9	بارد	مطب		8.1		15.4	شوق طابا
0.880	0.880	3.7	بارد	مطب		8.7		32.2	الجوازات
0.000	1.210	1210	ساخن	محور	2	0.144	116.2		
0.000	1.210	1210	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	711.5		
1.210	1.210	4.5	بارد	نوزه	1	21		47.3	نوزه العروسه
1.210	1.210	2.2	بارد	عدد ٦ سهم				13.6	قبل وبعد العروسه
1.210	1.210	4	بارد	مطب		8.4		33.6	بعد العروسه
1.210	1.210	248	ساخن	50/50	1	0.146	18.1		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	391.3		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر سنتر	1	0.143	190.3		
1.720	1.720	2.2	بارد	عدد ٦ سهم				8.8	عند الصينيه
1.720	1.720	2.4	بارد	مطب		12.4		29.8	المخابرات
1.762	1.762	2.4	بارد	مطب		11		26.4	المخابرات
2.541	3.207	666	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	391.6		
2.541	3.207	666	ساخن	محور	2	0.141	62.6		
2.541	3.207	666	بارد	مستمر	2	0.15		199.8	ازاله اصفر
5.925	5.925	4.4	بارد	مطب		8.7		38.3	صلاح الدين
6.359	6.359	4.2	بارد	مطب		8.4		35.3	صلاح الدين
3.207	9.081	5874	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1727.0		
3.207	9.081	1258	ساخن	محور	1	0.141	59.1		
3.207	9.081	4687	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	684.3		
8.252	8.252	2.8	بارد	مطب	1	7.4		20.7	القرية البدويه
8.356	8.356	2.5	بارد	مطب	1	7.4		18.5	القرية البدويه
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	10		45.0	كمين طابا
9.152	9.152	2.5	بارد	مطب	1	8.5		21.3	كمين طابا
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	11.1		50.0	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.2		39.2	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.1		38.9	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.2		15.6	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.3		15.9	كمين طابا
9.152	9.152	5	بارد	مطب	1	7.1		35.5	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.6		28.8	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.8		29.4	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.7		29.1	كمين طابا
9.152	9.152	688	بارد	مستمر	1	0.15		103.2	كمين طابا
				الاجمالي			4382.4	1136.3	

حصر اعماله
طاب

حصر اعماله
طاب

القطاع كمين طابا - طاباهايتس - نويبع حتى بدايه الازدواج

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
9.081	9.303	222	ساخن	مستمر جنب	1	0.145	32.2		
9.303	9.483	180	بارد	مستمر	3	0.15		81.0	وادي
9.081	18.854	2875	ساخن	محور	1	0.145	139.0		
9.081	18.854	9773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	2873.3		
9.081	18.854	6898	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	1007.1		
9.081	18.854	558	ساخن	مستمر سنتر اضافي	1	0.143	79.8		
18.854	18.854	2.1	بارد	مطب	1	7.3		15.3	طابا هايتس
18.854	18.854	3.3	بارد	مطب	1	8.6		28.4	طابا هايتس
18.854	18.854	2.8	بارد	مطب	1	7.3		20.4	طابا هايتس
18.854	23.215	632	ساخن	محور	1	0.142	29.9		
18.854	23.215	4361	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1282.1		
18.854	23.215	3730	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	544.6		
23.215	23.458	243	بارد	مستمر	3	0.15		109.4	وادي
23.458	24.130	672	ساخن	محور	1	0.135	30.2		
23.458	24.469	1011	ساخن	مستمر جنب	2	0.138	279.0		
24.130	24.469	339	ساخن	مستمر سنتر	1	0.134	45.4		
24.469	24.689	220	بارد	مستمر	3	0.15		99.0	وادي
24.689	35.676	1136	ساخن	محور	1	0.138	52.3		
24.689	35.676	10987	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	3230.2		
24.689	35.676	9851	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	1428.4		
35.676	35.676	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.786	35.786	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	57.418	2275	ساخن	محور	1	0.143	108.4		
35.676	57.418	21742	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	6392.1		
35.676	57.418	19467	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	2822.7		
57.418	57.418	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.714	57.714	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.800	57.800	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.831	57.831	4.5	بارد	مطب	1	10.5		47.25	كمين البدن
57.896	57.896	4.5	بارد	مطب	1	7.7		34.65	كمين البدن
58.024	58.024	3.1	بارد	مطب	1	7.6		23.56	كمين البدن
57.418	72.639	659	ساخن	محور	1	0.131	28.8		
57.418	72.639	15221	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	4475.0		
57.418	72.639	14562	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	2126.1		
61.892	61.892	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
62.063	62.063	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	4	بارد	نوز	1	38		76	مدخل نوبيع
63.110	63.110	2.2	بارد	عداد سهم		6		13.2	مدخل نوبيع
64.658	64.658	4	بارد	مطب	1	7.3		29.2	بنزينة مصر
65.490	65.490	4	بارد	مطب	1	11.1		44.4	الجامع
63.578	63.578	3.5	بارد	تهشير	1	44		154	نوبيع ١ ut
66.557	66.557	3.5	بارد	تهشير	1	23.2		81.2	نوبيع ٢ ut
67.487	67.487	3.6	بارد	مطب	2	8.5		61.2	وادي وتير
		2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	مستمر	4	0.15		213.6	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	50/50	1	0.15		53.4	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	محور	4	0.15		71.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	6سهم		6		13.2	وادي وتير
67.961	67.961	2.2	بارد	4سهم		4		8.8	وادي وتير
67.961	67.961	4.5	بارد	مطب	1	8.5		38.25	وادي وتير
67.961	67.961	3.6	بارد	مطب	1	8.5		30.6	وادي وتير
70.870	70.870	4.5	بارد	مطب	1	10.7		48.15	بنزينة وطنية
70.870	70.870	2.2	بارد	16سهم				35.2	
71.137	71.137	4.5	بارد	مطب	1	11.4		51.3	اتجاه دهب نوبيع
71.137	72.639	800	ساخن	50/50	1	0.144	57.6		ut
72.639	72.639	250	ساخن	مستمر	1	0.146	36.5		النوزد
72.639	72.639	10	بارد	نوز	1	40		200.0	مدخل نوبيع
							27100.7	1923.6	الاجمالي

الاجمالي

and give
BT

(Handwritten signature)

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق نويبع / دهب بطول

٢٧ كم

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٢)

تنفيذ : الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعلانية

- يوجد بكراسة الشروط (توريد بوية مرورية على البارد محاور للطرق بيضاء اللون بقيمة (٣٥ ألف

جنية) (خمسة وثلاثون ألف جنية) الى مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة

قدرها ٧٠ ألف جنية (سبعون ألف جنية).

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطمسان



أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (١٦٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
المؤرخ في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤ بمبلغ ٤,٩٨٩,٧٥٠ جنيهه (فقط وقدرة أربعة
مليون وتسعمائة تسعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " استكمال أعمال تامين
سلامة المرور على طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة) المنطقة
الحادية عشر - جنوب سيناء بالأمر المباشر
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى ((المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)) الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة
الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

- ٣ - على المقاول تعيين أحد الفنيين مسئولاً عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسميته من قبل المقاول ويكون لديه خبرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة قدرها ٥٠ جنيه (خمسون جنيهًا) عن كل يوم لا يتواجد فيه مسئول تأمين سلامة المرور بالموقع .
- ٤ - يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في التشغيل تحت إشراف المنطقة المشرفة ولا يتم البدء في العمل إلا بعد سحب العينات للاختبار.
- ٥ - يلتزم المقاول بتوريد بوية مرورية على البارد محاور للطرق بيضاء اللون بقيمة (٥٠ الف جنيه) (خمسون الف جنيه) الى مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها (٧٠ الف جنيه) (سبعون الف جنيه).

بند (٤١) : الضمان : بضاف الاتي :-

١. على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لانتهاء جميع اجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ ورود قرار التقييم .





تنفيذ شركة مصرية للمستلزمات الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٢١
مستخلص رقم (٢) ختامي
عملية : استكمال اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٨٢) في ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبويه المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	م	١٠٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠	ختامي	٤٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٦) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٧) بوليصة التأمين سارية حتي ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ . (٨) يراعي الخصومات الواردة بمحضر الاستلام و التقييم الابتدائي.
٢	نقل و تركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) و البند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير و طبقا للشروط و المواصفات	٨٠٠	عدد	٠	٥٦١,٠٠	٥٦١	ختامي	٤٤٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٨٠٠,٠٠	
فقط أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري لا غير											٤٩٤٨٨٠٠,٠٠

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع

أقر بصحة ذلك/ المقاول
م/ هشام علي العجروني
التوقيع

