



قطاع الشركة من 623+020 الى 626+020 العقد من 622+997 الى 624+300
تنفيذ شركة / الرؤى للمقاولات العمومية والتوريدات - اشرف عثمان على خليل شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 1 / 20

العقد رقم : (307 / 2023 / 2024) بتاريخ 2023 / 09 / 04

رقم البند	بيان الاعمال	كمية البند بالمتر	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جدة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جدة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-1	بالمتر المسطح أعمال نظهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التلنيد ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب وعمومية تمهيداً لأعمال الرصف المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	45723.00	م2	43330.00	0.00	43330.00	جاري	259980.00	0.00	259980.00	العلامات الإرشادية متواجده
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالعماء الأسفلتي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وكذلك الجيد بالهرسات والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعمدة والقطاعات العرضية والرسومات التنفيذية المعمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1000.085	م3	0.00	127.00	127.00	جاري	2921.00	0.00	2921.00	الاجهزة المساحية متواجده .
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	1000.085	م3	0.00	127.00	127.00	جاري	76.20	0.00	76.20	المعدات متواجده.
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالعماء الأسفلتي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وكذلك الجيد بالهرسات والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعمدة والقطاعات العرضية والرسومات التنفيذية المعمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	148000.00	م3	107220.00	4317.00	111537.00	جاري	2899962.00	0.00	2899962.00	الاجهزة المساحية متواجده .
2-2-1	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	148000.00	م3	72220.00	4317.00	76537.00	جاري	53575.90	0.00	53575.90	المعدات متواجده.
2-3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متجمدة أو) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالعماء الأسفلتي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وكذلك الجيد بالهرسات والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعمدة والقطاعات العرضية والرسومات التنفيذية المعمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	95000.00	م3	30330.00	38776.00	69106.00	جاري	2142286.00	0.00	2142286.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد
2-3-1	علاوة زيادة السولار 0.8 جنيه/3م ابتداء من 2023/5/4 .	95000.00	م3	30330.00	38776.00	69106.00	جاري	55284.80	0.00	55284.80	التقرير - المباني - الاسويحي - الشهي - متواجده.
3-1	أعمال تحميل ونقل أتربة عتاقية للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 620%) ورشها بالعماء الأسفلتي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعمدة والقطاعات العرضية والرسومات التنفيذية المعمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	64770.17	م3	24030.00	11827.00	35857.00	جاري	2151420.00	0.00	2151420.00	براعي تطبيق نصوص المتأكد
3-1-1	علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	64770.17	م3	24030.00	11827.00	35857.00	جاري	68128.30	0.00	68128.30	المستلزمات والمهمات متواجده
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)											
7633634.20											
7633634.20											
0.00											
7633634.20											
0.00											
7633634.20											



يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وإن المبالغ المبينة به تظهر وقدره
المعتمد
2024 سنة / 1

على الحساب
نهائي


يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة الفات

تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مدير الأعمال
مدير المشروعات
التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /



عن مستشاري
المكتب الفني
(HSP)
التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /

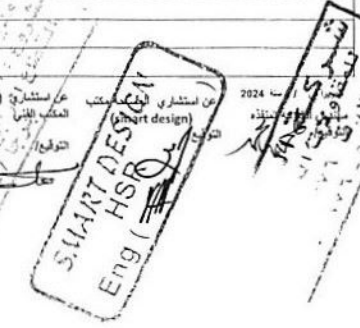

شاملة المدة	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		فرش	جنيه
بيان الأعمال التي تمت الآن		٧٦٣٣	٣٨٤,٢٠
الزجاج		٥٥٥,٢٠	٥١-
المواد الخشبية		٢٨٣٤٤	٧,٢٠
مستحق صرفه		٢٠٨٣٤	٣٠
استقطاعات		٢٠٦٥٩	٤٦٩
رسم لمغة	جنيه	٢٥٥٠	-
رسم لمغة اضافي	٢٠٦٥٩	٢٠٦٥٩	٤٦٩
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		١٧,٠٩١	٥٠
صافي المبلغ المستحق		٨٨٦٦١	٥٠

سنة	تحريرا في	رقم
20	الكاتب المموط	(1) شطب
	الكاتب المموط	(2) سحب - شيك - اذن صرف) رقم
	الكاتب المموط	(3) تنفيذ في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
	الكاتب المموط	(4) والدرج في كشف الحوالات رقم
	رقم الفيد وعلامة كتاب الشطب	

رقم المسمند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع العيانية فرع بند حرف

[illegible]
