

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٣).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٣٣٢٧٢٨٠ جنيها

(فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٦٥٤٦٢٨٠ جنيها

(فقط ستة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ١٥ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ١ / ٢١ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٣ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
احمد الطحان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٢٠٢٤ / ٧٠) في ٢٠٢٤ / ٧ / ١٥

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ٢٩

مرفقات عدد ()



مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٠) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٩ / ١ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري


بيان اعمال خلال المدة مستخلص جارى رقم (٣)

الموقع بالكم	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم	مستسل
في المسافه من الكم (٤+٧٦٠ - ٤+٤٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	١٣٨٠,٠٠	م ^٣	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	٢	١
في المسافه من الكم (٢٨+٧٢٠ - ٢٨+٢٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					

المهنية العامة للطرق والكباري



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)				
بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)				
الكمية المنفذة	الوحدة	البيان	رقم البند	
	م ^٣	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسيب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢	
		أولا : اتجاه شرم الشيخ / دهب		
٤٥٠,٦٠			في المسافه من الكم (٤٠٠ + ٤٠٠ - ٤٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	١
٩٣٨,١٦			في المسافه من الكم (٢٨٠ + ٢٨٠ - ٢٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٢
		اجمالي البند الثاني		
١٣٨٨,٧٦				



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)
المصلحة العامة بشارع بورسعيد



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(28+720 - 28+280) اتجاه شرم الشيخ / دهب

الكم	الطول (م)	الميل		القدمة		المكعب (م٣)	المكعب التراكمي (م٣)
		العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)		
28+280	10.000	8.000	0.150	بلاطة بدون قدمه		12.000	12.000
28+300	20.000	10.582	0.150	0.500	1.500	46.746	58.746
28+320	20.000	9.726	0.150	0.500	1.500	44.178	102.924
28+340	20.000	8.807	0.150	0.500	1.500	41.421	144.345
28+360	20.000	9.935	0.150	0.500	1.500	44.805	189.150
28+380	20.000	9.019	0.150	0.500	1.500	42.057	231.207
28+400	20.000	9.029	0.150	0.500	1.500	42.087	273.294
28+420	20.000	9.591	0.150	0.500	1.500	43.773	317.067
28+440	20.000	10.102	0.150	0.500	1.500	45.306	362.373
28+460	20.000	10.155	0.150	0.500	1.500	45.465	407.838
28+480	20.000	9.707	0.150	0.500	1.500	44.121	451.959
28+500	20.000	10.307	0.150	0.500	1.500	45.921	497.880
28+520	20.000	10.018	0.150	0.500	1.500	45.054	542.934
28+540	20.000	9.882	0.150	0.500	1.500	44.646	587.580
28+560	20.000	10.014	0.150	0.500	1.500	45.042	632.622
28+580	20.000	9.468	0.150	0.500	1.500	43.404	676.026
28+600	20.000	8.786	0.150	0.500	1.500	41.358	717.384
28+620	20.000	8.448	0.150	0.500	1.500	40.344	757.728
28+640	20.000	8.391	0.150	0.500	1.500	40.173	797.901
28+660	20.000	8.340	0.150	0.500	1.500	40.020	837.921
28+680	20.000	8.041	0.150	0.500	1.500	39.123	877.044
28+700	20.000	8.285	0.150	0.500	1.500	39.855	916.899
28+720	10.000	9.172	0.150	0.500	1.500	21.258	938.157
الاجمالي (م٣)							
938.157							

مهندس الهيئة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)


للبيئة العامة
للطرق و للباري
(GARB)
المنطقة الاقتصادية حرة تجارة حرة



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(4+760 - 4+460) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
17.003	17.003	0.850	0.300	0.150	9.635	10.000	4+460
50.708	33.705	0.850	0.300	0.150	9.535	20.000	4+480
84.755	34.047	0.920	0.300	0.150	9.509	20.000	4+500
119.735	34.980	0.920	0.300	0.150	9.820	20.000	4+520
154.466	34.731	0.960	0.300	0.150	9.657	20.000	4+540
189.089	34.623	0.960	0.300	0.150	9.621	20.000	4+560
222.449	33.360	0.960	0.300	0.150	9.200	20.000	4+580
253.922	31.473	0.960	0.300	0.150	8.571	20.000	4+600
283.991	30.069	1.000	0.300	0.150	8.023	20.000	4+620
314.225	30.234	1.000	0.300	0.150	8.078	20.000	4+640
344.099	29.874	1.000	0.300	0.150	7.958	20.000	4+660
373.805	29.706	0.950	0.300	0.150	8.002	20.000	4+680
403.412	29.607	0.950	0.300	0.150	7.969	20.000	4+700
430.517	27.105	1.000	0.300	0.150	7.035	20.000	4+720
443.981	13.464	بدون قدمه		0.150	4.488	20.000	4+740
450.602	6.621			0.150	4.414	10.000	4+760
450.602	الاجمالي (م³)						

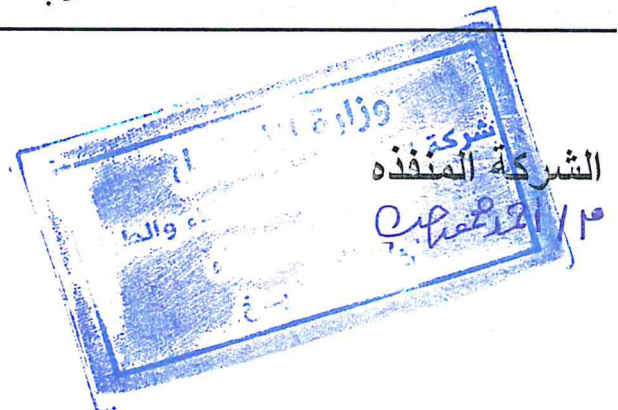

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٣ جاري

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

نسبة المنصرف	الكمية المنصرفة خلال المدة	الكمية المنصرفة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية الاجمالية المنفذة	كمية التعاقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	م
%٩٨,٩٨	١٣٨٠,٠٠	٦٦٣٠,٠٠	—	٦٦٩٨,٤٠	٧٧٣٨,٠٠	م٣	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢	١

مهندس الهيئة





تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المده من بدء العمل الي ٢٠٢٥ / ١ / ١٥
مستخلص رقم (٣) جاري
عملية اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)
العقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٧٠) في ٢٠٢٤ / ٧ / ١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م٣	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجدة . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٠٢٥ / ٥ / ٣٠ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (٤٠٠٠٠٠) فقط (فقط ريعمانه ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهو الملاحظات.
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٥٥٦	م٣	٥٢٥٠	١٣٨٠,٠٠	٦٦٣٠	جاري	١٦٩٤٦٢٨٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١٦٥٤٦٢٨٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقاً للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقاً للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ستة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير									١٦٥٤٦٢٨٠,٠٠		

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح

التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

التوقيع /



/ ٢٥

