

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء  
ملف رقم: / /

السيد الممهندس / رئيس قطاع التعمير والمناطق

تحية طيبة وبعد .....

بخصوص عملية: اعمال إنشاء الحاجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة

بطول حوالي ١٣ كم

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٢).

تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

عقد رقم: (٤١٥/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٤.

بقيمة: ٥٠٠٥٠,٦٣٨,٣٦٨ جنيه (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً مصرياً)

وخمسة قروش لا غير)

إجمالي: ١٩,٤٥٥,٢٦١,٠٠ جنيه (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان

وواحد وستون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٦.

بأهل التفضل بالعلم والإهاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ١٨/٥/٢٠٢٥

مرفقات عدد: ( )

مستخلص اصل + ٣ صوره

استماره ٥٠ ع.ج

بيان اعمال

حصر الاعمال

التجارب المعملية



مهندس /

أحمد الطحان

## استئثار المدفوعة المدورة

(١)

بيانات الموقت					
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	جنيه	قرش
				٢	
				٣	
				٢	
				٣	
				٣	

المتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس الأطباء / كريم  
وزير الطيران

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفات	بيانات	الاعتماد الإداري ونوع المخصص						المتم ذو التاريخ
		نوع المخصص	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	صلاح (١٤٥) اعمال ائاد الكواكب المسائية لأكزيون الوسائط لخبراء اسوبين / الملاحة طول ٦٢ كم عند (٢٠٠٥ / ٢٠٩٤ / ٥١) شركة (القى للمقاولات والخارج)		٣٧٨	٣٢١	٥٥			
	إجمالي الأصل							
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه					
	غادي إضافي دعوة توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش							
	حاصي القليلة الطلب مرقبا							

علامة

في ٢٠١ ستة

رئيس المصلحة



- (١) إقرار كاتب سجل الجوزات والنزارات :  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البد المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :  
 (أو) بأن المبلغ مضام بحساب : الإيرادات بتاريخ \_\_\_\_\_

المتم ذو التاريخ

ربيع في ٢٠١ سنة	٢٠١	ترقيع الكاتب المنوط بالسجل
( علامات المراجع ورئيس المصلحة )	٢٠	شيك يعتمد سحب إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات في ٢٠١ بمبلغ

الهيئة المصرية للطيران المدني رقم ٢٠١٢ - ٥٠٠٠

(٤) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) إمضاء الكاتب المنوط

المتم ذو التاريخ

(٤) قيد في دفاتر الحسابات المخصصة إمضاء موظفى الشطب

(٤) قيد في سجل الشيكات الدوليات

(٤) أدرج في كشف الشيكات الدوليات

(٤) استلمت شيك لجهة

إمضاء مطالب أو كاتب التصدير في ٢٠١

(٤) استلمت شيك لجهة

المتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشيكات الدوليات

(٤) أدرج في كشف الشيكات الدوليات

(٤) استلمت شيك لجهة

(٤) استلمت شيك لجهة

المنطقة الحادية عشر \_ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

## السيد الممهندس / رئيس قطاع التنهبي والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

بخصوص عملية : تنفيذ أعمال إنشاء الحاجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق

السويس / السخنة بطول حوالي ١٣ كم

عقد رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٥/٥٢١ )

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة

بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالية

- يوجد بكراسة الشروط (توريد بوية مرورية على البارد محاور للطرق بيضاء اللون بقيمة ١٤٠ الف

جنية) (مائة واربعون ألف جنية) إلى مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غامة قدرها


٢٨٠ ألف جنية مائتان وثمانون ألف جنية)

بأهل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاعتزاء

تحرير في: ٢٠٢٥/١/٨

مرفقات : عدد: ( )



عملية : اعمال إنشاء الحاجز الخرسانية بالجزيره الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول  
حوالى ١٣ كم  
اجماليات حصر الاعمال

الوحدة	الكميه	البند	م
٣م	١٦١٤٠,٠٠	اعمال قطع و إعادة تشغيل وتسوية للتربة	١
م.ط	٥٩٦٥,٠٠	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٢
م.ط	٧٤٨٥	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٣
٢م	٢٥٤٨١,٦٠	اعمال دهان الحاجز الخرسانية بخلط من السافيتو العازل للرطوبة	٤

مهندس هيئة الطرق و الكباري

شركة المنفذة



عملية : إنشاء الحاجز الخرساني بالجزء الوسطي لطريق السويس / السخنة بطول حوالي ١٣ كم  
 بيان أعمال مستخلص جاري

النسبة المئوية %	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة	كمية المقاييس المعلنة	الوحدة	البند	م
%١٠٠,٠٠٠	١٦,١٤٠,٠٠	١٦,١٤٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠	٣م	١ بالметр المكعب اعمال قطع و إعادة تشكيل وتسويه للتربة ورشها بالمياه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك جيداً بالهراستات والفناء تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	
%١٠٠,٠٠٠	٥,٩٦٥,٠٠	٥,٩٦٥,٠٠	٦٠٠٠,٠	م.ط	٢ بالметр الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرس) وجهين بارتفاع ٩٠ سم على الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفناء تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سماكة ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتنبيت الأشجار(٦) /م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	
%١٠٠,٠٠٠	٧,٤٨٥,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠	٧٩٦٥,٠	م.ط	٣ بالметр الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² وأ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي سماكة ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتنبيت الأشجار(٦) /م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	
%٨٢,٤١٢	٢١,٠٠٠,٠٠	٢٥,٤٨١,٦٠	٢١٠٠٠,٠	٢م	٤ بالметр المسطح اعمال دهان الحاجز الخرسانية بخليط من السافيتون العازل الرطوبية والسعر يشمل السعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنحو العمل نهاراً كاملاً والقياس هندسي طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	

مهندس الإشراف



/م

شركة التقوى للمقاولات والتجارة



/م

بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادة تشغيل وتسوية للتربة

الإجمالي	الخصم	الحد	السمك	العرض	الطول	م
١٦١٤٠	٠	١	٠,٣	٤	١٣٤٥٠	١
٣م ١٦١٤٠						الإجمالي

مهندس الاشراف

  
/م

شركة التقوى للمقاولات والتجار



بالاستر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تير جيرسي) وجهاين بارتفاع ٩٠ سم

الملامحات	الطول	المخططة		م
		إلى	من	
	١٦١٢	٠٤+٩٨٧	٠٣+٣٧٥	١
	٦١٥	٠٦+٨٦٥	٠٦+٢٥٠	٢
U-TURN خصم مسافة ٥٨ م.ط (مسافة امام قرية الوادي )	١١٩١	١٠+٥٩٩	٠٩+٣٥٠	٣
	٦٦٣	١١+٢٦٣	١٠+٦٠٠	٤
	٢٠٦	١٢+١٤٦	١١+٩٤٠	٥
	٢٤٣	١٤+٥٩٣	١٤+٣٥٠	٦
	١٧٠	١٥+٢٧٠	١٥+١٠٠	٧
	٢٥٢	١٥+٥٥٢	١٥+٣٠٠	٨
	٣٠٧	١٥+٩٠٧	١٥+٦٠٠	٩
	٢٦٦	١٦+١٩٦	١٥+٩٣٠	١٠
	١٢٢	١٦+٣٥٢	١٦+٢٣٠	١١
	٢٢٢	١٦+٦٢٢	١٦+٤٠٠	١٢
	٦٩	١٦+٧١٩	١٦+٦٥٠	١٣
عند بنزية موبيل	٥٩٦٦	28.00		١٤
			الإجمالي	

مهندس الاشراف

/م




بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم

الملحقات	الطول	المخططة		م
		إلى	من	
	م.م ط	١٦١	16+901	16+740
	م.م ط	٢٢٩٥	19+225	16+930
	م.م ط	١٣١٢	24+982	23+670
	م.م ط	٣٧١٧	24+017	20+300
	م.م ط	٧٤٨٥	الإجمالي	

مهندس الإشراف

/م

شركة التقوى للمقاولات والتجاره

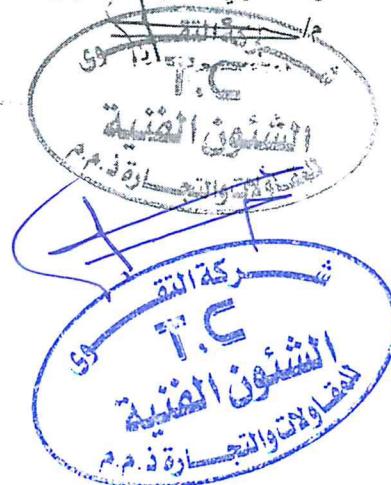

بالمتر المسطح اعمال دهان الحاجز الخرساني بخليل من السافيتوا العازل للرطوبة

الملحوظات	مسطح الدهان ٢م	طول الحاجز الخرساني م.ط	مسطح الحاجز (٢م)	نوع الحاجز	م
	١٢٢٩٨,٩٥	٦٧٩٥,٠٠	١,٨١	وجهة واحد	١
	١٣١٨٢,٦٥	٥٩٦٥,٠٠	٢,٢١	وجهين	٢
	اجمالي الدهان (٢م)				
	٢٥٤٨١,٦٠				


مهندس الاشراف



/م

شركة التقوي للمقاولات والتجاره

/م




الهيئة العامة للطرق و الكباري  
عملية : اعمال إنشاء الحاجز الخرسانية بالجزيره الوسطى لطريق السويس / السخنه بطول حوالي ١٣ كم  
عقد رقم : (٥٢١/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤  
تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات و التجارية  
مستخلص جاري رقم ٢

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٥-١٠-٦

رقم البند	بيان الأعمال	الفنية	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع او حجز جنية	باقي بعد الاستقطاعات جنية	نهاي / جاري	ملاحظات
١	بالметр المكعب اعمال قطع و اعاده تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالماء للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهراسات والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٣١,١٥	٣م	١٦,٥٠٠	١٥,٣٣٣,٠٠	٨٠٧,٠٠	١٦,١٤٠,٠٠	٥٠٢,٧٦١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٧٦١,٠٠	٣٠	تم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعلم متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقرير المبدئي والبرنامج الزمني متواجد
٢	بالметр الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم على الفرشة طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والفنية تشمل فرشة من الخرسانة العادي سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتشييت الأشواير(٦٠١٠) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	١,٥٠٠,٠٠	م.ط	٦,٠٠٠	٥,٦٦٦,٠٠	٢٩٩,٠٠	٥,٩٦٥,٠٠	٨,٩٤٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٤٧,٥٠٠,٠٠	٣٠	٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة ٩- يتم خصم مبلغ وقدره ( ) جنيه قيمة التجارب
٣	بالметр الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وا يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتشييت الأشواير(٦٠١٠) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠٠,٠٠	م.ط	٧,٩٦٥	٧,١١٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠,٠٠,٠٠	٣٠	
٤	بالметр المسطح اعمال دهان الحاجز الخرسانية بخلط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل والسعر يشمل كل ما يلزم لنھو العمل نھارا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا والقياس هندي وطبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٢٠,٠٠	٢م	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢,٥٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٢٠,٠٠٠,٠٠	٣٠	
<b>الإجمالي</b>												
<b>فقط تسعة عشر مليونا وأربعينا وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وستون جنيهاً مصرياً لا غير</b>												

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء



مهندس / احمد الطحان  
التاريخ :

مدير مشروع الهيئة

م / محمد سامي

التاريخ :

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

التاريخ :

الشركة المنفذة

مدير المشروع ( الشركة المنفذة )

م / أحمد مصطفى عبد العزيز

التاريخ :

