



عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منقولة/جرجا) المسافة من الكم ٣٩٤٤٥٠٠ الى الكم ٣٩٥٥٠٠٠ بطول ٥٠٠ كم (بالأمر المباشر).



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة المسابعة)

تنفيذ: شركة الحياة للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٤٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد بعد المناوضة		الوحدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		قرش / جنيه	قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه				
		يراعى تطبيق نصوص التعاقد														
٩	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة														مكتب جهاز الاشراف متواجد	
	المعمل متواجد															
	لوحات المشروع متواجدة															
٤-٩	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم/٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٧٥,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٩٧٠٠,٠٠	٩٧٠٠,٠٠		٧٢٧٥٠٠,٠٠				٧٢٧٥٠٠,٠٠		البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد	
	علاوة ١,٩٥جنيه/٣م لارتفاع السولار	١,٩٠	١٥٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٩٧٠٠,٠٠	٩٧٠٠,٠٠		١٨٤٣٠,٠٠				١٨٤٣٠,٠٠		وثيقة التأمين متواجدة	
٦-٩	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم/٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٨٨,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	جارى ١	٤٥٧٦٠٠٠,٠٠				٤٥٧٦٠٠٠,٠٠		البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد	
	علاوة ٢,٢جنيه/٣م لارتفاع السولار	٢,٢٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠			١١٤٤٠٠				١١٤٤٠٠,٠٠		وثيقة التأمين متواجدة
الإجمالى																
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص																
اجمالى قيمة الاستقطاعات																
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات																
ما سبق صرفه																
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)																

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

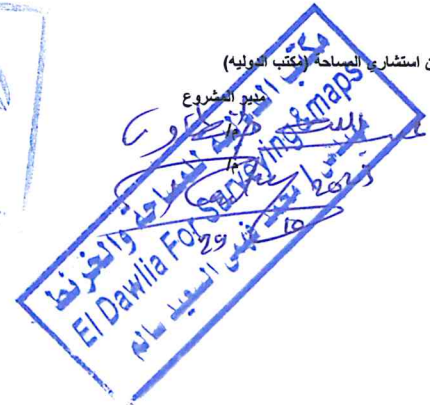

عن الاستشاري (مستشار)
مدير المشروع
/م
/م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
/م
/م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
/م
/م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
/م
/م

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط
/م
مهندس/ مصطفى علي مسعود
