


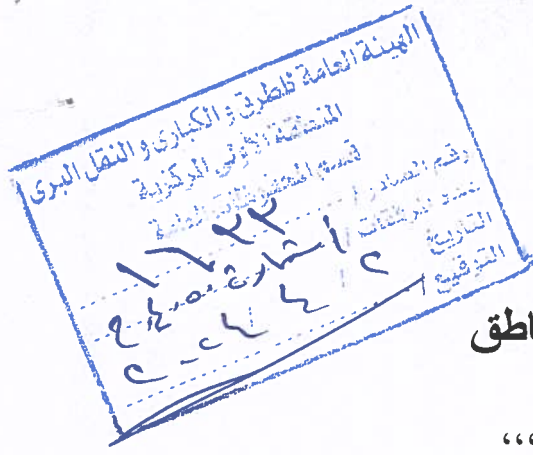

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٩١٩٥٧٥٧.٥٧ جنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلص رقم (١١/١٠) عملية استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ١٢٤,٠٠٠ الى الكم ١٤٠,٠٠٠ بطول ١٦ كم الاتجاهين (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٤/٢

عدد المرفقات ()

صور من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

الإجمالي

شركة سامكو
مدير المشروع
E Y P
التقارير الهندسية
مهندس عبد



Electric Express Train - HSR
Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nnatroun
Samco sector from 124+000 to 140+000



البرنامج الزمني لتنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
 لتنفيذ المسافة من الكم 124+00 إلى الكم 140+00 بطول 16 كم (الاتجاهين)

May-24				Apr-24				Mar-24				Feb-24				Jan-24				Dec-23				Nov-23				Oct-22				Sep-23				Aug-23				Jul-23				اجمالي الكميات (m3)	البيان	البند
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1											
28200	24675	21150	17625	14100	10575	7050	3525																													28200	أعمال الردم	3-1								
39600	34650	29700	24750	19800	14850	9900	4950																													39600	أعمال الحفر	2-1								
20200	18930	17668	16406	15144	13882	12620	11358	10096	8834	7572	6310	5048	3786	2524	1262																						20200	أعمال طبقة التأسيس	4-1							
20700	19395	18102	16809	15516	14223	12930	11637	10344	9051	7758	6465	5172	3879	2586	1293																							20700	أعمال طبقة الأساس	5-1						
435	378	324	270	216	162	108	54																															435	تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	1-4						
35180	32970	30772	28574	26376	24178	21980	19782	17584	15386	13188	10990	8792	6594	4396	2198																								35180	أعمال البلاطات الخرسانية	7-1					
									188	180	150	120	90	60	30																										188	قدمات البلاطات الخرسانية	7-2			

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الاولى

م/ نصر محمد طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م/ جهاد محمد سعد

ج.د

الهيئة العامة للطرق والكبارى


مدير المشروع

م/ أسماء على الشاذلى

أ.د

شركة سامكو

مدير المشروع



القطار الكهربائي السريع - شرق
